İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



2012 Yılı Faaliyet Raporu

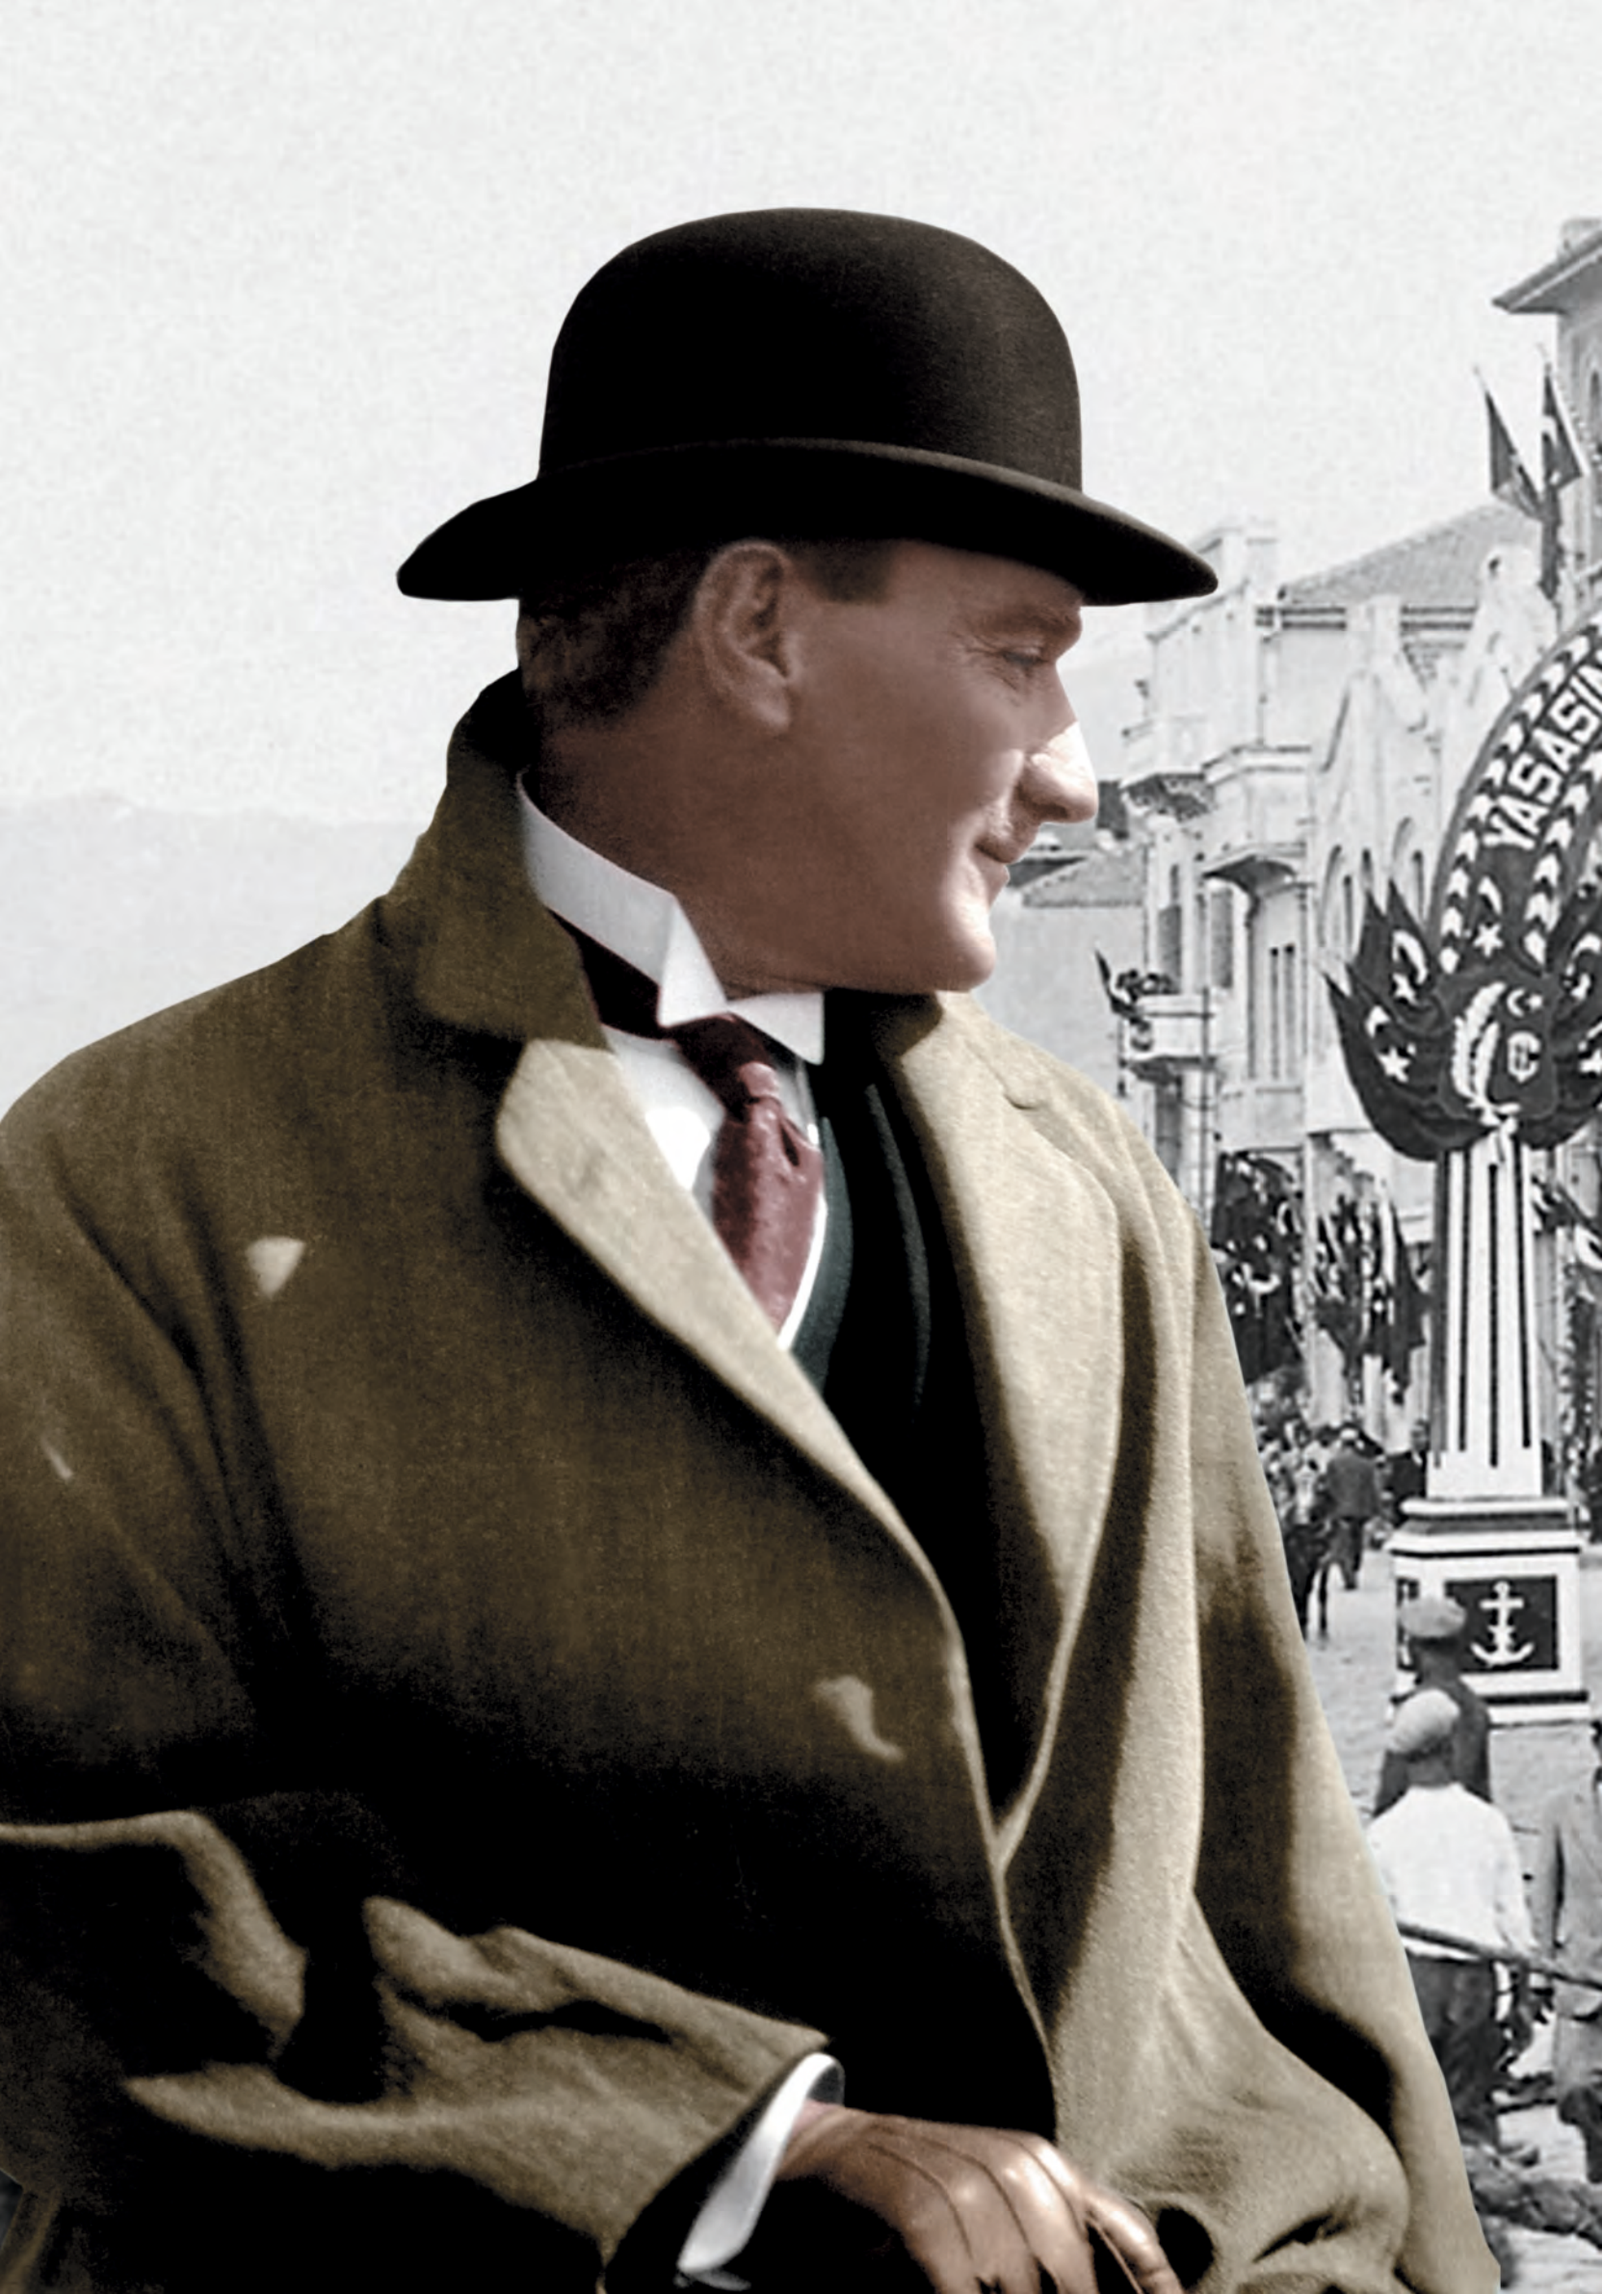


NTURKIYE CUMHURIYETI
G. Atatürk



Değerli Hemşehrilerim,

İzmir'e ve sizlere hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak için tüm gayretimizle çalıştığımız, yine önemli proje ve yatırımlara imza attığımız 2012 yılında, İZSU Genel Müdürlüğümüzün görevleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerimizi dikkatlerinize sunuyoruz.

Kentimizin içme suyu, atıksu ve kanalizasyon hizmetleri alanındaki ihtiyaçlarını yüksek standartlarda karşılamayı hedefleyerek bu alanda yine çok önemli adımlar attık, mesafe aldık. Yaşamımızın olmazsa olmaz en temel kaynaklarından olan suyun yönetimini, bugünle beraber geleceği de düşünerek büyük bir duyarlılıkla ve en üst düzeyde sorumluluk bilinciyle ele almaya devam ettik, ediyoruz.

Bu duyarlılık ve bilincimiz, İZSU 2010-2014 Stratejik Planı'nda deklare ettiğimiz vizyonumuzda da en özet şekliyle ifadesini bulmaktadır. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğini temel alan, çevreye ve doğal yaşama duyarlılık, kamu hizmeti bilinci, dünya standartlarında teknoloji, etkin yönetim anlayışı ile çalışan çağdaş bir lider kurum olma vizyonumuz doğrultusunda sizlere hizmet için geceli gündüzlü çalışıyoruz.

İZSU 2010-2014 Yılları Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2012 Yılı Performans Programı'yla, Genel Müdürlüğümüzün bir yıllık faaliyetlerini ayrıntılı biçimde belirledik. Geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetlerin değerlendirmelerine de bu raporda yer verdik.

Sizlere kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamaya yönelik yatırım ve hizmetlerimize 2012 yılında yenileri eklendi. İçme suyu şebeke ve iletim hattı imalatımızı iki katına çıkardık. Büyükşehir yetki alanımıza sonradan eklenen yerleşim birimlerinin bir çoğunun eski içmesuyu şebekeleri, daha sağlıklı malzeme kullanılarak ve su kayıplarını azaltacak şekilde yenilendi. Mevcut hatlarımızın bakımı, onarımı, arıza giderme ve azaltma çalışmalarının yenilenen araçlarımızla ve ekiplerimizin özverili çalışmaları ile sürdürülmesiyle, su şebekelerindeki arızalar geçen yıla oranla azaltıldı.

Gördes Barajı'ndan kentimize su temin etme amaçlı çalışmalarımız kapsamında, süreci hızlandırmak için yapımı öngörülen Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni planlanan tarihten önce tamamlayarak barajdan kentimize su verilmesine 2011 yılında başlamıştık. 2012 yılında da Gördes'ten su temininde devreye girmesi öngörülen ikinci yüksek kapasiteli tesis olarak, Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin proje çalışmalarını sürdürdük.

Kanalizasyon sistemine yönelik yatırım ve hizmetlerimize de yine büyük bir gayretle devam ediyoruz. 2012'de kilometrelerce kanalizasyon hattı imalatı, bakımı ve onarımını sağladık. Yağmursuyu hattı imalatlarımızı ve projelerimizi hızla sürdürdük. Kanalizasyon altyapısı ile arıtma tesislerimizin ömrünü uzatma ve taşkın yaşanan bölgelerdeki sorunları giderme amacıyla yağmursuyu ayrıştırma projelerini hayata geçirdik. Geçtiğimizin yılın iki katı daha fazla dere ıslahı gerçekleştirdik.

Vizyonumuz doğrultusunda, en önemli önceliklerimiz ve hassasiyetlerimizden olan "çevreye yatırıma" ara vermeksizin devam ettik. 2012 itibariyle, kentimiz 24 adet atıksu arıtma tesisine sahiptir. Kentimizde arıtılan atık suyun neredeyse tamamı, ileri biyolojik yöntemlerle arıtılmaktadır ve İzmir, ileri yöntemlerle atıksu arıtmada öncü kentlerden biri olma konumunu yine korumaktadır. "Büyük Körfez Projesi"ne 2011 yılında başladık. Yüzülebilir bir körfez hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için çalışma ve yatırımlarımız hızla devam ediyor.

Tüm bu çalışmalarımızda desteklerini her zaman hissettiren siz değerli hemşehrilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyor, proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde görev alan tüm İZSU yöneticileri ve personeli ile raporun hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



Saygıdeğer İzmirliler,

2012 Yılı kış aylarında gerçekleşen yoğun yağışlar sonucu İzmir'imize oldukça fazla su sağlanmış, ancak can kaybı yaratacak ölçüde büyük taşkınlar yaşanmamıştır. Yağışlar ve baraj rezervuarlarımızda önemli su potansiyeli elde edilmesi, önümüzdeki yıllar için büyük bir su rezervi yaratılmasını sağlamıştır.

2012'de kentimizde; yaklaşık 723 km. içme suyu, 131 km. atıksu kanalizasyon hattı döşenmiş olup; 19 km yağmursuyu kanalizasyonu ve 18 km'de dere ıslahı çalışması gerçekleştirilmiştir.

Gördes Barajından kentimize su temin etme amaçlı DSİ ile ortak çalışmalarımız kapsamında; İdaremizce 2011 Yılında planlanan tarihten önce tamamlanarak barajdan su temini başlatılan 135.000 metreküp/gün kapasiteli Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden sonra, devreye girmesi öngörülen ikinci büyük kapasiteli tesis olarak Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisinin proje çalışmaları 2012 Yılında sürdürülmüştür. 365.000 metreküp/gün kapasiteli Tesise ilişkin çalışmalar tamamlandığında, buraya ulaştırılarak arıtılacak suyun temini giderek nüfusu ve çağdaş ihtiyaçları artan kentimize su kaynağı kazandırmada yeni bir büyük adım olacaktır.

Önemli su kaynaklarından birisi olan Çamlı Barajının planlama revizyon raporu tamamlanmıştır.

2011 ve 2012 Yıllarında 60 köyümüzdeki su depolarında kurulan güneş panelleri ile, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik önemli bir adım atılmıştır. Su depolarının otomatik klorlama sistemleri, bu panellerden üretilen enerji ile beslenerek, hem enerji maliyetleri düşürülmüş hem de çevreye duyarlı bir teknolojiyle suyun dezenfeksiyonu sağlanmıştır.

Tüm atıksu arıtma tesislerimizin çamurlarının bertaraf edilmesi amacıyla, Çiğli'de yapılması planlanan atıksu çamurları bertaraf tesisi inşaatı önemli ölçüde tamamlanmıştır. Çamur Çürütme Kurutma Tesisi yapımına 2012 Yılında başlanmış olup, 2013 Yılında Kurutma Tesisinin işletmeye alınması ve Çürütme Tesisinin tamamlanması planlanmaktadır.

Kentimiz, atıksu arıtma kapasitesi ve tesis sayısı bakımından ülkemizin öncü kentlerinden bir olmaya devam etmiştir. 2012 Yılında, kıyı şeridinde oldukça yüksek öneme haiz olan Özdere ve Doğanbey Atıksu Arıtma Tesislerinin inşaatının tamamlanması aşamasına gelinmiştir. Özdere Atıksu Arıtma Tesisiyle birlikte, kentimiz 125.000 kişilik evsel atıksu arıtma kapasitesine sahip bir ileri biyolojik arıtma tesisine daha kavuşacaktır.

Kanalizasyon altyapısına yönelik çalışmalar kapsamında hayata geçirilen yağmur suyu ayrıştırma projeleri, atıksu ve yağmur sularını birlikte toplayarak arıtma tesislerine ileten mevcut birleşik sistem kanalizasyon altyapısının ve arıtma tesislerinin ömürlerini uzatma amacıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda, yağmur suları mevcut sistemden ayrıştırılarak alıcı ortama ulaştırılmaktadır. 2012 Yılında ilk etapta Bornova Çamdibi bölgesi projelendirilerek yapım aşamasına gelinmiş, ikinci etap olarak ele alınan Buca ilçesi projelerinde tamamlanma aşamasına gelinmiştir.

İzmir'in en büyük çevre projelerinden olan ve 2011 Yılında başlayan Büyük Körfez Projesi hızla ilerlemektedir. Bu kapsamda; hem 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'yle ortak bir model çalışması yapılmakta olup; hem de DDY Genel Müdürlüğü ile yapılan projeler çerçevesinde körfezin kuzeyinde ve deniz tabanında bir sirkülasyon kanalı açılması uygulamasına başlanmıştır. Oluşturulan model, körfezde kanal açılması, derinleştirme çalışmaları, gelecekteki kıyı tasarımı ve mühendislik uygulamalarında temel teşkil etmektedir. Bu çalışmalar tamamlanmış ve ilgili Bakanlığa ÇED başvurusunda bulunulmuştur.

Bu proje içerisinde, körfezde ilk defa olarak akıntı ve deniz dibi hareketlerini ölçen, aynı zamanda meteoroloji verilerini üretecek dört ayrı istasyon kurulmuştur. Bununla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere inşası yapılan ileri teknolojiye sahip kesici-emici gemi ve römorkör çalışmaya başlamıştır. Söz konusu gemilerin katılımıyla çalışmalar daha da hızlandırılmıştır. Böylece ileriki tarihlerde denize girilebilir bir körfezin yaratılmasında daha fazla mesafe aldığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum.

İZSU Genel Müdürlüğü ileri teknolojiye sahip ve donanımlı yapısıyla, kentimize ve İzmir halkımıza kaliteli hizmetler sunmaya devam edecektir.

Hemşehrilerimize ve Değerli Meclisimize saygıyla arz ederim.

Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
İzsu Genel Müdürü

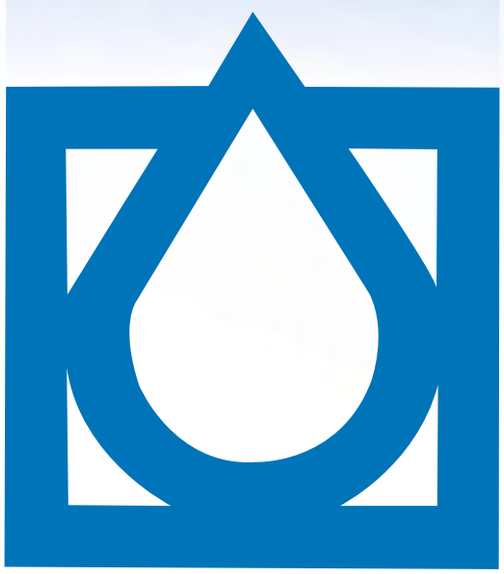

İZSU

T.C.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

YÖNETİM KURULU

AZİZ KOCAOĞLU	**İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı** **Yönetim Kurulu Başkanı**
DR. AHMET HAMDİ ALPASLAN	**Genel Müdür** **Yönetim Kurulu Üyesi**
DR. AYŞE SUZAN GÖK	**Genel Müdür Yardımcısı** **Yönetim Kurulu Üyesi**
PROF. DR. ÖMER ZAFER ALKU	**Yönetim Kurulu Üyesi**
DOÇ. DR. GÖKDENİZ NEŞER	**Yönetim Kurulu Üyesi**
PROF. DR. AYŞE FİLİBELİ	**Yönetim Kurulu Üyesi**

DENETÇİLER

BARIŞ KARCI

ÜNAL DAĞLI

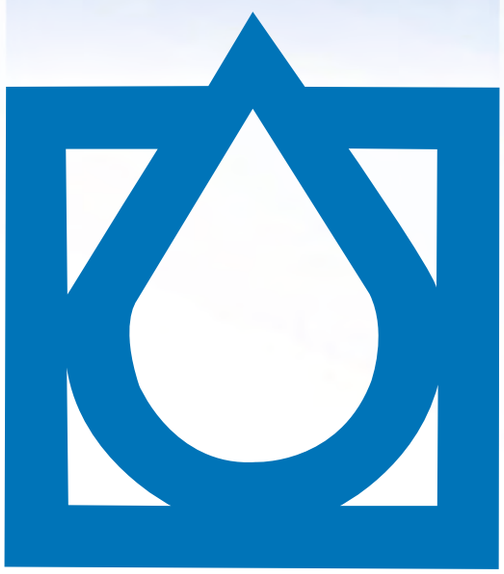

İZSU

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZSU

Karar No : 59285762-50.02.04/ 290

Karar Tarihi : 02.05.2013

YÖNETİM KURULU KARARI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 22.04.2013 tarih ve 75176608-040.05/ 5983 sayılı teklif yazısı ve ekleri incelendi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden Dairesince hazırlanan, ekli **2012 yılı İZSU Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu** kurulumuzca incelenerek uygun görülmüş olup, 2560 sayılı Kanunun 3009 sayılı Kanunla değişik 6. maddesi (e) fıkrasına istinaden karara bağlanmak üzere Genel Kurula havalesine, karar verilmiştir.

Aziz KOCAOĞLU Başkan	Dr. Ahmet H. ALPASLAN Genel Müdür	Dr. A. Suzan GÖK Genel Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU Üye	Prof.Dr.Gökdeniz NEŞER Üye	Prof.Dr.Ayşe FİLİBELİ Üye

ASLININ AYNIDIR

Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Şb. Md.

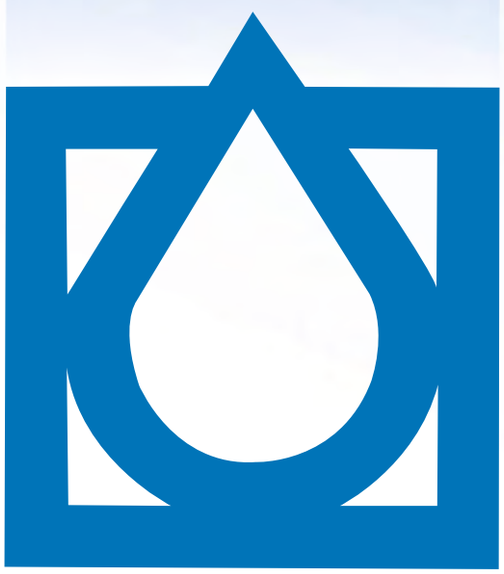

İZSU

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Karar No : 52158563-050.01.04/ 10

Karar Tarihi : 17.05.2013

İZSU GENEL KURULU KARARI
(MECLİS KARARI)

İZSU Genel Müdürlüğü ifadeli 06.05.2013 tarih, 52158563-40.05/ 805 sayılı Başkanlık önergesinde;

"5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan, ekli **2012 yılı İZSU Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu** İZSU Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş olup, görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim." Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık önergesi Genel Kurulca görüşülmüş olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden hazırlanan ekli **2012 yılı İZSU Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporunun,** 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişik 6. maddesi (e) fıkrasına istinaden oyçokluğu ile kabulüne, karar verilmiştir.

İmza

Aziz KOCAOĞLU
Meclis Başkanı
Büyükşehir Belediye Başkanı

İmza İmza İmza

Günsel SAĞLAM	(Bulunmadı) Mehmet ARITMAN	Olgun ATİLA	Ahmet TÜRKYILMAZ
Katip	Katip	Katip	Katip

ASLININ AYNIDIR

Ergül BAÇ
Kararlar ve Tutanaklar Şb. Md.

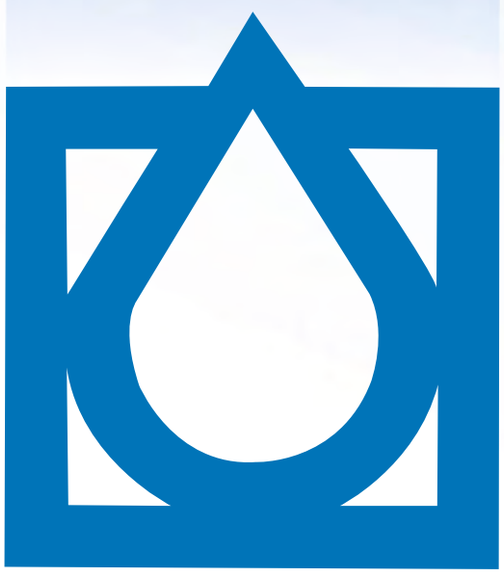

İZSU

İZSU GENEL MÜDÜRÜ ÖZGEÇMİŞİ

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı Soyadı	: Ahmet Hamdi ALPASLAN
Doğum Yeri	: Diyarbakır
Doğum Tarihi	: 01.12.1949
Medeni Durumu	: Evli

EĞİTİM DURUMU:

- 1972 : E.Ü. Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Lisans)
- 1974 : E.Ü. Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği (Yüksek Lisans)
- 1980 : E.Ü. İnşaat Fakültesi-Doktora

YABANCI DİL BİLGİSİ :İngilizce

BİLGİSAYAR BİLGİSİ :İşletim Sistemi, İnternet Kullanımı

SAHİP OLDUĞU EHLİYETLER :B sınıfı sürücü ehliyeti

İŞ TECRÜBESİ

- 1972 – 1976 : E.Ü. Mühendislik Bilimleri Fakültesi - Asistan

(DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-DSİ)

- 1976 – 2001 : 2. Bölge Müdürlüğü - Etüd Plan Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı (İzmir)
- 2001 – 2003 : 2. Bölge Müdürü (İzmir)
- 2003 – 2006 : Çoruh Projeleri Bölge Müdürü (Artvin)
- 2006 – 2007 : Etüd ve Plan Dairesi Başkanı (Ankara)

(İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

- 2007 – 2008 : Genel Müdür Yardımcısı
- 2008 – … : Genel Müdür

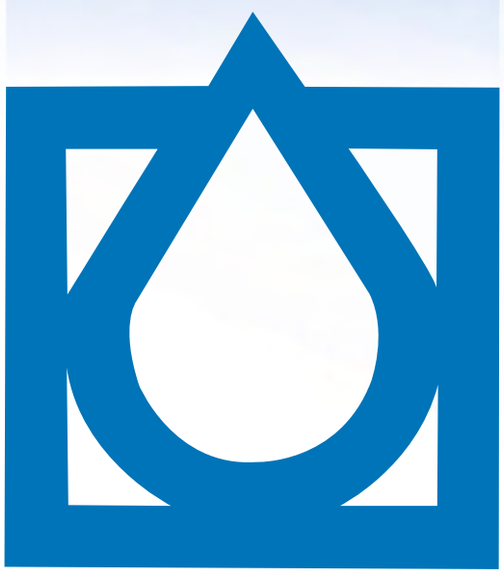

İZSU

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI m½D94 aTT

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı Soyadı	: Ali ATEŞ
Doğum Yeri	: Antalya
Doğum Tarihi	: 15.12.1950
Medeni Durumu	: EVLİ

EĞİTİM DURUMU:

- 1958-1968 :İlk-Orta ve Lise Eğitimi
- 31.07.1974 :Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

YABANCI DİL BİLGİSİ : Almanca

BİLGİSAYAR BİLGİSİ : İşletim Sistemi, İnternet Kullanımı

SAHİP OLDUĞU EHLİYETLER : B sınıfı sürücü ehliyeti

İŞ TECRÜBESİ:

- 1976 - 1987 :ESHOT Genel Müdürlüğü - Kontrol Mühendisi, Etüd Proje Müdür Yardımcısı, Etüd Proje Müdürü

(İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

- 1987 - 2006 : İçmesuyu Proje Müdürü
  Kesin Hesap Şube Müdürü
  Keşif İhale Şube Müdürü
  İnşaat Kont. Şube Müdürü
  Projeler Şube Müdürü
  Kanal Proje Müdürü
  Etüd Planlama Daire Başkanı
  Yönetim Kurulu Üyesi
- 2008 - 2009 : Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı
- 2009 (Mayıs) – … : Genel Müdür Yardımcısı
- 2010 – 2011(Mayıs) : Yönetim Kurulu Üyesi

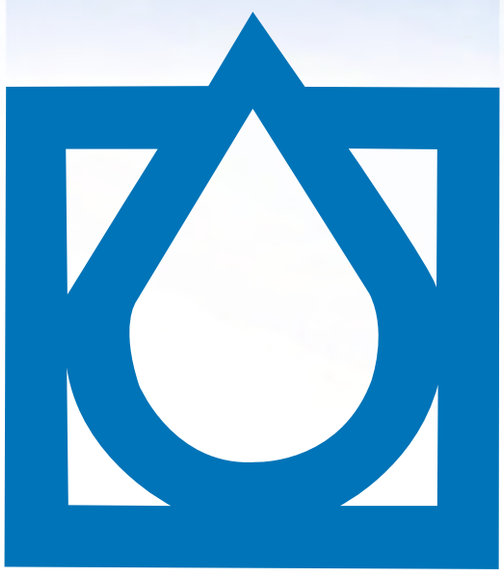

İZSU

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇMİŞİ

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı Soyadı	: A.Suzan GÖK
Doğum Yeri	: Ankara
Doğum Tarihi	: 30.07.1958
Medeni Durumu	: Evli

EĞİTİM DURUMU:

- 1965 – 1975 : İlk-Orta ve Lise Eğitimi
- 1975 – 1980 : Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Lisans)
- 1982 – 1985 : Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Yüksek Lisans ve Doktora)

YABANCI DİL BİLGİSİ : İngilizce

BİLGİSAYAR BİLGİSİ :Word, Excel, İnternet ve Bütçe Programı kullanımı

SAHİP OLDUĞU EHLİYETLER : B sınıfı sürücü ehliyeti

İS TECRÜBESİ:

- 1980 – 1985 : Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Asistan
- 1985 – 1988 : İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü
- 1986 – 1990 : DEÜ Deniz Bil.Tek.Enst. Öğretim Görevlisi
- 1989 – 1990 : EÜ Su Ürünleri Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi

(İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

- 1988 – 1996 : Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü
- 1996 – 2008 : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
- 2008 – … : Genel Müdür Yardımcısı
- 2011 (Mayıs) – … : Yönetim Kurulu Üyesi

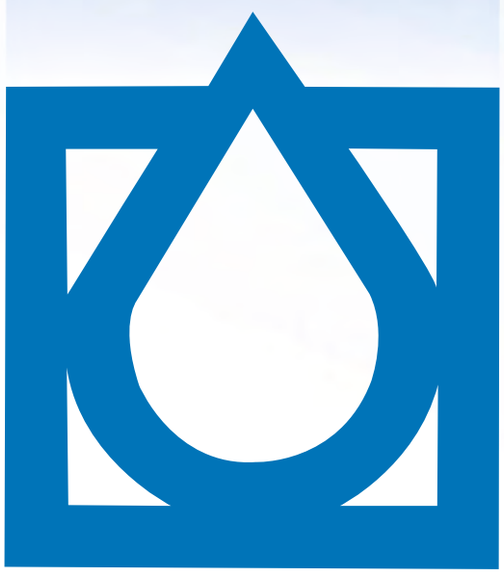

İZSU

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇMİŞİ

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı Soyadı : Gülay DEMİRCİOĞLU
Doğum Yeri : Acıpayam - DENİZLİ
Doğum Tarihi : 21.01.1962
Medeni Durumu : Bekar

EĞİTİM DURUMU:

- 1969 – 1979 : İlk-Orta ve Lise Eğitimi
- 1979 – 1983 : DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü-Lisans
- 1983 – 1986 : DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü-Yüksek Lisans

YABANCI DİL BİLGİSİ : İngilizce

BİLGİSAYAR BİLGİSİ: : Windows, Office, İnternet, Autocad kullanımı.

SAHİP OLDUĞU EHLİYETLER: : B sınıfı sürücü ehliyeti

İŞ TECRÜBESİ:

- 1985 – 1988 : İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Endüstriyel Çevre Kirliliği Kontrolü Denetim Mühendisi

(İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

- 1988 – 1995 : Çevre Koruma ve Su Arıtma Daire Başkanlığı Endüstriyel Atıksu Kirliliği Kontrolü Denetim Mühendisi
- 1995 – 1996 : Projeler Dairesi Başkanı
- 1996 – 2008 : Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Arıtma Tes.İşl. Şube Müdürü İçmesuyu Arıtma Tes. Şube Müdürü Yüzey Suyu Üretim Şube Müdürü
- 2008 (Nisan) – (2008 (Eylül) : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
- 2008 (Eylül) – 2012 : Etüd ve Plan Dairesi Başkanı
- 2012– 2013 : Genel Müdür Yardımcısı

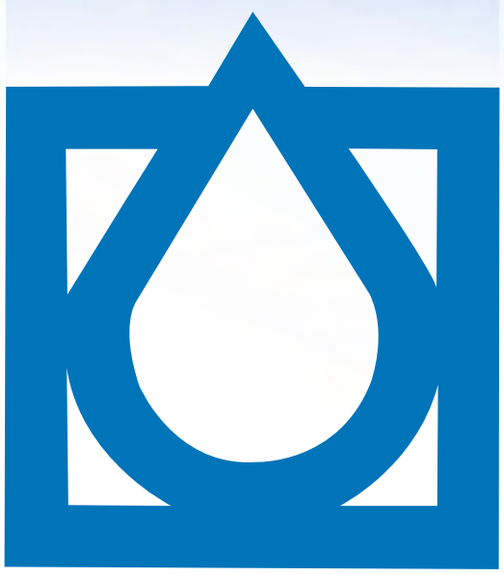

İZSU

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇMİŞİ

KİŞİSEL BİLGİLER:

Adı Soyadı : Serpil BARAN
Doğum Yeri : İstanbul
Doğum Tarihi : 24.12.1964

EĞİTİM DURUMU:

- 09.07.1986 :DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (Lisans)
- 06.07.1989 :DEÜ Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Hidrolik Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans)

İŞ TECRÜBESİ:

- 02.11.1987 : DEÜ Rektörlüğü - Memur

(İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ)

- 17.02.1989 : Mühendis
- 09.02.1995 : Fen İşleri Müdür Vekili
- 21.11.1996 : Çevre Koruma Müdürü
- 06.03.1998 : Temizlik İşleri Müdürü ve Çevre Koruma Müdürü

(İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

- 29.11.2004 : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
- 20.06.2007 : Genel Sekreter Yardımcısı

(İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

- 19.03.2013 - … : Genel Müdür Yardımcısı

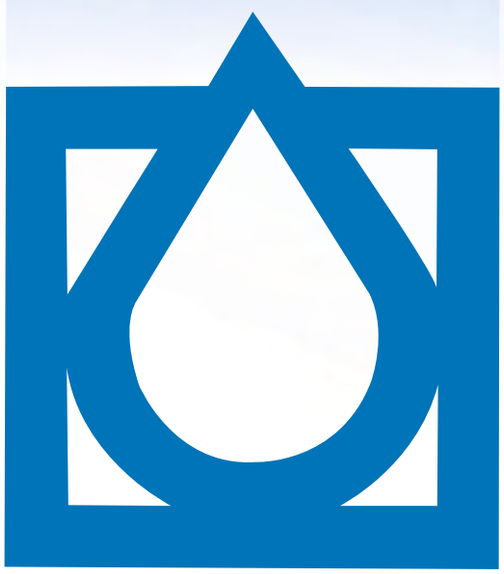

İZSU

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER 1-79

A) Misyon ve Vizyon 3

B) Yetki Görev ve Sorumluluklar 4-8

C) İdareye İlişkin Bilgiler 9-79

1. Fiziksel Yapı 9-21
2. Organizasyon Yapısı 22
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 23-29
4. İnsan Kaynakları 30-39
5. Sunulan Hizmetler 40-78
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 79

II. AMAÇ ve HEDEFLER 87-94

A) İdarenin Amaç ve Hedefleri 89-93

1. Stratejik Amaçlar 89
2. Stratejik Amaçlara Bağlı Hedefler 89-93

B) Temel Politikalar ve Öncelikler 94

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 95-564

A) Mali Bilgiler 99

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 101
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 101
3. Mali Denetim Sonuçları 101

B) Performans Bilgileri 129-560

1. Birimlerin Faaliyet ve Proje Bilgileri 131-538
   - Teftiş Kurulu Başkanlığı 131-134
   - Hukuk Müşavirliği 135-136
   - Koruma ve Güvenlik Amirliği 137-138
   - İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 139-146
   - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 147-160
   - Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 161-172
   - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 173-192
   - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 193-206
   - Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 207-306
   - Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 307-332
   - Projeler Dairesi Başkanlığı 333-360
   - Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 361-364
   - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 365-406
   - Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 407-424
   - Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı 425-448
   - Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 449-494
   - Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 495-536
   - Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 537-542
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 543-563
3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 564

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 565-570

A) Üstünlükler 567

B) Zayıflıklar 568

C) Değerlendirme 569-570

GÜVENCE BEYANLARI 571-576

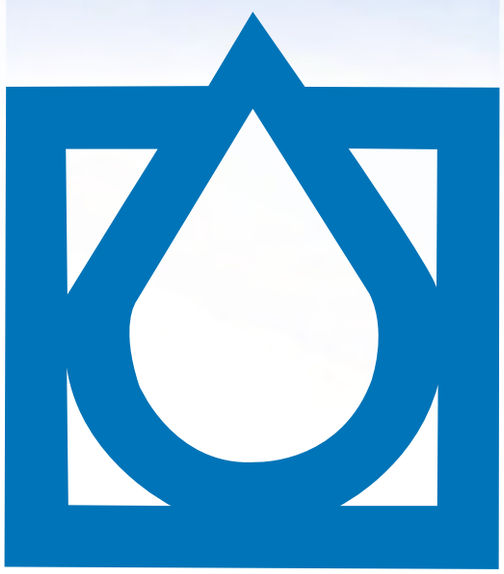

İZSU

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



I-Genel Bilgiler

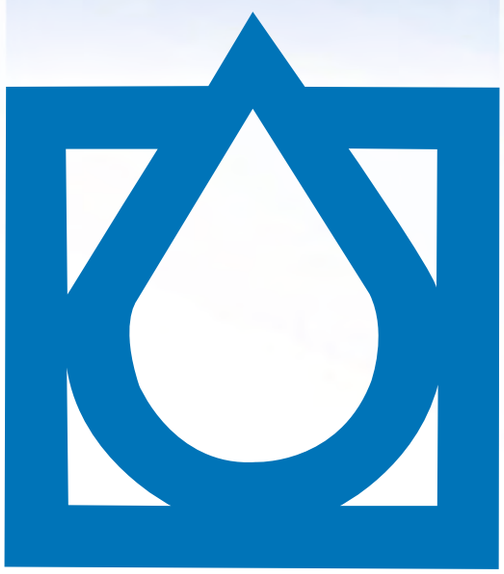

İZSU

I.GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yaşayanların içme suyu ve atıksu hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, etkin, verimli, kesintisiz ve kaliteli olarak yürütmektir

Vizyonumuz

Su kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve geliştirilmesini temel alan; çevreye, doğal yaşama ve insana duyarlılık, kamu hizmeti bilinci, dünya standartlarında teknoloji ve etkin bir yönetim anlayışı ile çalışan çağdaş, lider bir kurum olmaktır.



B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanı genişlemiş, dolayısıyla İZSU Genel Müdürlüğü'nün su ve kanalizasyon hizmeti verdiği alan da genişlemiştir. Bugün, bu alan kapsamına 21 ilçe, 161 orman köyü dahildir.

İZSU Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürün 2560 Sayılı Kuruluş Kanununa dayalı görev, yetki ve sorumlulukları; 1984 yılında çıkarılan 3009 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri de kapsayan bir sınıflandırma içinde aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Tablo 1. İZSU Genel Müdürlüğü'nün Görevleri ve Yetkileri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere başlamak,	Madde 2/a	-
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere başlamak,	Madde 2/b	-
Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,	Madde 2/c	-
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,	Madde 2/d	-
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İZSU'nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,	Madde 2/e	-
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.	Madde 2/f	-

Tablo 2. İZSU Genel Kurulunun Görevleri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,	Madde 6/a	Madde 4/a
Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/b	Madde 4/b
Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/c	Madde 4/c
Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,	Madde 6/d	Madde 4/d
Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,	Madde 6/e	Madde 4/e
Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,	Madde 6/f	Madde 4/f
İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,	Madde 6/g	Madde 4/g
10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,	Madde 6/h	Madde 4/h
Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,	Madde 6/ı	Madde 4/ı
Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,	Madde 6/j	Madde 4/j
Yapılan çalışmaların bu kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,	Madde 6/k	Madde 4/k
Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,	Madde 6/l	Madde 4/l
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.	Madde 6/m	Madde 4/m

Tablo 3. İZSU Yönetim Kurulunun Görevleri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
Kuruluş amacına uygun olarak İZSU'nun çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,	Madde 9/a	Madde 7/a
Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,	Madde 9/b	Madde 7/b
Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,	Madde 9/c	Madde 7/c
Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,	Madde 9/d	Madde 7/d
Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,	Madde 9/e	Madde 7/e
Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,	Madde 9/f	Madde 7/f
Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak,	Madde 9/g	Madde 7/g
Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,	Madde 9/h	Madde 7/h
10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,	Madde 9/ı	Madde 7/ı
Dava değeri 100.000 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,	Madde 9/j	Madde 7/j
Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,	Madde 9/k	Madde 7/k
Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,	Madde 9/l	Madde 7/l
Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,	Madde 9/m	Madde 7/m
Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,	Madde 9/n	Madde 7/n
Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.	Madde 9/o	Madde 7/o

Tablo 4. İZSU Denetçilerinin Görevleri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
Denetçiler İZSU'nun çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula sunmak	Madde 10	Madde 8
Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor vermek	Madde 10	Madde 8

Tablo 5. İZSU Genel Müdürünün Görevleri	2560 Sayılı Kanun	3009 Sayılı Kanun
İZSU'nun bu kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,	Madde 11/a	Madde 9/a
İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İZSU'yu temsil etmek,	Madde 11/b	Madde 9/b
Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,	Madde 11/c	Madde 9/c
Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,	Madde 11/d	Madde 9/d
23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,	Madde 11/e	Madde 9/e
Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,	Madde 11/f	Madde 9/f
Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak	Madde 11/g	Madde 9/g
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,	Madde 11/h	Madde 9/h
Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,	Madde 11/ı	Madde 9/ı
Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.	Madde 11/j	Madde 9/j

Tüm bu hizmetler söz konusu merciler tarafından gerçekleştirilirken aşağıda yer alan birimlerin desteği ile yürütülür:

Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetçiler, Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, Teknik Amirlikler, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün görevlerini yerine getirirken uyulması gereken diğer Kanun ve Yönetmelikler ise aşağıda yer almıştır:

İZSU'NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KANUNLAR	
1.	1475 Sayılı İş Kanunu
2.	5237 Sayılı T.C Türk Ceza Kanunu
3.	7201 Sayılı Tebligat Kanunu
4.	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kuruluş ve Yönetim Kanunu
5.	5393 Sayılı Belediye Kanunu
6.	6098 Sayılı Borçlar Kanunu
7.	6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
8.	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
9.	831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
10.	167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu
11.	4857 Sayılı İş Kanunu
12.	1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
13.	1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
14.	4734-4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
15.	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
16.	2872 Sayılı Çevre Kanunu
17.	3194 Sayılı İmar Kanunu
18.	2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
19.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
20.	6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun
21.	6245 Sayılı Harcırah Kanunu
22.	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

İZSU'NUN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TEMEL YÖNETMELİKLER	
1.	İZSU Disiplin Yönetmeliği
2.	İhale Kanunu İle İlgili Tüm Yönetmelikler
3.	İmar Yönetmelikleri
4.	İZSU Tarifeler Yönetmeliği
5.	Çevre Kanununa Bağlı Tüm Yönetmelikler
6.	Teşkilat Yönetmeliği
7.	Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
8.	Memur Sicil Yönetmeliği
9.	Su Havzaları Koruma Yönetmeliği
10.	Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği
11.	Havza Yıkım Yönetmeliği
12.	Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
13.	Hukuk Müşavirliği Kuruluş- Görev- Yetki Yönetmeliği
14.	Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
15.	Aday Memurların Yetiştirilmesi Yönetmeliği
16.	Temsil, Tören ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliği
17.	Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelik
18.	5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yönetmelikler

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.Fiziksel Yapı

İZSU Genel Müdürlüğü; İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde müstakil bütçeli bir kuruluş olup tüzel kişiliğe sahiptir. İZSU Genel Müdürlük Binası, Genel Müdürlüğe bağlı Sular İşletmesi ve Arıtma Tesisleri ile İzmir halkından gelen abonelik ve şikayet başvurularına daha kısa sürede cevap verebilmek amacıyla büyük ilçelerde Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Şube Müdürlükleri ve Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Bölge Şube Müdürlükleri şeklinde yapılanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü her türlü taşınır, taşınmaz malı satın alır, kiralar, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satar, İZSU'nun hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ya da özel kuruluşlarla ortak olarak kurar ve işletir, bu maksatla kurulmuş ya da kurulmakta olan tesislere iştirak eder, kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırır.

İdaremize ait gayrimenkullere ve araçlara ilişkin listeler aşağıda yer almıştır.

İLÇE BAZINDA PARSEL SAYILARI VE YÜZÖLÇÜMÜ TABLOSU						
İLÇELER	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ (parsel sayısı / adet	YÜZÖLÇÜMÜ (m2)	SINIRLI AYNİ HAKLAR (Parsel sayısı/adet)	YÜZÖLÇÜMÜ (m2)	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ + SINIRLI AYNİ HAKLAR (Parse sayısı/adet)	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ + SINIRLI AYNİ HAKLAR (yüzölçür /m2)
ALİAĞA	15	51.959,96	1	7.349,04	16	59.309,00
BALÇOVA	21	6.874,00	1	106.00	22	6.980,00
BAYINDIR	15	38.711,96	2	2.996,34	17	41.708,3
BAYRAKLI	1	2.080,00	0	0.00	1	2.080,00
BORNOVA	25	74.362,57	6	6.704.18	31	81.066,75
BUCA	8	27.874,51	12	25.428,07	20	53.302,58
ÇİĞLİ	400	12.120.770,50	29	2.282.372,12	429	14.403.142,62
FOÇA	9	11.968,44	0	0.00	9	11.968,44
GAZİEMİR	0	0.00	4	5.206,00	4	5.206,00
GÜZELBAHÇE	7	12.946,02	8	8.641,83	15	21.587,85
KARABAĞLAR	17	2.960,00	10	12.582,58	27	15.542,58
KARŞIYAKA	67	1.094.548,27	8	384.835.00	75	1.479.383,27
KEMALPAŞA	19	72.013,00	3	726,15	22	72.739,15

İLÇELER	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ (parsel sayısı / adet	YÜZÖLÇÜMÜ (m2)	SINIRLI AYNİ HAKLAR (Parsel sayısı/adet)	YÜZÖLÇÜMÜ (m2)	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ + SINIRLI AYNİ HAKLAR (Parse sayısı/adet)	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ + SINIRLI AYNİ HAKLAR (yüzölçür /m2)
KONAK	193	460.548,50	12	16.769,50	205	477.318,00
MENDERES	725	7.054.350,74	62	423.347,80	787	7.477.698,54
MENEMEN	17	12.482,45	29	26.831,51	46	39.313,96
MURADİYE	2	1.144,00	0	0.00	2	1.144.00
NARLIDERE	7	9.266.00	5	12.440,48	12	21.706,48
SARUHANLI	1	1744.00	0	0.00	1	1.744,00
SEFERİHİSAR	9	82.522,54	3	13.013,50	12	95.536,04
SELÇUK	0	0.00	1	34.560,00	1	34.560,00
TORBALI	3	44.164,01	11	81.849,03	14	126.013.04
URLA	2	18.960,00	3	10.859,35	5	29.819,35
GÖRDES	9	8.084,00	0	0,00	9	8.084,00
TOPLAM	**1572**	**21.210.335.47**	**210**	**3.356.618,48**	**1782**	**24.566.953,95**

ARAÇ ENVANTERLERİ

SIRA NO	MARKA	MODEL	CİNSİ	NET AĞIRLIK	İSTİAP HADDİ	KİŞİ	SAYISI (Adet)
1	NİSSAN	1990	*4X4 ARAZİ TAŞITI*	1950 Kg.	347 kg	5 Kişi	1
2	İVECO DAİLY 65C	2010	AÇIK SAÇ KASA KAMYON	*3175 Kg.*	3125 Kg.	7 Kişi	6
3	OPEL FRONTERA	2002	*ARAZİ TAŞITI*	1786 Kg.	664 Kg.	5 Kişi	1
4	MERCEDES-BENZ	2007	ÇEKİCİ	*8835 Kg.*	16165 Kg	2 Kişi	2
5	İVECO DAİLY 70 C 15 (4X2)	2012	*ÇIPLAK ŞASİ KAMYON*	2685 Kg.	4015 Kg.	7 Kişi	19
6	MERCEDES-BENZ ATEGO 1518	2012	ÇIPLAK ŞASİ KAMYON	*5025 Kg.*	10475 Kg	2 Kişi	3
7	MERCEDES-BENZ ATEGO2124	2012	*ÇIPLAK ŞASİ KAMYON*	6330 Kg	14670 Kg	2 Kişi	2
8	FATİH	1992	DAMPERLİ KAMYON	*10600 Kg.*	14675 kg	2 Kişi	3
9	FATİH-CUMMINS	1996	*DAMPERLİ KAMYON*	11722 Kg.	14278 Kg	2 Kişi	2
10	MERCEDES-BENZ AXOR 3340	2012	DAMPERLİ KAMYON	*11920 Kg.*	21080 Kg	2 Kişi	2
11	MERCEDES-BENZ AXOR 3029	2012	*DAMPERLİ KAMYON*	11980 Kg.	18020 Kg	2 Kişi	20
12	FORD CARGO 2532	2012	DAMPERLİ KAMYON	*12595 Kg.*	12405 Kg	2 Kişi	1
13	FORD CARGO 2532	2012	*DAMPERLİ KAMYON*	12845 Kg.	12155 Kg	2 Kişi	2
14	FORD CARGO	2009	DAMPERLİ KAMYON	*13860 Kg.*	12140 Kg	2 Kişi	1
15	İVECO DAİLY 65 C 15DC	2010	*DAMPERLİ KAMYON*	3600 Kg.	2700 kg.	7 Kişi	2
16	FATİH	1998	DAMPERLİ KAMYON	*4080 Kg.*	4320 Kg.	2 Kişi	1
17	FATİH	1998	*DAMPERLİ KAMYON*	4110 Kg.	4290 Kg.	2 Kişi	3
18	FATİH	1998	DAMPERLİ KAMYON	*4140 Kg.*	4260 Kg.	2 Kişi	1
19	FATİH	1996	*DAMPERLİ KAMYON*	4720 Kg.	3680 Kg.	2 Kişi	2
20	MERCEDES-BENZ	2011	DAMPERLİ KAMYON	*6720 Kg.*	8280 Kg.	3 Kişi	3
21	BMC PRO 522	2008	*DAMPERLİ KAMYON*	7335 Kg.	8665 Kg.	2 Kişi	10
22	FORD CARGO	2008	DAMPERLİ KAMYON	*9020 Kg.*	15980 Kg	2 Kişi	1
23	FATİH	2000	*KAMYON ÇİFT KOLLU KALDIRICILI*	8050 Kg.	9949 Kg.	2 Kişi	1
24	İVECO	2009	KAMYON ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA	*3135 Kg.*	3365 Kg.	7 Kişi	5
25	BMC MEGASTAR 400	2008	*KAMYON ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA*	3280 Kg.	1720 Kg.	6 Kişi	1
26	BMC MEGASTAR	2008	KAMYON ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA	*3370 kg.*	1630 Kg.	6 Kişi	3
27	BMC MEGASTAR 400	2008	*KAMYON ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA*	3375 Kg.	1625 Kg.	6 Kişi	8
28	BMC MEGASTAR 400	2008	KAMYON ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA	*3535 Kg.*	1465 Kg.	5 Kişi	1
29	BMC MEGASTAR	2008	*KAMYON ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA*	3735 Kg.	1265 Kg.	6 Kişi	1
30	BMC MEGASTAR	2008	KAMYON ÇİFT SIRALI HİDROLİK KAPAKLI	*3520 Kg.*	1480 Kg.	6 Kişi	1
31	FATİH	1998	*KAMYON KANAL TEM.ARACI*	3800 Kg.	4600 Kg.	2 Kişi	2
32	LEYLAND	1991	KAMYON VİNÇ	*6980 Kg.*	5258 kg	2 Kişi	1
33	LEYLAND	1991	*KAMYON VİNÇ*	7860 Kg.	10140 kg	2 Kişi	1
34	NİSSAN	1985	KAMYON VİNÇ (10 TON)	*14564 kg.*	136 Kg.	2 Kişi	1
35	ISUZU NQR	2009	*KAMYON VİNÇ (7 TON)*	5896 Kg.	68 Kg.	2 Kişi	1
36	ISUZU NQR	2009	KAMYON VİNÇ (7 TON)	*5895 Kg.*	1605 Kg.	2 Kişi	1
37	LEVEND	1998	*KAMYONET ÇİFT SIRALI*	1440 Kg.	970 Kg.	5 Kişi	13
38	FORD	2006	KAMYONET ÇİFT SIRALI	*1740 Kg.*	1110 Kg.	5 Kişi	1
39	FORD TRANSİT	2008	*KAMYONET ÇİFT SIRALI*	1968 Kg.	1532 Kg.	6 Kişi	1
40	FORD	2012	KAMYONET ÇİFT SIRALI	*1974 Kg.*	1526 Kg.	6 Kişi	1
41	FORD TRANSİT	2009	*KAMYONET ÇİFT SIRALI*	2032 Kg.	1468 Kg.	6 Kişi	1

SIRA NO	MARKA	MODEL	CİNSİ	NET	İSTİAP	KİŞİ	SAYISI (Adet)
42	BMC MEGASTAR	2008	KAMYONET ÇİFT SIRALI	2320 Kg.	880 Kg.	6 Kişi	2
43	BMC MEGASTAR 140	2008	KAMYONET ÇİFT SIRALI	2420 Kg.	1080 Kg.	6 Kişi	15
44	IVECO	2010	KAMYONET ÇİFT SIRALI	2735 Kg.	765 Kg.	7 Kişi	1
45	FORD TRANSİT	2009	KAMYONET ÇİFT SIRALI	3040 Kg.	460 Kg.	6 Kişi	1
46	NISSAN NAVARA	2012	KAMYONET ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA	2030 Kg.	775 Kg.	5 Kişi	1
47	NISSAN NAVARA	2012	KAMYONET ÇİFT SIRALI AÇIK SAÇ KASA (ARAZİ TAŞITI)	2035 Kg.	770 Kg.	5 Kişi	2
48	FORD TRANSİT	2010	KAMYONET KAP.KAS.ÇİFT SIR.CAMLI	1648 Kg.	1352 Kg.	6 Kişi	1
49	FORD TRANSİT	2009	KAMYONET KAP.KAS.ÇİFT SIR.CAMLI	1723 Kg.	1277 Kg.	6 Kişi	2
50	FORD TRANSİT	2012	KAMYONET KAP.KAS.ÇİFT SIR.CAMLI	1971 Kg.	1354 Kg.	6 Kişi	5
51	BMC MEGASTAR	2009	KAMYONET KAP.KAS.ÇİFT SIR.CAMLI	2240 Kg.	960 Kg.	6 Kişi	1
52	İVECO DAİLY 50 C 15 V	2010	KAMYONET KAP.KAS.ÇİFT SIR.CAMLI	3010 Kg.	490 Kg.	7 Kişi	1
53	RENAULT TRAFIC	2010	KAMYONET KAPALI KASA	1828 Kg.	1212 Kg.	3 Kişi	1
54	FORD TRANSİT	2009	KAMYONET KAPALI KASA PANELVAN	2006 Kg.	1494 Kg.	3 Kişi	1
55	İVECO	2006	KAMYONET KUKA KANAL AÇMA	2440 Kg.	1060 Kg.	3 Kişi	2
56	İVECO	2007	KAMYONET KUKA KANAL AÇMA	2140 Kg.	1360 Kg.	3 Kişi	6
57	OTOSAN	1979	KAMYONET PİKAP	900 Kg.	450 kg	2 Kişi	1
58	NİSSAN	1990	KAMYONET PİKAP	1250 Kg.	857 kg	2 Kişi	2
59	NİSSAN	1990	KAMYONET PİKAP	1250 Kg.	864 kg	3 Kişi	1
60	NİSSAN	1990	KAMYONET PİKAP	1250 Kg.	925 kg	2 Kişi	1
61	İVECO	2010	KAPALI KASA KAMYON	4750 Kg.	1550 Kg.	7 Kişi	1
64	İVECO	2009	KAPALI KASA KAMYON	4375 Kg.	2125 Kg.	7 Kişi	4
65	İVECO DAİLY 65 C 15DC	2011	KAPALI KASA KAMYON	2557 Kg.	3743 Kg.	7 Kişi	2
66	BMC MEGASTAR 400	2008	KAPALI KASA KAMYON	4575 Kg.	425 Kg.	6 Kişi	55
67	BMC PRO 518	2008	KAPALI KASA KAMYON	6100 kg.	4400 kg.	6 Kişi	2
68	RENAULT	1999	KAPALI KASA KAMYONET	870 Kg.	760 Kg.	2 Kişi	2
69	İVECO DAİLY 50 C 15 V	2011	KAPALI KASA KANAL TEMİZLEME ARACI KAMYON	3480 Kg.	1720 Kg.	3 Kişi	12
70	FATİH	1991	KASALI KAMYON	8520 Kg.	16085 Kg	2 Kişi	1
71	FİAT	1981	KASALI KAMYON	3340 Kg.	2560 kg	2 Kişi	1
72	MERCEDES-BENZ	2008	KOMBİNE KANAL ARACI	13900 Kg.	11100 Kg	2 Kişi	4
73	MERCEDES-BENZ	2008	KOMBİNE KANAL ARACI	14000 Kg.	12000 Kg	2 Kişi	4
74	MERCEDES-BENZ	2006	KOMBİNE KANAL ARACI	11832 Kg.	13168 Kg	2 Kişi	2
75	MERCEDES-BENZ	2008	KOMBİNE KANAL ARACI	10000 Kg.	8000 Kg.	2 Kişi	2
76	ÇUHADAR	2007	LOW BED YARI RÖMORK	10500 Kg.	39000 Kg		2
77	FORD	1989	MİNİBÜS	1550 Kg.	823 Kg.	11+1 Kişi	1
78	LEVEND	1998	MİNİBÜS	2540 Kg.	1020 Kg.	15 Kişi	3
79	YAMAHA	2005	MOTORSİKLET	120 Kg.	75 Kg.	2 Kişi	1
80	MONDİAL	2011	MOTORSİKLET	97 Kg.	152 Kg.	2 Kişi	28
81	TOFAŞ-FIAT	1991	OTOMOBİL	1060 Kg.	390 Kg.	5 Kişi	1
82	OPEL VECTRA	1992	OTOMOBİL	1115 Kg.	725 Kg.	5 Kişi	1
83	RENAULT	2000	OTOMOBİL	1115 Kg.	505 Kg.	5 Kişi	1
84	NİSSAN	1990	OTOMOBİL	1165 kg.	347 Kg.	5 Kişi	1
85	OPEL ASTRA	2001	OTOMOBİL	1170 Kg.	500 Kg.	5 Kişi	1
86	RENAULT	2000	OTOMOBİL	1190 Kg.	430 Kg.	5 Kişi	1

SIRA NO	MARKA	MODEL	CİNSİ	NET	İSTİAP	KİŞİ	SAYISI (Adet)
87	RENAULT FLUENCE	2012	OTOMOBİL	1360 Kg.	425 Kg.	5 Kişi	4
88	RENAULT	1998	OTOMOBİL	890 Kg.	450 Kg.	5 Kişi	3
89	RENAULT	1991	OTOMOBİL	900 Kg.	440 Kg.	5 Kişi	1
90	RENAULT	2000	OTOMOBİL	930 Kg.	405 Kg.	5 Kişi	1
91	RENAULT 12 SW	1989	OTOMOBİL	935 Kg.	450 kg	5 Kişi	1
92	RENAULT	1998	OTOMOBİL	940 Kg.	350 Kg.	5 Kişi	3
93	MURAT 131 ŞAHİN	1991	OTOMOBİL	945 Kg.	465 Kg.	5 Kişi	2
94	RENAULT 12 SW	1989	OTOMOBİL	950 Kg.	435 kg	5 Kişi	5
95	RENAULT SW	1988	OTOMOBİL	950 Kg.	450 kg	5 Kişi	2
96	RENAULT TOROS SW	1999	OTOMOBİL	950 Kg.	375 Kg.	5 Kişi	1
97	RENAULT SW	1991	OTOMOBİL	980 Kg.	450 kg	5 Kişi	1
98	MURAT 131 DOĞAN	1994	OTOMOBİL	985 Kg.	465 Kg.	5 Kişi	7
99	TOFAŞ-FIAT	1991	OTOMOBİL	985 Kg.	465 kg	5 Kişi	1
100	MERCEDES-BENZ	2011	ÖZEL AMAÇLI ARAÇ (KURTARICI-KAMYON)	9595 Kg.	11405 Kg	2 Kişi	1
101	FATİH	2000	ÖZEL AMAÇLI DAP.KANCALI LİFT	12100 Kg.	12900 Kg	2 Kişi	1
102	BMC PRO 625	2010	ÖZEL AMAÇLI HİDROLİK VİDANJÖR KAMYON	10970 Kg.	7030 Kg.	2 Kişi	6
103	IVECO	2012	ÖZEL AMAÇLI KAPALI KASA KAMYON	5310 Kg.	1390 Kg.	7 Kişi	2
104	İVECO DAİLY 70 C 15 (4X2)	2012	ÖZEL AMAÇLI SU ARIZA TAMİR BAKIM ARACI	5175 Kg.	1525 Kg.	7 Kişi	10
105	FIAT	2005	PANELVAN KAMYONET	1860 Kg.	1440 Kg.	5 Kişi	18
106	İVECO	2009	PANELVAN KAMYONET	3185 Kg.	315 Kg.	3 Kişi	4
107	FORD CARGO	2010	R.KAMYON.ÇİFT KOLLU KALDIRICI	9840	8160 Kg.	2 Kişi	1
108	AKS	2012	RÖMORK (MERKEZİ DİNGİLLİ)	700 Kg.	1800 Kg.		1
109	FATİH	2000	SAÇ KASA KAMYON	10300 Kg.	14698 Kg	2 Kişi	2
110	İVECO OTOYOL	1991	SAÇ KASA KAMYON	2950 Kg.	3750 kg	2 Kişi	1
111	İVECO OTOYOL	1991	SAÇ KASA KAMYON	3170 Kg.	3530 Kg.	2 Kişi	11
112	FATİH	1998	SAÇ KASA KAMYON	3780 Kg.	4620 Kg.	2 Kişi	2
113	İVECO	1991	SAÇ KASA KAMYON	3780 Kg.	2920 Kg.	2 Kişi	10
114	İVECO OTOYOL	1990	SAÇ KASA KAMYON	3780 Kg.	2920 Kg.	2 Kişi	4
115	FATİH	1998	SAÇ KASA KAMYON	4080 Kg.	4320 Kg.	2 Kişi	15
116	FATİH	1998	SAÇ KASA KAMYON	4220 Kg.	4180 Kg.	2 Kişi	1
117	FATİH	1991	TANKER (AKARYAKIT TANKERİ)	10820 Kg.	14180 kg	2 Kişi	1
118	BMC PRO 518	2007	TANKER (AKARYAKIT TANKERİ)	4640 Kg.	7343 Kg.	3 Kişi	1
119	BMC PRO 518	2007	TANKER (KLOR TANKERİ)	5785 Kg.	6201 Kg.	3 Kişi	1
120	FATİH	1991	TANKER (KOSTİK TANKERİ)	7840 Kg.	17160 kg	2 Kişi	1
121	BMC PRO 625	2008	TANKER (SU TANKERİ)	8800 kg.	9200 Kg.	2 Kişi	2
122	BMC PRO 935	2009	TANKER (SU TANKERİ)	13000 Kg.	13000 Kg	3 Kişi	4
123	FORD CARGO	2010	TANKER (SU TANKERİ)	9410 Kg.	8511 Kg.	2 Kişi	2
124	BMC PRO 518	2008	TELESKOPİK SEP.KAMYON	10800 Kg.	1190 Kg.	2 Kişi	1
125	NEW HOLLAND	2001	TRAKTÖR	2611 Kg.	2649 Kg.	1 Kişi	1
128	NEW HOLLAND	2010	TRAKTÖR	3770 Kg.	2230 Kg.	1 Kişi	1
129	NEW HOLLAND	2012	TRAKTÖR	2700 kg.	400 Kg.	1 Kişi	1
130	FATİH	2000	VİDANJÖR	8450 Kg.	9549 Kg.	2 Kişi	9
131	FATİH	1999	VİDANJÖR	8560 Kg.	9440 Kg.	2 Kişi	1

SIRA NO	MARKA	MODEL	CİNSİ	NET	İSTİAP	KİŞİ	SAYISI (Adet)
132	FORD	2006	VİDANJÖR	*11315 Kg.*	6685 Kg.	2 Kişi	6
133	FORD	1986	*VİDANJÖR*	8500 Kg.	4500 Kg.	2 Kişi	1
134	İVECO	2001	VİDANJÖR	*18972 Kg.*	6028 Kg.	3 Kişi	1
135	LEYLAND	1988	*VİDANJÖR*	6500 Kg.	7050 Kg.	2 Kişi	1
136	MERCEDES-BENZ	2005	VİDANJÖR	*15280 Kg.*	10720 Kg	2 Kişi	2
137	RENAULT	2004	*VİDANJÖR*	8810 Kg.	9180 Kg.	2 Kişi	6
138	BMC PRO 518	2008	VİNÇLİ KAMYON	*10700 Kg.*	1200 Kg.	6 Kişi	10
139	BMC PRO 522	2008	*VİNÇLİ KAMYON*	13000 Kgç	6500 Kg.	6 Kişi	10
140	MAN	2008	VİNÇLİ KAMYON	*8480 Kg.*	10165 Kg	2 Kişi	1

İŞ MAKİNELERİ ENVANTERİ

SIRA	MARKA	CİNSİ	TİPİ	SAYISI (ADET)
1	CATERPILLAR	BEKO LODER	CAT. 432 E	19
2	CATERPILLAR	BEKO LODER	CAT. 432 F	6
3	CATERPILLAR	BEKO LODER	CAT. 434 E	1
4	ÇUKUROVA	BEKO LODER		2
5	ÇUKUROVA	BEKO LODER	883 STD	1
6	HİDROMEK	BEKO LODER	HMK 102 B	12
7	JCB	BEKO LODER		1
8	MASTAŞ 444	BEKO LODER	1004-4T	6
9	SAMSUNG	EKSKAVATÖR	14600	2
10	LİEBHERR	EKSKAVATÖR	A904	1
11	HİDROMEK	*EKSKAVATÖR*	HMK 200 W-3	1
12	NİSSAN	FORKLİFT- 2,5 TON	TD 27	1
16	KOMATSU	FORKLİFT-2,5 TON	FD25HT-17	1
13	CATERPILLAR	FORKLİFT- 3 TON	DP 30 N	1
17	KOMATSU	FORKLİFT-3,5 TON	FD 35	1
14	ÇUKUROVA	FORKLİFT- 4 TON	CF 40 FX	3
15	HYSTER	FORKLİFT- 5 TON	TD 50	1
16	MITSUBISHİ	GRAYDER		1
17	CATERPILLAR	LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	CAT. M318 D	8
18	CATERPILLAR	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	CAT. 930 H	1
19	CATERPILLAR	LASTİKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ	CAT. 246 B	10
20	KAWASAKİ	LODER	KSS 60 Z	1
21	JCB	MİNİ BEKO LODER	1 CX EC	4
22	DAEWOD	MİNİ YÜKLEYİCİ	DSL 802	1
23	CATERPILLAR	PAL.MİNİ EKSKAVATÖR	CAT. 303 C	10
24	CATERPILLAR	PAL.MİNİ EKSKAVATÖR	CAT. 303.5D CR	2
25	KOBELCO TLS.EKSKAVATÖR	PALETLİ DERE TEMİZLEME ARACI	E.R 11000.P	1
26	CATERPILLAR	PALETLİ EKSKAVATÖR	CAT. 329 DL	5

SIRA	MARKA	CİNSİ	TİPİ	SAYISI (ADET)
27	HİDROMEK	PALETLİ EKSKAVATÖR	HMK 300LC-3	1
28	CATERPILLAR	PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ	CAT. 247 B	10
29	LINK-BELT	PALETLİ SALLAMA KEPÇE		1
30	ÇUKUROVA	PALETLİ YÜKLEYİCİ		1
31	CATERPILLAR	PALETLİ YÜKLEYİCİ	963 D	1
32	TADANO	VİNÇ-50 TON	TG 500E	1
33	TADANO	VİNÇ-30 TON	TG 300E	2
34	JOHNSTON	YOL SÜPÜRME ARACI	CN 200	1
35	RAVO	YOL SÜPÜRME ARACI	STH	1

KİRALIK HİZMET ARAÇLARI

SIRA NO	CİNSİ	SÜRÜCÜLÜ	SÜRÜCÜSÜZ
1	ÇİFT SÜRGÜLÜ YANLARI CAMLI PANEL KAMYONET		137 Adet
2	ÇİFT KABİN KAMYONET		58 Adet
3	SEDAN TİPİ BİNEK		20 Adet
4	ÇİFT SÜRGÜLÜ YANLARI CAMLI PANEL KAMYONET	81 Adet	
5	ÇİFT KABİN KAMYONET	34 Adet	
6	MİNİBÜS	34 Adet	









İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEPO HACİMLERİ VE KULLANIM DURUMLARI (31.12.2012)			
İZSU KODU	**DEPO ADI**	**DEPO HACMİ (m^3)**	**DEPO DURUMU**
T2	T-2 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T3	T-3 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T50	T-50 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T51	T-51 Depo	2.500	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T82	T-82 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T1	Cumhuriyet Depo	51.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T74	T-74 Depo	2.500	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T4	T-4 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T67	Bayraklı 5.000 m^3	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T41	T-41 Depo	20.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T45	T-45 Depo	7.500	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T46	T-46 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T47	T-47 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T48	T-48 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T76	T-76 Depo	2.500	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T77	T-77 Depo	2.500	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T78	T-78 Depo	1.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T7	T-7 Depo	15.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T8	T-8 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T9	T-9 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T14	Altındağ 600 m^3	600	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
	Altındağ 200 m^3	200	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T12	H.pınar 55.000 m^3	55.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T68	Çoban Çeşme Depo	2.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T69	Atçalar Depo	1.500	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T71	Çamlık Depo	1.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
T25	Kale Eski Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
	Kale Yeni Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor
	Poligon Depo	17.500	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor

İZSU KODU	DEPO ADI	DEPO HACMİ (m³)	DEPO DURUMU	
T20	Bozyaka Depo	10.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
T18	T-18 Depo	20.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
T17	T-17 Depo	10.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
T52	T-52 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
T54	T-54 Depo	1.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
T49	T-49 Depo	500	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
T56	T-56 Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Belediye Önü Depo	700	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Çullutepe Hamsu	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Çullutepe Arıtılmış	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
MAP1	Menemen Acil Toplama	800	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Sarıkız Toplama 1	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Sarıkız Toplama 2	6.500	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Yahşelli Depo	5.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Tahtalı Arıtma Tesisi	21.600	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Sarnıç Köy Depo	1.000	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Görece Üst Depo	750	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Buca Teknik Amirlik İçi	500	Su dağıtım sisteminde kullanılıyor	
	Karabağlar Depo	15.000	Kullanılabilir	
	Güzeltepe Alt Depo		Kullanım dışı	
	H.pınar 10.000 m³		Kullanım dışı	
T72	Levent Depo		Kullanım dışı	
T62	T62 Depo		Kullanım dışı	
	T53 Depo		Kullanım dışı	
	Yeşilyurt Gömme		Kullanım dışı	
	Acil Yükleme Depo		Kullanım dışı	
	Onat Depo		Kullanım dışı	
	Balçova Baraj Depo	5.000	Hat depo önünde by-pass yapıyor.	Şu anda su dağıtım sisteminde kullanılmıyor

İZSU KODU	DEPO ADI	DEPO HACMİ (m³)	DEPO DURUMU	
	Yelkentepe Depo		Kullanım dışı	Şu anda su dağıtım sisteminde kullanılmıyor
	Gültepe Depo	300	Kullanım dışı	Şu anda su dağıtım sisteminde kullanılmıyor
	MTK Yanı Depo		Kullanım dışı	Şu anda su dağıtım sisteminde kullanılmıyor
	Bornova 2.500 m³	2.500	Kullanım dışı	Şu anda su dağıtım sisteminde kullanılmıyor
	Zafertepe Depo		Kullanım dışı	Şu anda su dağıtım sisteminde kullanılmıyor
	T79 Depo		Kullanım dışı	Şu anda su dağıtım sisteminde kullanılmıyor
T-24	İnönü Depo	300	Kullanım dışı	İçerisinde Scada kontrolü olmayan bir pompa var
	Huzur Depo	250	Kullanım dışı	İçerisinde Scada kontrolü olmayan bir pompa var
	Güzeltepe Üst Depo	150	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı	
	Doğançay Depo	200	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı	
	Bayraklı 500 m³	500	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı	
	Bayraklı 1.000 m³	1.000	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı	
	Pınarbaşı Depo	1.500	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı	
	Işık Depo	200	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı	
	Narlı Depo	900	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı	
	Narlıdere Depo	300	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı	
	Köyiçi Depo	250	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı	
	Yıkıkkemer Depo	2.500	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı / nadiren kullanımda	

İZSU KODU	DEPO ADI	DEPO HACMİ (m^3)	DEPO DURUMU
	Oyak Depo	5.000	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı / nadiren kullanımda
	Afet Depo	800	Konvertör uygulaması nedeniyle kullanım dışı / nadiren kullanımda
	Altındağ 100 m^3 Depo		Kullanım dışı



2.ORGANİZASYON YAPISI

İZSU Genel Müdürlüğü organizasyonu oluşturan amirlikler ve temel birimler şunlardır; 6 Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Denetçi, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, 3 İç Denetçi, 1. Hukuk Müşaviri, 15 Daire Başkanlığı, 57 Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği, Sivil Savunma Uzmanlığı ile İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi.



İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

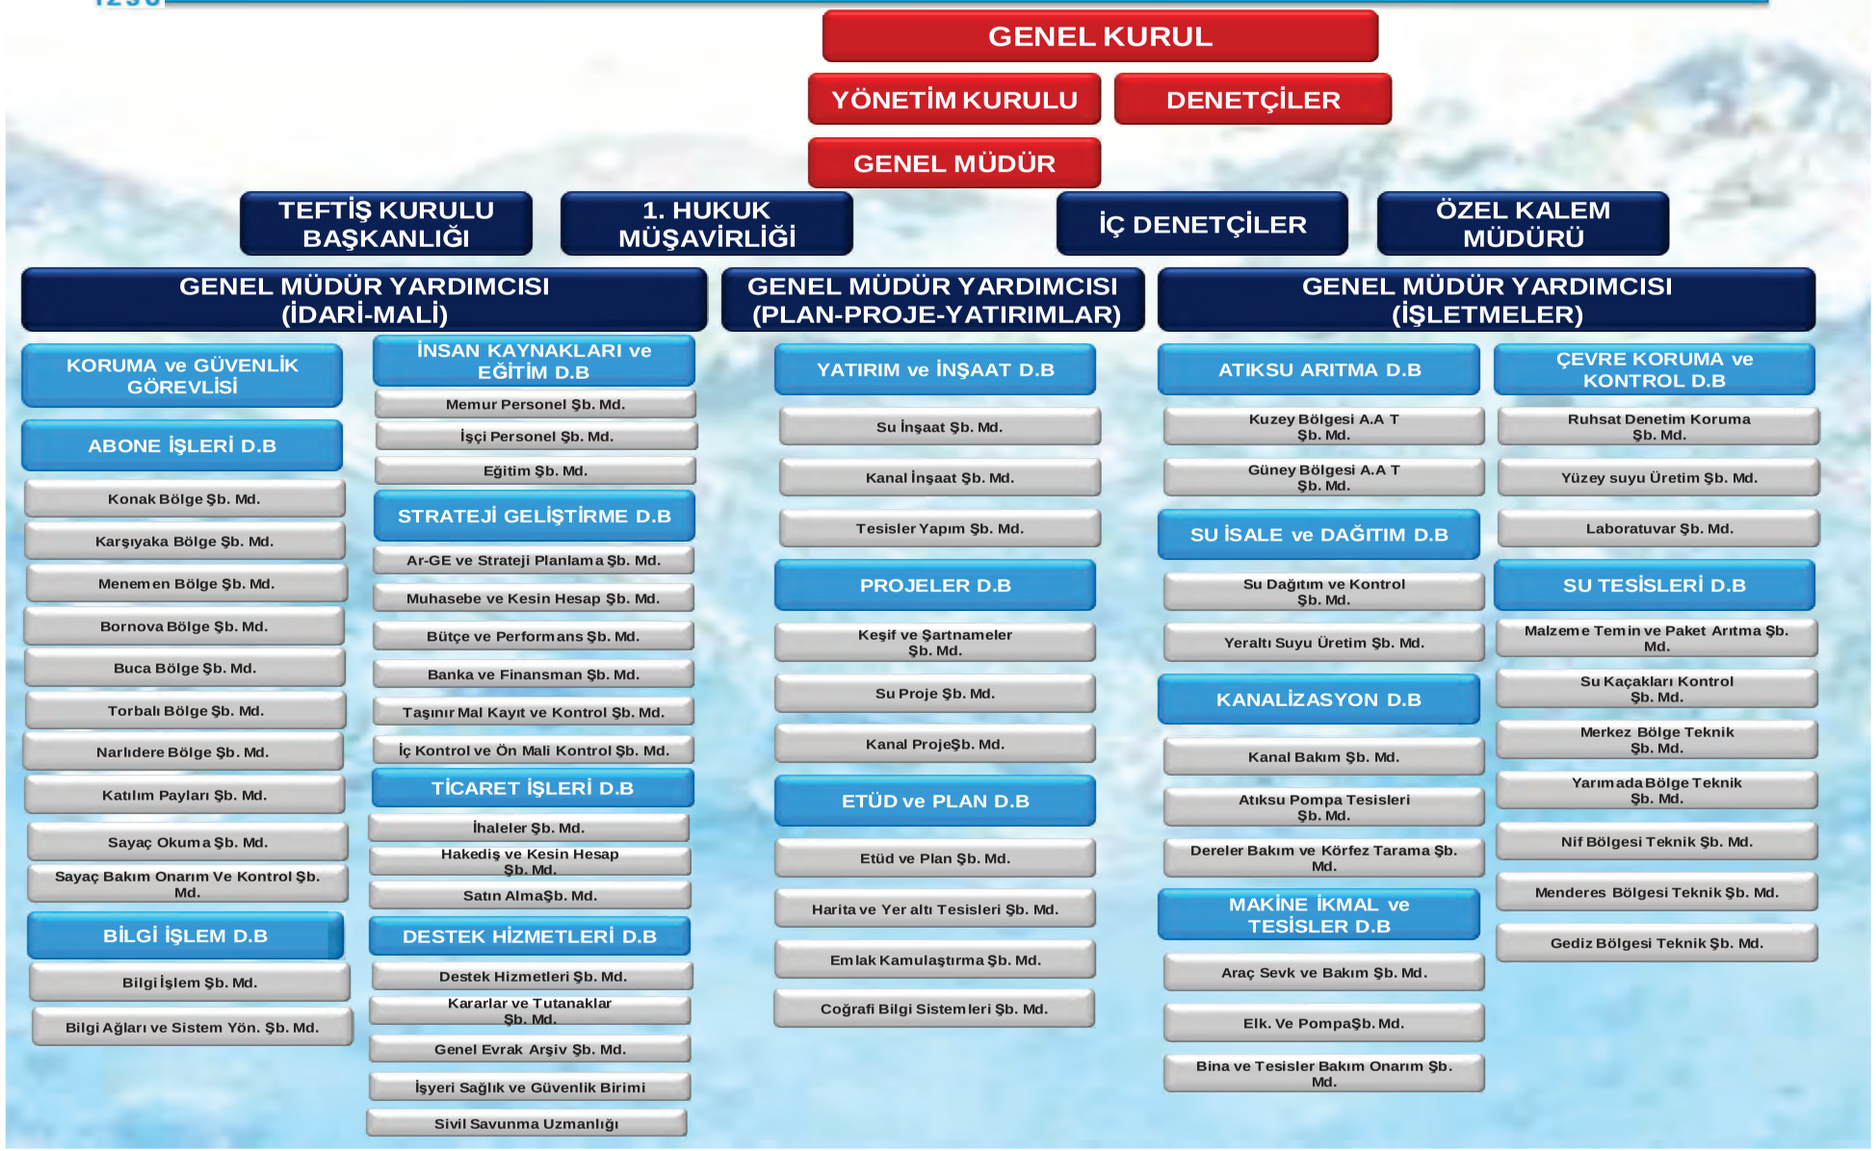

3.BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında kullanılan temel bilgisayar uygulamaları; Finans ve Lojistik , Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), Bakım Yönetim Sistemi (BYS), Arıza Takip Yönetim Sistemi, Arac / Ekipman Kontrol Yönetim Sistemi, Personel Yönetim Sistemi, Su Kalite Kontrol Yönetim Sistemi, Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi, İştirak Payları Yönetim Sistemi, Evrak Kayıt ve Takip Sistemi, İhale Takip Sistemi, Proje Takip Sistemi, Yönetim Bilgilendirme Sistemi, Emlak Kamulaştırma Takip Sistemi Projeleri'dir.

Tüm bu uygulamaların çalışması için gerekli network altyapısı ve yüklenici firmaya ait donanımların (PC, printer, router, modem, switch vb.) sarf malzemeleri, bakım ve onarım işleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

Uygulamada kullanılan veri tabanı Oracle 10g'dir. ABYS ve Finans Lojistik Uygulamaları Oracle10i As uygulama sunucusu üzerinde çalışmaktadır.

DONANIM BİLEŞENLERİ	
SUNUCULAR	**MİKTAR**
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ABYS, DB)	2 Adet
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ERP, DB)	2 Adet
Web Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2 Adet
Etki Alanı Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2 Adet
Dosya Sunucusu Fujitsu Primergy RX 300 S	1 Adet
Yönetim Bilgilendirme Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
Uygulama ve Veritabanı Test Sunucusu Fujitsu SES T1000	2 Adet
Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu FibreCat CX4-120	1 Adet
Yedekleme Ünitesi Fujitsu Eternus LT40	1 Adet
Sistem Yönetim Sunucusu Fujitsu Primergy RX100 S5i	1 Adet
ABYS Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
ERP Felakate Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	1 Adet
FKM Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Eternuz DX60	1 Adet
Evrak Kayıt Server	1 Adet
Hemşehri İletişim Merkezi Server	1 Adet
Trend Micro Anti-Virüs Server	1 Adet
Websense-Checkpoint Server	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S6	2 Adet
İnternet Log Sunucusu HP Proliant DL 160 G6	1 Adet

İSTEMCİLER (İzsu+Yüklenici Firma)				
HARCAMA BİRİMLERİ	**PC**	**Nokta Vuruşlu Yazıcı**	**Hızlı Satır Yazıcı**	**Deskjet/Laserjet Yazıcı**
Abone İşleri D. Bşk.	344	194	19	61
Atıksu Arıtma D. Bşk.	84	1	-	32
Bilgi İşlem D. Bşk.	34	1	1	7
Çevre Koruma ve Kont. D. Bşk.	71	6	-	68
Destek Hizmetleri D. Bşk.	26	1	-	15
Etüd ve Plan D. Bşk.	38	1	-	10
Özel Kalem	23	1	-	17
İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk.	20	5	-	7
Kanalizasyon D. Bşk.	76	13	-	20
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği	6	1	-	4
Makine İkmal ve Tesisler D. Bşk.	41	5	-	20
Projeler D. Bşk.	59	1	-	19
Strateji Geliştirme D. Bşk.	65	10	-	31
Su İsale ve Dağıtım D. Bşk.	49	1	-	20
Su Tesisleri D. Bşk.	150	38	-	60
Ticaret İşleri D. Bşk.	46	2	-	19
Yatırım ve İnşaat D. Bşk.	83	2	-	25
Hukuk Müşavirliği	21	1	-	7
Teftiş Kurulu Başkanlığı	6	1	-	19
Toplam	**1.242**	**285**	**20**	**461**

İLETİŞİM BİLEŞENLERİ
YEREL AĞ (LAN)
Bina içi kablolama
Switchlerle omurga
GENİŞ AĞ(WAN)
Fiber optik altyapı
G.SHDSL modemler
Routerlar ve ses entegrasyonu
3G Mobil Modemler ile VPN
Radyo-Linki Altyapı

YAZILIM BİLEŞENLERİ

1. Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nda yürütülmekte olan abonelik işlemlerinin yapılması, denetlenmesi, raporlanması, belgelenmesi işlemleri bu uygulama aracılığı ile yapılmaktadır.

Abonelik işlemleri, abonelerin İZSU'nun idari birimlerine başvurması ile başlamaktadır. Abonelerin her tür dilekçeleri ABYS uygulaması ile alınmakta ve dilekçenin içeriğine göre yapılması gereken işlemlerin tamamı ABYS uygulaması tarafından yönetilmektedir. Örneğin İlk abonelik başvurusu sonrası ABYS uygulamasından Bakım Yönetim Sistemine otomatik olarak keşif iş emri düşmekte, Bakım Yönetim Sistemi tarafından Keşif İş emrinin kapatılması sonrasında Abonman veznelerine iş emri ile girilmiş tutarlar otomatik olarak düşmektedir. Veznelerden tahsilatın gerçekleşmesi sonrası Sayaç Bağlama iş emri yine otomatik olarak düşmekte, iş emrinin kapatılması sonrasında ise yine otomatik olarak abonenin aylık tahakkuklarının oluşması süreci başlamaktadır. Kurum bünyesinde verilen her abonelik işleminin uygulamada karşılığı bulunmakta ve iş süreçleri aynı mantıkla uygulama tarafından yönetilmektedir.

Abonelerin sayaçlarının her ay okunması ve okumalar sonrası tahakkukların oluşması, oluşan tahakkukların veznelerden ve tamamı online çalışan bankalardan tahsilatlarının yapılması, abone itirazlarının alınması, itirazlar sonrası oluşan tahakkuk iptal ve kıyas tahakkuklarının hesaplanması, abonelik işlemlerinin sonlanması, su kesme ve sayaç sökme süreçlerinin yönetimi, hukuk işlemlerinin başlaması ve abonelerin icralık konuma gelmeleri gibi tüm süreçler bu uygulama kapsamında değerlendirmekte ve gerçekleştirilmektedir.

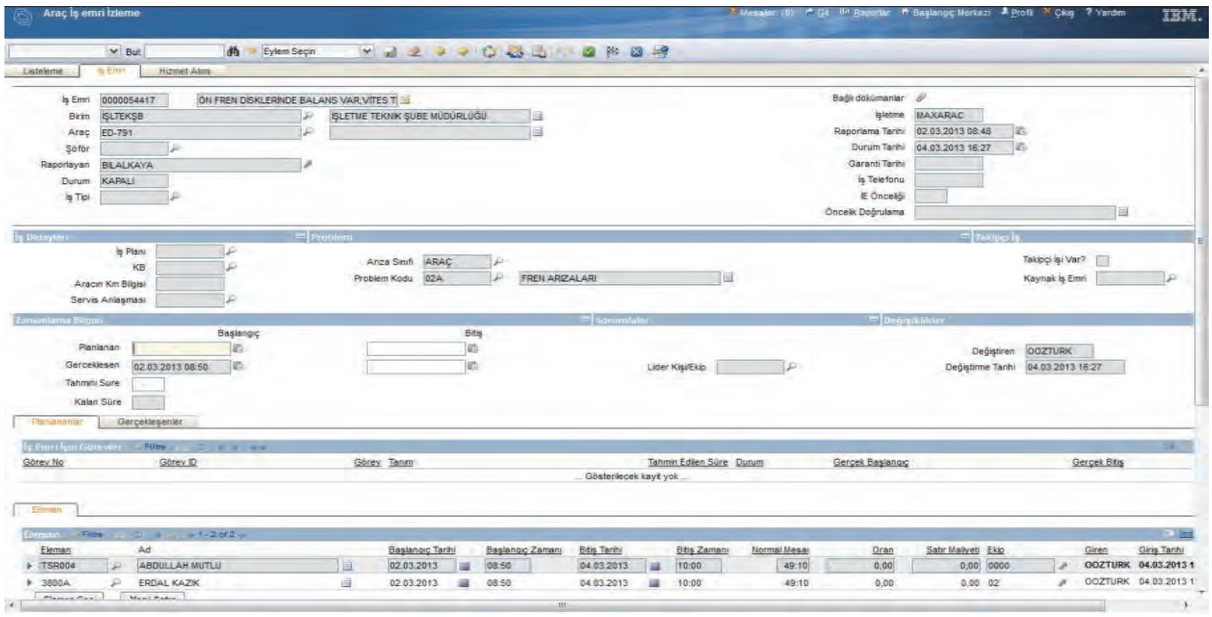

2. Bakım Yönetim Sistemi (BYS)

Abone Bilgi Yönetim Sistemi tarafındaki iş süreçleri gereği oluşturulan iş emirlerinin işlendiği ve yönetildiği sistemdir. ABYS de tanımlanmış her bir iş emri, Bakım Yönetim Sistemi tarafından tek tek ele alınmış ve her biri için süreç tanımları yapılmıştır. Her bir tip iş emrinde işlemi sahada gerçekleştiren teknik ekipten alınacak bilgiler belirlenmiş, süreçler tanımlanmış ve koşullar belirlenmiştir. Bakım Yönetim Sistemi içerisinde işlem gören iş emirlerinin ekiplere dağıtılması, saha için iş emirlerinin listelenmesi, sonuçlanan iş emirlerinin bilgilerinin girilmesinden sonra Abone Bilgi Yönetim Sistemi'ne gerekli sonuç ve bilgilerin iletilmesi, bu uygulamanın kapsamında değerlendirilmekte ve gerçekleştirilmektedir.

Bakım Yönetim Sistemi, Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Taşınır Mal Yönetim Sistemi ile tam entegre çalışmaktadır.

3. Arıza Takip ve Yönetim Sistemi (ATYS)

185 Su Arıza Bildirim Hattı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi, İZSU Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Su ve Kanal Arıza Birimleri ve diğer arıza bildirim telefonlarından herhangi biri ile bildirilen kanal ve şebeke arızalarının, arıza adresi, arıza tanımı, vb. bilgilerin detaylı olarak girilerek, arıza iş emirleri oluşturulmakta, oluşturulan iş emirleri ilgili teknik birimlere yönlenmekte ve ekiplere bölüştürülmekte, sonuçlanan iş emirlerinin sonuçları da yine programa girilerek takibi sağlanmaktadır.

Arıza Takip ve Yönetim Sistemi, Taşınır Mal Yönetim Sistemi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile tam entegre çalışmaktadır.

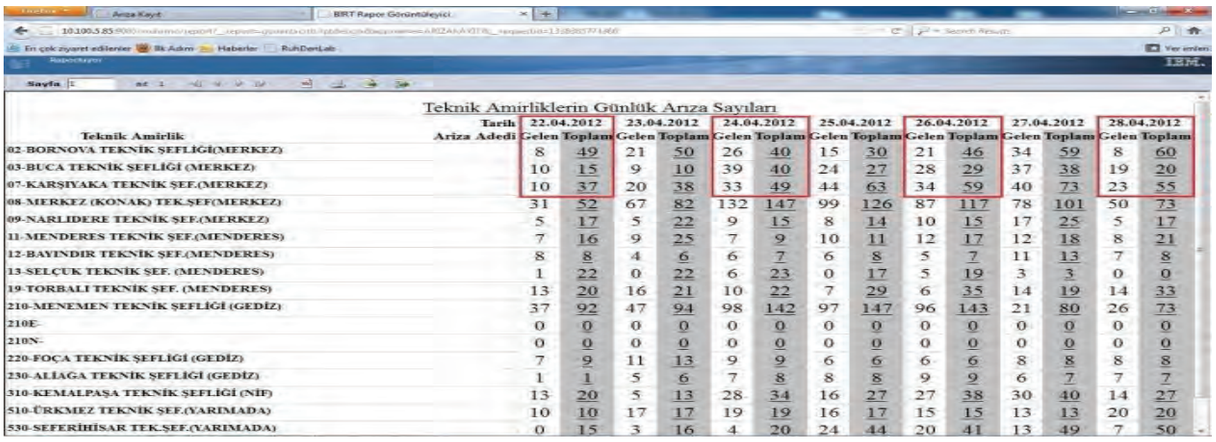

Teknik Amirliklerin Günlük Arıza Sayıları

Teknik Amirlik / Tarih / Arıza Adedi	22.04.2012		23.04.2012		24.04.2012		25.04.2012		26.04.2012		27.04.2012		28.04.2012	
	Gelen	Toplam	Gelen	Toplam	Gelen	Toplam	Gelen	Toplam	Gelen	Toplam	Gelen	Toplam	Gelen	Toplam
02-BORNOVA TEKNİK ŞEFLİĞİ(MERKEZ)	8	49	21	50	26	40	15	30	21	46	34	59	8	60
03-BUCA TEKNİK ŞEFLİĞİ (MERKEZ)	10	15	9	10	39	40	24	27	28	29	37	38	19	20
07-KARŞIYAKA TEKNİK ŞEF.(MERKEZ)	10	37	20	38	33	49	44	63	34	59	40	73	23	55
08-MERKEZ (KONAK) TEK.ŞEF(MERKEZ)	31	52	67	82	132	147	99	126	87	117	78	101	50	73
09-NARLIDERE TEKNİK ŞEF.(MERKEZ)	5	17	5	22	9	15	8	14	10	15	17	25	5	17
11-MENDERES TEKNİK ŞEF.(MENDERES)	7	16	9	25	7	9	10	11	12	17	12	18	8	21
12-BAYINDIR TEKNİK ŞEF.(MENDERES)	8	8	4	6	6	7	6	8	5	7	11	13	7	8
13-SELÇUK TEKNİK ŞEF. (MENDERES)	1	22	0	22	6	23	0	17	5	19	3	3	0	0
19-TORBALI TEKNİK ŞEF. (MENDERES)	13	20	16	21	10	22	7	29	6	35	14	19	14	33
210-MENEMEN TEKNİK ŞEFLİĞİ (GEDİZ)	37	92	47	94	98	142	97	147	96	143	21	80	26	73
210E-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210N-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220-FOÇA TEKNİK ŞEFLİĞİ (GEDİZ)	7	9	11	13	9	9	6	6	6	6	8	8	8	8
230-ALİAĞA TEKNİK ŞEFLİĞİ (GEDİZ)	1	1	5	6	7	8	8	8	9	9	6	7	7	7
310-KEMALPAŞA TEKNİK ŞEFLİĞİ (NİF)	13	20	5	13	28	34	16	27	27	38	30	40	14	27
510-ÜRKMEZ TEKNİK ŞEF.(YARIMADA)	10	10	17	17	19	19	16	17	15	15	13	13	20	20
530-SEFERİHİSAR TEK.ŞEF.(YARIMADA)	0	15	3	16	4	20	24	44	20	41	13	49	7	50

4. Araç/Ekipman Kontrol Yönetim Sistemi

İdareye ait araçlar (binek, kamyon, kamyonet, iş makinesi) ve ekipmanların (pompa, kompresör, jeneratör), marka, model, tip ve diğer tüm teknik bilgilerinin detaylı bir şekilde bilgi girişleri yapılabilmekte, planlı/plansız arıza ve bakım kayıtları oluşturularak sonuçları sistemde izlenebilmektedir. Araç/Ekipman Kontrol Yönetim Sistemi, Taşınır Mal Yönetim Sistemi ile entegre çalışmaktadır.

5. İştirak Payları Yönetim Sistemi

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde inşaat yapan ve inşaat ruhsatı almak isteyen tüm kişi/kurum/kuruluşların öncelikle İZSU'dan inşaat altyapısı için belge almaları gerekmektedir. Bu belge verilmeden önce başvuru sahiplerinden kanal ve içme suyu alt yapılarına iştirak payları oranında bedellerini yatırmaları istenmektedir. Bu uygulama, kuruma bu amaçlarla yapılan başvuruların takibi, kontrolü, izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

6. İhale Takip Sistemi

4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na uygun olarak çalışan uygulama, açık ihale, 21-B Pazarlık ve doğrudan temin yöntemleri ile yapılan ihale tiplerini kapsamakta olup, ihale dokümanlarının hazırlanması ve ihale aşamalarının takibi ile ihale sonuçlarının belirlenmesi ve izlenmesi için kullanılmaktadır.

İhale Takip Sistemi, Satınalma Yönetim Sistemi, Proje Takip Modülü ve Personel Takip Sistemi ile tam entegre çalışmaktadır.

7. Proje Takip Sistemi

İdare tarafından ihale edilen alt yapı ve üst yapı projelerinin sözleşme bilgileri ile, ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanmış işlerin, başlaması ile sonuçlanması arasında geçen süre içerisinde geçirdiği safları izlemek, hakediş, ödeme, süre uzatımı gibi detayları takip edebilmek amacıyla kullanılan sistem, Üst yönetime sunulmak üzere analiz raporları da sunmaktadır.

Proje Takip Sistemi, Satınalma Yönetim Sistemi, İhale Takip Sistemi, Bütçe Modülü, Genel Muhasebe Modülü ve Personel Takip Sistemi ile entegre çalışmaktadır.

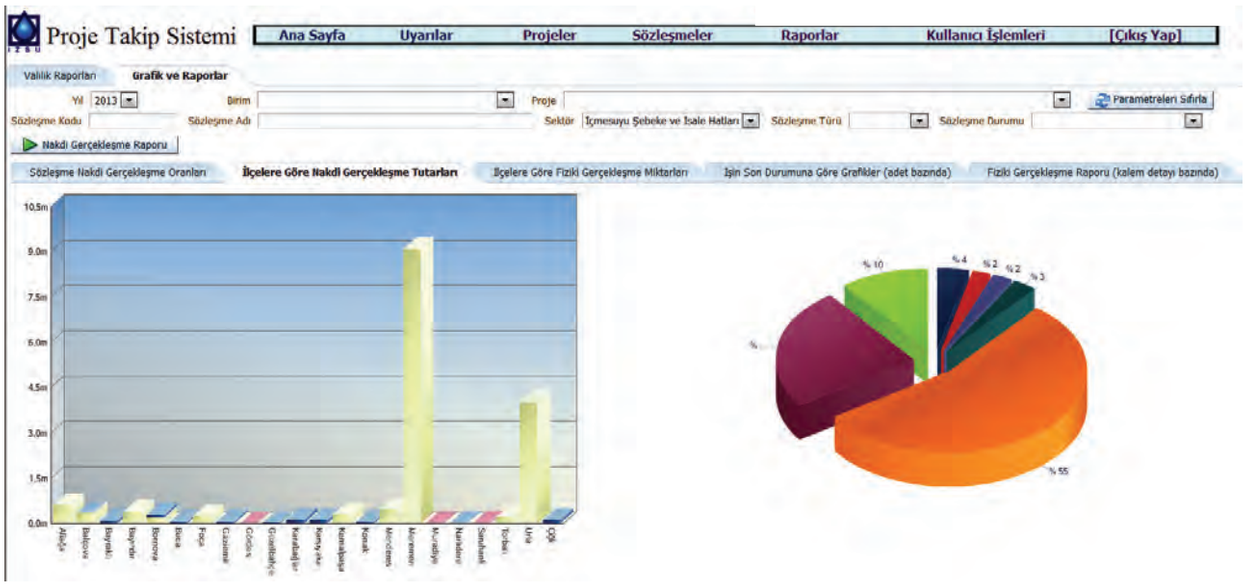

8. Emlak Kamulaştırma Sistemi

İdare tarafından yapılan kamulaştırma ve protokollerin takibi amacıyla kurulmuş olan sistem, tüm kamulaştırma sürecinin ve detay bilgilerinin takip edilmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıca üst yönetime sunulabilecek analiz raporlarını da içermektedir.

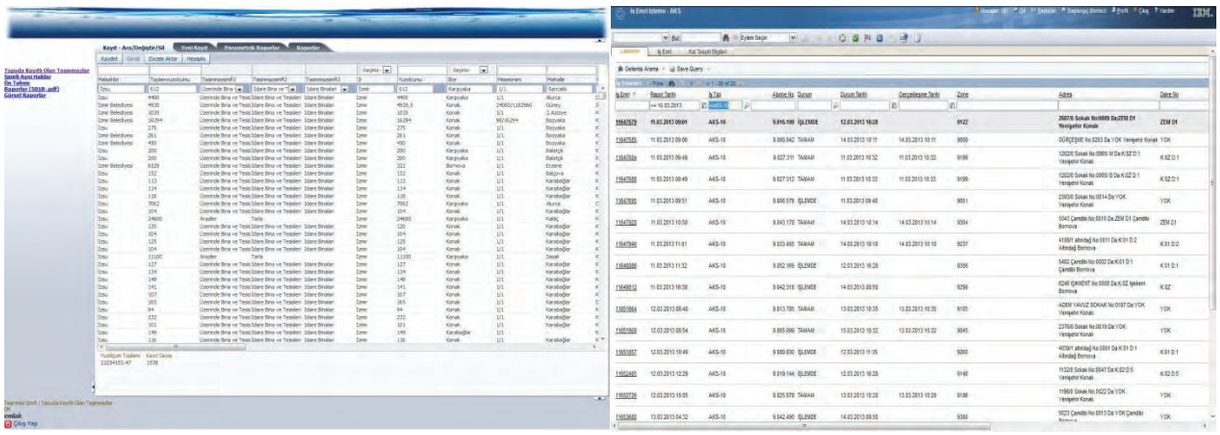

9. Su Kalite Kontrol Yönetim Sistemi

İZSU Laboratuvar Birimine, su kaynaklarından, arıtma tesislerinden, depolardan, konut ve işletmelerden, içme suyu şebekesinden, memba sularından, atık sulardan ve düzenli alınan su örnekleme noktalarından gelen numunelerin kayıtlarının alınması, analiz sonuçlarının işlenmesi, analiz sonuçlarının çeşitli standartlara göre değerlendirilerek uygunluğunun tespiti ve raporlanması işlemlerini içermektedir. Su Kalite Kontrol Yönetim Sistemi, Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi ve Sağlık Bakanlığı Su Kalite Sistemi ile entegre çalışmaktadır.

10. Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi

İZSU Ruhsat Denetim Birimi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kayıtlı işletmelere yaptıkları haberli / habersiz kontrollerin ve bu kontrollerde alınan numunelerin izlenmesi ile bu numunelerin analiz sonuçlarına göre işletmelere çıkması gereken Kirlilik Önlem Payı bedellerinin hesaplanması, raporlanması ve izlenmesi işlemlerini içermektedir.

Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi, Su Kalite Kontrol Yönetim Sistemi ve Abone Bilgi Yönetim Sistemi ile entegre çalışmaktadır.

11. Personel Yönetim Sistemi

Kurum bünyesinde çalışmakta olan Memur, Kadrolu İşçi, Sözleşmeli Memur, Stajyerler ile yine kurum bünyesinde çalışmakta olan dış kaynak alımı ile insan kaynağı temini kapsamında çalışan personellerinin özlük bilgileri ile puantaj ve bordro bilgileri girişi, izlenmesi işlemleri ile bordronun hazırlanması ve basılması işlemlerini içeren Memur Personel, İşçi Personel ve Stajyer Personel şeklinde üç farklı kısımdan oluşan sistemdir. Personel Yönetim Sistemi Genel Muhasebe ile entegre çalışmaktadır.

12. Finans Yönetim Sistemi

Genel Muhasebe ve Bütçe Modüllerinden oluşmaktadır. Uygulamalar, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tam uyumlu olup kurumun ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiştir. Abone Bilgi Yönetim Sistemi tarafından oluşmuş olan tahakkuk, vezne tahsilatı, banka tahsilatı ve resmi daire aboneleri tahsilatları, Personel Yönetim Sistemi'ne oluşmuş olan ücret, avans, ikramiye vs.ödemeleri, Taşınır Mal Yönetim Sistemi'nden gelen TİF ve yapılan çıkışlar, Proje Yönetimi'nden girilen hakediş ödemeleri, Bütçe Modülü'nden yıllık kabul edilen bütçe bilgileri Genel Muhasebe sistemi'ne entegrasyon ile gelmektedir.
Genel Muhasebe Modülü içerisinde, hesap kodları ile ilgili işlemler, Entegre çalışılan sistemlerden (Abone Bilgi Yönetim Sistemi, Personel Yönetim Sistemi, Taşınır Mal Yönetim Sistemi, Demirbaş Yönetim Sistemi, Proje Yönetimi, Bütçe, vs) gelen bilgilere ait fişlerin muhasebe sistemine dahil edilmesi, günlük fiş işlemleri ile raporlamalar bulunmaktadır.
Bütçe Modülü içerisinde ise, her harcama biriminin kendi bütçesini oluşturması, daha sonra bu bütçelerden konsolide bütçe oluşturulması ve bütçenin onaylanması sonrası Genel Muhasebe Modülü'ne bilgilerin aktarılması ve Bütçe gerçekleşmelerinin kontrolü ile detaylı raporlamalar bulunmaktadır.

13. Lojistik Yönetim Sistemi

Satın alma Yönetim sistemi, Taşınır Mal Yönetim Sistemi ve Demirbaş Takip Sistemi modüllerinden oluşmaktadır. Satın alma Yönetim Sistemi, Taşınır Mal Yönetim Sistemi, Bütçe Yönetim Sistemi ve Genel Muhasebe Sistemi ile entegre çalışmaktadır. Bütçe Yönetim Sistemi, Genel Muhasebe Sistemi ile entegre çalışmaktadır.

Satın alma Yönetim Sistemi, birimlerin satın alma taleplerini oluşturması, Satın alma Biriminin girilmiş taleplerle ilgili talepleri toplaması ve siparişe dönüştürmesi süreçlerini içermektedir.
Taşınır Mal Yönetim Sistemi, Satın alma Biriminin yarattığı sipariş kayıtlarına karşılık olan teslim almaların yapılması, malzemelerin ilgili alt birimlere yada kullanıma sevk edilmesi, takibinin yapılması ve Taşınır İşlem Fişlerinin basılması gibi süreçleri içermektedir.

Demirbaş Takip Sistemi, Satın alma biriminin yarattığı sipariş kayıtlarına karşılık olan teslim almaların yapılması, malzemelerin birimlere sevk edilmesi, kişilere zimmetlenmesi, zimmet defterlerinin oluşturulması gibi süreçleri içermektedir. Demirbaş Takip Sistemi, Satın alma Yönetim Sistemi, Personel Yönetim Sistemi, Genel Muhasebe Sistemi ile entegre çalışmaktadır.

14. Evrak Kayıt ve Takip Sistemi

Birimlere ve kuruma gelen ve giden tüm evrakların kayıt altına alınması, istenirse dokümanın sistemde oluşturulması yada oluşturulmuş dokümanın evrak kaydı ile ilişkilendirilmesi, izlenmesi, numaralandırılması, yanıtlanması ve takiplerinin yapılması konusundaki iş süreçleri kapsamaktadır. Uygulama İZSU bünyesindeki tüm birimlerde kullanılmaktadır.

DAİRE BAŞKANLIKLARI BAZINDA KULLANILAN PROGRAMLAR	
Programın Adı	**Kullanan Daire Başkanlıkları**
Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Bakım Yönetim Sistemi (BYS)	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Arıza Takip ve Yönetim Sistemi (ATYS)	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Araç/Ekipman Kontrol Yönetim Sistemi	Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
İştirak Payları Yönetim Sistemi	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Takip Sistemi	Etkin: Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı İzleme: Tüm Daire Başkanlıkları
Proje Takip Sistemi	Projesi olan tüm Daire Başkanlıkları
Emlak Kamulaştırma Sistemi	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Su Kalite Kontrol Yönetim Sistemi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Personel Yönetim Sistemi	Etkin: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İzleme: Tüm Daire Başkanlıkları
Finans Yönetim Sistemi	Tüm Daire Başkanlıkları, Teftiş Kurulu Bşk Özel Kalem, İç Denetçiler, Koruma ve Güvenlik Amirliği
Lojistik Yönetim Sistemi	Tüm Daire Başkanlıkları, Teftiş Kurulu Bşk, Özel Kalem, İç Denetçiler, Koruma ve Güvenlik Amirliği
Evrak Kayıt ve Takip Sistemi	Tüm Daire Başkanlıkları, Teftiş Kurulu Bşk, Özel Kalem, İç Denetçiler, Koruma ve Güvenlik Amirliği

4.İNSAN KAYNAKLARI

4.1. İZSU Genel Müdürlüğü Personeline İlişkin Veri ve İstatistikler

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle istihdam edilen personel sayısı 1.610'dur. Görev yapmakta olan 754 adet memur personel toplam personelin % 47'sini, 716 adet kadrolu işçi personel toplam personelin % 44'ünü, 140 adet sözleşmeli personel de toplam personelin % 9'unu oluşturmaktadır.

Personel dağılımına bakıldığında, sayısal çoğunluk bakımından birinci sırada memur personelin, ikinci sırada kadrolu işçilerin, üçüncü ve son sırada ise sözleşmeli personelin olduğu görülmektedir.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIFLARI İTİBARI İLE PERSONEL DAĞILIMI TABLOSU - SAYISAL			
Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	TOPLAM
754	140	716	1.610

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SINIFLARI İTİBARI İLE PERSONEL DAĞILIMI GRAFİĞİ - YÜZDESEL

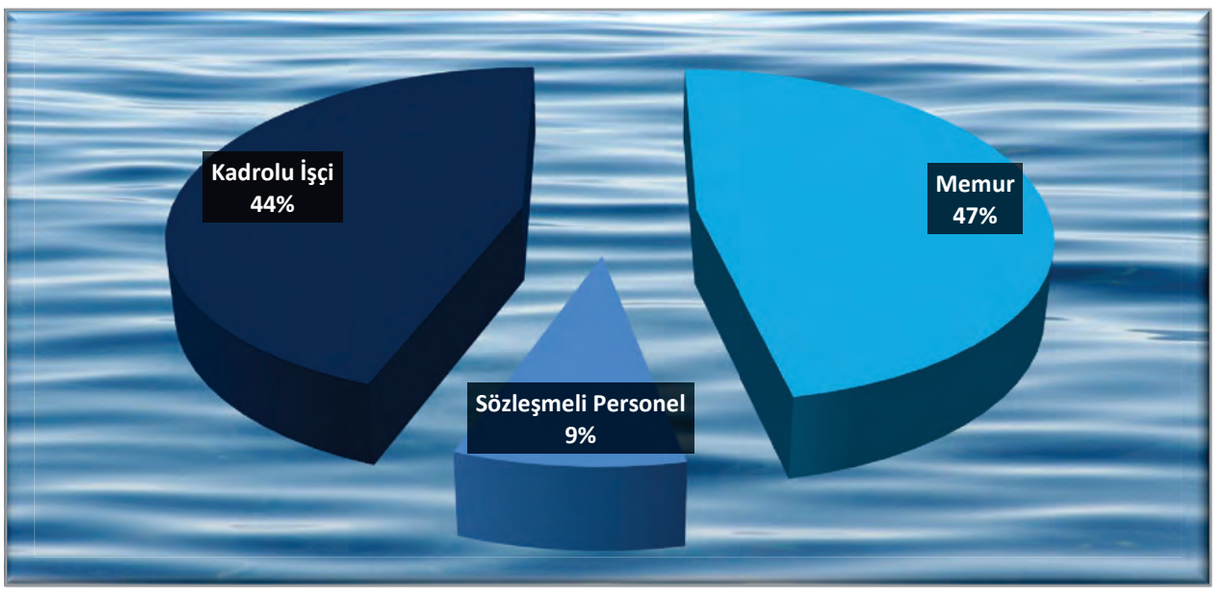

4.1.1.Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 431 ilkokul mezunu personel, tüm personelin %27 'sini, 159 ortaokul mezunu personel tüm personelin %10'unu, 297 lise mezunu personel tüm personelin % 18'ini, 138 meslek lisesi veya teknik öğrenim mezunu personel tüm personelin % 9'unu, 12 lise üstü bir yıllık meslek okulu veya teknik öğrenim mezunu personel tüm personelin % 1'ini, 167 iki yıllık yüksek okul mezunu personel tüm personelin %10'unu, 372 dört yıllık üniversite mezunu personel tüm personelin %23'ünü, 24 yüksek lisans (master) seviyesinde personel tüm personelin %1'ini, 10 doktora seviyesinde personel tüm personelin %1'ini oluşturmaktadır.

Grafik dağılımına bakıldığında tüm personelin %27 oranında ilkokul mezunu bulunduğu, bunların kendi içlerinde incelemesi yapıldığında ilkokul mezunlarının %99 oranla kadrolu işçilerden oluştuğu görülmektedir. Personel dağılımı geneline bakıldığında ise yüksek okul (4 yıllık) mezunların 2. sırada, lise

mezunlarının da 3. sırada yer aldığı diğerlerinin de bunları takip ettiği görülmektedir. Ve ayrıca toplamda 34 lisansüstü ve doktora mezunlarının da bünyede istihdam edildiği görülmektedir.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU				
Öğrenim Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Toplam
İlkokul (5 Yıl)	4		427	431
Ortaokul	56		103	159
Lise (3 Yıl)	151		146	297
Mes.Lisesi / Tek.Öğ.	138			138
Lise Üstü 1Yıl Mes./Tek.Öğ.	12			12
Yüksek Okul (2 Yıl)	142		25	167
Yüksek Okul (4 Yıl)	224	133	15	372
Lisansüstü (Master)	17	7		24
Doktora	10			10
Toplam	754	140	716	1.610

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SINIFLARI İTİBARI İLE PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ

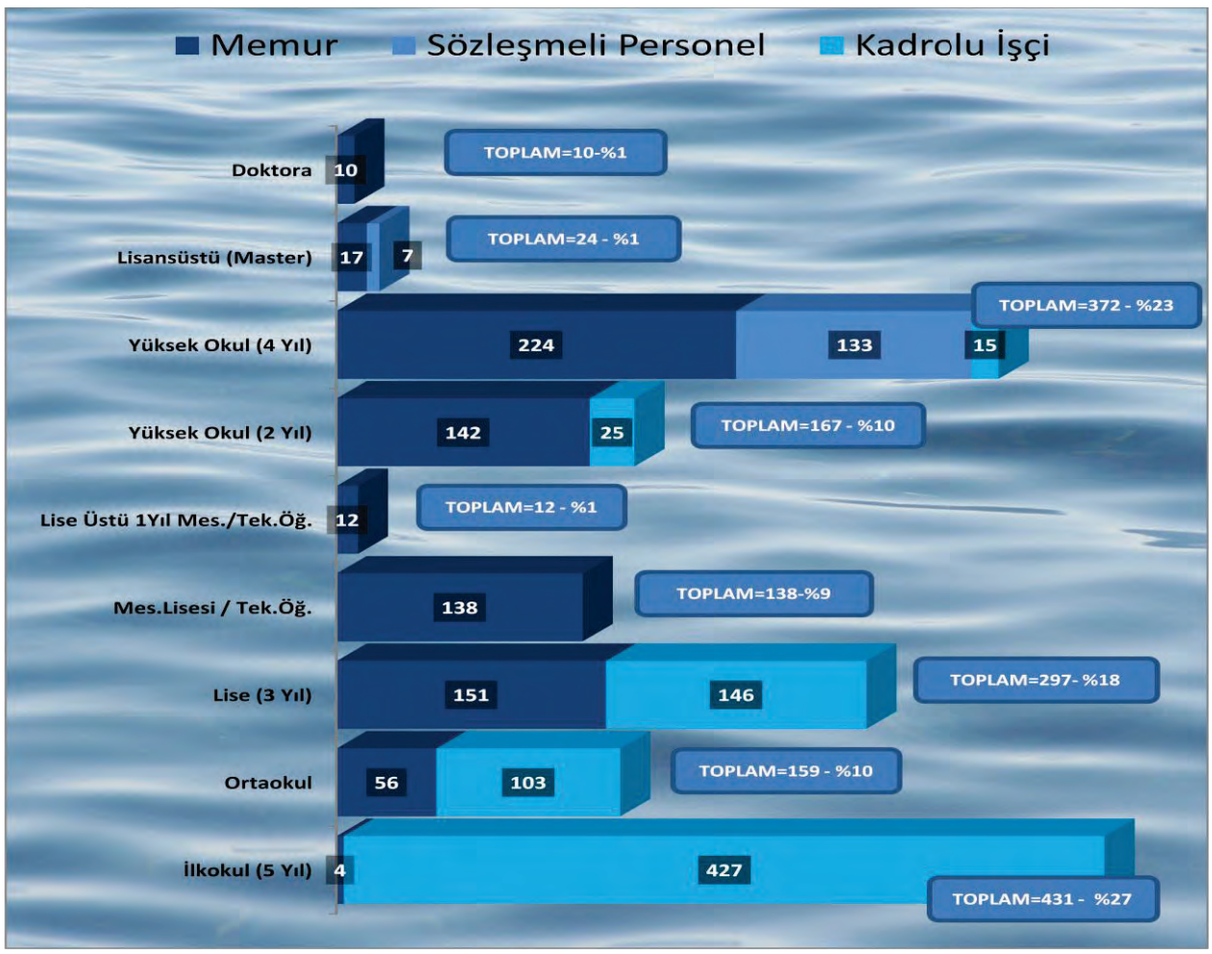

4.1.2.Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle görev yapan 1.610 adet personelin, %10'u 0 ile 5 yıl arasında, %14'ü 6 ile 10 yıl arasında, %15'i 11 ile 15 yıl arasında, %25'i 16 ile 20 yıl arasında, %10' u 21 ile 25 yıl arasında görev yapmış olup, %13'ü de 25 yıldan fazla süredir görevdedir.

Grafiğin genel dağılımına baktığımızda %33'lük oran ile 16-20 yıl tecrübeli personelin çoğunlukta bulunduğu ve kadrolarda % 76'lık oranla 10 yıl ve üstü deneyimli personelin istihdam edildiği görülmektedir. Tecrübeliler sınıflamasında memur personelin ağırlığı oluşturduğu, ikinci sırada ise kadrolu işçilerin yer aldığı görülmektedir.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI				
YILLAR	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	TOPLAM
0-5	31	118	4	153
06-10	18	19	196	233
11-15	49	3	188	240
16-20	224		182	406
21-25	282		81	363
25 YILDAN FAZLASI	150		65	215
TOPLAM	754	140	716	1610

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI GRAFİĞİ

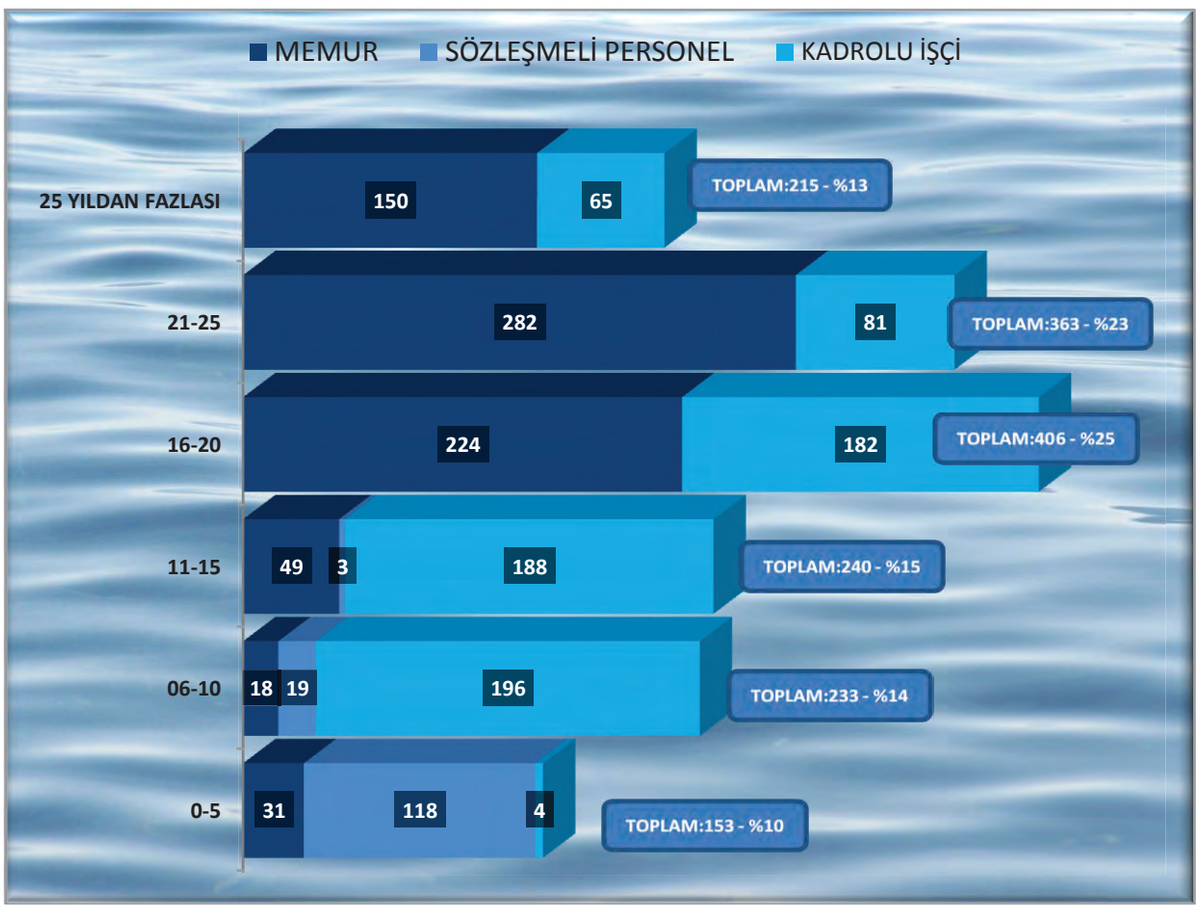

4.1.3. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 1.610 adet personel, %83 oranında erkek , %17 oranında kadın personelden oluşmaktadır.

Grafikte görüldüğü gibi cinsiyet dağılımı açısından ağırlığın erkek personelde olduğu görülmektedir.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI				
CİNSİYET	MEMUR	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	KADROLU İŞÇİ	TOPLAM
Kadın	187	51	40	278
Erkek	567	89	676	1332
TOPLAM	754	140	716	1610

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI GRAFİĞİ

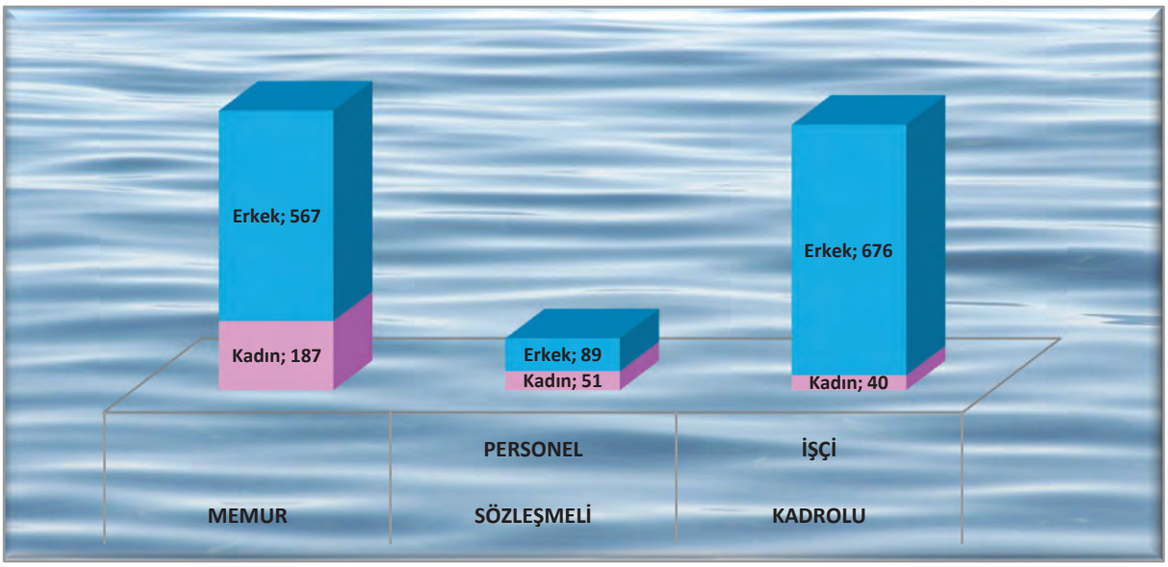

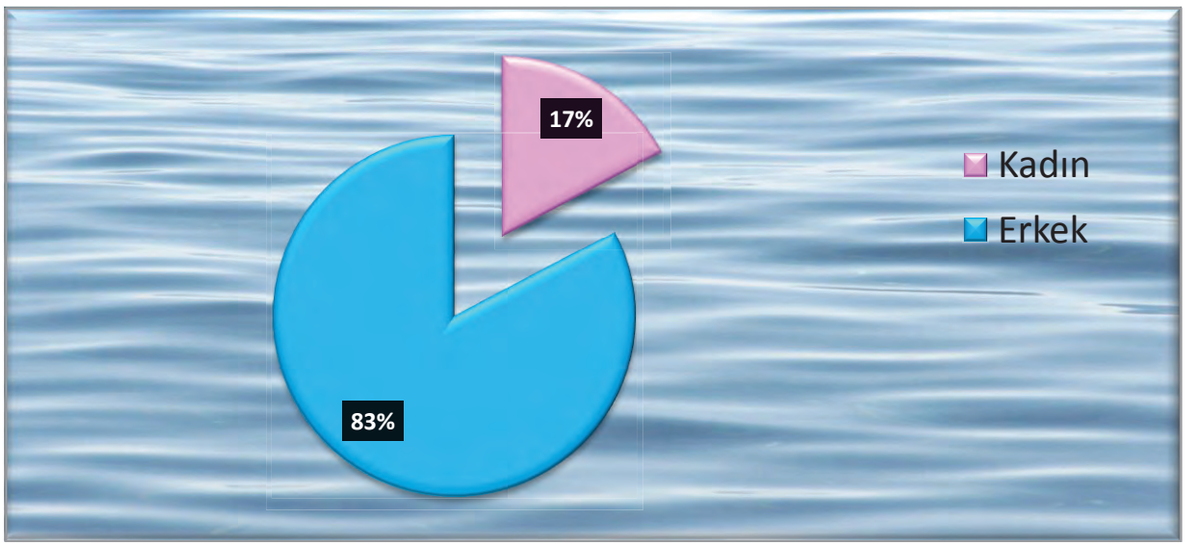

4.2. Memur Personel İstatistikleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle; 754 memur personel görev yapmaktadır. İZSU Genel Müdürlüğü memur personeli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olup, memur personele ilişkin çeşitli veri ve istatistikler aşağıdaki başlıklar altında verilmektedir.

4.2.1. Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 578 adet genel idari hizmetleri sınıfındaki personel, tüm memur personelin %77'sini, 9 adet sağlık personeli sınıfındaki personel tüm personelin %1'ini, 3 adet avukatlık hizmeti sınıfındaki personel tüm personelin %0,5' ini,161 adet teknik personel sınıfındaki personel tüm personelin % 21'ini, 3 adet yardımcı hizmetler sınıfındaki personel tüm personelin %0,5' ini oluşturmaktadır.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

HİZMET SINIFI	TOPLAM
Genel idari Hizmetleri Personel	578
Sağlık Personeli	9
Avukatlık Hizmeti	3
Teknik Personel	161
Yardımcı Hizmetler	3
TOPLAM	754

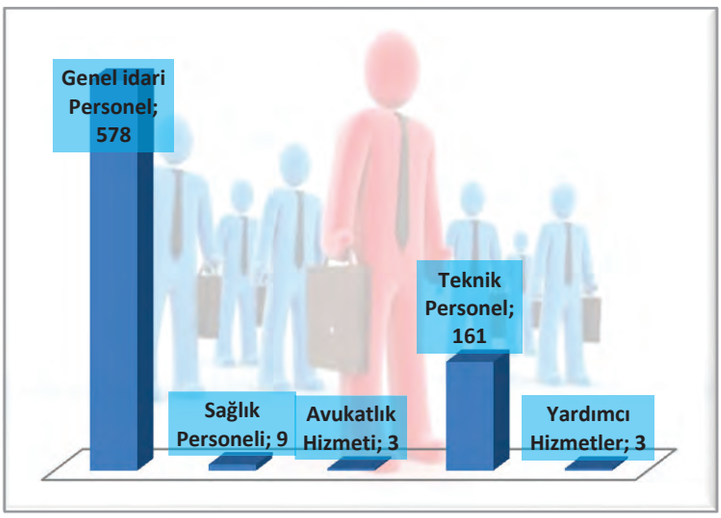

4.2.2.Memur Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle görev yapan 754 adet memur personelin, %4' ü 0 ile 5 yıl arasında, %2'si 6 ile 10 yıl arasında, %7'si 11 ile 15 yıl arasında, %30'u 16 ile 20 yıl arasında, %37' si 21 ile 25 yıl arasında görev yapmış olup, %20'si 25 yıldan fazla süredir görev yapmaktadır.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMUR PERSONELİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

YILLAR	TOPLAM
0-5	31
06-10	18
11-15	49
16-20	224
21-25	282
25 YILDAN FAZLASI	150
TOPLAM	754

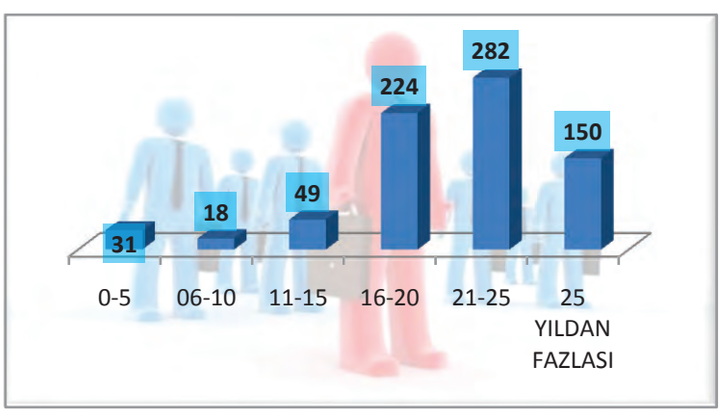

4.2.3. Memur Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle görev yapan memur personelin %1'i ilkokul mezunu, %7'si ortaokul mezunu, %20'si lise mezunu, %18'i meslek lisesi / Tek. Öğ. Mezunu, %0,2'si Lise üstü 1 yıl Mes./Tek. Öğ., %19'u 2 yıllık yüksek okul mezunu, %30'u 4 yıllık üniversite mezunu, %2'si lisansüstü (master) seviyesinde, %1'i doktora seviyesindedir. Memur personelin ağırlıklı olarak lise ve dört yıllık üniversite arasında dağıldığı görülmektedir.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

ÖĞRENİM DURUMU	TOPLAM
İlkokul (5 Yıl)	4
Ortaokul	56
Lise (3 Yıl)	151
Mes. Lisesi / Tek. Öğ.	138
Lise Üstü 1 Yıl Mes. /Tek. Öğ.	12
Yüksek Okul (2 Yıl)	142
Üniversite (4 Yıl)	224
Lisanüstü (Master)	17
Doktora	10
TOPLAM	754

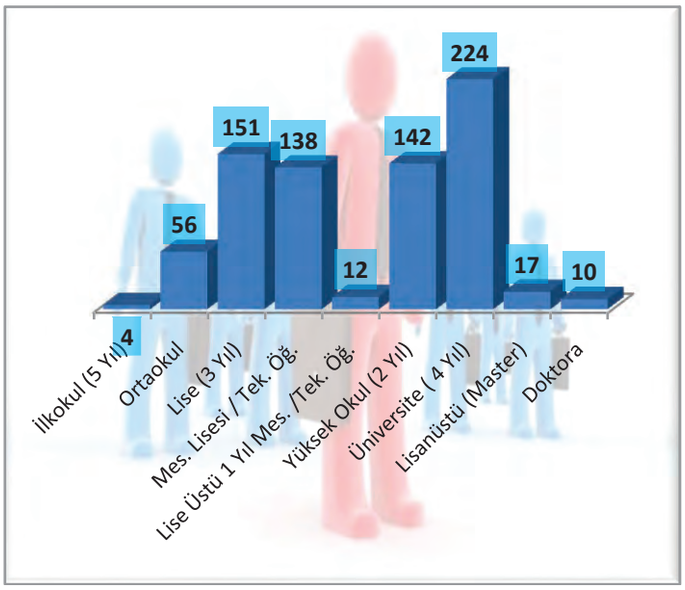

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEMUR PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

4.2.4.Memur Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan memur personelin %75'i erkek, % 25'i kadın personelden oluşmaktadır.

CİNSİYET	MEMUR
Kadın	187
Erkek	567
TOPLAM	754



İZSU bünyesindeki memur personel hizmet sınıfları açısından bakıldığında sayısal çoğunluk bakımından; %76'lık oranla "Genel İdari Hizmetler" sınıfı personelinin birinci sırada, "Teknik Hizmetler" sınıfı personelinin ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Hizmet süreleri ayrımı yapıldığında; %96 oranında 10 yıl ve üstü tecrübeli personelin bulunduğu, mesleki dağılım açısından bakıldığında ise; %92 oranında lise

ile lisansüstü dağılımlı personelin olduğu görülmektedir. Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise çoğunluğun dörtte üç oranında erkek personelden oluştuğu gözlenmektedir.

4.3. Sözleşmeli Personel İstatistikleri

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle; 140 sözleşmeli personel bulunmaktadır. İZSU sözleşmeli personeli 5393 Sayılı Kanunun 49. madde hükümlerine tabi olup, aşağıdaki başlıklar altındaki tablo ve grafiklerle sergilenen kategorilerde sınıflandırılmıştır.

Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan sözleşmeli personelin %96'sı teknik hizmetlerde, %4'ü avukatlık hizmetlerinde görev yapmaktadır.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

HİZMET SINIFI	TOPLAM
Teknik Hizmetler	134
Avukatlık hizmetleri	6
TOPLAM	140



4.3.1.Sözleşmeli Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle görevde bulunan 140 adet sözleşmeli personelinin, %84'ü 0 ile 5 yıl arasında, %14'ü 6 ile 10 yıl arasında, %2'si de 11 ile 15 yıl arasında hizmet süreleri bulunmaktadır.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

YILLAR	TOPLAM
0-5	118
06-10	19
11-15	3
TOPLAM	140



4.3.2.Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 140 adet sözleşmeli personelin %95'i üniversite mezunu olup, %5'i yüksek lisans (master) derecesine sahiptir.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

ÖĞRENİM DURUMU	TOPLAM
Üniversite	133
Lisansüstü (Master)	7
TOPLAM	140



İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

4.3.3.Sözleşmeli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan 140 adet sözleşmeli personelin %36'sı kadın personel, %64'ü erkek personelden oluşmaktadır.

CİNSİYET	TOPLAM
Kadın	51
Erkek	89
TOPLAM	140

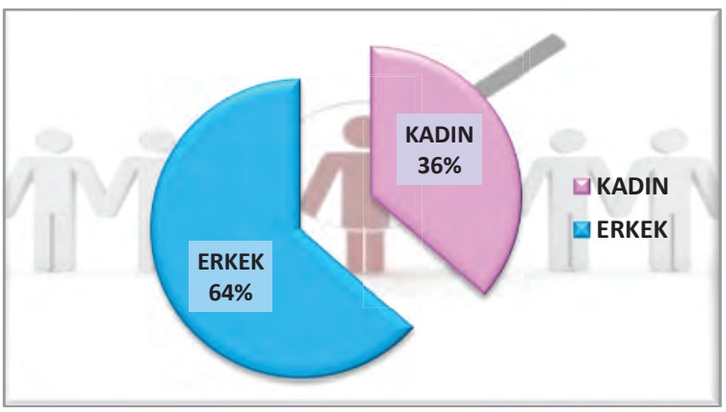

Sözleşmeli personel hizmet sınıfı bakımından incelendiğinde; teknik ve avukatlık hizmetlerinde istihdamın olduğu, %81 oranla ilk sırayı teknik hizmetlerdeki personelin aldığı görülmektedir. Hizmet süreleri açısından bakıldığında; sözleşmeli personelin %89 oranla 10 yıldan az tecrübeli genç kadrodan oluştuğu, üniversite ve üstü mezunlardan oluştuğu, erkek personelin çoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir.

4.4. Kadrolu İşçi İstatistikleri

Genel Müdürlüğümüzde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle; 716 adet kadrolu işçi bulunmaktadır. İZSU Genel Müdürlüğünde görev yapan kadrolu işçi personel, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olup, aşağıdaki kategorilerdeki veri ve istatistikler çerçevesinde bilgileri sınıflandırılmıştır:

4.4.1.Kadrolu İşçilerin Personel Grubuna Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan işçi personelin %5,2'si vasıflı işçilik, % 48'si usta işçilik, %25'i ustabaşı işçilik, %1'i teknisyen işçilik, %15'i şoför işçilik, %5'i iş makineleri operatörü gruplarında yer almakta olup vasıfsız işçilik grubunda 2 işçi bulunmaktadır.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADROLU İŞÇİLERİN PERSONEL GRUBUNA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

PERSONEL GURUBU	TOPLAM
Vasıfsız İşçilik Grubu	2
Vasıflı İşçilik Grubu	11
Usta İşçilik Grubu	299
Ustabaşı İşçilik Grubu	256
Teknisyen İşçilik Grubu	12
Şöför İşçilik Grubu	102
İş Makineleri Operatörü	34
TOPLAM	716



4.4.2.Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kadrolu işçilerin %62'si ilkokul mezunu, %13'ü ortaokul mezunu, %19'u lise mezunu, %3'ü meslek yüksek okulu mezunu, %1'i yüksek okul mezunu, %2'si üniversite mezunudur.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADROLU İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

YILLAR	TOPLAM
İlkokul (5 Yıl)	427
Ortaokul	103
Lise (3yıl)	146
Endüstri Meslek Lisesi	0
Meslek Yüksek Okul	25
Yüksek Okul	0
Üniversite	15
TOPLAM	716

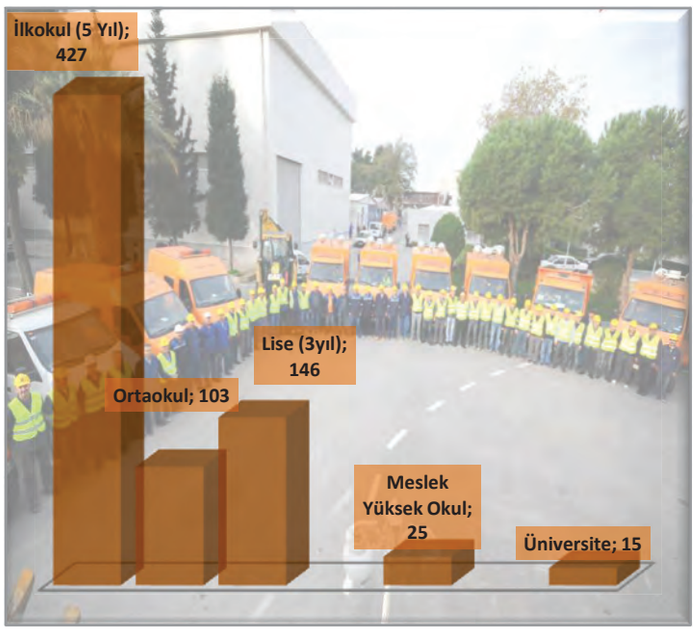

4.4.3.Kadrolu İşçilerin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle görev yapan 716 adet kadrolu işçi personelin, %4'ü 0 ile 5 yıl arasında, %24'ü 6 ile 10 yıl arasında, %27'si 11 ile 15 yıl arasında , %22'si 16 ile 20 yıl arasında, %11'i 21 ile 25 yıl arasında, %12'si 25 yıldan fazla hizmet yapmıştır.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADROLU İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

YILLAR	TOPLAM
0-5	4
6-10	196
11-15	188
16-20	182
21-25	81
25 YILDAN FAZLA	65
TOPLAM	716

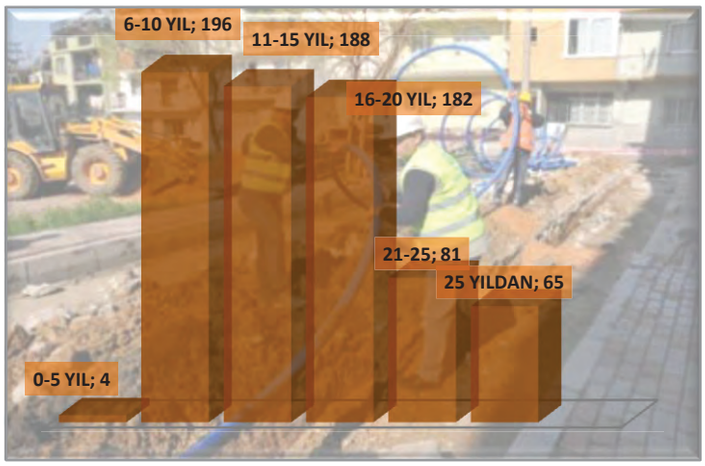

4.4.4.Kadrolu İşçilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

İZSU Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kadrolu işçilerin %6'sı kadın, %94'ü erkek personelden oluşmaktadır.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADROLU İŞÇİLERİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU VE GRAFİĞİ

CİNSİYET	KADROLU İŞÇİ
Kadın	40
Erkek	676
TOPLAM	716



Kadrolu işçilerin personel gruplarına bakıldığında; usta ve ustabaşı işçilik ile şoförler işçilik gruplarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Kadrolu işçilerin çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu ve hizmet süreleri bakımından 6 ile 20 yıl arasında tecrübe dağılımının bulunduğu görülmektedir. Kadrolu işçilerin genellikle fiziksel güç gerektiren görevler yapması nedeniyle erkek personel sayısının çoğunlukta olduğu gözlenmektedir.

5.SUNULAN HİZMETLER

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmektedir. Bu hizmetler kapsamında içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı, her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklardan sağlanmakta ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta, ihtiyaç duyulan her türlü proje yapılmakta, yaptırılmakta ve hizmete alınmakta, bu projelere göre hizmete alınan tesisler işletilmekte, gerekli bakım ve onarımı yapılmaktadır.





İzmir'de hizmet alanı içinde yaklaşık 4 milyon nüfusa hizmet veren İZSU Genel Müdürlüğü' nün faaliyet alanı, su kaynaklarının bir bölümünün il sınırları dışında kalması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet alanından daha fazladır.

İZSU Genel Müdürlüğü hizmet alanındaki ilçe, mahalle ve köylere sağlıklı ve kesintisiz içme suyunu ulaştırabilmek için içme suyu şebekelerini yenilemekte, gelecekteki muhtemel su sıkıntılarına karşın kaynak arayışını sürdürmekte, bu kapsamda su sıkıntısı yaşayan yeni yerleşim yerlerine, su kuyuları açıp hizmete almakta, su depoları yapmakta, mevcut su kaynaklarımızı çevre kirliğinden korumak için ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır.

2012 yılında da İzmir' e 24 saat kesintisiz su verme hizmetini sürdürmeye devam etmiştir. İçme suyu kalitesi İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygundur.

İZSU Genel Müdürlüğü su baskınlarına karşı kenti korumak için çeşitli kanalizasyon alt yapı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda kanalizasyon, yağmursuyu kanalı ve dere ıslahı faaliyetlerine devam etmektedir.

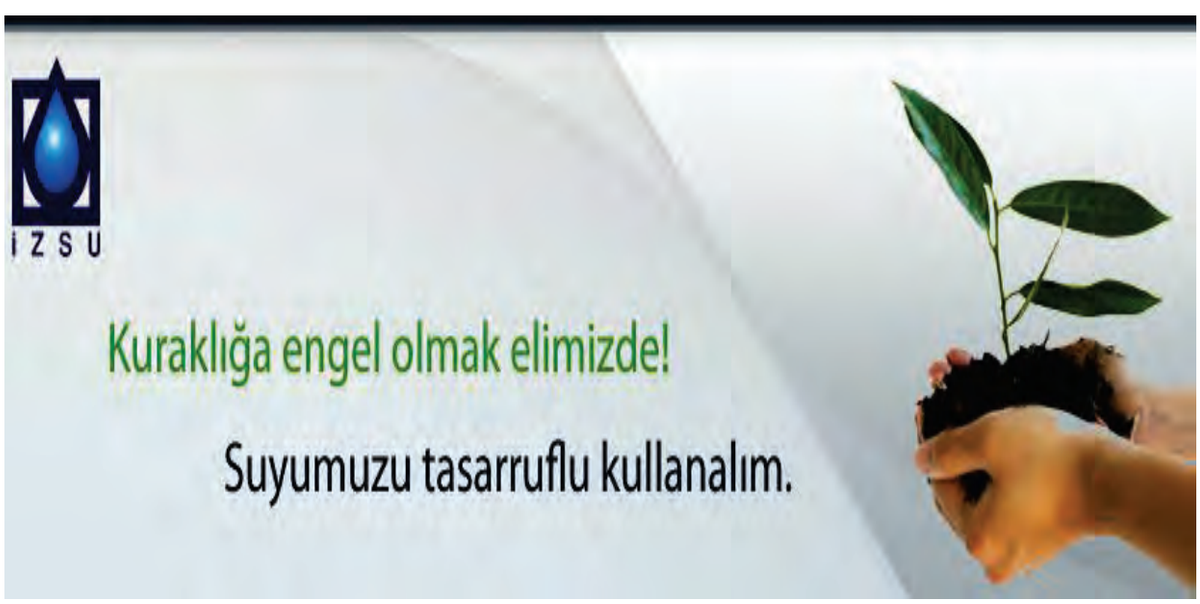

ANA FAALİYET ALANLARI

İZSU Genel Müdürlüğü'nün ana faaliyet konuları çerçevesindeki görev ve faaliyet kapsamları, ana başlıklar ve onlara bağlı detay başlıklar olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

A) İÇMESUYU

2012 yılında kenti küresel iklim değişikliklerine karşı hazırlamış ve susuz bırakmamak için pek çok çalışma olumlu bir şekilde sonuçlanmıştır. Ancak bu olumlu tabloya rağmen rehavete kapılmayıp gelecek yıllarda yaşanması muhtemel kuraklık tehlikesine karşı önlemler almaya ve konuyla ilgili yatırımlara devam edilmiştir.

Kaynak Yaratımı ve Korunması

İZSU Genel Müdürlüğü'nce İzmir şehrinin nüfus artışına paralel olarak içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacına uygun mevcut su kaynaklarına ek besleyici yeni su kaynakları (yer altı ve yer üstü) bulunarak, fizibilite çalışmaları yürütülmekte, yapılabilirlik sonuçlarına dayanılarak etüd, proje, kamulaştırma çalışmaları yapılmakta, ihaleye çıkılıp imalatlar gerçekleştirilmekte, işletim aşamasında su kaynak havzalarının kirlenmeye karşı korunmasına yönelik denetimler ile güvenli işletilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Yeraltı Suyu Çalışmaları

2012 yılında Su kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle sıkıntı yaşayan Bayındır, Torbalı, Bornova, Kemalpaşa, Menderes, Karabağlar, Menemen, Selçuk ve Bornova köylerinde 17 adet yeni su sondaj kuyusu açılmıştır.



Küresel ısınmadan kaynaklanan su sıkıntısının etkilerini azaltabilmek için 2005 yılından bu yana kentte ve çevre yerleşimlerde toplam 200' den fazla sondaj kuyusu açılmıştır.

Kemalpaşa Çambel Köyü, Menderes Çamönü köylerinde 3 yeni su kuyusunun sondajı 2013 yılında devam etmektedir.

Ayrıca Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini faaliyetleri kapsamında 10 adet su sondaj kuyusuna motopomp temini ve saç kabini yapılmış, 6 adet içme suyu kuyusuna elektrik temin edilmiştir.

Seferihisar Eski Orhanlı Köyü Demir/Mangan Tesisinin devreye alınmasıyla birlikte, 8 ayrı ilçede toplam 14 köyde arsenik veya demir ve mangan arıtma tesisleri kurulmuş olup, köylerimize sağlıklı su verilmesi sağlanmıştır. Gerçekleştirilen tesislere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir.



2012 Yılı Sonu İtibariyle Köy Kuyularındaki İşletmeye Alınan Toplam Arsenik, Demir /Mangan Tesisleri

No	İlçe Adı	Yerleşim Birimi Adı	Arıtılan Madde	Debi (m^3/sn)
1	Aliağa	Bozköy	Arsenik	7
2		Yukarı Şehit Kemal		3,5
3		Samurlu		7
4	Bayındır	Çınardibi	Demir/ Mangan	8
5	Bornova	Yaka	Arsenik	4
6		Çiçekli		3
7		Karaçam		3
8	Foça	Ilıpınar	Arsenik	8
9	Menderes	Özdere-Ç3	Demir/ Mangan	15
10		Özdere-Ç4		15
11		Özdere-Çukuraltı		15
12	Menemen	Bozalan	Arsenik	3
13	Torbalı	Helvacı	Demir/ Mangan	3
14	Seferihisar	Eski Orhanlı	Demir/ Mangan	8

Suda Geleceğe YapılanYatırımlar

Çamlı Barajı



Çamlı Baraj aksı İzmir İl Merkezini Güzelbahçe üzerinden Seferihisar İlçesine bağlayan karayolu üzerindeki Çamlı Köyünün 2 km doğusunda, Çamlı Deresi üzerindedir. Baraj Dere talveginden 81,00 m yükseklikte silindirle sıkıştırılmış beton tipinde olup baraj kret uzunluğu 354,00 m, kret genişliği 8,00 m' dir. Barajdan elde edilecek olan ortalama yıllık 15,65 milyon m^3 içme suyunun hizmet vereceği alan Güzelbahçe, Urla ve Seferihisar ilçelerine bağlı yerleşim birimlerini kapsamaktadır. Barajın Revize Planlama Raporu tamamlanmış olup, sonrasında Revize Kesin Projesinin tamamlanmasından sonra inşaatına başlanacaktır.

Değirmendere Barajı

Menemen ilçesi sınırları içerisinde ve Emiralem Beldesi'ne kuş uçuşu yaklaşık 5 km uzaklıkta, beldenin güneydoğusunda, Değirmendere Deresi'nin havzasında yer almaktadır. Baraj tipi olarak kil çekirdekli kaya dolgu baraj olarak planlanan barajın talveg kodu 172,00 m. kret kodu ise 214,00 m olup kret genişliği 10,00 m ve 273,00 m uzunluğundadır. Revize Planlama Raporlarının hazırlanma aşamasında olan barajdan sağlanacak ortalama yıllık 4,32 milyon m^3 içme suyu, Menemen İlçesi ve Menemen ile Karşıyaka arasındaki yerleşim birimlerinin ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.

Alionbaşı Barajı

Narlıdere İlçesi' nin Çamlık ve Narlı mevkilerinde yer alan Alionbaşı Barajı' nın Revize Planlama raporları hazırlanmaktadır. Narlıdere İlçesinin içinden geçerek denize mansaplanan Alionbaşı Barajı deresi üzerinde taşkın koruma ve içme – kullanma suyu temin amaçlıdır. Taşkın koruma amacına ilave olarak; Barajın, minumum su seviyesi 162,00 m olan Ali Onbaşı deresinin doğal akımlarını Balçova Barajına iletim tüneli vasıtasıyla 2,34 milyon metreküp/yıl aktarması düşünülmektedir.

Bostanlı Barajı

Önümüzdeki yıllarda ortalama 3 milyon metreküp su elde edilmesi planlanan Bostanlı Barajı için yatırım kararı alınmıştır. Örnekköy Mezarlığı'na yakın bir bölgede kurulacak baraj, olası sel taşkınlarını da önleyecektir. Bostanlı Barajı; İzmir ili' nin Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Revize Planlama Raporları hazırlanan baraj kapsamında, baraj tipi silindirle sıkıştırılmış beton dolgu baraj öngörülmüş olup 2,51 milyon m^3 içme suyu temin edilmesi amaçlanmıştır.



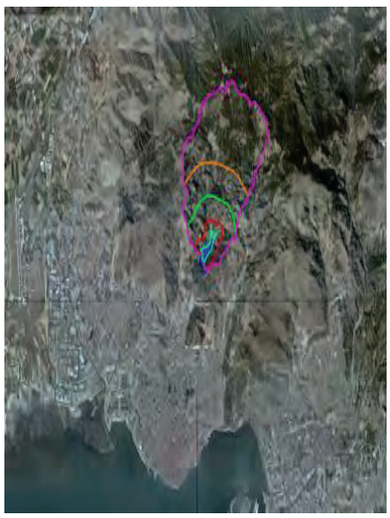

Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı' nın Ağaçlandırılması, Bakım ve Korumasının Yapılması

Yatırım projelerinde "çevreye duyarlılığını" ön planda tutan İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in yeşil dokusunu arttırma çalışmalarına 2012 yılında devam etmiştir.

İzmir'in en önemli su kaynaklarının başında gelen Tahtalı Barajı ve havzasını çevre kirliliğinden korumak için kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Eşenköyü ile Eskişaşal köyündeki kısa mesafeli koruma alanındaki iki adet yerleşim alanının kamulaştırma işlemleri ise sürdürülmektedir. 2012 yılına kadar 450 hektarlık alanda 500.000 fidan dikilerek "İZSU Ormanı" oluşturulmuş, 2012 yılında 450 hektardaki bakım ve koruma çalışmaları sürdürülürken 39.000 fidan daha dikilmiş, Tahtalı Havzası mutlak koruma alanında ağaçlandırılan 450 hektar alanda fidan sayısı da yaklaşık 540.000'e ulaşmıştır.





Ağaçlandırma çalışmalarında kızılçam, fıstıkçamı, meşe dallı servi, mavi servi, Kıbrıs akasyası, yalancı akasya, ıhlamur, zeytin, gladiçya, demir ağacı, Lübnan sediri, Himalaya sediri, okaliptüs, söğüt, kavak, dut, leylandi, ılgın, erguvan, tespih ağacı, Halep çamı, gülibrişim, katalpa ve top akasya türü fidanlar kullanılmıştır.







Harita: Mutlak koruma alanı, orman alanları, ağaçlandırılan ve ağaçlandırılacak alanları gösterir harita

Üretim ve Dağıtım

Üretim ve dağıtım faaliyetleri kapsamında içme sularının üretim noktalarında arıtımı yapılmakta, pompalar aracılığı ile ana isale hatlarına, depo, şebeke, branşman ve sayaçlar vasıtasıyla aboneye ulaşımının 24 saat kesintisiz sunumu için dağıtım sistemi üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanların bakım, onarım ve iyileştirmesi yapılmakta, sağlıklı su temini için belirlenmiş kontrol noktalarında analiz ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütülmekte, dağıtım hatları üzerindeki depo, pompa vs. güvenliği sağlanarak dağıtımın güven içinde gerçekleştirilmesi sağlanmakta, su dağıtımının izlenmesi, kontrolü ve kumandası SCADA sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır.

İzmir 2012 yılında yaklaşık 4 milyonluk nüfusu ile Batı Anadolu'nun en hızlı büyüyen kenti durumundadır. Bu hızlı büyüme ile birlikte içme suyu ihtiyacı da büyük bir hızla artmıştır.

İZSU'nun abone sayısı 2012 yılı sonu itibariyle 1.246.338'e ulaşmıştır. Merkezde yer alan nüfusun 2012 yılındaki günlük ortalama toplam su üretimi de 522.198 m^3/gün olarak gerçekleşmiştir. İzmir kent alanının (eski metropol alanının) tamamına 24 saat kesintisiz su sağlanmaktadır.

Su Kaynakları

2012 yılında üretilen su miktarı 11 ilçeyi kapsayan eski metropol alanı için 183.970.893 m^3/yıl'dır; bu miktar Urla ve Menemen ilçelerine kısmen verilen su miktarları ile birlikte 190.602.597 m^3/yıl' a ulaşmaktadır.

Scada sistemindeki Tahtalı ve Balçova Barajı ile Halkapınar, Göksu, Sarıkız ve Menemen derin kuyularının ortalama toplam yıllık su potansiyeli DSİ'ce yapılan incelemelerle 324 milyon m^3 olarak belirlenmiştir.

Yeraltı Su Kaynakları (Derin Kuyular)		
Sarıkız Kuyuları	(35 adet)	11.068.408 m³/yıl
Göksu Kuyuları	(22 adet)	42.559.582 m³/yıl
Menemen & Çavuşköy Kuyuları	(32 adet)	17.103.272 m³/yıl
Halkapınar Kuyuları	(19 adet)	31.128.709 m³/yıl
Pınarbaşı Kuyuları	(2 adet)	1.408.740 m³/yıl
Buca Kuyuları	(3 adet)	990.943 m³/yıl
TOPLAM	(113 adet)	104.259.654 m³/yıl
Yerüstü Su Kaynakları (Barajlar)		
Tahtalı Barajı		66.336.300 m³/yıl
Balçova Barajı		5.243.395 m³/yıl
Güzelhisar Barajı (İzmir)		0 m³/yıl
Gördes Barajı		14.763.248 m³/yıl
	TOPLAM	86.342.943 m³/yıl
TOPLAM SU ÜRETİMİ		190.602.597 m³/yıl

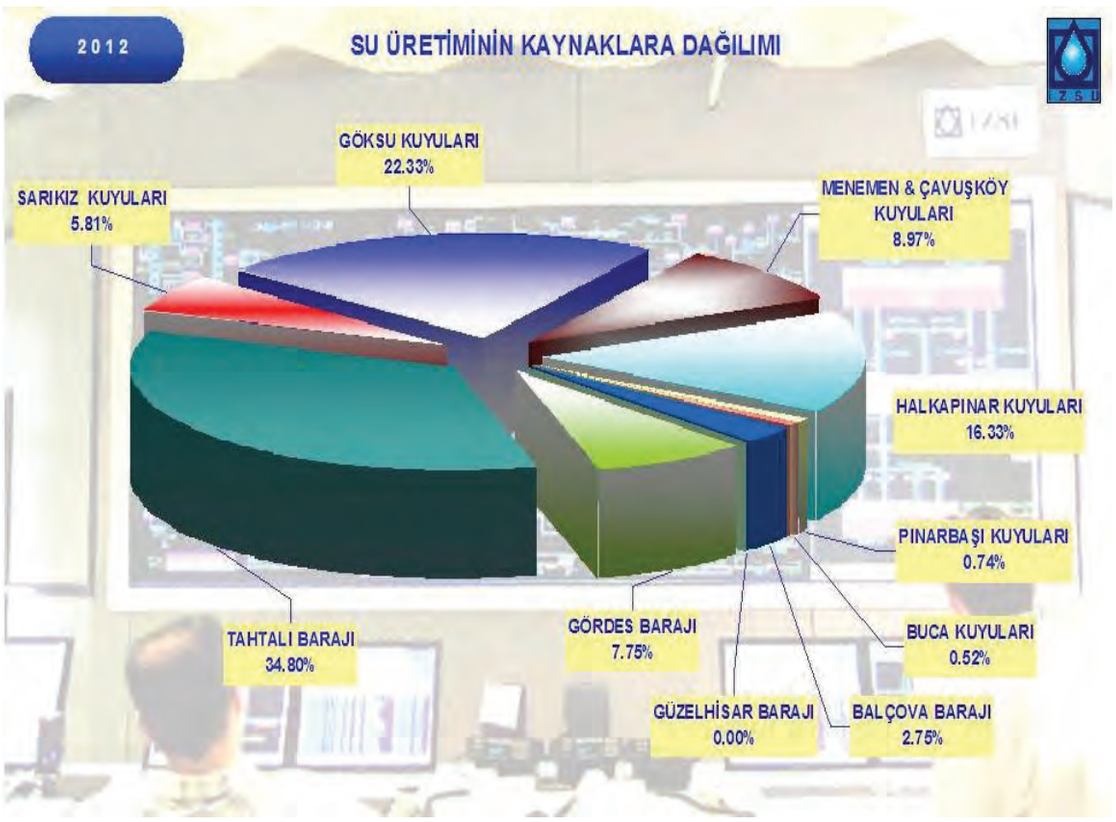

Yıl	İZMİR' E VERİLEN SU MİKTARLARI		
	m³/yıl	m³/gün	litre/saniye
2012	190.602.597	522.198	6.044
2011	190.512.247	521.951	6.041
2010	188.799.293	517.258	5.987
2009	184.481.003	505.427	5.850
2008	192.138.414	526.407	6.093
2007	201.357.705	551.665	6.385
2006	215.228.378	589.667	6.824
2005	209.241.845	573.265	6.635
2004	204.160.704	559.344	6.473



Yeraltı Su Kaynakları ve Arıtma Tesisleri

2012 yılı verilerine göre, İzmir'e su sağlayan kaynakların % 54,70'i yer altı suyu kaynaklarıdır.

Halkapınar Kuyuları

Bu kaynaklar içinde, kentsel alan içinde yer alan ve 1897 yılından beri 115 yıldır kente su sağlayan Halkapınar kaynakları, kent içinde olması ve 45 milyon m³/yıl potansiyeli ile en önemli kaynaktır.

Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi

Halkapınar kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi 1.000 l/s (87.119 m^3/gün) kapasiteyle devrededir. Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisinde arıtılan su üretimi 2012 yılında 31.128.708 m^3/yıl olarak gerçekleşmiştir.



Halkapınar tarihi pompa istasyonu ve Arsenik Arıtma Tesisi

Göksu ve Sarıkız Kuyuları

Potansiyeli daha yüksek olan ancak Manisa ili Muradiye beldesinde yer alan Göksu kaynakları 63 milyon m³/yıl, yine Manisa ilinde Saruhanlı ilçesi Nuriye beldesinde bulunan Sarıkız kaynakları da 45 milyon m^3/yıl potansiyelleri ile İzmir'e su sağlayan diğer yer altı suyu kaynaklarıdır. Göksu kaynakları 1988, Sarıkız kaynakları da 1990 yılında kente bağlanmıştır.



Çullu Arsenik Arıtma Tesisi

Göksu'daki ve Sarıkız'daki çalışan kuyulardan alınan suyu arıtan tesisin kapasitesi 3000 l/s (259.200m^3/gün)'dür. 2012 yılında Çullu Arsenik Arıtma Tesisinde arıtılmış su üretimi 53.627.990 m^3/yıl olarak gerçekleştirilmiştir.



Menemen & Çavuşköy Kuyuları



Menemen ilçe merkezi ve Çavuşköy'deki kuyular 1976 yılında İzmir'e bağlanmış olup, toplam 25 milyon m³/yıl potansiyel ile İzmir'in su kaynakları içinde önemli bir paya sahiptir.

Menemen Arsenik Arıtma Tesisi

Menemen ve Çavuşköy'de çalışan kuyulardan alınan suyu arıtan tesisin kapasitesi 600 l/s (51.840 m^3/gün)'dir. Menemen arsenik arıtma tesisinde arıtılmış su üretimi 2012 yılında 17.103.272 m^3/ yıl dır.

Pınarbaşı ve Buca Kuyuları

Halen işletmede olan ancak sistemin bütünü içinde çok küçük bir paya sahip olan Pınarbaşı ve Buca' daki kuyular da yeraltı kaynaklarımız arasındadır.

Yüzeysel Su Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri

İzmir'e su sağlayan sistem içinde yüzeysel su kaynaklarının payı 2012 yılı verilerine göre % 45,30'dur.

Tahtalı Barajı



En önemli yüzeysel su kaynağı Tahtalı barajıdır. 1997 yılından beri İzmir'e su veren Tahtalı barajının projesindeki ortalama potansiyeli 128 milyon m³/yıl' dır.

Tahtalı Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi

Menderes ilçesi, Görece Beldesi'nin hemen güneyinde yer alan Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisi 520.000 m³/gün kapasiteli, 1250 KVA kurulu güce sahip olup, Tahtalı baraj gölünden alınan suyun içme suyu standartlarına uygun olarak arıtılmasını sağlamaktadır. Arıtma Tesisi; havalandırma, hızlı karıştırıcı, durultucular, filtreler, kimya binası, klor binası, filtre baskı ünitelerinden oluşmaktadır. Arıtma Tesisi her biri 260.000 m³/gün kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşmaktadır Barajdan basılan hamsu, Giriş vanası ve Giriş Debi ölçerinden geçerek 750 m³'lük dengeleme Tankına gelmektedir. Dengeleme tankında taşkın savağı ve taşkın hattı girişi bulunmaktadır



Balçova Barajı

İkinci yüzeysel su kaynağı 1984 yılından beri devrede olan Balçova barajı olup, projesindeki ortalama potansiyeli 12 milyon m³/yıl olarak belirlenmiştir.

Balçova Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi

Baraj gövdesinin hemen önünde yer alan içme suyu arıtma tesisleri 1984 yılı Mayıs'ında tamamlanmıştır. 70 000 m^3/gün kapasiteye sahip olan Balçova barajı arıtma tesisinde havalandırma, ön klorlama, hızlı kum filtreleri, temiz su tankı ve son klorlama üniteleri bulunmaktadır

Güzelhisar Barajı

Aliağa ilçe merkezine devamlı, İzmir kent merkezine ise zaman zaman su veren Aliağa ilçesindeki Güzelhisar barajı İzmir'in yüzeysel su kaynakları içindeki diğer paydaştır. Güzelhisar barajından İzmir'e içme suyu amacıyla herhangi bir tahsis bulunmamakla beraber, zaman zaman karşılıklı anlaşma yolu ile İzmir'e değişken miktarlarda içme suyu alınmaktadır.

Aliağa Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi

Güzelhisar barajı dip savağından başlayan 14 207 m uzunluğunda, 1 400 mm çapındaki iletim boru hattı ile PETKİM tesisleri içinde bulunan Aliağa Belediyesi içme suyu arıtma tesisine gelen su burada arıtılarak Aliağa içme suyu dağıtım şebekesine verilmektedir. PETKİM ile DSİ arasında 1977 yılında yapılan bir protokole göre Aliağa Belediyesine 70 l/s içme suyu tahsisi yapılmıştır.

Gördes Barajı

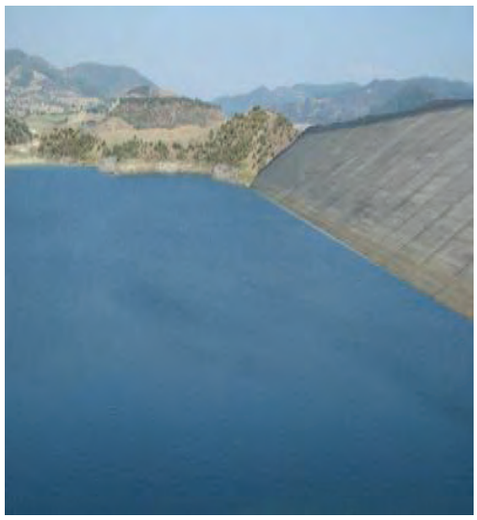

Gördes barajı Ocak 1998 tarihinde DSİ' ce ihale edilmiş olup Ocak 2009' da inşaatı tamamlanmıştır. Barajdan yılda 129,6 milyon m³ su çekilmesi ve bu suyun 58,9 milyon m³'ünün İzmir'e içme suyu olarak, 71,1 milyon m³'ünün de Selendi ve Gölmarmara ovalarına sulama suyu olarak verilmesi planlanmıştır. Gördes barajı Tahtalı barajından sonra İzmir'e içme suyu sağlayacak en büyük yüzeysel su kaynağıdır. Manisa ilinde yer alan Gördes barajında 2009 yılı itibariyle su tutulmaya başlanmıştır.

Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi



Gördes Barajından İzmir'e su sağlayacak boru hattının ilk 35,5 km' lik bölümü DSİ tarafından Aralık 2010 tarihinde tamamlanmıştır. Ancak kalan 79 km'lik bölümü ile Kemalpaşa ilçesi Çambel köyünde 99 m. yüksekliğe su basacak pompa istasyonu inşaatına Ağustos 2011 itibariyle başlanmıştır.

Gördes Barajı'nın esas amacı Bornova ilçesi Belkahve mevkiinde inşa edilecek olan 365.000 m^3/gün kapasiteli Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su ulaştırmaktır. Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kamulaştırma ve proje ihale çalışmaları İZSU tarafından sürdürülmektedir. Tüm bu tesislerin yapımının uzun süre alacak olması nedeniyle barajda toplanan suyun bir an önce kullanıma sunulabilmesi için İZSU, Gördes Barajı'ndan İzmir'e ulaşacak olan boru hattının Sarıkız kaynaklarına yaklaştığı bölgede 1.620 m. uzunluğunda ve 1,2 m. çapındaki bağlantı boru hattı ile Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin inşa edilmesini öngörmüştür. Barajdan İzmir'e su getirecek boru hattının ilk 35,5 km'lik bölümünün inşaatı ile Manisa Saruhanlı' daki Sarıkız İçme suyu Arıtma tesisimizde 135 000 m³/gün kapasitede bir içme suyu arıtma tesisi inşaatı tamamlanmış olup İzmir'e su verilmesine 2011 yılında başlanmıştır.

Ürkmez Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi

Ürkmez İçmesuyu Arıtma Tesisi Ürkmez Barajının yaklaşık 900 m. doğusunda bulunmaktadır. Proje debisi 109 l/s' dir. Ancak maksimum debi 131 l/s olarak tespit edilmiştir. Ürkmez beldesinin su ihtiyacı 1992 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan ve

daha sonra İZSU Genel Müdürlüğüne devredilen protokolle Ürkmez Barajından alınacak ham suyun arıtılmasıyla sağlanmaktadır. Arıtma tesisi 2.7.2004 tarihinde işletmeye açılmıştır.



İçme Suyu Şebeke

2012 yılında Büyükşehir Belediyesi yetki alanında toplam 723 km. içmesuyu şebekesi ve iletim hattı imalatı yapılmıştır. Böylece, 2012 yılında döşenen içme suyu şebeke ve iletim hattı miktarı geçen yıla oranla yaklaşık %100 oranında artmıştır. Büyük şehir Belediyesi yetki alanına sonradan eklenen 10 yeni ilçe ile 37 beldenin (mahalle) birçoğunun eski ve kanserojen etkili asbest borulardan oluşan içme suyu şebekeleri yenilenmiştir. Hem şebekedeki kaçakları önlemek ve hem de yeni yerleşimleri kanserojen etkili içme suyu borulardan arındırmak için başlatılan çalışma kapsamında İzmir' de toplam 723 km. uzunluğundaki içme suyu şebekesi sağlıklı borularla değiştirilmiş ve yenilenmiştir.







2008-2012 Yılları Arasında Yapılan Su İnşaat Miktarları (km.)
723,04
363,44
185,70
341,14
214,94
2012
2011
2010
2009
2008


ESKİMİŞ BORULAR
YENİ BORULAR

İçme Suyu Sisteminin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı

Bu kapsamda su temin ve dağıtım sistemindeki her türden ve her çaptaki borular üzerinde meydana gelen arızalara, yetişmiş ekiplerce, hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmektedir.

Su Deposu ve Pompa İstasyonlarının Bakımı ve Onarımı





Bayındır sınırları içindeki 26 adet su deposunun 2011 yılında başlanan yenileme çalışmaları 2012 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 19 Adet içme suyu deposunun bakım ve onarımı 2012 yılında tamamlanmıştır. Bakım-onarım çalışmaları kapsamında depo çatlakları onarılıp su yalıtımları yapılmış, sıva, boya ve badana işleri gerçekleştirilirken, çürüyen içme suyu boruları, vanalar, kapı ve pencereler de yenilenmiştir. Depo haznesini güneşten korumak ve suyun ısınmasını önlemek amacıyla toprak dolgu yapılmıştır. Depo içindeki suyla temas eden yüzeyler fayans ile kaplanmıştır. Merdivenler krom merdivenlerle değiştirilerek yenilenmiş, manevra odaları sıvanarak boyanmış ve tabanına fayans döşenmiştir. Enerji temini yapılarak ihtiyacı olan depoların etrafına da koruma çiti döşenmiştir. Bazı bölgelerde ise yeni depo yapılmıştır.

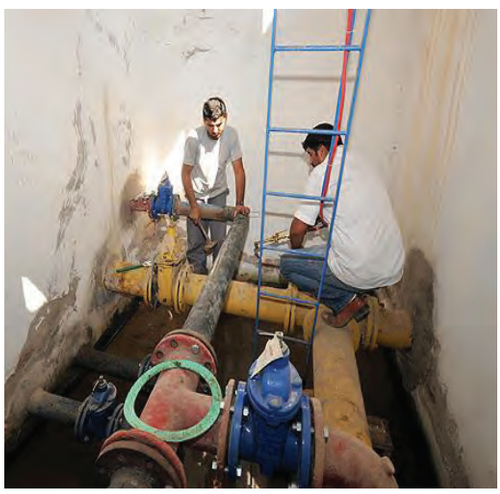

Urla ve Seferihisar ilçelerindeki 60 adet depo, pompa, terfi istasyonu ve trafonun yenilenmesi çalışmalarına 2012 yılında başlanmış ve 30 adet tesisin çeşitli yenileme işleri bitirilmiştir

Aliağa, Bayındır, Foça, Menderes, Menemen, Selçuk, Torbalı İlçelerindeki 81 adet Transformatörün yerinde durum tespitleri yaptırılmıştır.

Güneş Enerjili Otomatik Klorlama Sistemi



2011 - 2012 yıllarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli bir adım daha atılmıştır. Bu doğrultuda 60 adet köydeki su deposunda güneş panelleri kurulmuştur**.** Otomatik klorlama sistemleri bu panellerden üretilen enerji ile beslenmiş, böylece hem enerji maliyetleri düşmüş olup hem de en uygun teknoloji ile suyun dezenfeksiyonu sağlanmıştır.

İçme Suyu Şebeke Sisteminin Bakımı ve Onarımı

Su Arıza Ekiplerimiz tarafından su şebeke arızalarının giderilmesi, yeni su bağlanması çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda İçme suyu şebeke ekiplerince 75.072 adet küçük arıza, 12.567 adet büyük arıza giderilmiş olup, 56,3 km. içme suyu şebekesi yenilenmiş ve 19.185 adet yeni su bağlantısı yapılmış, 87.639 adet su şebeke arızası tamir edilmiştir.

Ayrıca sık arıza yapan, bu nedenle su kayıplarının artmasına neden olan branşman hatlarının yenilenmesi ve yeni şebeke borusu döşenmesi çalışmaları kapsamında 57,3 km. branşman yenileme, 60,3 km. su borusu döşenmesi, 3.757 adet sayaç bağlama işlemi gerçekleşmiştir.

2012 yılında 10 adet hidrolik üst ekipmanlı araç daha alınarak tam donanımlı araç sayısı 65 adete çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde su arızaları geçen yıla oranla %4 oranında azalmış ve kente kazandırılan su miktarında artış sağlanmıştır.





Su Kaçak ve Kontrol Projesi

Su Kaçak ve Kontrol Şube Müdürlüğü, İzmir'in su ihtiyacını karşılayan içme suyu işletim sisteminin iyileştirilmesi ve izlenmesi ile su kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Proje çalışmaları, matematiksel modelleme yoluyla izole bölgeler oluşturma, tek noktadan beslenen yaklaşık 1500-2000 hanelik izole bölgeler oluşturma, basınç regülasyonu, sürekli izleme, bölgeye verilen su miktarı ile bölgedeki abone bilgi ve tahakkuklarının karşılaştırılması, su kaçağı nedenlerinin tespiti ve giderilmesi yöntemi ile yürütülmektedir.

İzmir'de yaklaşık 430 izole bölge olması planlanmaktadır , 31 Aralık 2012 itibarı ile 39M izole bölge oluşturulmuştur. "İzole Bölge Sayaçları Uzaktan Okuma Sistemi" işi kapsamında 2009 yılı Nisan ayı başında oluşturulmuş olan izole sayaç bölgelerinin tamamı sisteme dâhil edilmiş olup, 15 dakikada bir kayıt edilen basınç ve debi verilerinin günde bir kez SMS yoluyla merkezi bilgisayara gelmesi sağlanmıştır. Mevcut basınç kırıcı vanaların bakım ve onarımları yapılarak uygulanan basınç regülasyonu sayesinde arıza sayıları azalmış, oldukça ciddi su kazanımı sağlanmıştır. Basınç ve debi için alarm değerleri tanımlanmış olup, su kesintisi ve su kaybından erken haberdar olunarak dinamik bir işletme yapısı kurulmuş, kayıpların önlenmesi adına önemli bir adım atılmıştır Yapılan çalışmalar sonucunda 2012 yılında kaçak oranı %34.51'e inmiştir. 2012 yılı aylık su kaçak oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.





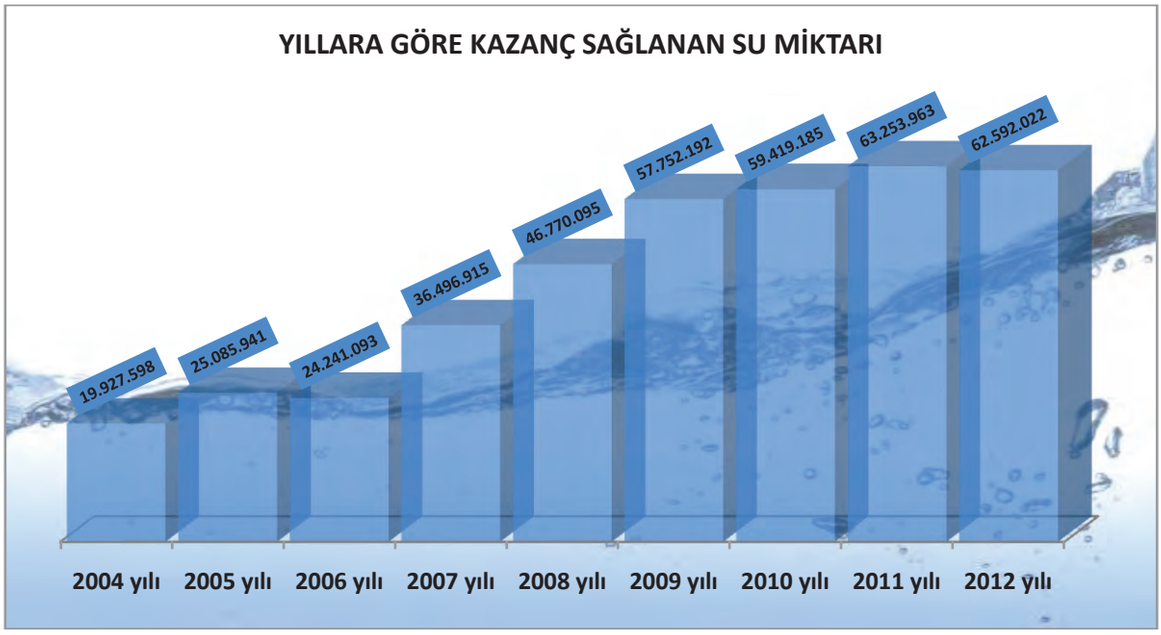

YILLARA GÖRE
ÜRETİLEN ve SATILAN SU MİKTARLARI İLE KAYIP ORANLARI

YILLAR	SU ÜRETİMİ (metreküp)	SATILAN SU (metreküp)	KAYIP ORANI (%)
1998	241.308.031	92.718.856	61,58%
1999	249.323.110	96.452.510	61,31%
2000	237.313.867	97.081.596	59,09%
2001	216.256.726	97.423.293	54,95%
2002	198.866.669	96.160.778	51,65%
2003	206.938.909	101.570.099	50,92%
2004	204.160.704	107.918.651	47,14%
2005	209.241.845	113.297.805	45,85%
2006	215.228.378	118.241.770	45,06%
2007	201.357.705	111.317.772	44,72%
2008	192.138.414	111.182.740	42,13%
2009	184.481.003	110.904.184	39,88%
2010	183.171.383	116.418.426	36,44%
2011	183.330.975	118.073.343	35,60%
2012	183.970.892	119.949.857	34,51%

**** Bu tablodaki su kaçak oranları Metropol alan için geçerlidir. Ayrıca Su tanker tüketim miktarı 301.773m^3, arıza nedeni ile tahliye edilen su miktarı 20.276,5m^3, İzsu Tüketim miktarı 201.695m^{3}olmak üzere denetim dışı kullanımlar dahil edildiğinde kayıp oranı %34,51 olmaktadır.***

Su kayıp oranları hesaplanırken, gerek İdaremizin gerekse diğer belediyelerin yangın hidrantlarından aldığı su miktarları da hesaplanarak su kayıp miktarlarından düşülmüştür. Ayrıca, su şebeke arızalarında, şebekeden tahliye edilen su miktarları hesaplanarak kayıp miktarlarından düşülmüştür. Böylece su kayıp oranının içindeki, gerçek fiziki su kaçaklarına daha yakın bir değer bulmak hedeflenmiştir.

SCADA Su Dağıtım ve Merkezi Kontrol

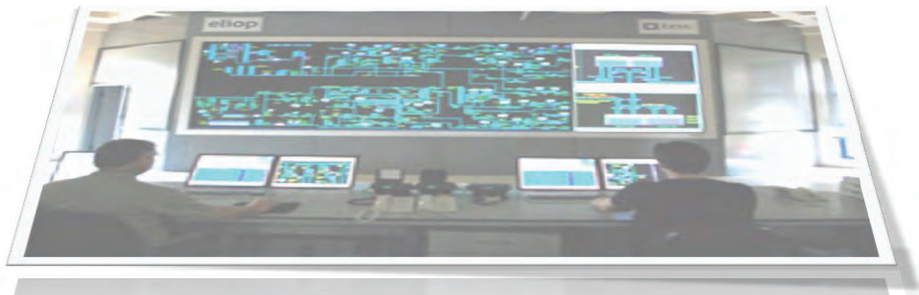

2000 yılından bu yana işletilmekte olan Scada sistemi ile kente verilen su, izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Üretim kaynakları ve su dağıtım hatları üzerinde bulunan tüm pompaj ve depolar ile bazı ana hat vanaları 24 saat kesintisiz çalışan Scada merkezi tarafından denetim altında tutulmaktadır. Scada sistemi, 5216 sayılı kanunla verilen, yetki alanında bulunan tüm ilçe ve büyük yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde genişletilecek olup bu çalışmanın ihalesi tamamlanmış olup, yapım süreci başlatılmıştır. Scada sisteminin genişlemesi sonucu 5216 sayılı yasa ile Büyükşehir kapsamına alınan ilçe, belde ve büyük yerleşim yerlerinin su dağıtım sistemleri izlenip kontrol altına alınabilecektir.

İçme Suyu Kalitesi



İzmir merkez 11 ilçeye ait dağıtım şebekesinde 2012 yılında toplam 80 ayrı noktadan periyodik olarak numune alınmaktadır. Alınan su numunelerinde içme suyunun kalitesini belirlemekte kullanılan 17 ayrı parametre analiz edilmekte ve analiz sonuçları İZSU Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayınlanmaktadır. Analizi yapılan parametreler bulanıklık, PH, iletkenlik, klorür, nitrit, suyun rengi, amonyum, arsenik, demir oksitlenebilirlik, tuzluluk, toplam sertlik, serbest klor, E coli sayısı, C.Perfringens sayısı, koloni sayısı ve koliform bakteri sayısıdır. Bu parametrelerin ölçülen değerlerinin "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik' te verilen sınır değerlerin altında kalıp kalmadıkları kontrol edilmektedir. Yapılan tüm analizlerde parametre değerlerinin verilen sınır değerler altında kaldığı görülmüştür.

İçme suyundan alınan örneklerde kent içindeki tüm noktalarda arsenik konsantrasyonları dünya ve ülkemiz standartlarında sınır değer olarak verilen litrede 10 mikrogram sınır değerinin altında bulunmaktadır.

İZSU Türkiye'de içme suyu ve atık su alanında akreditasyon belgesi alan ilk kamu laboratuvarına sahiptir.

2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi kapsamında kapasite genişletilerek İZSU Laboratuarı'nın su ve atık suda yetki alınmış parametre sayısı 13'den 36'ya çıkarılmıştır. Yine Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan denetimlerle, laboratuvarın akredite olduğu parametre sayısı 42'den 56'ya yükseltilmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınan Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi'nin süresi Mayıs 2015 yılına kadar uzatılmıştır.

2006 yılında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen sertifikamız Eylül 2014 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süre içinde laboratuvarımızın çalışma alanları yenilenmiş, yeni cihazlar sayesinde analizlerin çok kısa sürede sonuçlanması sağlanmıştır.



İZSU' nun internet sitesinden Su Kalite Raporları takip edilebilmektedir.





Tarife Sistemi

İZSU Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı tarifeler; Evsel Su ve Atık Su tarifeleri olarak iki sınıfa ayrılmaktadır.

a)Evsel Su Tarifesi:



Abonelere normal şehir şebekesinden verilen suyun bedelidir.

Konut, İşyeri ve Sanayi Abonelerine yapılacak su satış gelirlerinin;

- Enerji, malzeme ve bakım giderleri
- Personel giderleri
- Çeşitli giderler (kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, eğitim ve benzer giderleri)
- Su taşıma giderleri
- Tamirat giderleri
- Amortisman giderleri

Yukarıda tanımlanan yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerinin toplamı üzerinden en az %10 karı sağlayabilecek seviyede olması esastır. Dolayısıyla faturalanan (tahakkuk eden) 1m³ suyun maliyeti yukarıda belirtilmiş olan giderlerin tahakkuk şebeke su miktarına bölünmesi şeklinde hesaplanmaktadır. İZSU, tasarrufu teşvik etmek, az su kullanana sosyal yardım sağlamak ve gelirlerini arttırmak amacıyla kademeli tarife uygulayıp faturaya yansıtmaktadır.

b) Atıksu Tarifesi: Abonelerin kullanmış oldukları şebeke veya kuyu suyunun, kirletildikten sonra uzaklaştırılması ve temizlenmesi bedelidir.

Su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden, bunların uzaklaştırılması için atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür.

Su abonesi olmayan fakat kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, sanayi işletmeleri de su kirleteceklerinden atıksu bedeline esas olarak; konutlardan ayda 15 m³ su tükettikleri, işyeri ve sanayilerde ise çalışan insan sayısı ve işyerinin özelliklerine göre hesaplanacak miktarda su tüketecekleri varsayılarak tahakkuk ettirilir. Evsel su tarifesinde belirtilmiş olan yönetim, işletme ve amortisman giderlerinin yukarıda belirtilen atıksu kullanıcılarına göre hesaplanan toplam atık su miktarına bölünmesiyle 1 m³ atıksu bedeli bulunmaktadır.







T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Kurul Kararı'na Göre Hazırlanan Su ve Atık Su Satış Tarifeleri
01.01.2012 Tarihinden Geçerli Olmak ve Faturalandırılmak Üzere
K.D.V. Hariç Aşağıdaki Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir.

TİP KODU	ABONE TİPLERİ	BARAJLAR M^3/AY	SU BEDELİ	ATIK SU BEDELİ	GENEL TOPLAM
01	KONUT	0~13	1,38	0,90	2,28
		14~20	3,53	2,35	5,88
		21 Üstü	5,70	3,80	9,50
02	K.Ö.P	Kademesiz		1,18	1,18
04	KONUT DIŞI	0~10	4,71	3,14	7,85
		11~Üstü	5,43	3,62	9,05
05	BELEDİYELER	Kademesiz	3,15	2,10	5,25
08	PARK VE BAHÇELER	Kademesiz	1,54	1,03	2,57
09	ELÇİLİK ABONELİĞİ	KDV SİZ	7,70	5,13	12,83
12	RESMİ DAİRE	Kademesiz	4,06	2,71	6,77
13	ŞANTİYE	0~10	4,71	3,14	7,85
		11 Üstü	5,43	3,62	9,05
14	NATO ABONELİĞİ	KDV SİZ	7,70	5,13	12,83
15	K.ATIKSU KONUT	Kademesiz		1,95	1,95
16	K ATIKSU KONUT DIŞI	Kademesiz		3,86	3,86
17	SANAYİ	Kademesiz	4,36	2,90	7,26
18	K ATIKSU R.DAİRE	Kademesiz		2,61	2,61
19	SANAYİ ATIKSU	0-15000			$0,50+KDV
		15001-30000			$0,25+KDV
		30000-ÜSTÜ			$0,15+KDV
20	ÖZEL HASTANELER	0~10	1,35	0,90	2,25
		11~20	3,55	2,37	5,92
		21 Üstü	5,08	3,38	8,46
21	RESMİ OKULLAR-HASTANELER	Kademesiz	3,25	2,17	5,42
22	TURİSTİK TESİS	Kademesiz	3,53	2,35	5,88
23	FIRIN - HAMAM	Kademesiz	4,22	2,82	7,04
24	K.ATIKSU FIRIN-HAMAM	Kademesiz		2,61	2,61
25	K.ATIKSU TURİSTİK TESİS	Kademesiz		1,95	1,95
26	K.ATIKSU ÖZEL HASTANELER	Kademesiz		1,95	1,95
27	K.ATIKSU RESMİ OKUL-HASTANE	Kademesiz		2,16	2,16
31	SPOR KULÜPLERİ	0~13	1,38	0,90	2,28
		14~20	3,53	2,35	5,88
		21 Üstü	5,70	3,80	9,50
32	ORGANİZE SAN.ABONELERİ	Kademesiz	2,13	1,42	3,55
33	SERBEST BÖL AB.	Kademesiz	2,13	1,42	3,55
35	İTOB ORG.SAN.AB	Kademesiz		0,61	0,61
40	ORMAN KÖYÜ KONUT	0-13	0,69	0,45	1,14
		14-20	1,77	1,18	2,95
		21 Üstü	2,85	1,90	4,75
41	ORMAN KÖYÜ TARIM/HAYVAN	Kademesiz	0,69	0,46	1,15
44	İLÇE BELEDİYELERİ TARIM/HAYVAN	Kademesiz	0,69	0,46	1,15
45	ÖZEL OKULLAR	Kademesiz	3,25	2,17	5,42
46	K.ATIKSU ÖZEL OKULLAR	Kademesiz		2,16	2,16
47	ŞEHİT - GAZİ ABONELERİ	0-13	0,69	0,46	1,15
		14-20	1,77	1,18	2,95
		21 Üstü	2,85	1,90	4,75
48	ÖZÜRLÜ ABONELER	0~13	0,69	0,46	1,15
		14~20	3,53	2,35	5,88
		21 Üstü	5,70	3,80	9,50
100	KÖP PROTOKOL	Kademesiz			$0,075+KDV

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Kurul Kararı'na Göre Hazırlanan Su ve Atık Su Satış Tarifeleri
01.06.2012 Tarihinden Geçerli Olmak ve Faturalandırılmak Üzere
K.D.V. Hariç Aşağıdaki Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir.

TİP KODU	ABONE TİPLERİ	BARAJLAR M^3/AY	SU BEDELİ	ATIK SU BEDELİ	GENEL TOPLAM
01	KONUT	0~13	1,20	1,66	2,86
		14~20	3,04	4,30	7,34
		21 Üstü	4,90	6,95	11,85
02	K.Ö.P	Kademesiz		1,18	1,18
04	KONUT DIŞI	0~10	4,71	3,14	7,85
		11~Üstü	5,43	3,62	9,05
05	BELEDİYELER	Kademesiz	2,71	3,84	6,55
08	PARK VE BAHÇELER	Kademesiz	1,32	1,88	3,20
09	ELÇİLİK ABONELİĞİ	KDV SİZ	6,62	9,39	16,01
12	RESMİ DAİRE	Kademesiz	3,49	4,99	8,48
13	ŞANTİYE	0~10	4,05	5,75	9,80
		11 Üstü	4,67	6,62	11,29
14	NATO ABONELİĞİ	KDV SİZ	6,62	9,39	16,01
15	K.ATIKSU KONUT	Kademesiz		3,57	3,57
16	K ATIKSU KONUT DIŞI	Kademesiz		7,06	7,06
17	SANAYİ	Kademesiz	3,75	5,31	9,06
18	K ATIKSU R.DAİRE	Kademesiz		4,78	4,78
19	SANAYİ ATIKSU	0-15000			$0,50+KDV
		15001-30000			$0,25+KDV
		30000-ÜSTÜ			$0,15+KDV
20	ÖZEL HASTANELER	0~10	1,16	1,65	2,81
		11~20	3,05	4,34	7,39
		21 Üstü	4,37	6,19	10,56
21	RESMİ OKULLAR-HASTANELER	Kademesiz	2,80	3,97	6,77
22	TURİSTİK TESİS	Kademesiz	3,04	4,30	7,34
23	FIRIN - HAMAM	Kademesiz	3,63	5,16	8,79
24	K.ATIKSU FIRIN-HAMAM	Kademesiz		4,78	4,78
25	K.ATIKSU TURİSTİK TESİS	Kademesiz		3,57	3,57
26	K.ATIKSU ÖZEL HASTANELER	Kademesiz		3,57	3,57
27	K.ATIKSU RESMİ OKUL-HASTANE	Kademesiz		3,95	3,95
31	SPOR KULÜPLERİ	0~13	1,18	1,67	2,85
		14~20	3,04	4,30	7,34
		21 Üstü	4,90	6,95	11,85
32	ORGANİZE SAN.ABONELERİ	Kademesiz	1,83	2,60	4,43
33	SERBEST BÖL AB.	Kademesiz	1,83	2,60	4,43
35	İTOB ORG.SAN.AB	Kademesiz		0,61	0,61
40	ORMAN KÖYÜ KONUT	0-13	0,59	0,84	1,43
		14-20	1,52	2,16	3,68
		21 Üstü	2,45	3,48	5,93
41	ORMAN KÖYÜ TARIM/HAYVAN	Kademesiz	0,59	0,84	1,43
44	İLÇE BELEDİYELERİ TARIM/HAYVAN	Kademesiz	0,59	0,84	1,43
45	ÖZEL OKULLAR	Kademesiz	2,80	3,97	6,77
46	K.ATIKSU ÖZEL OKULLAR	Kademesiz		3,95	3,95
47	ŞEHİT - GAZİ ABONELERİ	0-13	0,59	0,84	1,43
		14-20	1,52	2,16	3,68
		21 Üstü	2,45	3,48	5,93
48	ÖZÜRLÜ ABONELER	0~13	0,59	0,84	1,43
		14~20	3,04	4,30	7,34
		21 Üstü	4,90	6,95	11,85
100	KÖP PROTOKOL	Kademesiz			$0,075+KDV

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Kurul Kararı' na Göre Hazırlanan Su ve Atık Su Satış Tarifeleri
01.07.2012 Tarihinden Geçerli Olmak ve Faturalandırılmak Üzere
K.D.V. Hariç Aşağıdaki Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir.

TİP KODU	ABONE TİPLERİ	BARAJLAR M^3/AY	SU BEDELİ	ATIK SU BEDELİ	GENEL TOPLAM
01	KONUT	0~20	1,11	1,71	2,82
		21~Üstü	2,82	4,47	7,29
02	K.Ö.P	Kademesiz		1,18	1,18
04	KONUT DIŞI	0~10	4,71	3,14	7,85
		11~Üstü	5,43	3,61	9,04
05	BELEDİYELER	Kademesiz	2,52	3,68	6,20
08	PARK VE BAHÇELER	Kademesiz	1,23	1,80	3,03
09	ELÇİLİK ABONELİĞİ	KDV SİZ	6,16	9,75	15,91
12	RESMİ DAİRE	Kademesiz	3,25	4,46	7,71
13	ŞANTİYE	0~10	4,71	3,14	7,85
		11~Üstü	5,43	3,61	9,04
14	NATO ABONELİĞİ	KDV SİZ	6,16	9,75	15,91
15	K.ATIKSU KONUT	Kademesiz		2,60	2,60
16	K ATIKSU KONUT DIŞI	Kademesiz		5,26	5,26
17	SANAYİ	Kademesiz	3,49	4,31	7,80
18	K ATIKSU R.DAİRE	Kademesiz		3,21	3,21
19	SANAYİ ATIKSU	0~15000			$0,50+KDV
		15001~30000			$0,25+KDV
		30000~Üstü			$0,15+KDV
20	ÖZEL HASTANELER	0~20	1,11	1,71	2,82
		21~Üstü	2,82	4,47	7,29
21	RESMİ OKULLAR-HASTANELER	Kademesiz	2,60	4,15	6,75
22	TURİSTİK TESİS	Kademesiz	2,82	4,47	7,29
23	FIRIN - HAMAM	Kademesiz	3,38	4,12	7,50
24	K.ATIKSU FIRIN-HAMAM	Kademesiz		3,21	3,21
25	K.ATIKSU TURİSTİK TESİS	Kademesiz		2,60	2,60
26	K.ATIKSU ÖZEL HASTANELER	Kademesiz		2,60	2,60
27	K.ATIKSU RESMİ OKUL-HASTANE	Kademesiz		3,90	3,90
31	SPOR KULÜPLERİ	0~20	1,11	1,71	2,82
		21~Üstü	2,82	4,47	7,29
32	ORGANİZE SAN.ABONELERİ	Kademesiz	1,70	2,70	4,40
33	SERBEST BÖL AB.	Kademesiz	1,70	2,70	4,40
35	İTOB ORG.SAN.AB	Kademesiz		4,40	4,40
40	ORMAN KÖYÜ KONUT	0~20	0,55	0,86	1,41
		21~Üstü	1,41	2,24	3,65
41	ORMAN KÖYÜ TARIM/HAYVAN	Kademesiz	0,55	0,86	1,41
44	İLÇE BELEDİYELERİ TARIM/HAYVAN	Kademesiz	0,55	0,86	1,41
45	ÖZEL OKULLAR	Kademesiz	2,60	4,15	6,75
46	K.ATIKSU ÖZEL OKULLAR	Kademesiz		3,90	3,90
47	ŞEHİT - GAZİ ABONELERİ	0-20	0,55	0,86	1,41
		21~Üstü	1,41	2,24	3,65
48	ÖZÜRLÜ ABONELER	0~20	0,55	0,86	1,41
		21~Üstü	2,82	4,47	7,29
100	KÖP PROTOKOL	Kademesiz			$0,075+KDV

Yeni Aboneler ve Abonelere Yönelik Teknolojik Hizmetler

2012 yılında 21.099 adet yeni abonenin su bağlantısı yapılmış olup toplam abone sayısı 1.246.338' e ulaşmıştır. 2012 yılı 136.654 adet su şebeke arızası tamir edilmiştir.

2012 yılında İZSU'daki teknolojik hizmetler, İZSU Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine artık cep telefonlarından da erişebilir hale gelinmiştir. www.izsu.gov.tr adresini kullanan İzmirliler, mobil internet sayfası aracığıyla İZSU ile ilgili haberler, su kesintileri, su faturası borcu, su ve atıksu tarifesi, laboratuar analiz, makine ve araç kiralama, keşif, proje ve katılım payı, baraj doluluk oranları, su kalite raporlar, ihaleler, günlük su üretimi, abonelik işlemleri hakkında bilgi alabilmekte, adres ve telefon numarası bırakarak arıza bildiriminde bulunabilmektedir.








İZSU
Cebinizde
BORÇ YAZ
BOŞLUK BIRAK
ABONE NUMARANI YAZ
3599'A GÖNDER
İZSU FATURA BİLGİLERİNİZ
ANINDA CEBİNİZE GELSİN...
BORC
1002030
Kime:3599
3599 NOLU SERVİS İLE SU KESİNTİLERİNİ DE ÖĞRENEBİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ
İZSU'nun 3599 servis numarasına gönderdiğiniz ve 3599 servis numarasından size gelen her bir SMS, 1 Standart SMS olarak ücretlendirilir. Sabit bir abonelik ücreti bulunmamaktadır.


İZSU
Cebinizde
T.C. KİMLİK NUMARANI YAZ
BOŞLUK BIRAK
ABONE NUMARANI YAZ
3599'A GÖNDER
BORÇ NEDENİYLE VEYA
PLANLI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
SU KESİNTİLERİNİ ÖNCEDEN ÖĞREN...
1002030
Kime:3599
Servisimizden yararlanın Susuz Kalmayın
İZSU'nun 3599 servis numarasına gönderdiğiniz 1 SMS'le bu hizmete abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra İZSU'dan gelen bilgilendirme mesajları için herhangi bir ücretlendirilme yapılmamaktadır.

B) ATIKSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim birimlerinde oluşan evsel nitelikli atık suların ilgili mevzuatta tanımlanmış kriterlere uygun şekilde arıtımını sağlamak, alıcı ortamlara deşarj etmek, atık su arıtma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak, ekipman ve ünitelerin revizyonlarını yapmak, dizayn kapasitesinin aşılmış olduğu tesislerde kapasite artışlarını gerçekleştirmek, atıksu arıtımı ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak İZSU Genel Müdürlüğünün atıksu ile ilgili faaliyet alanlarıdır.

Atıksu Arıtımı

2012 yılında Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak; Çiğli, Güneybatı, Urla, Havza, Menemen, Torbalı, Aliağa, Kemalpaşa, Seferihisar, Foça, Bayındır ve Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere 12 adet ileri biyolojik arıtma, İYTE, Halilbeyli, Hacıömerli, Gümüldür, Bağarası, Kozbeyli ve Gödence Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere 7 adet biyolojik arıtma, Selçuk, Ürkmez, Balıklıova, Çakırbeyli ve Korucuk Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere 5 adet doğal atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. 24 adet atıksu arıtma tesisinde toplam 270.485.036 m^3 atıksu arıtılmıştır. Atıksuların 267.183.437 m^3'ü (%98,78) ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde, 812.599 m^3'ü (% 0,30) biyolojik atıksu arıtma tesislerinde ve 2.489.000 m^3'ü (%0,92) doğal atıksu arıtma tesislerinde arıtılmıştır.

2012 YILINDA ARITILAN SU MİKTARLARI		
ARITMA TESİSLERİ	**ARITMA YÖNTEMİ**	**ARITMA MİKTARI (m^3)**
Çiğli, Güneybatı, Urla, Havza, Menemen, Torbalı, Aliağa, Kemalpaşa, Seferihisar, Foça, Bayındır ve Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisleri	İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ **TOPLAM 12 ADET**	267.183.437 **(%98,78)**
İYTE, Halilbeyli, Hacıömerli, Gümüldür, Kozbeyli, Bağarası ve Gödence Atıksu Arıtma Tesisleri	BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ **TOPLAM 7 ADET**	812.599 **(%0,30)**
Selçuk, Ürkmez Çakırbeyli, Balıklıova ve Korucuk Atıksu Arıtma Tesisleri	DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ **TOPLAM 5 ADET**	2.489.000 **(% 0,92)**
TOPLAM	**24 ADET**	**270.485.036**

2012 Yılında Tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisleri

ÖZDERE ATIKSU ARITMA TESİSİ



10.08.2012 tarihi itibari ile yapım işleri tamamlanmıştır. Yapım İşletme süresi Deşarj hattının bitimine müteakip başlayacaktır. 125 bin kişinin evsel atıksu arıtma kapasiteli İleri biyolojik atıksu arıtma tesisinde ayrıca koku giderim sistemi de yer alacaktır. Tesisin hizmete girmesi ile fosseptiklerle toplanarak alıcı ortama verilen evsel atıklara biyolojik arıtmadan sonra çöktürme işlemi uygulanacak ve ultraviyole ile dezenfekte edilerek doğaya verilecektir.

ÜRKMEZ – DOĞANBEY ATIKSU ARITMA TESİSİ



19.08.2012 tarihi itibari ile yapım işleri tamamlanmıştır. Yapım İşletme süresi elektrik temininin bitimine müteakip başlayacaktır.
Doğanbey (Ürkmez) Atıksu Arıtma Tesisi, Doğanbey-Payamlı-Ürkmez yerleşimlerinin yaz ve kış nüfusu dikkate alınarak birbirine paralel iki hattan oluşacaktır. Azot ve fosfor giderimi yapılacak tesiste koku giderim üniteleri de yer alacaktır.
Tesise gelen ham atıksu, çeşitli ızgaralardan geçerek sonrasında havalandırmalı kum ve yağ tutucuda işlem görecek. Ardından içerdiği fosfor arıtılacak, uzun havalandırmanın yapıldığı aktif çamur ünitesinde arıtma işlemi yapıldıktan sonra çöktürme işlemi uygulanacak ve ultraviyole ile dezenfekte edilerek doğaya verilecektir.

FOÇA BAĞARASI ARITMA TESİSİ TÖRENLE HİZMETE ALINDI



2005-2006 döneminde devreye alınan tesis, makine ve ekipman takviyeleri ile dünyanın kabul ettiği ileri biyolojik atıksu arıtma seviyesine çıkarılmıştır. 10 bin 500 kişiye hizmet verecek şekilde düzenlenen tesis, günlük 2 bin 100 metreküp arıtma kapasitesine sahiptir. Tesiste otomatik ızgara, havalandırma havuzu, son çökeltim havuzu, geri devir haznesi ve klor temas tankı üniteleri yer almaktadır**.**

ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 4. FAZ



Körfez'deki iyileşmeyi sürdürmek için "Yüzülebilir Körfez" hedefiyle "Büyük Körfez Projesi" kapsamında; Büyük Kanal Projesi ile 2000 yılında hizmete giren Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde halen işletmedeki 3 faz arıtma ünitelerine ek olarak saniyede 2.5 metreküp atıksu arıtma kapasiteli 4. faz inşa edilecektir. Mevcut arıtma tesisine eklenecek bir yeni hatla, halen günde 604 bin 800 metreküp olan arıtma kapasitesinin, günde 216 bin metreküp artırılarak 820 bin 800 metreküpe ulaşacaktır. Günde 24 saat kesintisiz olarak çalışan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde kentin büyümesine bağlı olarak arıtılan atıksu miktarını güvenli ve yüksek kalitede arıtabilmek, gerekli bakım ve yenilemelerini daha iyi yapılabilmek ve yağışlı havalarda daha yüksek debilerde atıksu arıtılabilmek için 4.faz üniteleri yapılacaktır.

Çiğli A.A.T.'nin 4.faz projeleri tamamlanmış olup 2013 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.

Büyük Kanal Projesi'nin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi

İZSU Genel Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü arasında 2000 yılından beri "Büyük Kanal Projesi'nin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının İzlenmesi" projesi yaptırılmakta olup, 14.01.2011 tarihinde imzalanan sözleşme ile aynı proje 3 yıl daha uzatılmıştır. Bu projenin amacı İzmir Körfezi'nde kirliliğin önlenmesi ve körfezin iyileştirilmesi amacıyla devreye girmiş olan "Büyük Kanal Projesi"nin ve kısmen Gediz Nehri'nin, denizel ortamdaki (su ve sedimentteki) etki ve sonuçlarının saptanması hedeflenmektedir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda günde 10 bin metreküpün üzerinde arıtma yapan belediyelerden 2011 yılında yayınladığı genelge ile çıkış suyu ölçüm ve analiz kabinleri oluşturmasını isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na en kısa sürede yanıt İzmir'den gelmiştir.

Günde 10 bin metreküp ve üzerinde evsel atık suyun arıtıldığı Çiğli, Güneybatı, Menemen, Torbalı, Aliağa, Kemalpaşa, Urla, Seferihisar, Havza ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin çıkış noktalarına ölçüm ve analiz kabinleri kurulmuştur. 3 ayda tamamlanan sistem gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra Mart ayının başında faaliyete geçmiştir.

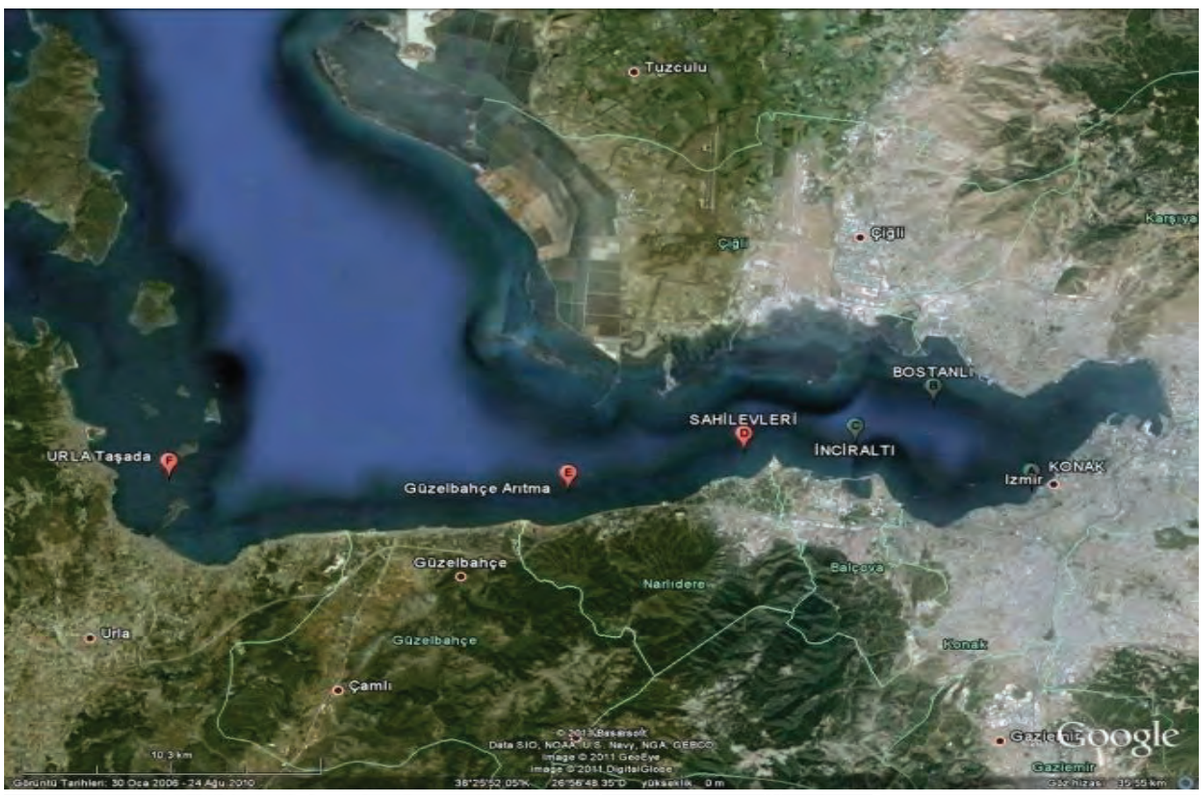





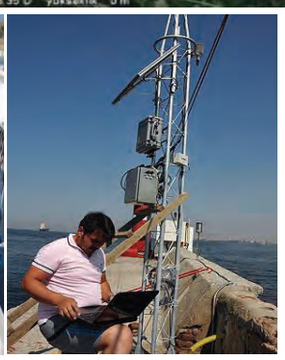



Arıtılmış Atıksuyun Yeniden Kullanımı

Arıtılmış atıksuyun tarımsal, endüstriyel ve proses suyu amaçlı olarak yeniden kullanımı için geri kazanım tesisi inşaatı planlanmaktadır. Söz konusu tesisin kurulacağı alanın zemin etüd raporu hazırlatılmıştır.

Merkezi Scada Sistemi

Bu proje ile atıksu debisi, enerji tüketimi, oksijen seviyeleri gibi ana parametrelerin ve blower, pompa gibi ana ekipmanların merkezi izleme ve işletmesini kapsayan bir sistemin oluşturulması hedeflenmiştir. Yapım ihalesi yapılmıştır. İhale komisyonun incelemesi süreci devam etmektedir.

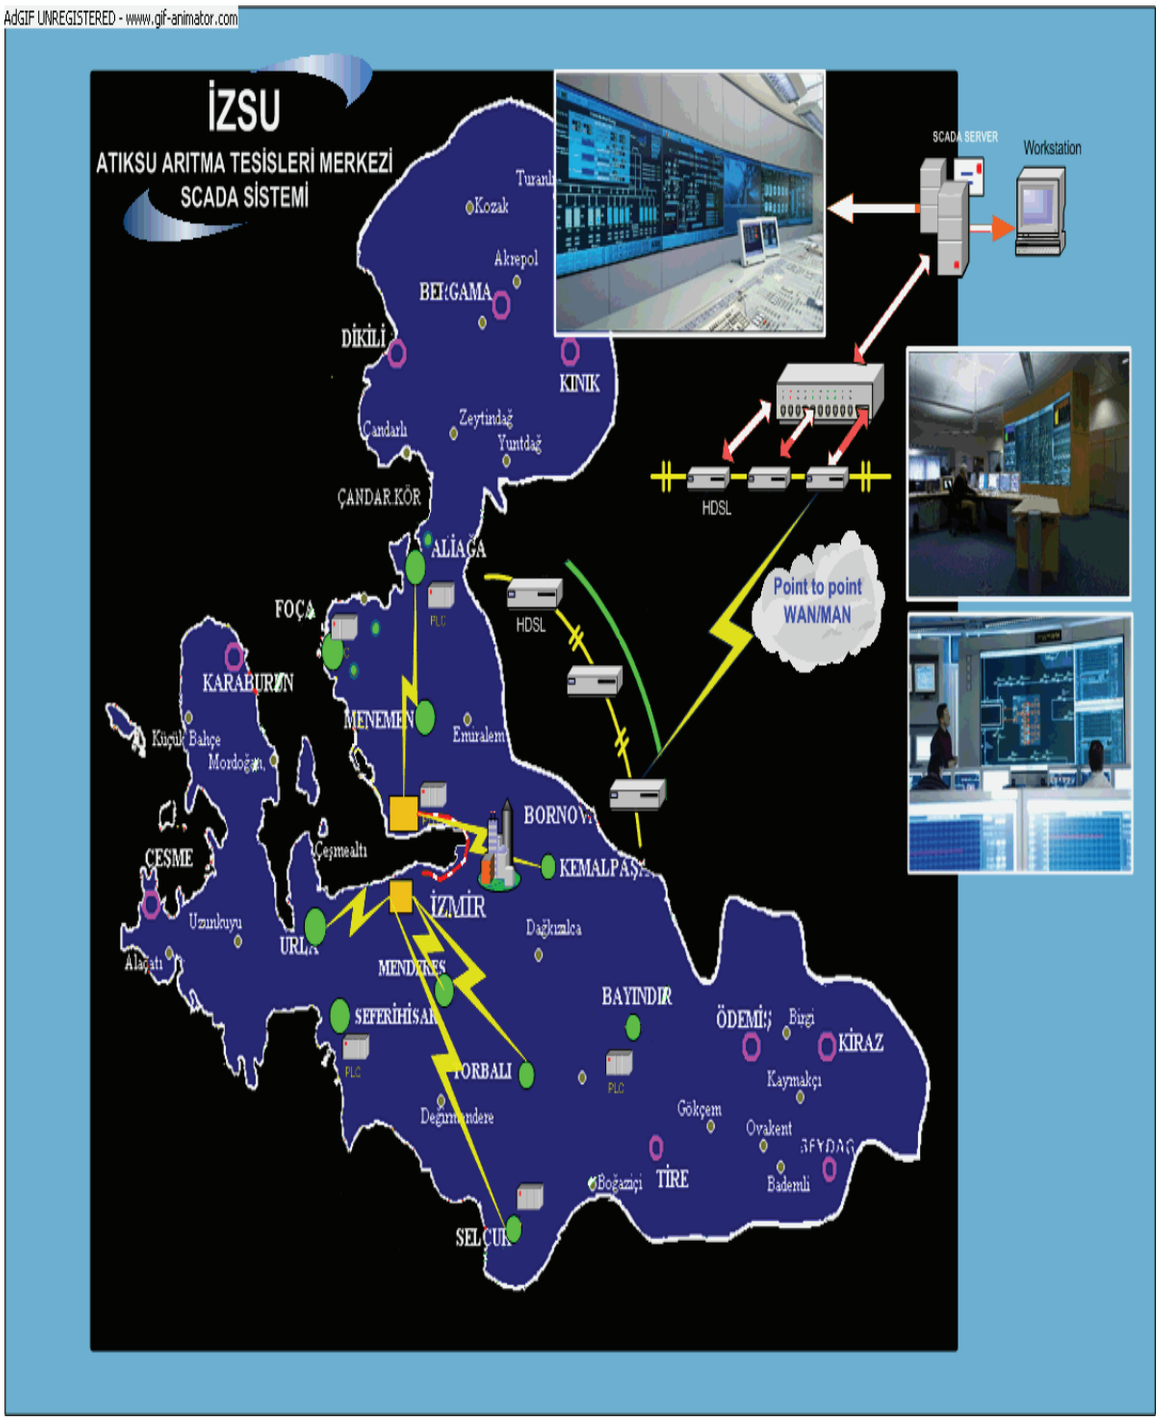

Atıksu Arıtma Tesislerinin Kapasiteleri, Arıtma Yöntemleri ve 2012 yılında Arıtma Yöntemlerine Göre Arıtılan Su Yüzdeleri


Çiğli A.A.T
604.800 m³/gün kapasite


Güneybatı A.A.T
21.600 m³/gün kapasite


Urla A.A.T
21.600 m³/gün kapasite


Havza A.A.T
21.600 m³/gün kapasite


Menemen A.A.T
21.600 m³/gün kapasite


Seferihisar A.A.T
10.800 m³/gün kapasite

İLERİ BİYOLOJİK AAT
98,78%
12 ADET


Torbalı A.A.T 21.
600 m³/gün kapasite


Foça A.A.T
9.763 m³/gün kapasite


Aliaağa A.A.T
21.600 m³/gün kapasite


Bayındır A.A.T
6.912 m³/gün kapasite

DOĞAL AAT
0,92%
5 ADET

BİYOLOJİK AAT
0,30%
7 ADET


Kemalpaşa A.A.T
12.960 m³/gün kapasite


Ayrancılar A.A.T
6.912 m³/gün kapasite

Torbalı Korucuk A.A.T
200 m³/gün kapasite

Torbalı Çakırbeyli A.A.T
200 m³/gün kapasite


Halilbeyli A.A.T
1.300 m³/gün kapasite


Gödence A.A.T
250 m³/gün kapasite


Gümüldür A.A.T
1.800 m³/gün kapasite


Selçuk A.A.T
10.200 m³/gün kapasite


Ürkmez A.A.T
2.000 m³/gün kapasite


Balıklıova A.A.T
1.000 m³/gün kapasite


İYTE A.A.T
2.250 m³/gün kapasite


Kozbeyli A.A.T
500 m³/gün kapasite


Hacıömerli A.A.T
250 m³/gün kapasite

Foça Bağarası A.A.T
2.100 m³/gün kapasite

İşletmedeki Atıksu Arıtma Tesislerinin Kapasiteleri ve Arıtma Yöntemleri

No	Tesis Adı	İlçe Adı	Kapasitesi (m^3/gün)	Eşdeğer nüfus(kişi)	İZSU Tarafından İşletmeye Alınma Yılı	Arıtma Yöntemi
1	Çiğli	Çiğli	604.800	3.000.000	2000	İleri Biyolojik
2	Güneybatı	Narlıdere	21.600	100.000	2001	İleri Biyolojik
3	Havza	Menderes	21.600	100.000	2004	İleri Biyolojik
4	Halilbeyli	Kemalpaşa	500	5.500	2007	Aktif Çamur
5	Kozbeyli	Foça	500	2.100	2007	Aktif Çamur
6	Balıklıova	Urla	1.000	5.000	2008	Doğal Arıtma
7	Foça	Foça	9.763	57.000	2008	İleri Biyolojik
8	Gümüldür	Menderes	1800	4.000	2008	Aktif Çamur
9	Hacıömerli	Aliağa	250	1.250	2008	Biyodisk
10	İYTE	Urla	2.250	22.500	2008	Aktif Çamur
11	Selçuk	Selçuk	10.200	50.000	2008	Stabilizasyon Havuzu/Doğal Arıtma
12	Ürkmez	Seferihisar	2.000	10.000	2008	Doğal Arıtma
13	Urla	Urla	21.600	100.000	2009	İleri Biyolojik
14	Bayındır	Bayındır	6.912	40.000	2009	İleri Biyolojik
15	Ayrancılar-Yazıbaşı	Torbalı	6.912	40.000	2010	İleri Biyolojik
16	Gödence	Seferihisar	250	1.250	2010	Aktif çamur
17	Torbalı	Torbalı	21.600	100.000	2010	İleri Biyolojik
18	Menemen	Menemen	21.600	100.000	2010	İleri Biyolojik
19	Seferihisar	Seferihisar	10.800	50.000	2010	İleri Biyolojik
20	Kemalpaşa	Kemalpaşa	12.960	70.000	2010	İleri Biyolojik
21	Aliağa	Aliağa	21.600	100.000	2010	İleri Biyolojik
22	Bağarası	Foça	2.100	10.500	2008	Aktif çamur
23	Çakırbeyli	Torbalı	200	1000	2011	Doğal Arıtma
24	Korucuk	Torbalı	200	1000	2011	Doğal Arıtma
TOPLAM			80н.797	3.971.100	-	-

Çamur Bertarafı

2012 yılında atıksu arıtma işlemleri sonucu 200.321 ton arıtma çamuru oluşmuştur.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurları Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi sahasında inşa edilmiş olan ve geçirimsizliği jeomembran malzeme ile sağlanan çamur kurutma yataklarına transfer edilmekte, kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) kullanılarak bu çamurların stabilizasyonu sağlanmaktadır. Çamur Çürütme –Kurutma Tesisi İnşaası 2012 ocak ayında başlamış olup 2013 yılı haziran ayında Kurutma Tesisinin işletmeye alınması, 2013 yılı sonunda ise Çürütme Tesisinin tamamlanması planlanmıştır.



Katı Atık Depolama



2012 yılı içerisinde Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı'nda günlük ortalama olarak 3.854 ton/gün atık depolanmıştır. Tesiste 2012 yılı içinde toplam 1.407.012 ton evsel, evsel nitelikli endüstriyel, tıbbi, imha atığı ve arıtma çamuru depolanmıştır. Depolama alanında oluşan sızıntı suları, bir toplama şebekesi ile toplanarak, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılması sağlanmıştır.

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı'ndaki üstü kapatılmış olan çöp depolama alanlarında, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu kılavuzlar ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştır.

Rehabilitasyon Projesi kapsamında yeni metan gazı tahliye bacalarının yapılması, metan gazı yakma sistemi kurulması, ekonomik olması halinde metan gazından elektrik üretimi, yol yapımı ve peyzaj düzenlemeleri bulunmaktadır. Ayrıca, yeni yağmur suyu kuşaklama kanalı ve sızıntı suyu toplama kanalları yapılarak mevcut sistem geliştirilecektir.

Arıtma Sahası

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan arıtılmış suların Körfez'e döküldüğü alan, adeta Kuş Cenneti'ne döndü. Avrupa standartlarında arıtma kalitesi ile dikkat çeken tesisin çıkış hattında soyları tükenmekte olan pelikanlardan flamingolara, ördek türlerinden şahinlere, balıkçıllardan kartala kadar pek çok kuş türünü görmek mümkün hale gelmiştir.

Türkiye'nin Avrupa standartlarında arıtma yapan en büyük arıtma tesisi olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi; arıtma kalitesi ile Körfez'in temizlenme sürecine ve ekolojik dengenin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Eski Gediz Deltası üzerinde 22 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan tesise konuk olan kuşlar da arıtma kalitesinin canlı örneğidir.







Körfezdeki çeşitlilikten örnekler

C) KANALİZASYON

Kanalizasyon Sisteminin Kurulması

İZSU'nun kanalizasyon hizmetleri alanındaki görevlerinden biri; İzmir şehrinin nüfus artışına paralel olarak, abonelerden gelen talepleri de dikkate alarak atıksuların aboneden arıtma tesislerine, yağmur sularının da toplanma noktasından alıcı ortama ulaşmasını sağlamak için gerekli tüm tesislerin (atıksu arıtma tesisi, her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi, kollektör, ana kuşaklama kanalları, atıksu pompa istasyonları ile yağmursuyu kanalları ve derelerin ıslah çalışmaları) yapılabilirlik sonuçlarına dayanarak etüd, proje, kamulaştırma çalışmalarını yapmak, imalatlarını gerçekleştirmektir.

Yeni Kanalizasyon Şebekesi Çalışmaları

2012 yılında İzmir ilimizde 131,3 km Kanalizasyon Şebekesi imalatı yapılmıştır.







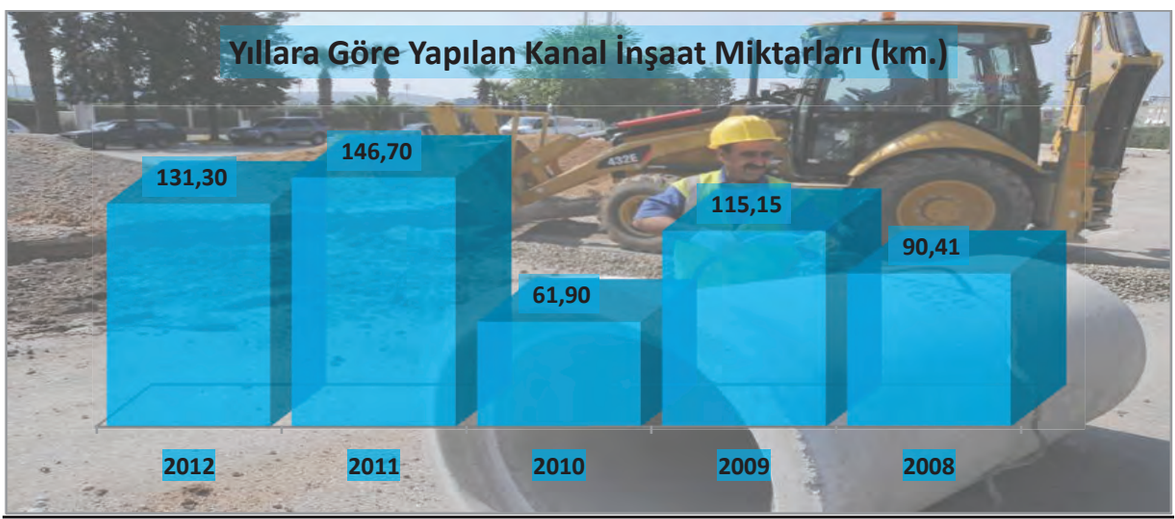

Yağmursuyu Çalışmaları

Yağmursuyu kanalı projelerinin amacı yağış sularının çevreye zarar vermeden alıcı ortamlara (dere veya denizlere) ulaştırılmasıdır. Yapılan çalışmalar ile yağış suları kanalizasyon sisteminden ayrıştırılmaktadır. Bu çalışmalar aynı zamanda taşkın yaşanan bölgelerde sıkıntıları gidermeye de yöneliktir. Bu kapsamda 2012 yılında İzmir ilimizde toplam 19 km Yağmursuyu hattı imalatı yapılmıştır.

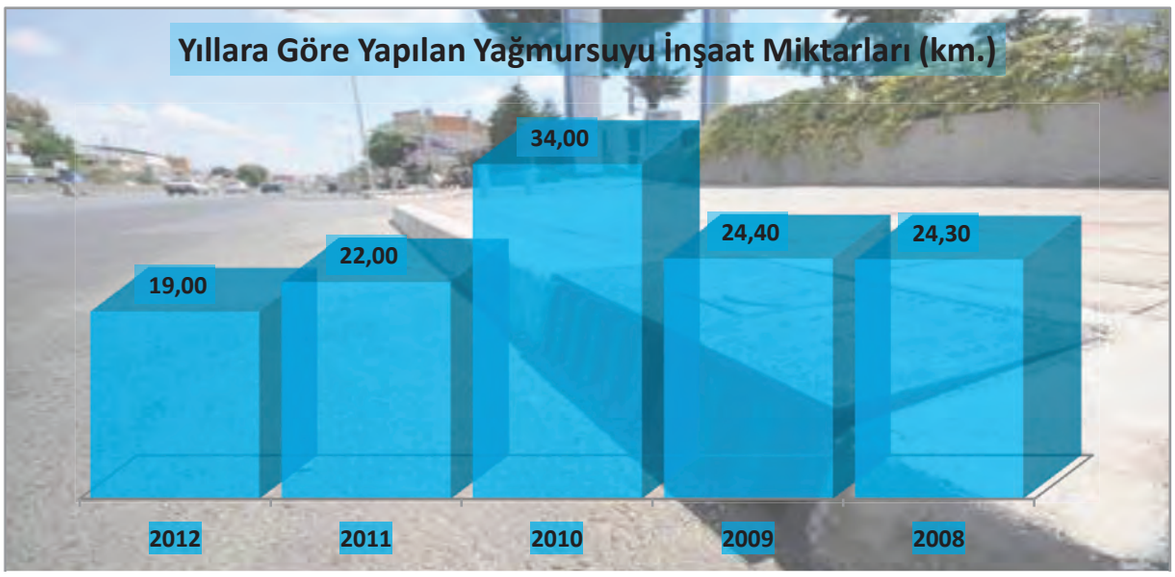







Birleşik Sistem Kanalizasyon Sisteminin Ayrılması:

Ayrıştırma projeleri; atıksu ve yağmursularını birlikte toplayarak arıtma tesislerine ileten mevcut birleşik sistem kanalizasyon alt yapısının ve arıtma tesislerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacı ile hazırlanmaktadır. Bu Kapsamda yağmursuları mevcut sistemden ayrıştırılarak ayrı hatlar yardımı ile alıcı ortama (dere ve veya denize) ulaştırılmaktadır. 2012 yılında ilk etapta Bornova Çamdibi bölgesi projelendirilerek yapım aşamasına gelinmiş, ikinci etap olarak ele alınan Buca İlçesi için proje çalışmalarında tamamlanma aşamasına gelinmiştir.

Bornova İlçesi Çamdibi Bölgesi Yağmursuyu Ayrıştırma Projesi

Bornova İlçesi Meriç, Tuna, Serintepe, Zafer, Birlik, Koşukavak, Gaziosmanpaşa Mersinli, Barbaros, Yeşilova, Rafetpaşa, Çınar ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri'nde Yaklaşık 29 km uzunluğunda atıksu kanalı ve 21 km uzunluğunda yağmursuyu kanalı imalatları ile Arap Deresi'nin 6,5 km uzunluğundaki kısmında dere düzenlemesi yapılarak akış rahatlatılacaktır. Proje kapsamında yağmursuyu hatlarının en yakın dereye ulaştırılması amaçlanarak 4 ayrı noktada Arap Deresi, Kocasu Deresi, Manda Çayı ve Halkapınar Terfi Merkezi'ne deşarj edilecek, yenilenecek olan atıksu hatları ise Manda Çayı ve Fatih Caddesi'nde bulunan mevcut kollektörlere bağlanacaktır.

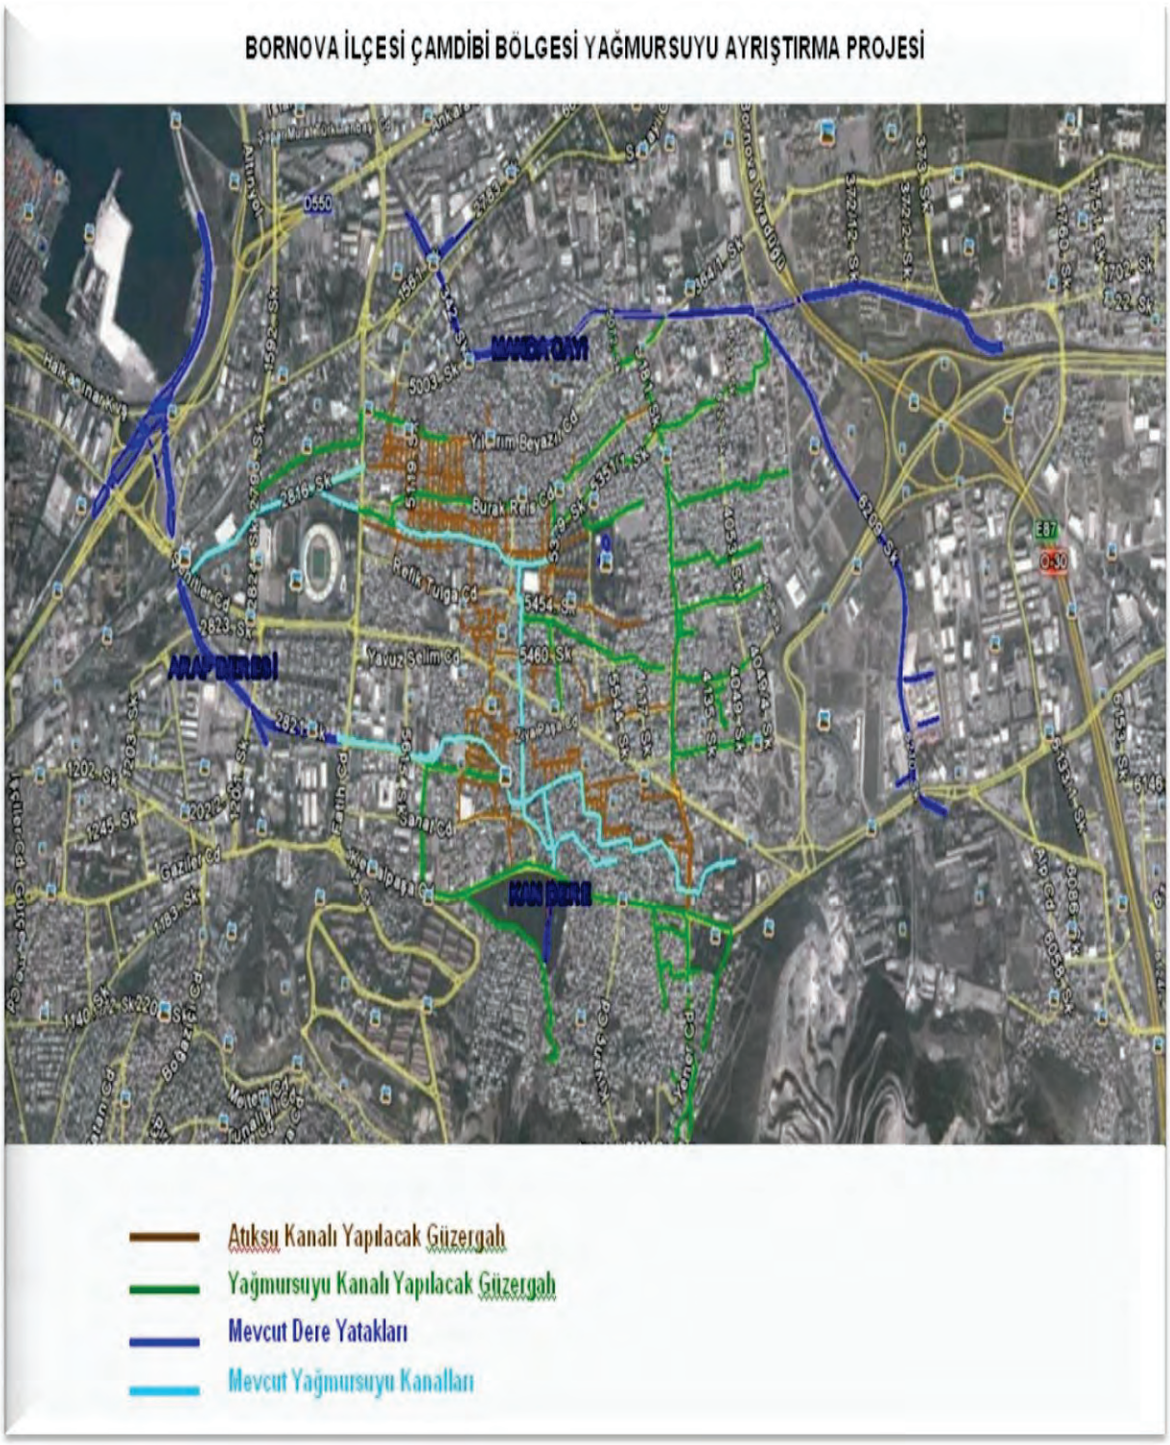

Buca İlçesi Atıksu ve Yağmursuyu Ayrıştırma Projesi

Buca İlçesi Atatürk, Menderes, Vali Rahmi Bey, Dumlupınar, Yaylacık, Akıncılar, Efeler, Fırat, Yenigün, Çamlıkule, Kozağaç, Yıldız, Adatepe ve Şirinkapı Mahallelerinde Yaklaşık 10 km uzunluğunda atıksu kanalı, 18 km uzunluğunda yağmursuyu kanalı ve yapılacak yağmursuyu hatlarının mansap noktasını teşkil edecek olan Kozağaç Deresi'nde 1 km uzunluğunda dere yatağı düzenlemesi yapılacaktır.

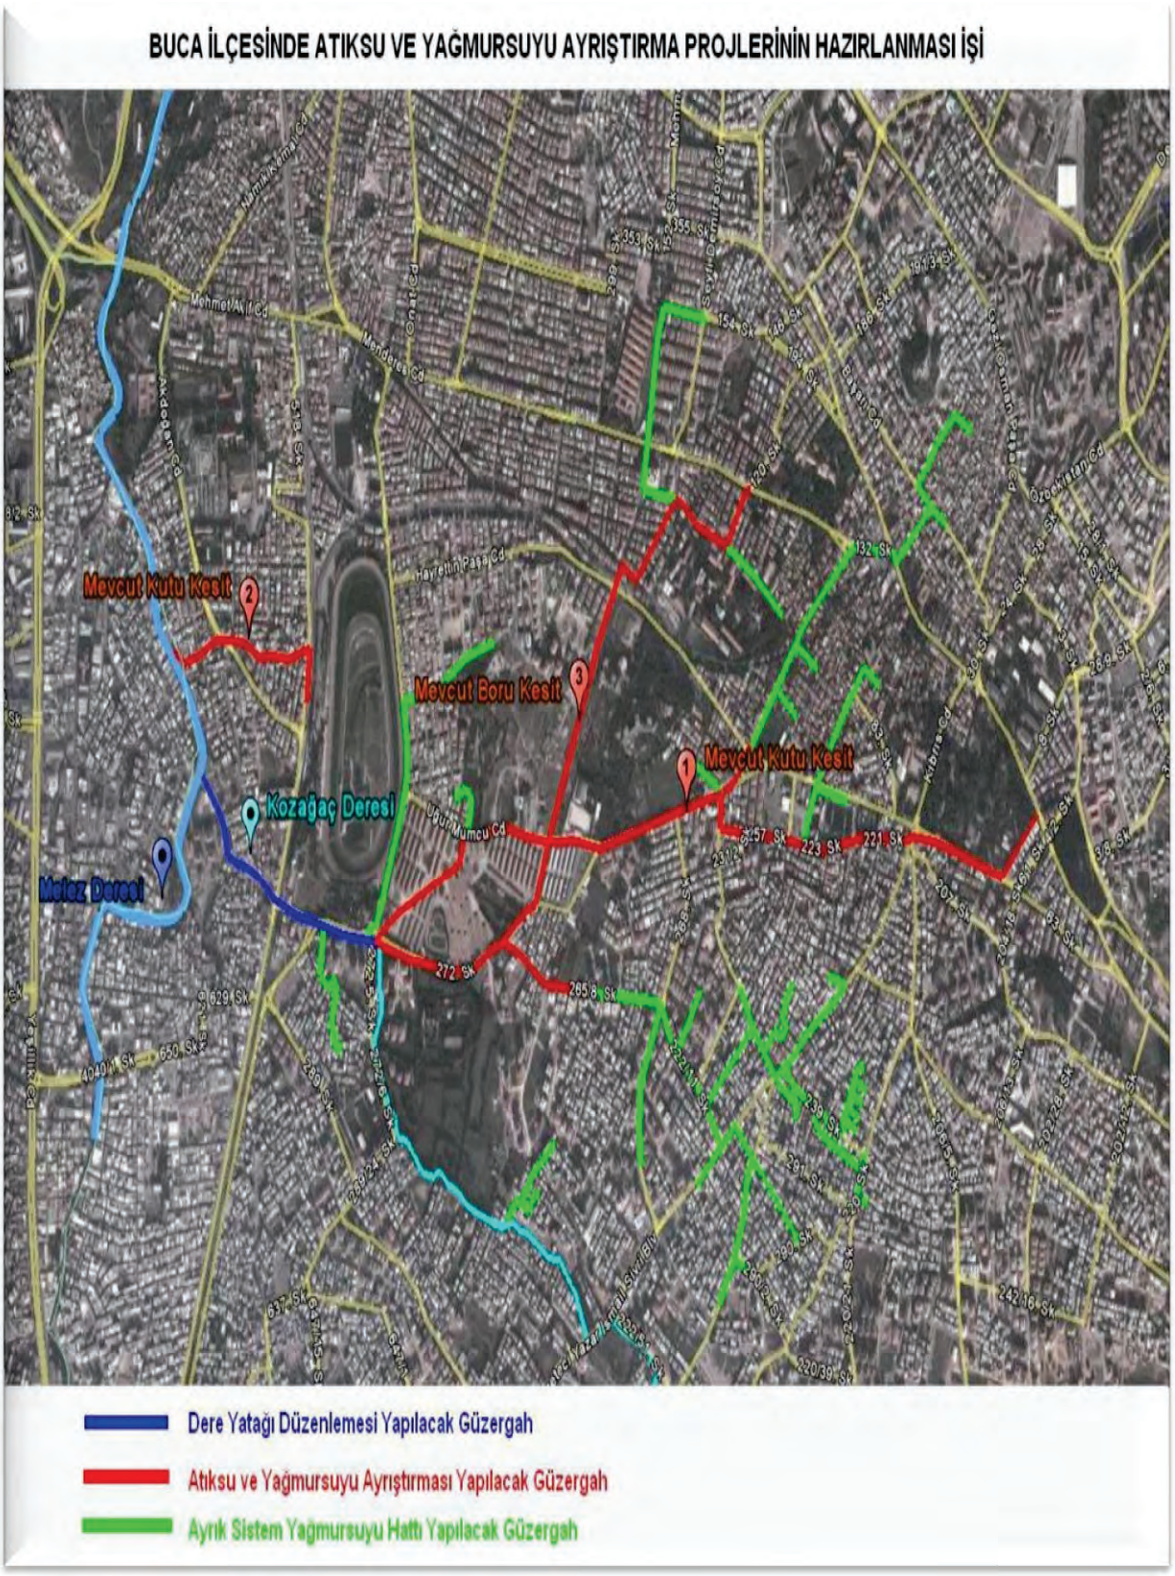

Dere Islahı Çalışmaları

Yağışlı havalarda taşkına neden olan derelerde ıslah programı 2012 yılında da devam etmiştir. Çalışmalar kapsamında dere tabanları betonlanmakta, yan duvarları yükseltilerek korkuluk takılmaktadır. Böylelikle dereler yaya ve araçlar için de güvenli hale getirilmiş olmaktadır. 2012 yılında İzmir ilimizde toplam 18 km Dere Islahı, 22,3 km dere kenarı korkukluk imalatı ve 4 adet tersip bendi onarımı yapılmıştır.

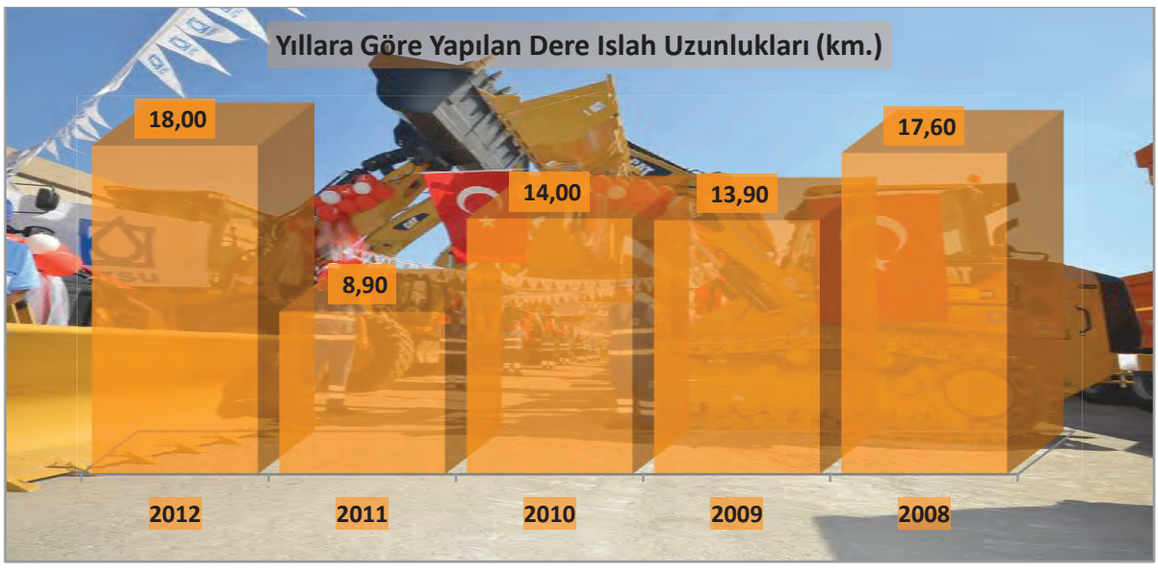



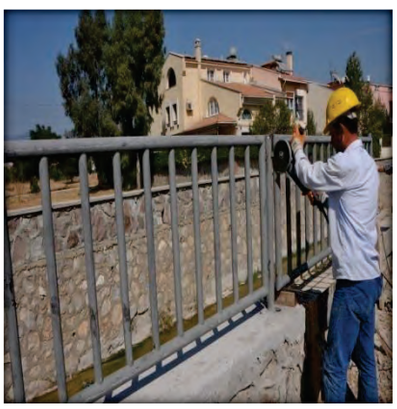



Kanalizasyon Sisteminin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı

İZSU'nun kanalizasyon hizmetleri alanında diğer görevi; imalatı tamamlanmış her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi, kollektör, ana kuşaklama kanalları, atıksu pompa istasyonları, yağmur suyu kanalları tesisi ile dereleri sürekli çalışır halde tutmak, oluşabilecek her türlü arızayı gidermek, bakım-onarım ve temizliklerini periyodik olarak yapmak, atıksu pompa istasyonlarını sürekli çalışır halde tutmak için periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, pompa istasyonlarına gerekli sarf malzemeleri stokta tutmak, ömrünü tamamlamış ya da herhangi bir nedenle çalışamaz hale gelen kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilemek, abonelerin kanal açma ve foseptik çekim hizmetlerini yürütmektir.

Kanal Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışmaları

2012 yılında İzmir'de mevcut kanalizasyon şebekelerini çalışır halde tutabilmek için muhtelif işler kapsamında toplam 67 km kanal bakım ve onarım, 1.720 km kanalizasyon hatlarının temizliği, 35.811 sefer foseptik temizliği, 751 adet parsel bacası, 7 km parsel bağlantısı yapılması, 878 adet parsel arızası giderilmesi, 9.206 adet kanalizasyon baca kapakları ve yağmursuyu ızgaralarının yol seviyesine getirilmesi, 24.270 adet bina kolu açma, 308,90 m³ galeri mecra hatlarının bakım onarım ve temizliği yapılmış, 4.705 adet baca kapağı yenilenmiştir.



Yağmur Suyu Hatlarının Onarım ve Temizlik Çalışmaları

2012 yılında İzmir'de mevcut yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmaları kapsamında toplam 65 km kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamiratı, 472.085 adet tekli yağmursuyu ızgaralarının temizliği ve bağlantı kollarının temizliği, 322 km kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmursuyu hatlarının temizliği, 42 m. delikli saçlı yağmursuyu ızgarası yapılmış, 3.6 km. yağmursuyu hattı imalatı yapılmış, 3.820 adet tekli yağmursuyu ızgarası yapılmış, 32 km yağmursuyu ızgarası kolu ile bina kolu bağlantısı yapılmıştır.

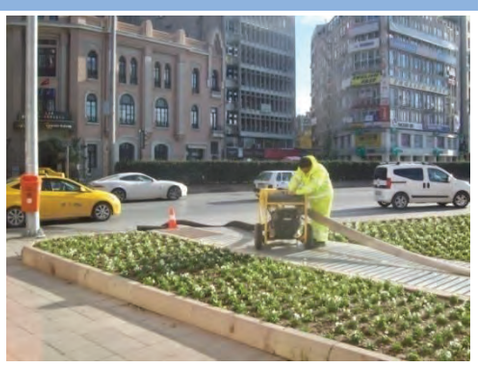

2012 yılında şehir merkezinde yağış anında ciddi sıkıntılar yaşanabilecek kritik noktalar tespit edilmiştir. Bu noktalarda yağış öncesi pompalar kurularak su baskınlarının önüne geçilmiştir. Konak İlcesi Mithatpaşa Caddesi 89 Sokak, Buca İlcesi Şirinyer Inkılap Mahallesi Şirinyer Metro İstasyonu önü, Narlıdere İlcesi Alionbaşı Deresi ile Irmak Sokak köşesi, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı deniz cıkışı ile Cumhuriyet Meydanı, Karşıyaka İlcesi 1671 Sokak ile Girne Bulvarı kavşağı, 1671 Sokak ile Ruştu Şardar Sokak kavşağı, Bostanlı Deresi Yalı caddesi kavşağı, Karşıyaka Bostanlı arabalı vapur iskelesi onun gibi kritik noktalarda yağmur oncesi yağmursuyu pompaları kurularak su baskınlarının önüne geçilmiştir.



Dere Temizlik Çalışmaları

Yönetim Kurulumuzun 29.03.2012 tarih 224 sayılı kararı ile Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı teşkilat yapısı yeniden düzenlenerek "Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü" kurulmasından önce Kanal Bakım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen dere temizlikleri kapsamında İzmir genelinde ihaleli işler kapsamında 78.187,50 saat iş makinası çalıştırılmış, İzsu ekipman ve personeli ile 205.394 mt derelerde temizlik çalışması yapılmıştır.



2012 yılında İzmir içindeki tüm derelerin temizliği yapılarak daimi olarak akarları sağlanmış, özellikle yağış sonrasında derelerin mansap kısımlarında toplanan rusubatlar temizlenerek bir sonraki yağışlarda dere taşkınlarının yaşanmasını önlemek için çalışmalar periyodik olarak sürdürülmüştür.

İdaremiz tarafından öncelikle İzmir Metropol alanı içerisinde yeralan derelerin bakım ve temizleme çalışmalarında kullanılmak üzere "**Makine Parkı**" oluşturulmuştur. Araç filomuz toplam 20 iş makinası ve 20 adet damperli kamyondan oluşmaktadır.

limiz yerleşim alanları içerisinden gelen İzmir Körfezi'ne dökülen ana derelerden olan **Melez ve Arap** derelerinde yıllık bakım çalışması Mayıs ayı içerisinde yapılmış olup **89175 ton** malzeme çıkartılmıştır.

Yağışlar sonrası yüzeysel atık malzemelerin dereler yoluyla İzmir Körfezi'ne ulaşmadan bertarafının sağlanması için Melez ve Arap derelerinin birleşim noktası ile Manda Deresi üzerinde **sabit bariyer sistemi** tesis edilmiştir.



Büyükçiğli Deresi'nde istinat duvarının yıkılan ve risk arz eden **125 mt** uzunluğundaki bölümünün güçlendirilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları 20.12.2012 tarihinde tesis edilmiş ve sorun ivedilikle giderilmiştir.

İzmir Körfezi Su Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar

İzmir Körfezi'ne dereler vasıtasıyla taşınan teressubatın belirli periyotlarla alınması ve körfez kuzey aksında su sirkülasyonunu engelleyen Ragıp Paşa Dalyanı'nın ve dere ağızlarının denizden tarama yapılarak temizlenmesi ve su sirkülasyonunu engelleyen Ragıp Paşa Dalyanı dip kalıntılarının alınması için 11.03.2010 tarihinde **Denizdibi Tarama Başmühendisliği** (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) ile İdare arasında Protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Mavişehir ve Bostanlı Derelerinde tarama çalışmaları tamamlanmış ve **Ragıp Paşa Dalyanı** da dahil olmak üzere bugüne kadar (Aralık 2012 sonu itibariyle) yaklaşık **1.068.000 m^3** tarama işlemi gerçekleşmiştir. Protokol hükümleri kapsamında yaklaşık 210.585 m^3 daha malzeme alınması için tarama işlemi yapılması planlanmaktadır.

Tarama çalışmalarının daha hızlı, yüksek kapasite ve verimlilikle ve kendi öz imkanlarımızla yapılabilmesi için İdare tarafından bir adet **kesici-emici tip tarama gemisi** ve bu iş gemisine lojistik destek sağlayacak **römorkör** tipinde diğer bir iş gemisinin ihale kapsamında imalatı yaptırılmıştır. **İmbat İzmir** Römorkörü, İstanbul Tuzla Tersaneleri'nde üretilmiş ve 23.06.2012 tarihinde İZSU Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. **Meltem İzmir** kesici-emici tip tarama gemisi ise, Çiğli Ata Sanayi Sitesi'nde imal edilmiş; 02.07.2012 tarihinde Levent Marina'dan denize indirilmiştir.

Her iki iş gemimizin de açılışı, **24.07.2012** tarihinde İnciraltı Levent Marina'da gerçekleştirilmiştir.



Körfezin; öncelikle doğal yapısına uygun koruma / kullanım dengesinde planlanmasının sağlanması amacıyla, denizlerin üretken olabilmeleri ve temiz kalabilmeleri açısından en önemli etken olan akıntı rejimini gerçek zamanlı olarak izlemek üzere **" İzmir Körfezi Gerçek Zamanlı Sayısal Akıntı Ve Sediment Taşınım Modelleme Projesi "** kapsamında gerçek zamanlı meteo-oşinografik gözlem verilerine dayalı matematiksel modelleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan model; körfezde kanal açılması, derinleştirme çalışmaları ve gelecekteki kıyı tasarımı ve mühendislik uygulamalarında temel oluşturmaktadır. Bu çalışmalar tamamlanmış ve ilgili Bakanlığa ÇED başvurusunda bulunulmuştur.

Süre giden modelleme projesi doğrultusunda İzmir Körfezi'nin akıntı modelini doğrulamak ve sürekli çevrimiçi ölçümlerle yenileyebilmek amacıyla **"Meteorolojik Ve Oşinografik Gözlem Sistemleri Kurulumu Ve İşletimi Projesi"** dahilinde tüm körfezi kapsayacak şekilde Foça / Deveboynu, Güzelbahçe / AAT, Karaburun / Büyükada ve Pasaport İskele'de kurulan gözlem istasyonları devreye alınmıştır.



İdaremiz ile Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı arasında "**İzmir Körfezi Tarama İşlerinde İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol**" 08.08.2011 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında, her iki kurum tarafından yapılacak çalışmalara ilişkin olarak mühendislik hizmetleri ile ÇED Yönetmeliği kapsamında gerekli görülen tüm iş ve işlemler entegre olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işbirliğinin ilk adımı olarak gerçekleştirilen "İzmir Körfezi ve İzmir Limanı Rehabilitasyon Projesine Ait Mühendislik Hizmetleri İle Çevresel Etki Değerlendirilme (ÇED) Raporlarının Hazırlanması ve Nihai ÇED Kararlarının Alınmasına Yönelik Danışmanlık Hizmet Alımına İlişkin İhale" Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 31.01.2012 tarihinde yapılan sözleşme ile yürürlüğe konulmuştur. Sözleşme kapsamında ÇED sürecinin doğru amaçlarla yapılandırılması ve uygulanması amacıyla 19-21 Eylül 2012 tarihleri arasında sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, akademisyenler, yerel yöneticiler ve halkın katılımıyla **"İzmir Körfezi Ve Limanı Rehabilitasyon Projesi Çalıştayı"** düzenlenmiştir.

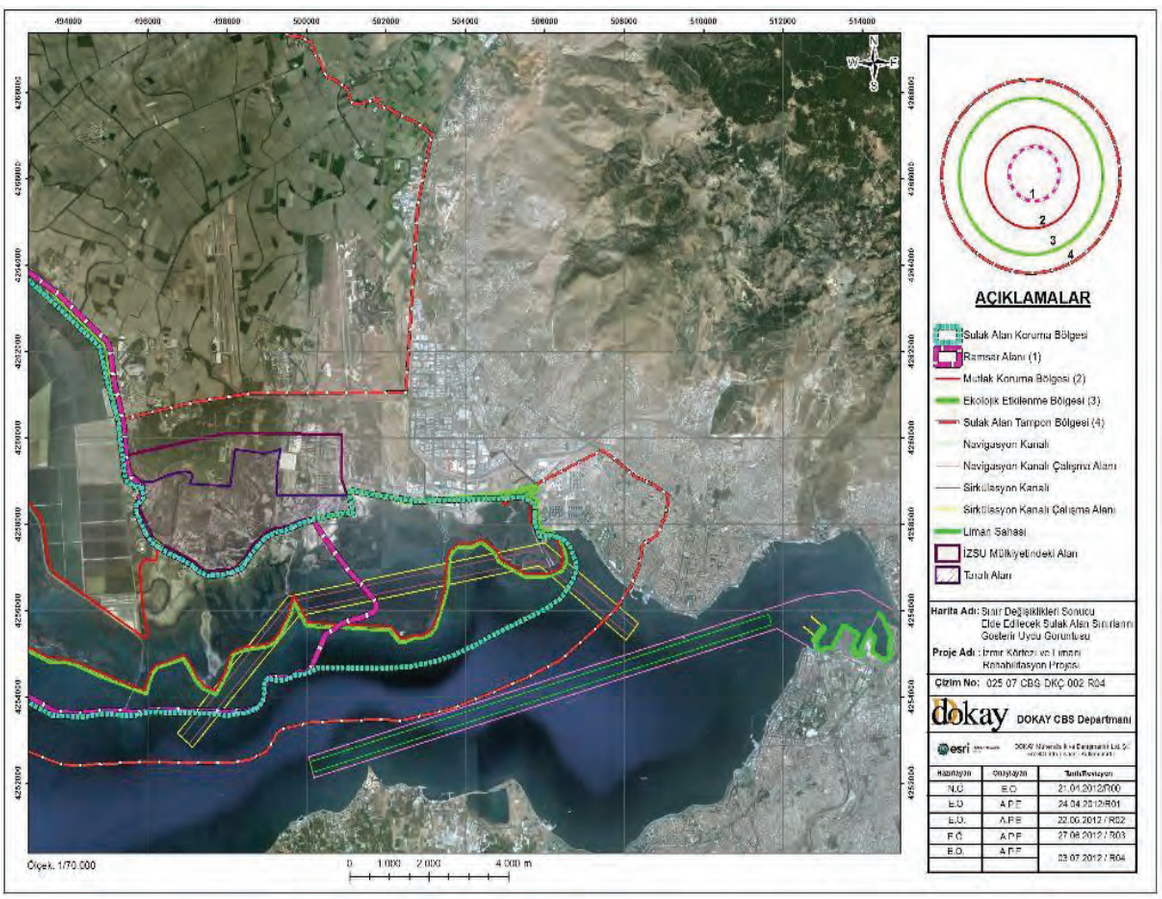

Tüm bu çalışmalara bağlı olarak körfez suyundaki değişimleri yakından takip etmek ve dereler yoluyla körfeze boşalan suyun yarattığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimleri izlemek amacıyla yürütülen "**İzmir Körfezi Su Kalitesi İzleme Projesi**" kapsamında belirlenen 22 farklı noktadan periyodik olarak numune alınarak İdareye bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nde analizleri yapılmaktadır.

Atıksu Pompa İşleri

2012 yılında pompa istasyonlarında bulunan atıksu pompaları aracılığı ile günlük ortalama 6,98 m^3 / sn atıksu pompalanmıştır.

İZSU Genel Müdürlüğü, hizmetlerini yürütürken zaman zaman Belediye Şirketleri olan İZELMAN, İZBELCOM, İZBETON personelinden destek almaktadır. Söz konusu şirketlerden aldığı destekler aşağıda belirtilmiştir.

İZELMAN

İZELMAN Ltd. Şti. 1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Yayıncılık ve İZULAŞ ortaklığı ile kurulmuştur. İZSU Genel Müdürlüğü'ne insan kaynağı tedarik etmektedir.

İZBELCOM

2001 yılı itibariyle kurulan İZBELCOM A.Ş., İZSU'nun ihtiyaç duyduğu; evsel ve sanayi atıksularının toplanması ve arıtılması, deniz, körfez, akarsu ve yüzey sularının temizlenmesi, çevre korunması ve iyileştirilmesi kapsamında su, toprak ve hava kirliliği, taşkın ve dere ıslah çalışmaları ile erozyonla mücadele çalışmalarında etüt, fizibilite, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, kontrol hizmetleri, kurulu tesislerin işletme ve bakımı konularında personel ve bilgi desteği vermektedir.

İZBETON

1980 yılında kurulmuş olan İZBETON A.Ş. İZSU Genel Müdürlüğü ile müştereken; İZSU adına doğal su kaynağından el değmeden şebeke kurarak İzmir halkına ucuz ve sağlıklı içme suyu sağlayan su satış istasyonlarının kurulması ve işletilmesi konusunda çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, makine parkı ve teknik donanımı sayesinde İzmir'in en büyük taahhüt firması olma özelliğini taşıyarak şu anda alt yapı ve sanat yapıları, ızgara, baca yükseltme imalat ve montajlarının yapılması konularında İZSU'ya yardımcı olmaktadır.

Ayrıca; İZSU Genel Müdürlüğü'nün ihale yolu ile hizmet aldığı taşeron şirketler bulunmaktadır. Bu şirketlerden de; sayaç okuma, açma kesme, temizlik işleri, kiralık araç sağlanması işlerinde hizmet alınmaktadır.

6.YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ

a) Yönetim Sistemi

İZSU Genel Müdürlüğü, toplumsal ve çevresel etkisi açısından büyük önem taşıyan bir kuruluştur. İZSU'nun yönetimi, 2560 Sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince aşağıdaki organlardan oluşmaktadır.

Genel Kurul :

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İZSU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu:

İZSU Yönetim Kurulu, bir Başkan ve beş üyeden oluşur. İZSU Yönetim Kurulu'nun Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Bugünkü haliyle Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı: Aziz KOCAOĞLU

Genel Müdür: Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN

Genel Müdür Yardımcısı: Dr. A.Suzan GÖK

Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Ömer Zafer ALKU

Yönetim Kurulu Üyesi: Doç. Dr. Gökdeniz NEŞER

Yönetim Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ

Denetçiler :

İki yıllık hizmet süreleri boyunca İZSU'nun işlemlerini denetlemek üzere, mesleki tecrübesi 10 yıldan az olmayan ve İZSU Genel Kurulunca seçilen iki denetçi görev yapmaktadır.

Barış KARCI - Ünal DAĞLI

Genel Müdür ve Yardımcıları :

İZSU Genel Müdürü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek üzere sayıları dördü geçmemek kaydıyla yeterli sayıda Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları da, Genel Müdürün teklifi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Dairelerin Başkan ve diğer görevlileri, yetkileri kapsamındaki hizmetleri mevzuat ve usullere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

İZSU Genel Müdürlüğü'nde; Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Sivil Savunma Uzmanı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri, 15 Daire Başkanı ve 57 Şube Müdürü birim amiri olarak görev yapmaktadır. Birim amirleri hizmetlerin yürütülmesi sürecinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile sürekli iletişim içinde olup, düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadırlar.

b) İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol mekanizması kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır.

01.01.2006 tarihi itibariyle tam olarak yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, kamu kaynaklarının; etkili, verimli ve ekonomik kullanımı gibi mali yönetim ilkelerini esas almaktadır. Bu çerçevede mali işlemlerin yapılması sürecinde işlemler, harcama yetkililerince mevzuata uygunluk açısından kontrol edilmektedir.

Genel Müdürlüğün Ön Mali Kontrole ilişkin işlemleri "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde harcama birimleri ve Mali Hizmetler Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamdaki temel kavram ve sorumluluklar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

İÇ KONTROL;

İç Kontrol Sistemi; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini; varlık ve kaynakların korunmasını; muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını; malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününden oluşturmaktadır.

İç Kontrolün Amacı;

Kaynakların etkili ve etkin bir şekilde ve idarenin amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, mevzuata uygunluğu sağlamak, idarenin faaliyetleri hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi sağlamak, idarenin varlıklarını korumak, yolsuzluk ve usulsüzlüğü önlemektir.

İç Kontrol Sorumluluğu:

İç Kontrol sürecinde;

≠ Üst Yönetici: Sistem kurma ve gözetim,
≠ Harcama Yetkilileri:Uygulama,
≠ Mali Hizmetler Birimi: Sistemin kurulması, standartların uygulanması çalışmaları, raporları ve ön mali kontrol,
≠ Muhasebe Yetkilisi: Kayıtların usulüne uygunluğu ve saydamlık,
≠ Gerçekleştirme Görevlileri: Uygulama görevlerinden sorumludur.

2012 yılı içerisinde, Genel Müdürlük bünyemizde İç Kontrol sistemi çalışmalarına süreç yaklaşımı ile başlanmış olup tüm harcama birimlerinin mevcut süreçleri tespit edilerek bununla ilgili İş akış Şemalarının çizimleri tamamlanmıştır.

Ön Malî Kontrol;

İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü kapsamaktadır. Harcama birimlerinde Ön Mali Kontrol süreç kontrolü ile yerine getirilmektedir.

Ön Mali Kontrol İç Kontrolün bir parçasıdır; bağlayıcı değildir, danışma ve önleyici niteliktedir. Ön mali kontrolde sorumluluk tek bir birimin (ön mali kontrol biriminin) değildir, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri ile paylaşılır.

İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'yla, kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin; stratejik öncelikler dikkate alınarak belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkeleri ile hesap verebilirlik ve mali saydamlık anlayışı temelinde, uluslararası iyi uygulama örnekleri de dikkate alınarak, yeniden yapılandırılması öngörülmüştür.

Bu yapılandırmaya ilişkin geçiş sürecinin 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmasıyla, 2008 yılı başından itibaren uluslararası standartlar ve AB uygulamaları ile uyumlu bir kamu iç mali kontrol sisteminin (KİMK) işlemeye başlaması hedeflenmiş ve bu hedef doğrultusunda da Genel Müdürlük bünyesinde gerekli çalışmalar yerine getirilmiştir.

Bu Kanunla kamu idare bütçeleri uluslararası tanımlamalara uygun olarak yeniden sınıflandırılmış, bütçenin kapsamı genişletilerek kamuda muhasebe birliği sağlanmış; stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, yönetsel hesap verebilirlik, iç kontrol, iç denetim, şeffaflık ve raporlama gibi çağdaş mali yönetim ve kontrol uygulamaları sisteme dahil edilmiştir.

Kurulan yeni sistemin en önemli unsurlarından birisi de, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi öngörülen "İç Denetim"dir. "Kurumun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti" şeklinde tanımlanan "iç denetim" kavramı, yukarıda sözü edilen Kanunun 63. maddesiyle mali yönetim ve kontrol sistemine dahil edilmiştir.

İç Denetim Biriminin Örgüt Yapısı

5018 Sayılı Kanunun 65.maddesi gereğince hazırlanan ve 12.07.2006 Tarih ve 26226 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve 05.10.2006 Tarih ve 26310 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ihdas edilip norm kadrolarına eklenmiş sayılan iç denetçi kadrolarına 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun geçici 5. Maddesi çerçevesinde yapılan atamalarda halihazırda 3 İç Denetçi ile iç denetim faaliyeti doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak, birim statüsünde olmadan yürütülmektedir.
Kurumda görevli iç denetçiler sertifika eğitimlerini tamamlamalarını takiben yaptıkları hazırlık çalışmaları sonrasında bugüne kadar 2008-2010 dönemini kapsayan uc yıllık denetim planının her bir yılına ilişkin hazırlanan denetim programları ile 2011-2013 donemi denetim planının 2012 yılı denetim programına uygun doğrultuda denetimlerini eksiksiz olarak yerine getirmişlerdir.

İç Denetçinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İç denetçiler, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen görevleri yürütmektedir. Bu görevler; nesnel risk analizlerine dayanarak İZSU Genel Müdürlüğü'nün yönetim ve kontrol yapısını değerlendirmek, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, İZSU Genel Müdürlüğü'nün harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak, denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek, denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre

soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, üst yöneticiye bildirmek, üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek, suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmektir.
İç Denetçilerin Yetkileri; denetim konusuyla ilgili her türlü bilgi ve belge ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek, denetlenen personelden yazılı ve sözlü bilgi istemek, denetimin gerektirdiği araç, gereç ve diğer olanaklardan yararlanmak, denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticiye bildirmektir.
İç Denetçilerin sorumlulukları; mevzuata, denetim standartlarına ve mesleki ahlak kurallarına uygun hareket etmek, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek, iç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan ve verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumlarda, birim statüsünde ise iç denetim birimi yöneticisini (başkanını) haberdar etmek, değilse durumu iç denetçilerle görüşerek değerlendirmek, gerekiyorsa üst yöneticiyi bilgilendirmektir. Denetim raporlarını kanıtlara dayandırmak, değerlendirmelerinde objektif olmak, denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumaktır.

İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri

Genel Müdürlükte yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinde amaç; faaliyetlerin, stratejik plana, performans programına ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamaktır.

İç denetim faaliyeti sonucunda, varlıkların güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgariye indirilmesi için, hedeflere ulaşılmada karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

İç denetim faaliyetinin başarıya ulaşması konusundaki en önemli unsurlardan birisi olan yönetim desteğinin en üst düzeyde sağlanması ve bunun daimi kılınması amacıyla, iç denetimin üst düzey yöneticilerce anlaşılması ve sahiplenilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

İç denetim faaliyetinin tanıtımı ve uygulanmasına yönelik olarak bu güne kadar üst yönetici ve birim yöneticileri düzeyinde gerçekleştirilen çalışmaların tüm kurum personelini kapsayacak şekilde sürdürülerek hem iç denetim konusundaki farkındalığın arttırılması, hem de idare çalışmalarına değer katmayı amaçlayan iç denetim faaliyetinin; kurumsal düzeyde tanınması, anlaşılması ve öncelikli amacının suç ve suçlu aramak olmadığının özellikle vurgulanarak iç denetim uygulamalarının personel nezdinde genel kabul görmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
İç Denetim faaliyeti kapsamında yapılan danışmanlık hizmetinde ise; risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmek konusunda birimlerimize yardımcı olmak ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin, işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.

Temel Politikalar ve Öncelikler

İç denetimin sağlıklı ve amacına uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla; idare içerisinde iç denetim kapsamının ve iç denetçilerle idare çalışanlarının iç denetimdeki rollerinin açıklığa kavuşturulması ve genel kabul görmesinin sağlanması, öncelikle idarelerin teşkilat yapısı ve iş süreçleri, yönetim ve kontrol süreçlerinin gözden geçirilmesi, idarenin risk yönetim süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi, denetim kaynağı kullanımında risk odaklı yaklaşımın benimsenmesi, üst yönetici tarafından onaylanan 2011-2013 dönemi İç Denetim Planı gereği 2012 yılı denetim programının gerçekleştirilmesinin akabinde 2012 denetim programının gereği için üst yönetici onayına sunulması, iç Denetim Planı ve Programlarında; sistem denetimi, uygunluk denetimi, mali denetim, bilgi teknolojilerin denetimi ve performans denetimi sıralamasının esas alınması; denetlenecek süreç/birimin özellik ve yapısı dikkate alınarak hangi denetim uygulamasının öncelik kazanacağı öngörülerek sıralamanın bu yönde etkili bir şekilde değiştirilerek uygulanabilirlik kazandırılması, 2012 yılı denetim programı dahilinde mevcut olan tüm denetim kaynağı değerlendirilerek belirlenen denetim alanlarında denetimlerin tamamlanmasıyla, diğer alanların denetimi bakımından alınan sonuçlar ve edinilen tecrübelerin değerlendirilmesi, denetim faaliyetlerinde idarenin yönetim ve kontrol süreçlerindeki zayıflıkların veya geliştirilmesi gereken alanların ortaya çıkarılması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla idare yöneticileriyle birlikte ortak aksiyon planlarının hazırlanması, iç denetim faaliyetleri sonucunda, idare ile mutabık kalınan ve aksiyon planına bağlanan önerilerin planlandığı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin izlenmesidir.

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

a- Denetim Faaliyetleri

2012 Denetim Programı gereğince;
1. Emlak ve Kamulaştırma Hizmetleriyle İlgili İş ve İşlemler,
2. Araç Sevk ve Bakım Faaliyetleriyle İlgili İş ve İşlemler,
3. Koruma ve Güvenlik Hizmetleriyle İlgili İş ve İşlemler,
4. Su Proje Faaliyetleriyle İlgili İş ve İşlemler
5. Atık su Pompa Tesisleriyle İlgili Hizmet, Faaliyet İş ve İşlemleri
6. Yeraltı Suyu Üretim Faaliyetleriyle İlgili İş ve İşlemleri

süreçlerinin (Süreç/Birim) denetimi gerçekleştirilmiştir.

b- Danışmanlık ve Diğer Faaliyetler

≠2012 yılı içerisinde yürütülen iç denetim çalışmaları sırasında; idarenin geneline yönelik bazı önemli görülebilecek sorunların tespit olunması ve tespit olunan bu hususların kurumun genelini ilgilendirmesi nedeniyle söz konusu bu tespitlere iç denetim raporu kapsamında yer yer değinilmekle birlikte, idare genelinde bir bütünlük anlayışı içerisinde hareket edilebilmesi ve işleyişle ilgili müşterek kriterler geliştirilerek koordinasyonun sağlanabilmesi bakımından gereği için

danışmanlık faaliyeti kapsamında inceleme raporları tanzim olunarak üst yönetici - İzsu Genel Müdürlük Makamı'na sunulmuştur.

≠2012 yılı içerisinde idarenin teşkilat yapısı içerindeki değişikliklere bağlı olarak denetim evreni revizyonu güncelleme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede 9 yeni ana sürecin ilgili müdürlükleriyle bağlantıya geçilmiş ve risk kriter puanlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar halen sürmektedir.

≠İZSU Genel Müdürlüğünün aylık koordinasyon toplantılarına zaman zaman katılmak suretiyle idari faaliyet ve uygulamalarla bütünlük sağlanmıştır.

≠İZSU Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği hazırlık çalışmaları amacıyla oluşturulan komisyonda bir iç denetçi görev almıştır.

≠Genel Müdürlük Makamı'nın istekleri doğrultusunda idare yararına ve idareyi ilgilendiren muhtelif konularda görüşme ve toplantılara katılmak suretiyle katkıda bulunulmuştur.

Performans Bilgileri

a- Kalite Güvence Değerlendirmeleri

İç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ile kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında öz değerlendirme yapılmıştır.

Bu çerçevede;

- İç Denetim Yönergesi 2008 yılında üst yönetici tarafından onaylanarak ilk haliyle yürürlüğe girmişse de, takip eden süreç te İDKK'nın gerekli uyarıları dikkate alınarak yönerge üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak üst yönetici onayına sunulmuş ve 21.01.2009 tarihinde değişik haliyle yürürlüğe girmiştir.
- İç denetim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygunluğu yönüyle; İç denetimin planlanması çalışmaları ile ilgili olarak, İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki iş ve işlem süreçlerine ilişkin önem düzeyi yüksek riskli alanların belirlenmesi esas alınmıştır. "Denetim Evreni" tanımlamasının yapılmasına müteakip, Denetim Evreninin, birim, faaliyet, süreç, proje esası üzerinden değerlendirilmesi suretiyle idare faaliyetlerinin denetlenebilir bölümlere ayrılmasıyla, en son 2009 yılında teşkilat yapısındaki kısmi değişimler de dikkate alınıp denetim evreninde gerekli revizyon yapılarak, denetim alanı İZSU Genel Müdürlüğü'nün temel iç denetim alanları olarak belirlenmiştir. Denetim alanları üzerinde yapısal risk düzeylerini belirleme çalışmaları yapılmıştır. Kurumun faaliyetlerine etki eden altı risk kriteri tanımlanmıştır. Denetim alanlarına yönelik yapısal risk kriterleri tanımlandıktan sonra, denetim alanlarının bu risk kriterleri karşısındaki durumu puanlamaya tabi tutulup ilgili birimlerinde görüşü alınarak değerlendirilmek suretiyle yapısal risk düzeyleri kümülatif yönteme göre belirlenmiş ve risk sıralaması yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde de idarenin teşkilat yapısındaki değişikliklere bağlı olarak denetim evreni revizyonu çalışmalarına başlanmıştır. Halihazırda bu çalışmalar sürmektedir.

Bu çalışmalar neticesinde hazırlanan 2012 Yılı İç Denetim Programı, İZSU Genel Müdürü tarafından onaylanmış ve programa uygun doğrultuda gerekli iç denetim çalışmaları eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. İzlenen bu çalışma ve prosedür standartlara uygun olarak gerçekleşmiştir. Program kapsamında yapılan denetim ile ilgili olarak, iç denetim uygulamaları İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan "İç Denetim Rehberi"ne uygun olarak gerçekleşmesi için azami gayret ve özen gösterilmiştir. Bu çerçevede; denetimin kapsamı ve amacının belirlenmesi, temel risklerin ortaya konulması ve tanımlanması, iş süreçlerinin belirlenmesi, ön hazırlık çalışmaları, ilgililerle görüşmeler, her çalışmanın "çalışma kağıtları" ile belgelenmesi ve saklanması, risk kontrol matrisinin düzenlenmesi, "açılış toplantısı" düzenlenerek denetlenen birim ile denetimin kapsamı, amacı, beklentiler gibi hususların görüşülmesi, "bireysel iş programı" nın hazırlanması ve onaylanması, belirlenen testlerin bizzat sahada test edilmesi, elde edilen bulguların analitik yöntem ile analiz edilmesi ve "bulgu formu" ile belgelenmesi, bulguların denetlenen birime gönderilerek cevap alınması, bulgu ve önerilerin yanlış anlama ve yorumlanmasını önlemeye ve bir anlaşma zemini oluşturmaya yönelik olarak denetlenen birim ile bir "kapanış toplantısı" nda bir araya gelinerek

müzakere edilmesi, bulguların bir kere daha "taslak rapor" ile denetlenen birime gönderilmesi, nihai olarak raporlanması sürecinde sürekli olarak anılan rehber ve standartlar göz önünde bulundurulmuştur. Rapor yazımında doğruluk, tarafsızlık, açıklık, ölçülebilirlik, kısalık (özlü), yapıcılık, tamlık, zamanlılık, kararlılık (çözüm) ilkelerine riayet edilmesi konusunda azami özen gösterilmiştir.
- İç denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ve iyileşmeleri destekleme düzeyi yönüyle; 2012 yılı Denetim Programı kapsamında gerçekleştirilen iç denetimler neticesinde yapılan öneriler ve rehberlik ile bu süreçlerde kalıcı iyileşmeler sağlandığı düşünülmektedir.
- Faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli mesleki özen ve dikkat gösterilmiştir. Ayrıca, denetim faaliyetlerinde meslek ahlak ilkeleri olan dürüstlük, objektiflik, gizlilik ve yetkinlik sürekli olarak göz önünde bulundurulmuştur.
- Performans göstergeleri yönüyle; Genel olarak iç denetim faaliyetleriyle ilgili, 2011-2013 yılı Denetim Planı gereğince; 2012 yılı İç Denetim Programı doğrultusunda iç denetimlerin sonuçlandırılması nedeniyle, belirlenen ve Kurum Stratejik Planında yer alan göstergelerimize göre değerlendirmelerin ileriki yıllarda yapılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.

b- Diğer Değerlendirmeler

2011-2013 Denetim Planının 2. Aşamasını teşkil eden 2012 yılı Denetim Programı yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak amacına uygun doğrultuda sonuçlandırılmıştır. Özellikle iç denetimi yapılan süreçlerin ilgili birimlerinde görev yapan yönetici kademesindeki görevliler ile diğer yetkili personelin iç denetim metodolojisinin beraberinde getirdiği yapıcı yaklaşım ve sorunları gidermeye yönelik ortaya koyduğu ivme ve kattığı artı değer, sistemin işleyişine sağladığı fayda, vb gibi hususlar yapılan görüşme ve değerlendirmelerde açık ve net ortaya konmaktadır.

İdarenin Riskleri, Risk Yönetimi, Yönetim ve Kontrol İstemleri

İç denetim faaliyetlerini planlamak, öncelikleri belirlemek ve çalışmalarında kullanmak üzere gerekli risk çalışmaları yapılmıştır. Bu çerçevede, süreçlerle ilgili temel riskler belirlenmiştir. Ayrıca, 2012 yılında yapılan denetimlerle ilgili olarak, iç denetçiler denetim alanlarında riskleri belirleyerek kontrol faaliyetlerinin yeterliliği ve etkiliğini test etmişlerdir.

Eğitim Faaliyetleri

2012 yılı içerisinde değişik tarihlerde düzenlenen eğitim seminer ve konferanslarına iç denetçiler dönüşümlü olarak katılmıştır. Bu eğitim seminerleri aşağıda belirtilmiştir;

≠ Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2012 tarih ve B.07.0.BMK.0.32-300/1089 sayılı yazısı ile bildirildiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında "Kamu İç Mali Kontrol Sistemi"nin oluşturulması, geliştirilmesi ve uyumlaştırılması amacıyla 12.07.2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin" 33 ncü maddesi uyarınca, iç denetçilerin her üç yılda bir yüz saatlik eğitim süresinin otuz saatlik kısmı kurulun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca verileceği belirtildiğinden; Maliye Bakanlığı tarafından merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde koordinasyon, eğitim ve rehberlik hizmeti verilebilmesi amacıyla 24 Mart - 9 Nisan/2012 tarihleri arasında üçer gün süreyle dört grup halinde iç denetçilere Antalya'da eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu bu eğitime idaremiz iç denetçileri dönüşümlü olarak katılmışlardır.

≠ Avrupa Birliği ülkeleri Sayıştay Başkanlıkları ile Avrupa Birliği Bakanlığının ortaklaşa düzenledikleri iç denetim ve dış denetimin koordinasyonu ve birlikteliği konulu konferansa bir iç denetçi katılmıştır.

≠ Ege Belediyeler Birliği tarafından 16-17-18 Kasım 2012 tarihlerinde kurum geneline yönelik olarak Tepekule Kongre ve sergi Salonunda düzenlenen üç tam gün süreli Kamu İhale Mevzuatı konusundaki eğitim programına 2 iç denetçi katılmıştır.

İç denetim faaliyetlerimizin İç Denetim Koordinasyon Kurulu düzenlemeleri ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesine özen gösterilmektedir. İç denetim alt yapı ve kuruluş çalışmalarına tüm iç denetçilerin eğitiminin sona ermesini takiben bilfiil Temmuz-2008'de başlanmasına rağmen yönerge, denetim evreni, yapısal risk değerlendirme çalışmaları ile üç yıllık plan, yıllık program ve benzeri alt yapı çalışmaları hızla tamamlanıp bilahare 2008 yılı iç denetim programı kapsamında pilot bir iç denetim gerçekleştirilmiş, 2008–2010 donemi Denetim Planı uyarınca 2009 ve 2010 yılı İç Denetim Programları gereği yapılması gereken iç denetimler ile 2011-2013 donemi Denetim Planı gereği en son 2012 yılı denetim programı doğrultusunda yapılması öngörülen denetimler sonuçlandırılmış, dolayısıyla iç denetim çalışmalarında plan ve programlara uygun doğrultuda bugüne kadar yapılması gereken bütün denetimler tamamlanarak önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



II-Amaç ve Hedefler

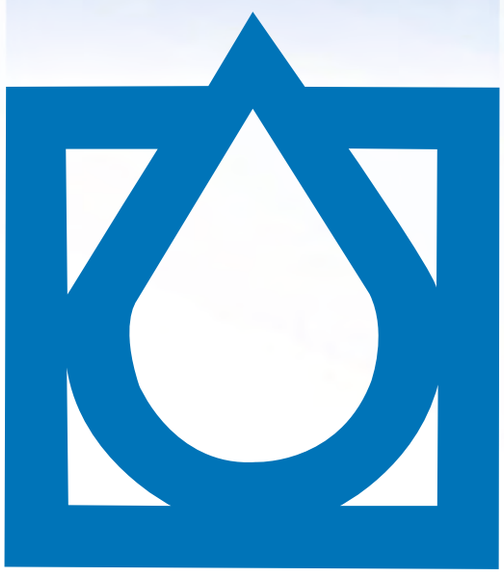

İZSU

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ

1. STRATEJİK AMAÇLAR

1.İzmir Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde; yeni su kaynakları araştırıp bularak mevcut su kaynaklarının rehabilitasyonunu sağlayarak, su kaynaklarının kirlenmesini ve su kayıplarını önleyerek sağlıklı ve yeterli su temin etmek, arıtmak ve dağıtmak.

2.İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde oluşan evsel ve endüstriyel atıksuları doğaya ve çevreye zarar vermeden, yüzeysel (körfez, su havzaları, dereler,vs) suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyerek toplamak, bertaraf etmek ve yağmursularını toplayarak uzaklaştırmak, yağmur sonrası yaşanan sorunlarını ve dere ıslahları ile ilgili sel baskınlarını önlemek .

3.Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ilgili mevzuata uygun biçimde artırabilmek için atıkları değerlendirip ekonomiye kazandırarak kamu gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunmak, çevreyi ve doğal yaşam alanlarını korumak, atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyu kalitesini yükseltmek ve etkin kullanmak.

4.Çağdaş gereksinimlere uygun kalite ve gelişmişlikte bir kurumsal çizgiyi yakalayabilmek için; verimlilik ve hizmet kalitesini arttırarak, kurum yapı, işleyiş ve kapasitesine ilişkin unsurları sürekli izleyip değerlendirerek, gerekli önlemleri alıp, iyileştirmelerini yaparak kurumsal gelişim ve etkin yönetimi sürdürülebilir kılmak.

2. STRATEJİK AMAÇLARA BAĞLI HEDEFLER

AMAÇ 1: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI DAHİLİNDE: YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.

HEDEF 1: Mevcut su havzalarını koruyarak ve yeni su kaynakları bularak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak.

FAALİYETLER:

1.İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması

2.Yeni Yüzeysel Su Kaynakları

3.Çamlı Barajı İsale Hattı Arıtma Tesisi

4.Değirmendere Barajı İsale Hattı İçmesuyu Arıtma Tesisi

5.Tuzlu Su Arıtma Tesisleri

6.İçmesuyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi

7.Gördes Barajı İçmesuyu Sistemi (Arıtma Tesisi)

8.Sarıkız (Gördes) İçmesuyu Arıtma Tesisi

9.Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisi (yenileme)

10.Balçova İçmesuyu Arıtma Tesisi (ilave üniteler)

11.Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini

12.Yeraltı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini Oluşturmak ve İyileştşrmek Çalışmaları

13.Yüzeysel Sularda Sağlıklı İçmesuyu Üretimi

14.Çamlı Baraj Havzası Bilimsel Etüdü

15.Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı ağaçlandırılması, bakım ve koruma işi

16.İçmesuyu Havzalarının koruma ve kontrol çalışmaları

17.Kamulaştırmalar

HEDEF 2: Su dağıtım hatlarını ve su tesislerini hijyenik biçimde ve sürekli çalışır halde tutmak ve modernleştirmek.

FAALİYETLER:

1.İzmir İçmesuyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi

2.Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışması

3.Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması

4.Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerindeki SCADA Sistemi Tesisi Etmek

5.Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışması

HEDEF 3: Su dağıtım sistemini sürekli izlemek ve enerji hatlarının tasarruflu ve sorunsuz biçimde çalışmasını sağlamak.

FAALİYETLER:

4. Atölye Bakım Onarım Çalışmaları

HEDEF 4: Su kaçaklarını en aza indirerek kaynak arttırımını sağlamak.

FAALİYETLER:

1.Muhtelif içmesuyu hatlarının revizyonu ve boru alımı

2.5216 sayılı yasa ile ilave edilen ilçe ve beldelerde uzaktan okuma sistemi kurulması

3.İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde su arıza takiplerinin yapılması

4.İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde su kaçağı azaltma çalışmaları

5.Abone Bilgi yönetim sistemi (ABYS), SCADA ve uzaktan okuma sistemi entegrasyon yazılımı işi

6.İçmesuyu şebeke ve isale hattı

7.Su depoları

HEDEF 5: Tarihi su yapılarını restore ederek, kente kazandırmak

FAALİYETLER:

2.Halkapınar Genel Müdürlük Binası Açık Hava Müzesi Restorasyonu

AMAÇ 2: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER, VS) SULARIN VE YERALTI SULARININ KİR-LENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BER-TARAF ETMEK VE YAĞMURSULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARINI VE DERE ISLAHLARI İLE İLGİLİ SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK .

HEDEF 1: Kanalizasyon hatları ve üzerindeki tesislerin bakım,onarım,temizlik ve yenileme işlerini yapmak.

FAALİYETLER:

10.Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri

11.Atıksu Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları

13.Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Master Planı

14.İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi

15.İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi

16.İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi

17.İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi

18.İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması

HEDEF 2: Yağmursuyu kanalları yapmak ve mevcut hatların yenileme, bakım, onarım ve temizliklerini, yapmak

FAALİYETLER:

4.İzmir İli Konak, Bornova ve Karşıyaka İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi

5.İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı işi

12.Yağmursuyu Toplama Sistemleri

13.İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi

14.İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi

HEDEF 3: Dere ıslahı ve temizliği çalışmalarını yürütmek.

FAALİYETLER:

1.Büyükşehir Belediye Kapsamındaki Mevcut Dere Yataklarının Temizlikleri İçin İş Makinesi ve İş Gücü Temini ve Dere Islahının Yapılması

2.Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)

HEDEF4: Atıksu arıtma tesisleri inşaa ederek,uygun maliyetle ve ilgili mevzuata göre işlemek.

FAALİYETLER:

1.Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

2.Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi

3.Merkezi Scada Sistemi İşi

4.Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları

HEDEF 5: İzmir körfezini temizlemek,korumak ve körfeze kirlilik taşıyan su havzalarını izlemek

FAALİYETLER:

1.Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi

AMAÇ 3: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK-LARININ KULLANIMINI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN BİÇİMDE ARTIRABİLMEK İÇİN ATIK-LARI DEĞERLENDİRİP EKONOMİYE KAZAN-DIRARAK KAMU GELİRLERİNİN ARTI-RILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK, ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SUYU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE ETKİN KULLANMAK.

HEDEF 1:Atıksu arıtma çamurlarını yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirmek.

1.Çamur Çürütme Tesisi İnşaatı İşi

HEDEF 2: Arıtma tesisleri çıkış sularının kullanılabileceği iş alanlarının fizibilite çalışmalarını yapmak ve geliştirmek.

FAALİYETLER:

1.Çamur Yönetimi Master Planı

3.A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi

AMAÇ 4: ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL ÇİZGİYİ YAKALIYABİLMEK İÇİN; VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK, KURUM YAPI, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN UNSURLARISÜREKLİ İZLEYİP DEĞERLEN-DİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP, İYİLEŞTİR-MELERİNİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK.

HEDEF 1: Kurumun fiziksel kaynaklarının verimli ve gereksinimlere uygun biçimde kullanılmasına ve yenilenmesini sağlamak.

FAALİYETLER:

1. Hizmet Binaları, Tesis Yap

3. Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları

4.Akaryakıt Alımı

5.Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri

6.Hizmet Aracı Kiralaması

HEDEF 2: Beşeri kaynakların verimlilik, kalite ve etkinliğini arttırmak

FAALİYETLER:

1.Proje Yapım Kontrollüğü-Müşavirlik

2.Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler

3.Personelin Doğru Yerlerde İstihdamın Sağlanması

4.Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi

5.Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi

6.Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme.

9.Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı

HEDEF 3: Kurumun hizmet alıcılarının ve abonelerin gereksinimleri yönünde en kısa zamanda ve etkili biçimde çözümler üretilmesini sağlamak.

FAALİYETLER:

1.Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi

2.Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi

3.Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı

4.Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı

5.Sayaç Kontrol İşlemleri

6.Açma Kesme İşlemleri

7.Atık Su-köp (Katılım Ödeme Payları)İşlemler

8.Abonelik Oluşturma, Su Bağlama

9.Kanal Katılım İşleri

10.Sayaç Okuma İşlemleri

HEDEF 4: Destekleyici hizmetler alanındaki gereksinimleri çağdaş standartlara uygun biçimde karşılamak ve geliştirmek.

FAALİYETLER:

2.Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması

3.Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirtilen Şekilde Techizat Alınması

4.5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması

5.Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması

6.Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi

7.Tahtalı Baraj Havzasının Korunması

8.Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güvenlik. İzin Belgesinin. Alınması

9.İdare Tarafından ve Yahut İdare Aleyhine Açılan Davalarla, İcra Takiplerini İdarenin Vekili Olarak, Adli İdari ve Mali Kaza Mercileri, Hakem veya Hakem Heyeti Nezdinde Takiple Sonuçlanmasını Sağlamak, Bunların Dosyalarını Düzenlemek, Hukuki Konular Hakkında Mütalaa Vermek,Hukuki Konulara İlişkin İşlemleri Yapmak,Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Katılmak,İlgili Daire Başkanlıklarınca Hazırlanan Tüzük,Yönetmelik,Sözleşme ve Şartname Tasarılarını İncelemek v.s.

HEDEF 5: Çağdaş yönetim tekniklerini ve teknolojileri kurumun gereksinimlerine uygun biçimde kullanarak, verimli ve ekonomik mali kaynak yönetimini sağlayarak yönetimde etkinliği geliştirmek

FAALİYETLER:

1.Bütçe Yönetimi

2.Finansman Yönetimi

3.Ön mali Kontrol Faaliyetleri

4.Stratejik Yönetim Faaliyetleri

5.Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

6.Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri

7.Hakediş ve Kesin Hesap İşleri

8.Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin Kurulması

B. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

İdaremizin temel politikası, 24 saat kesintisiz ve standartlara uygun su temini ile kanal ve dere temizliklerinin en iyi şekilde yapılması, su kaçaklarının azaltılması, çağdaş ve teknolojiye uygun olarak hizmet verilmesi ve zaman içinde AB Uyum Yasaları'na paralellik kurarak hizmet kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasıdır.

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



III-Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

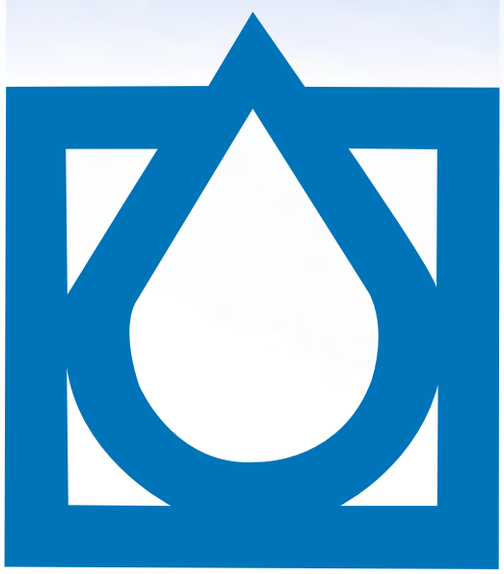

İZSU

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



A-Mali Bilgiler

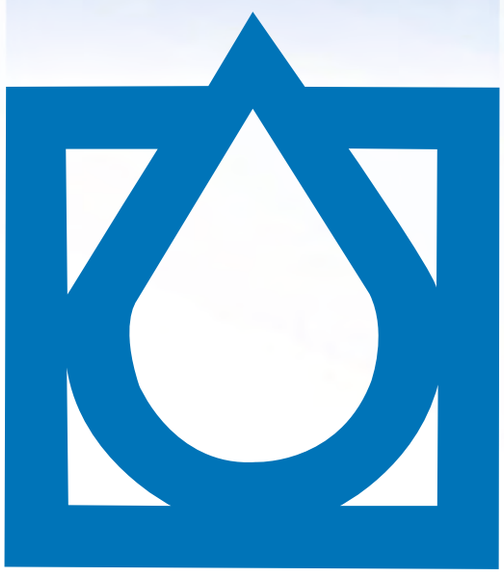

İZSU

III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A.MALİ BİLGİLER

1.Bütçe Uygulama Sonuçları

2007 - 2012 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GELİRLERİ ANALİZİ VE GRAFİĞİ (RED VE İADELER DAHİL)

YILLAR	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	TOPLAM NET BÜTÇE GELİRİ	GERÇEKLEŞEN GELİR ARTIŞ/DÜŞÜŞ %	GERÇEKLEŞME ORANI %
2007	409.460.000,00	406.176.370,30	8%	99%
2008	481.648.000,00	384.906.866,40	-5%	80%
2009	905.165.000,00	737.324.853,75	92%	81%
2010	524.000.000,00	504.980.193,14	-32%	96%
2011	618.740.000,00	658.296.133,67	30%	106%
2012	657.722.000,00	679.485.603,80	3%	103%

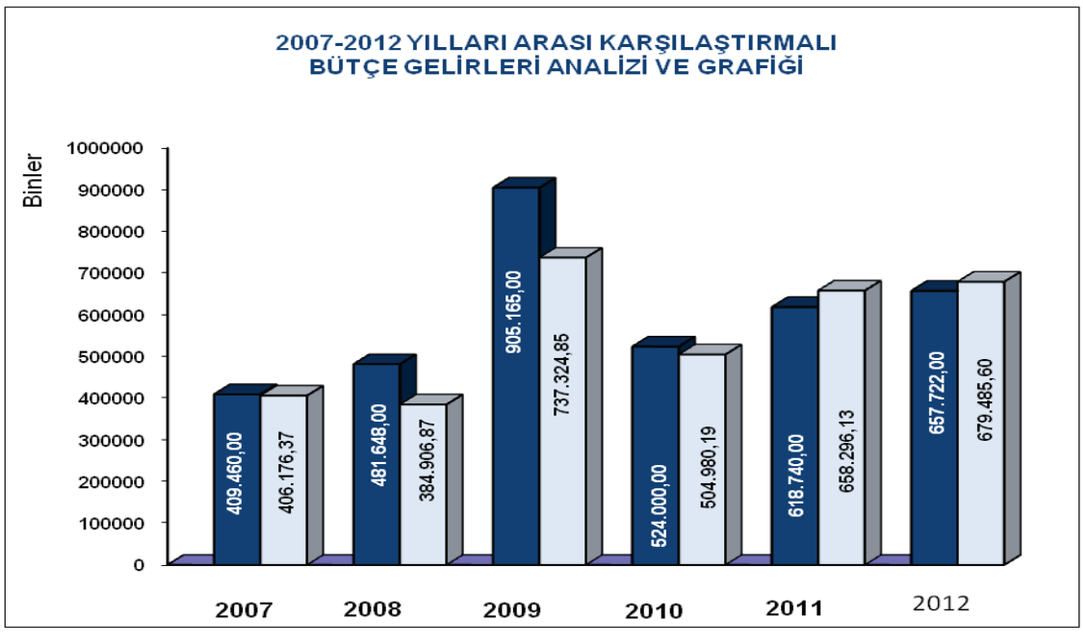

İdaremizin yıllar itibari ile gerçekleşen net bütçe gelirleri göz önüne alındığında, 2008 yılının 2007yılına göre %5 düşüşle,2009 yılının 2008 yılına göre %92 artışla 2010 yılının 2009 yılına göre %32 azalışla, 2011 yılının 2010 yılına göre %30 artışla, 2012 yılının 2011 yılına göre %3 artışla,2012 mali yılında net 679.486.999,23 TL bütçe geliri tahsil edildiği görülmüştür.

Yıllar itibariyle bütçeyle tahmin edilene göre gerçekleşme yüzdeleri 2007 yılı için %99, 2008 yılı için %80,,2009 yılı için%81,2010 yılı için %96, 2011 yılı için %106, 2012 için %103' dür.

2007 - 2012 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GİDERLERİ ANALİZİ VE GRAFİĞİ

YILLAR	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	TOPLAM BÜTÇE GİDERİ	GERÇEKLEŞEN GİDER ARTIŞ/DÜŞÜŞ %	GERÇEKLEŞME ORANI %
2007	737.321.261,13	425.856.116,87	4%	58%
2008	750.004.633,88	531.722.324,83	116%	71%
2009	1.160.767.284,02	857.582.386,97	25%	74%
2010	917.583.717,19	484.437.226,32	61%	53%
2011	902.163.509,09	686.879.973,07	42%	76%
2012	1.109.962.200,00	733.016.693,52	7%	66%

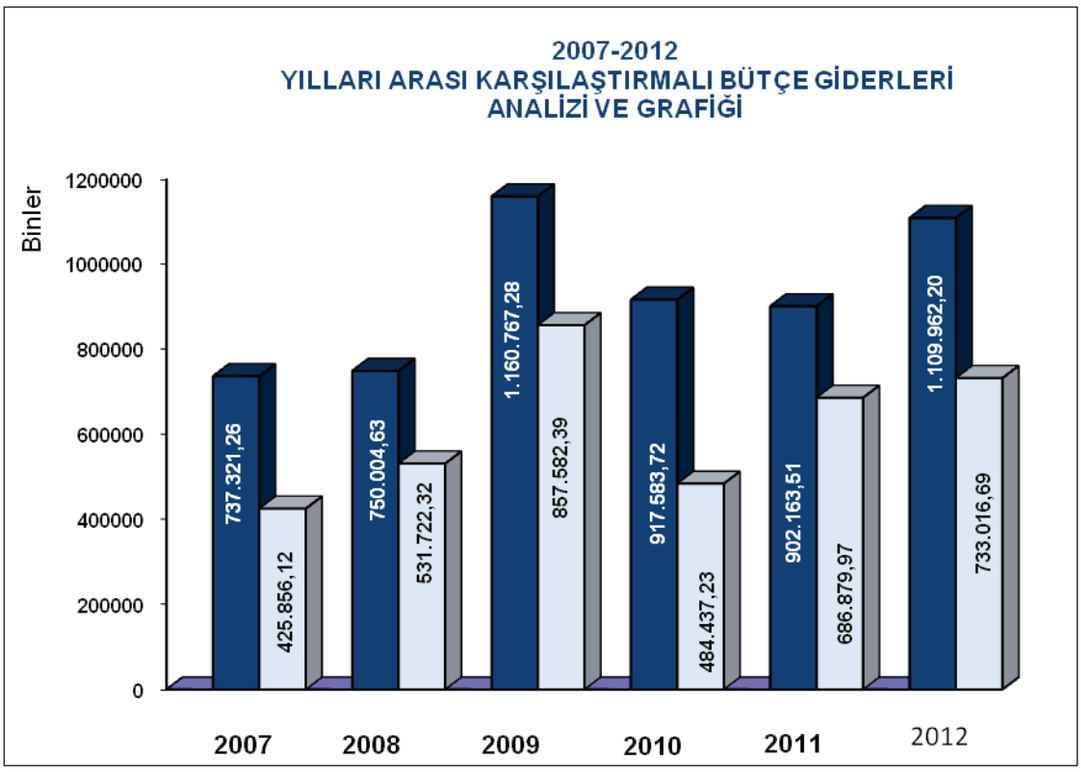

İdaremizin yıllar itibari ile gerçekleşen net bütçe giderleri göz önüne alındığında, 2008 yılının 2007 yılına göre % 25 artışla, 2009 yılının 2008 yılına göre %61 artışla,2010 yılının 2009 yılına göre %44 azalışla 2011 yılının 2010 yılına göre %42 artışla,2012 yılının 2011 yılına göre %7 artışla, 2012 mali yılında toplam 733.016.693,52 TL bütçe gideri gerçekleştiği görülmüştür.

Yıllar itibariyle net bütçe ödeneğine göre gerçekleşme yüzdeleri 2007 yılı için %58, 2008 yılı için %71, 2009 yılı için %74, 2010 yılı için %53, 2011 yılı için %76, 2012 yılı için %66'dır.

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ

Kurumu : İZSU Genel Müdürlüğü

Yılı : 2012

KURUMSAL KODU				BİRİM ADI	2012 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	2012 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ	2012 YILI GERÇ. %	BÜTÇE GİDERİ GENEL TOP.İÇİNDE %
I	II	III	IV					
46	35	03	02	ÖZEL KALEM	3.952.000,00	2.858.334,24	72%	0%
46	35	03	04	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8.143.600,00	5.348.351,53	66%	1%
46	35	03	05	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	129.847.900,00	100.369.076,21	77%	14%
46	35	03	10	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	7.605.200,00	6.482.214,95	85%	1%
46	35	03	11	MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	53.267.400,00	50.139.016,82	94%	7%
46	35	03	20	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	462.400,00	188.939,60	41%	0%
46	35	03	23	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	119.957.378,00	78.597.179,98	66%	11%
46	35	03	24	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	1.486.600,00	1.278.750,96	86%	0%
46	35	03	30	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	33.955.800,00	23.720.985,94	70%	3%
46	35	03	31	ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	57.458.540,00	41.788.679,75	73%	6%
46	35	03	32	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	21.338.400,00	16.606.729,33	78%	2%
46	35	03	34	ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	11.391.677,83	7.540.100,41	66%	1%
46	35	03	35	KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	185.902.200,00	75.270.716,15	40%	10%
46	35	03	38	SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	87.523.700,00	72.225.974,73	83%	10%
46	35	03	39	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	316.902.360,00	196.734.982,75	62%	27%
46	35	03	40	TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.965.700,00	1.371.970,99	70%	0%
46	35	03	41	SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	36.428.300,00	27.270.933,56	75%	4%
46	35	03	42	KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ	23.254.200,00	22.945.255,30	99%	3%
46	35	03	45	PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	9.117.844,17	2.278.500,32	25%	0%
				BÜTÇE GİDER TOPLAMI	1.109.962.200,00	733.016.693,52	66%	100%

2012 Mali yılında 1.109.962.200,00 TL. Net bütçe ödeneği ve gerçekleşen 733.016.693,52 TL. Bütçe giderinin, harcama birimleri itibariyle dağılımı ve gerçekleşme yüzdeleri yukarıda yer alan **Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırması Tablosunda** yer almaktadır.

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamaya, ilgili tabloların altında yer verilmiştir.

3.Mali Denetim Sonuçları

Mali denetim sitemi genel olarak 2 başlık altında ele alınabilir.

- İç denetim sistemi
- Dış denetim

2012 Mali Yılı Hesaplarının Mali Denetimi, İdaremiz denetçileri ve Meclis Denetim Komisyonu tarafından sürdürülmektedir.

İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen iç kontrol sistemi uygulaması kurumumuzda dört başlık altında tasnif edilebilir.

Harcama birimleri bünyesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında süreç kontrolleri şeklinde yapılan ön mali kontrol uygulaması.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen

- ≠ Muhasebe Uygulaması
- ≠ Ön Mali Kontrol Uygulaması
- ≠ Kurum İçi Denetçilerle Yapılacak İç Denetim

Harcama birimleri ile ön mali kontrol uygulaması 'Süreç Kontrolü' şeklinde yürütülmektedir; bu çerçevede Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında kurulan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü, 5018 sayılı yasa gereği çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca meclis denetim komisyonu tarafından inceleme yapılmış ve rapor haline getirilmiştir.

Dış Denetim

Kurum dış mali denetimini yapmakla yetkili Sayıştay Başkanlığının 2012 yılı denetim programı doğrultusunda 2012 mali yılına ilişkin kurum harcamalarımız Sayıştay denetçilerince denetlenmiştir.

Henüz sorgu maddeleri idaremize tebliğ edilmemiştir.

İş ve işlemlerin yürütümüne ilişkin; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından 2010-2012 yıllarını kapsayan denetim yapılmış denetleme sonucu tenkit ve tavsiyeler değerlendirilmeye alınmıştır.

2012 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

KURUMU : İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

HESAP	EKONOMİK KOD					GİDERİN TÜRÜ	CARİ YIL(2012)	HESAP	EKONOMİK KOD					GELİRİN TÜRÜ	CARİ YIL(2012)
KODU	KOD1	KOD2	KOD3	KOD4	KOD5		TL	KODU	KOD1	KOD2	KOD3	KOD4	KOD5		TL
630	01	00	00	00	00	PERSONEL GİDERLERİ	80.213.055,71	600	03	00	00	00	00	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	531.916.325,70
630	02	00	00	00	00	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	13.179.132,27	600	04	00	00	00	00	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	53.209,98
630	03	00	00	00	00	MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ	240.631.429,13	600	05	00	00	00	00	DİĞER GELİRLER	97.457.999,85
630	04	00	00	00	00	FAİZ GİDERLERİ	290.578,87	600	11	00	00	00	00	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİM GELİRLERİ	994.628,67
630	05	00	00	00	00	CARİ TRANSFERLER	73.879.531,38								
630	11	00	00	00	00	DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ	307.709,57								
630	12	00	00	00	00	GELİRLERİN RED VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER	209.992,42								
630	13	00	00	00	00	AMORTİSMAN GİDERLERİ	22.588.729,57								
630	14	00	00	00	00	İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ	40.487.875,76								
630	30	00	00	00	00	PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER	12.300,00								
						GİDERLER TOPLAMI	471.800.334,68							GELİRLER TOPLAMI	630.422.164,20
														FAALİYET SONUCU(+/-)	158.621.829,52

2012 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

KURUM : SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HESAP KODU	EKONOMİK KOD				BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	CARİ YIL(2012) TL	HESAP KODU	EKONOMİK KOD				BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	CARİYIL (2012) TL
	KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4				KOD 1	KOD 2	KOD 3	KOD 4		
830	01	0	0	0	PERSONEL GİDERİ	80.213.369,42	800	03	0	0	0	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	583.228.413,28
830	02	0	0	0	SOSYAL GÜV. KURUM.DEVL.PRİ.GİD.	13.179.132,27	800	04	0	0	0	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİR	53.209,98
830	03	0	0	0	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	288.196.192,32	800	05	0	0	0	DİĞER GELİRLER	96.788.192,54
830	04	0	0	0	FAİZ GİDERLERİ	3.935.939,54	800	08	0	0	0	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0,00
830	05	0	0	0	CARİ TRANSFERLER	73.989.369,75							
830	06	0	0	0	SERMAYE GİDERLERİ	273.502.690,22							
					BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A)	733.016.693,52						BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B)	680.069.815,80
							810	03	0	0	0	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	474.765,31
							810	05	0	0	0	DİĞER GELİRLER	109.446,69
												BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)	584.212,00
												NET BÜTÇE GELİRİ (B - C) (D)	679.485.603,80
												BÜTÇE GELİR - GİDER FARKI (D - A)	-53.531.089,72

2012 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (RED VE İADELER HARİÇ)

				STRATEJİ D. BŞK
EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	2012 YILI NET GELİR	2012 YILI GERÇEKLEŞME %
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	563.490.000,00	583.228.413,28	104%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	53.209,98	100%
05	DİĞER GELİRLER	94.232.000,00	96.788.192,54	103%
GENEL TOPLAM		657.722.000,00	680.069.815,80	103%

2012 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANMAYA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ GRAFİĞİ

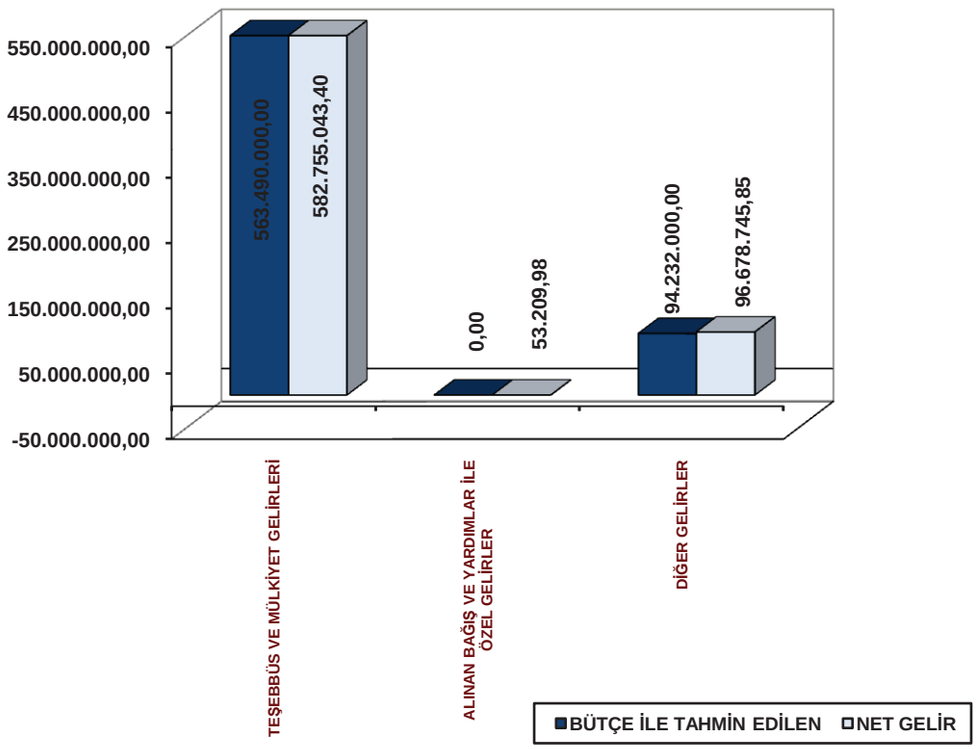

2012 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR

EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	2012 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	2012 YILI GERÇEKLEŞEN HARCAMA	STRATEJİ D.BŞK 2012 YILI GERÇEKLEŞME %
01	PERSONEL GİDERLERİ	97.064.273,34	80.213.369,42	83%
02	SOSYAL GÜV.KURUM.DEVL.PRİ.GİD.	14.980.501,27	13.179.132,27	88%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	352.762.148,66	288.196.192,32	82%
04	FAİZ GİDERLERİ	4.112.000,00	3.935.939,54	96%
05	CARİ TRANSFERLER	88.931.200,00	73.989.369,75	83%
06	SERMAYE GİDERLERİ	523.856.198,73	273.502.690,22	52%
09	YEDEK ÖDENEK	28.254.878,00	0,00	0%
GENEL HARCAMA TOPLAMI		1.109.961.200,00	733.016.693,52	66%

2012 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ

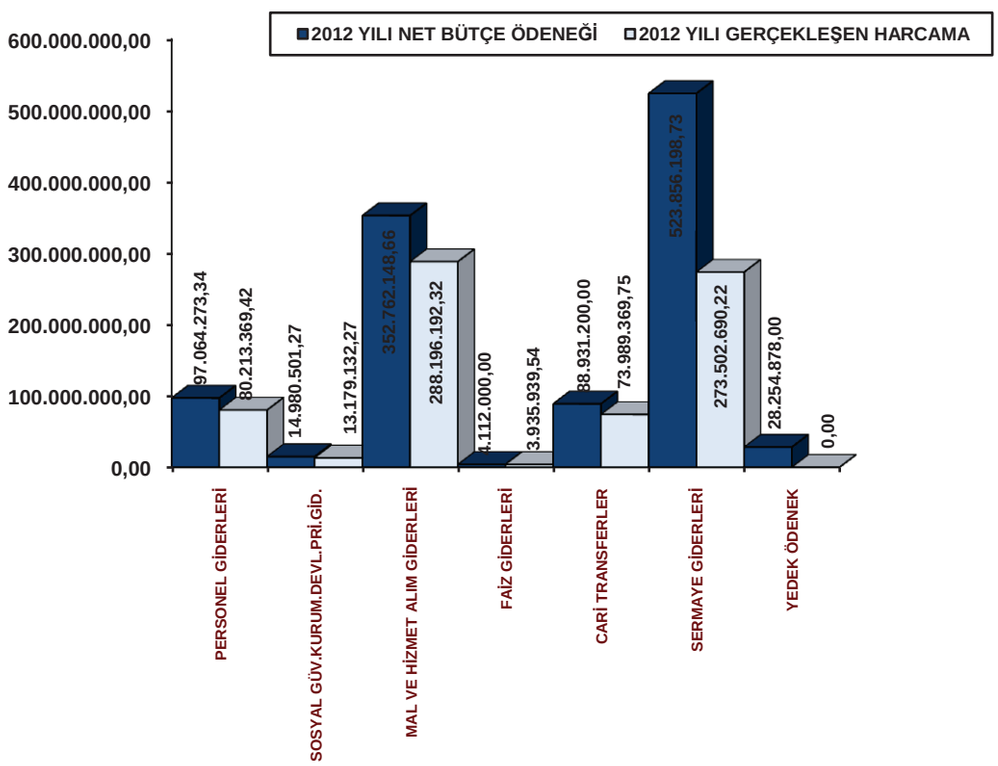

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31.12.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇOSU

A K T İ F				P A S İ F			
I - **DÖNEN VARLIKLAR:**			**357.302.027,50**	III- **KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR:**			**120.863.964,30**
10- HAZIR DEGERLER		16.946.256,86		**30-KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**		21.016.994,59	
100- Kasa	6.802,74			300- Banka Kredileri Hesabı	20.507.305,41		
101-Alınan Çekler Hesabı	2.694,22			303- Kamu İdarelerine Mali Borçlar	509.689,18		
102- Bankalar	2.626.010,12			**31-KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR**		0,00	
103- Verilen Çekler ve Gönd.Emir. (-)	-371.905,28			310- Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar			
104- Proje Özel Hesabı	0,00			**32- FAALİYET BORÇLARI**		29.675.212,36	
108- Diğer hazır değerler	6.916.916,76			320- Bütçe Emanetleri	29.675.212,36		
109-Banka kredi kartlarından	7.765.738,30			**33- EMANET YABANCI KAYNAKLAR**		15.395.885,25	
12-TİCARİ ALACAKLAR		97.041.190,53		330- Alınan Depozito ve Teminatlar	885.450,98		
120- Alacaklar Hesabı	81.636.317,97			333- Emanetler	14.510.434,27		
121- Takipli Alacaklar	10.930.112,65			**34- ALINAN AVANSLAR**		2.724.727,53	
122-Tecilli ve Tehirli Alacaklar	3.493.696,80			340- Alınan Sipariş avansı	1.744.373,28		
126- Verilen Dep.ve Teminatlar	981.063,11			349-Alınan Diğer Avanslar	980.354,25		
14- DİĞER ALACAKLAR		6.737.590,19		**36- ÖDENECEKDİGER YÜKÜMLÜLÜKLER**		49.211.211,90	
140- Kişilerden Alacaklar	6.737.590,19			360- Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.745.668,80		
15- STOKLAR		132.720.694,79		361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesinti.	1.133.589,09		
150- İlk madde ve malzeme	132.720.694,79			362- Fonlar veya Diğer Kamu.İd.Adı.Tah.	15.881.542,15		
				363- Kamu İdareleri Payları Hesabı	27.587.433,09		
16- ÖN ÖDEMELER		9.559.460,04		368-Vadesi Geçmiş ve Ertelenmiş Borçlar	862.978,77		
162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler	9.559.460,04			**38- GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDERLER**		2.839.123,07	
165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Kredi				381-Gider Tahakkukları Hesabı	2.839.123,07		
19- DİGER DÖNEN VARLIKLAR		94.296.835,09		**39- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**		809,60	
190-Devreden katma değer vergisi	94.296.432,37			397- Sayım Fazlalıkları	809,60		
197-Sayım Noksanları	402,72			IV- **UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**			**133.032.221,44**
II - **DURAN VARLIKLAR**			**543.437.533,60**	**40- UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR**		43.530.178,52	
24- MALİ DURAN VARLIKLAR		26.691.411,66		400- Banka Kredileri Hesabı	35.375.151,64		
240- Mali Kuruluşlara Yatır.Sermayeler	26.650.711,66			403-Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	8.155.026,88		
241- Mal ve Hizmet Ür.kuruluş.Yatı.Sermayeler	40.700,00			**41- UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR**		12.103.101,00	
25- MADDİ DURAN VARLIKLAR		516.746.121,94		410-Dış Mali Borçlar Hesabı	12.103.101,00		
250- Arazi ve arsalar	41.107.914,61			**43- DİĞER BORÇLAR**		75.151.553,50	
251- Yeraltı ve yerüstü düzenleri	609.353.405,52			430- Alınan Depozito ve Teminatlar	75.151.553,50		
252- Binalar	38.542.095,26			**48- GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDERLER**		2.247.388,42	
253- Tesis makina ve cihazlar	131.515.472,24			481-Gider Tahakkukları Hesabı	2.247.388,42		
254- Taşıtlar	51.570.315,00			V- **ÖZKAYNAKLAR**			**646.843.375,36**
255- Demirbaşlar	11.475.879,23			**50- NET DEĞER**		531.225.576,99	
257- Birikmiş Amortismanlar (-)	-595.331.316,89			500-Net Değer	531.225.576,99		
258- Yapılmakta olan yatırımlar	228.512.356,97			**52- YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI**		101.055.886,81	
26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00		522- Yeniden Değerleme Farkları	101.055.886,81		
260-Haklar	16.394.278,15			**57- GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET**		373.721.764,84	
268-Birikmiş Amortisman(-)	-16.394.278,15			570- Gecmiş yıllar Olumlu Faaliyet	373.721.764,84		
29- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		0,00		**58-GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI**		517.781.682,80	
294-Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi D.				580- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı(-)	517.781.682,80		
299-Birikmiş Amortisman (-)				**59- DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI**		158.621.829,52	
				590- Dönem olumlu faaliyet	158.621.829,52		
AKTİF TOPLAMI:			**900.739.561,10**	PASİF TOPLAMI:			**900.739.561,10**
NAZIM HESAPLAR:			**220.203.749,60**	**NAZIM HESAPLAR:**			**220.203.749,60**
91- NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MANKUL KIYMET HESABI				**91- NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MANKUL KIYMET HESABI**			
910-Teminat Mektupları Hesabı		88.853.583,33		911-Teminat Mektupları Emanetlweri Hesabı		88.853.583,33	
92- TAAHÜT HESAPLARI				**92- TAAHÜT HESAPLARI**			
920-Gider Taahütleri Hesabı		131.350.166,27		921-Gider Taahütleri Karşılığı Hesabı		131.350.166,27	
GENEL TOPLAM :			**1.120.943.310,70**	GENEL TOPLAM :			**1.120.943.310,70**

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumu : İZSU Genel Müdürlüğü
Yılı : 2012

GELİRİN KODU				AÇIKLAMA	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	GERÇEKLEŞEN NET GELİR TOPLAMI	2012 GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	İZSU GENEL TOPLAM İÇİNDE	KENDİ GRUBU İÇİNDE
I	II	III	IV	İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	657.722.000,00	680.069.815,80	103%	100%	100%
03				TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	563.490.000,00	583.228.413,28	104%	86%	100%
03	1			MAL VE HİZMET SATIŞI GELİRLERİ	562.330.000,00	571.089.679,33	102%	84%	98%
03	1	1		Mal Satışı Gelirleri	250.000,00	53.900,00	22%	0%	0%
03	1	1	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	250.000,00	53.900,00	22%	0%	0%
03	1	2		Hizmet Gelirleri	562.080.000,00	571.035.779,33	102%	84%	98%
03	1	2	06	Labaratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	400.000,00	471.079,47	118%	0%	0%
03	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	561.620.000,00	570.538.551,52	102%	84%	98%
03	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	60.000,00	26.148,34	44%	0%	0%
03	6			KİRA GELİRLERİ	160.000,00	6.952.375,78	4345%	1%	1%
03	6	1		Taşınmaz Kiraları	150.000,00	6.952.375,78	4635%	1%	1%
03	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	150.000,00	6.952.375,78	4635%	1%	1%
03	6	2		Taşınır Kiraları	10.000,00	0,00	0%	0%	0%
03	6	2	01	Taşınır Kira Gelirleri	10.000,00	0,00	0%	0%	0%
03	09			DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.000.000,00	5.186.358,17	519%	1%	1%
03	9	9		Diğer Gelirler	1.000.000,00	5.186.358,17	519%	1%	1%
03	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000.000,00	5.186.358,17	519%	1%	1%
04				ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	0,00	53.209,98	100%	0%	100%
04	03			DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0,00	0,00	0%	0%	0%
04	03	1		Cari	0,00	0,00	0%	0%	0%
04	03	01	02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0%	0%	0%
04	4			KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR	0,00	53.209,98	100%	0%	100%
04	4	1		Cari	0,00	37.408,20	100%	0%	70%
04	4	1	01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	37.403,48	100%	0%	70%
04	4	1	02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	4,72	100%	0%	0%
04	4	2		Sermaye	0,00	15.801,78	100%	0%	30%
04	4	2	01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	15.801,78	100%	0%	30%
05				DİĞER GELİRLER	94.232.000,00	96.788.192,54	103%	14%	100%
05	1			FAİZ GELİRLERİ	2.900.000,00	1.541.709,51	53%	0%	2%
05	1	4		Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	800.000,00	305.474,00	38%	0%	0%
05	1	4	01	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	800.000,00	305.474,00	38%	0%	0%
05	1	9		Diğer Faizler	2.100.000,00	1.236.235,51	59%	0%	1%
05	1	9	01	Kişilerden Alacaklar Faizi	0,00	4.922,84	100%	0%	0%
05	1	9	03	Mevduat Faizleri	2.100.000,00	1.231.312,67	59%	0%	1%
05	1	9	99	Diğer Faizler	0,00	0,00	100%	0%	0%
05	2			KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	83.000.000,00	83.071.344,44	100%	12%	86%
05	2	2		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	64.000.000,00	65.407.136,87	102%	10%	68%
05	2	2	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	64.000.000,00	65.407.136,87	102%	10%	68%
05	2	4		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	19.000.000,00	17.664.207,57	93%	3%	18%
05	2	4	51	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	8.000.000,00	6.705.474,07	84%	1%	7%
05	2	4	52	Su Tesisleri harcamalarına Katılma Payı	11.000.000,00	10.958.733,50	100%	2%	11%
05	3			PARA CEZALARI VE CEZALAR	6.602.000,00	7.679.775,51	116%	1%	8%
05	3	2		İdari Para Cezaları	250.000,00	2.032.724,38	813%	0%	2%
05	3	2	99	Diğer idari Para Cezaları	250.000,00	2.032.724,38	813%	0%	2%
05	3	4		Vergi Cezaları	6.000.000,00	5.483.843,79	91%	1%	6%
05	3	4	1	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı	6.000.000,00	5.256.676,97	88%	1%	5%
05	3	4	5	6111 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı	0,00	22.269,12	100%	0%	0%
05	3	4	6	6111 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı	0,00	115.681,02	100%	0%	0%
05	3	4	7	6111 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı		89.216,68	100%	0%	0%
05	3	9		Diğer Para Cezaları	352.000,00	163.207,34	46%	0%	0%
05	3	9	02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirleri, Alınacak Gecikme Zammı	350.000,00	7.418,98	2%	0%	0%
05	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	2.000,00	155.788,36	7789%	0%	0%
05	9			DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.730.000,00	4.495.363,08	260%	1%	5%
05	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	1.730.000,00	4.495.363,08	260%	1%	5%
05	9	1	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	10.000,00	519.581,64	5196%	0%	1%
05	9	1	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	700.000,00	817.123,00	117%	0%	1%
05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	20.000,00	1.402.979,74	7015%	0%	1%
05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1.000.000,00	1.755.678,70	176%	0%	2%
06				SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0%	0%	0%
06	2			TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ	0,00	0,00	0%	0%	0%
06	2	3		Stok Satış Gelirleri	0,00	0,00	0%	0%	0%
06	2	3	01	Stok Satış Gelirleri	0,00	0,00	0%	0%	0%
08				ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0%	0%	0%
08	1			YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	0,00	0%	0%	0%
08	1	5		Mahalli İdarelerden	0,00	0,00	0%	0%	0%
08	1	5	05	Bağlı İdarelerden	0,00	0,00	0%	0%	0%
				GELİR TOPLAMI	657.722.000,00	680.069.815,80	103%		
				RED VE İADELER (-)	327.000,00	584.202,42	179%	100%	100%
3				TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	207.000,00	474.765,31	229%	81%	81%
3	1			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	204.000,00	461.008,04	226%	79%	79%
3	1	01		Mal Satış Gelirleri	1.000,00	226,53	100%	0%	0%
3	1	02		Hizmet Gelirleri	203.000,00	460.781,51	227%	79%	79%
3	9			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.000,00	13.757,27	459%	2%	2%
3	9	09		Diğer Gelirler	3.000,00	13.757,27	459%	2%	2%
5				DİĞER GELİRLER	120.000,00	109.437,11	91%	19%	19%
5	1			Faiz Gelirleri	0,00	0,00	100%	0%	0%
5	01	09		Diğer Faizler	0,00	0,00	100%	0%	0%
5	2			Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	120.000,00	61.716,52	51%	11%	11%
5	02	04		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	120.000,00	61.716,52	51%	11%	11%
5	3			Para Cezaları	0,00	9,58	100%	0%	0%
5	3	09		Diğer para Cezaları	0,00	9,58	100%	0%	0%
5	9			Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	47.720,59	100%	8%	8%
5	9	01		Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	47.720,59	100%	8%	8%
				NET GELİR	657.395.000,00	679.485.613,38	103%		

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

Kurumu : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2012

STRTJ GEL.D.BŞK.

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N) TL.
630	**01**				**PERSONEL GİDERLERİ**	**80.213.055,71**
630	**01**	**1**	**0**		**MEMURLAR**	**29.392.811,19**
630	01	1	1		Temel Maaşlar	10.207.528,25
630	01	1	1	01	Temel Maaşlar	10.207.528,25
630	01	1	2		Zamlar ve Tazminatlar	11.285.361,25
630	01	1	2	01	Zamlar ve Tazminatlar	11.285.361,25
630	01	1	3		Ödenekler	90.315,00
630	01	1	3	01	Ödenekler	90.315,00
630	01	1	4		Sosyal Haklar	6.565.104,96
630	01	1	4	01	Sosyal Haklar	6.565.104,96
630	01	1	5		Ek Çalışma Karşılıkları	1.237.397,05
630	01	1	5	01	Ek Çalışma Karşılıkları	1.237.397,05
630	01	1	6		Ödül ve İkramiyeler	0,00
630	01	1	6	01	Ödül ve İkramiyeler	0,00
630	01	1	9		Diğer Personel Giderleri	7.104,68
630	01	1	9	01	Diğer Personel Giderleri	7.104,68
630	**01**	**2**			**SÖZLEŞMELİ PERSONEL**	**6.070.802,18**
630	01	2	1		Ücretler	6.070.802,18
630	01	2	1	90	Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	6.070.802,18
630	**01**	**3**			**İŞÇİLER**	**44.369.681,60**
630	01	3	1		İşçilerin Ücretleri	23.899.998,83
630	01	3	1	01	Sürekli İşçilerin Ücretleri	23.899.998,83
630	01	3	2		İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	4.686.834,26
630	01	3	2	01	Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	4.686.834,26
630	01	3	3		İşçilerin Sosyal Hakları	6.333.713,18
630	01	3	3	01	Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	6.333.713,18
630	01	3	4		İşçilerin Fazla Mesaileri	2.777.382,01
630	01	3	4	01	Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	2.777.382,01
630	01	3	5		İşçileri Ödül ve İkramiyeleri	6.671.753,32
630	01	3	5	01	Sürekli İşçileri Ödül ve İkramiyeleri	6.671.753,32
630	**01**	**4**			**GEÇİCİ PERSONEL**	**365.673,62**
630	01	4	1		Ücretler	365.673,62
630	01	4	1	02	Aday, Çırak, Çırak ve Satjyer Öğrencilerin Ücretleri	365.673,62
630	**01**	**5**			**DİĞER PERSONEL**	**14.087,12**
630	01	5	1		Ücret ve Diğer Ödemeler	14.087,12
630	01	5	1	52	Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	14.087,12
630	**02**				**SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**	**13.179.132,27**
630	**02**	**1**			**MEMURLAR**	**4.254.903,90**
630	02	1	6		Sosyal Güvenlik Kurumuna	4.254.903,90
630	02	1	6	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.657.215,13
630	02	1	6	02	Sağlık Primi Ödemeleri	1.597.688,77
630	**02**	**3**			**İŞÇİLER**	**8.924.228,37**
630	02	3	4		İşsizlik Sigortası Fonuna	764.779,32
630	02	3	4	01	İşsizlik Sigortası Fonuna	764.779,32
630	02	3	6		Sosyal Güvenlik Kurumuna	8.159.449,05
630	02	3	6	01	Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri	8.159.449,05
630	**03**				**MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**	**240.631.429,13**
630	**03**	**1**			**ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI**	**418.441,18**
630	03	1	1		Hammadde Alımları	483,00
630	03	1	1	01	Hammadde Alımları	483,00
630	03	1	6		Kimyevi Ürün Alımları	110.513,82

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

Kurumu : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2012

STRTJ GEL.D.BŞK.

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N) TL.
630	03	1	6	01	Kimyevi Ürün Alımları	110.513,82
630	03	1	8		Metal Ürünü Alımları	0,00
630	03	1	8	01	Metal Ürünü Alımları	0,00
630	03	1	9		Diğer Mal ve Malzeme Alımları	307.444,36
630	03	1	9	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	307.444,36
630	**03**	**2**			**TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI**	**75.522.769,02**
630	03	2	1		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	16.286,24
630	03	2	1	01	Kırtasiye Alımları	7.633,29
630	03	2	1	02	Büro Malzemesi Alımları	210,00
630	03	2	1	03	Periyodik Yayın Alımları	7.324,95
630	03	2	1	05	Baskı ve Cilt Giderleri	1.118,00
630	03	2	2		Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	3.479.395,35
630	03	2	2	01	Su Alımları	3.478.253,15
630	03	2	3	02	Temizlik Malzemesi Alımları	1.142,20
630	03	2	3		Enerji Alımları	71.593.439,90
630	03	2	3	01	Yakacak Alımları	129.429,20
630	03	2	3	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	21.891,21
630	03	2	3	03	Elektrik Alımları	71.442.119,49
630	03	2	5		Giyim ve Kuşam Alımları	0,00
630	03	2	5	01	Giyecek Alımları	0,00
630	03	2	6		Özel Malzeme Alımları	0,00
630	03	2	6	01	Labaratuar Malzemesi İle Kimyevi ve Temizlik Malzemesi Alımı	0,00
630	03	2	6	02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0,00
630	03	2	7		Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler	1.054,53
630	03	2	7	5	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	1.054,53
630	03	2	9		Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	432.593,00
630	03	2	9	01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	230.413,34
630	03	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	202.179,66
630	**03**	**3**			**YOLLUKLAR**	**307.157,59**
630	03	3	1		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	123.034,21
630	03	3	1	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	123.034,21
630	03	3	2		Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	6.358,35
630	03	3	2	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	6.358,35
630	03	3	3		Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	17.342,35
630	03	3	3	01	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	17.342,35
630	03	3	5		Arazi Tazminatları	160.422,68
630	03	3	5	02	Arazi Tazminatları	160.422,68
630	**03**	**4**			**GÖREV GİDERLERİ**	**4.116.302,04**
630	03	4	2		Yasal Giderler	2.337.517,20
630	03	4	2	3	Kusursuz Tazminatlar	226.800,53
630	03	4	2	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	1.925.390,01
630	03	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	185.326,66
630	03	4	3		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	1.778.784,84
630	03	4	3	1	Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1.318.692,25
630	03	4	3	2	İşletme Ruhsatı Ödemeleri vb.Giderler	101.947,50
630	03	4	3	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	358.145,09
630	**03**	**5**			**HİZMET ALIMLARI**	**129.387.800,51**
630	03	5	1		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	99.714.513,58
630	03	5	1	01	Etüd-Proje, Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	3.042.086,25
630	03	5	1	02	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	8.750,00
630	03	5	1	04	Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil)	84.234.556,67
630	03	5	1	08	Temizlik Hizmet Alım Giderleri	1.357.382,23
630	03	5	1	09	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Giderleri	10.174.570,18
630	03	5	1	90	Diğer Müşavir Firma Ve kişilere Ödemeler	897.168,25
630	03	5	2		Haberleşme Giderleri	1.324.325,11
630	03	5	2	01	Posta ve Telgraf Giderleri	84.745,75
630	03	5	2	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	896.683,71

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

Kurumu : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2012

STRTJ GEL.D.BŞK.

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N) TL.
630	03	5	2	04	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	82.995,92
630	03	5	2	06	Hat Kira Giderleri	222.499,73
630	03	5	2	90	Diğer Haberleşme Giderleri	37.400,00
630	03	5	3		Taşıma Giderleri	76.059,38
630	03	5	3	03	Yük Taşıma Giderleri	63.677,57
630	03	5	3	04	Geçiş Ücretleri	7.746,00
630	03	5	3	90	Diğer Taşıma Giderleri	4.635,81
630	03	5	4		Tarifeye Bağlı Ödemeler	2.562.324,98
630	03	5	4	01	İlan Giderleri	520.680,13
630	03	5	4	02	Sigorta Giderleri	110.667,65
630	03	5	4	03	Komisyon Giderleri	1.911.902,36
630	03	5	4	90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	19.074,84
630	03	5	5		Kiralar	23.923.578,25
630	03	5	5	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	9.166.899,76
630	03	5	5	03	İş Makinası Kiralaması Giderleri	10.912.665,51
630	03	5	5	05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	450.171,35
630	03	5	5	10	Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri	3.365.672,72
630	03	5	5	90	Diğer Kiralama Giderleri	28.168,91
630	03	5	09		Diğer Hizmet Alımları	1.786.999,21
630	03	5	9	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	108.432,21
630	03	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	1.678.567,00
630	**03**	**6**			**TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ**	**70.019,66**
630	03	6	1		Temsil Giderleri	29.987,35
630	03	6	1	01	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	29.987,35
630	03	6	2		Tanıtma Giderleri	40.032,31
630	03	6	2	01	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	40.032,31
630	**03**	**7**			**MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİD.**	**3.706.048,80**
630	03	7	1		Menkul Mal Alım Giderleri	262.268,45
630	03	7	1	01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	43.236,80
630	03	7	1	02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	17.366,00
630	03	7	1	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	52.500,62
630	03	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	149.165,03
630	03	7	2		Gayri Maddi Hak Alımları	176.126,00
630	03	7	2	01	Bilgisayar Yazılım Alımları	176.126,00
630	03	7	3		Bakım ve Onarım Giderleri	3.267.654,35
630	03	7	3	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.032.362,73
630	03	7	3	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	402.105,26
630	03	7	3	04	İş Makinası Onarım Giderleri	281.950,25
630	03	7	3	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	1.551.236,11
630	**03**	**8**			**GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ**	**27.102.890,33**
630	03	8	1		Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	446.968,50
630	03	8	1	01	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	4.625,00
630	03	8	1	04	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	322.133,40

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

Kurumu : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2012

						STRTJ GEL.D.BŞK.
Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N) TL.
630	03	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	120.210,10
630	03	8	4		Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri	23.500,00
630	03	8	4	01	Gemi Bakım ve Onarımı Giderleri	23.500,00
630	03	8	6		Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	21.896.429,84
630	03	8	6	01	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	21.896.429,84
630	03	8	9		Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri	4.735.991,99
630	03	8	9	01	Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri	4.735.991,99
630	**04**				**FAİZ GİDERLERİ**	**290.578,87**
630	**04**	**2**			**DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ**	**290.578,87**
630	04	2	9		Diğer İç Borç Faiz Giderleri	290.578,87
630	04	2	9	01	TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	290.578,87
630	**05**				**CARİ TRANSFERLER**	**73.879.531,38**
630	**05**	**1**			**GÖREV ZARARLARI**	**1.233.495,20**
630	05	1	1		Kamu Teşebbüslerine	516,45
630	5	1	1	90	Diğer Teşebbüslere	516,45
630	05	1	2		Sosyal Güvenlik Kurumlarına	1.232.978,75
630	05	1	2	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	1.232.978,75
630	**05**	**3**			**KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ.YAPILAN TRANSFERLER**	**869.679,08**
630	05	3	1		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	869.679,08
630	05	3	1	05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	844.818,03
630	05	3	1	90	Diğerlerine	24.861,05
630	**05**	**8**			**GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR**	**71.776.357,10**
630	05	8	1		Genel Bütçeye Verilen Paylar	4.988.924,01
630	05	8	1	01	Genel Bütçeye Verilen Paylar	4.988.924,01
630	05	8	5		Mahalli İdarelere Verilen Paylar	66.787.433,09
630	05	8	5	02	Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	66.787.433,09
630	**11**				**DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GİDERLERİ**	**307.709,57**
630	**11**	**6**			**KUR DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE DÖVİZ CİNSİ BORÇ STOKUNDAKİ ARTIŞLAR**	**307.709,57**
630	**12**				**GELİRLERİN RED VE İADESİNDEN KAYNAKLANAN GİDERLER**	**209.992,42**
630	**12**	**3**			**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**150.741,19**
630	12	3	1		Mal ve Hizmet Satiş Gelirleri	111.561,80
630	12	3	1	02	Hizmet Gelirleri	111.561,80
630	12	3	9		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.179,39
630	12	3	9	09	Diğer Gelirler	39.179,39
630	**12**	**5**			**DİĞER GELİRLER**	**59.251,23**
630	12	5	9		Diğer Çeşitli Gelirler	59.251,23
630	12	5	9	1	Diğer Çeşitli Gelirler	59.251,23
630	**13**				**AMORTİSMAN GİDERLERİ**	**22.588.729,57**
630	**13**	**1**			**MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN GİDERLERİ**	**21.307.610,93**
630	13	1	1		Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlerinin Amortsman Giderleri	9.665.724,59
630	13	1	2		Binaların Amotisman Giderleri	352.276,30
630	13	1	3		Tesis Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri	5.143.222,94

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

Kurumu : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2012

STRTJ GEL.D.BŞK.

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N) TL.
630	13	1	4		Taşıtların Amortisman Giderleri	2.443.111,12
630	13	1	5		Demirbaşların Amortisman Giderleri	3.703.275,98
630	**13**	**2**			**MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMAN GİD.**	**1.281.118,64**
630	13	2	1		Haklar Amortisman Giderleri	1.281.118,64
630	**14**				**İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ**	**40.487.875,76**
630	**14**	**1**			**Kırtasiye Malzemeleri**	**383.715,49**
630	**14**	**2**			**Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri**	**1.200,00**
630	**14**	**3**			**Tıbbi ve Labarotuar Sarf Malz.**	**1.982.242,82**
630	**14**	**4**			**Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları**	**15.482.391,41**
630	**14**	**5**			**Temizleme Ekipmanları**	**218.947,91**
630	**14**	**6**			**Giyecek Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri**	**926.526,38**
630	**14**	**7**			**Yiyecek**	**432.903,43**
630	**14**	**9**			**Canlı Hayvanlar**	**4.391,75**
630	**14**	**10**			**Zirai Maddeler**	**6.068,50**
630	**14**	**12**			**Bakım Onarım ve Üretim Malz.**	**5.401.269,12**
630	**14**	**13**			**Yedek Parçalar**	**13.923.260,96**
630	**14**	**14**			**Nakil Vasıtaların Lastikleri**	**311.580,34**
630	**14**	**15**			**Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar**	**49.446,14**
630	**14**	**17**			**Basınçlı Akipmanlar**	**931.447,33**
630	**14**	**99**			**Diğer Tüketim Amaçlı Malz.**	**432.484,18**
630	**30**				**PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER**	**12.300,00**
630	**30**	**06**			**PROJE KAPSAMINDA YAPILAN CARİ GİDERLER**	**12.300,00**
630	30	06	06		Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	12.300,00
630	30	06	06	07	Müteahhitlik Giderleri	12.300,00
					T O P L A M	**471.800.334,68**

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU

Kurumu : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2012

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	Kod.2	Kod.3	Kod.4	GELİRİN TÜRÜ	STRATEJİ D.BŞK. Cari Yıl (2012) TL
600	**03**				**TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**	**531.916.325,70**
600	**03**	**1**			**MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ**	**522.036.079,85**
600	03	1	1		Mal Satış Gelirleri	45.672,93
600	03	1	1	01	Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri	45.672,93
600	03	1	2		Hizmet Gelirleri	521.990.406,92
600	03	1	2	06	Labaratuar Deney ve Analiz Gelirleri	400.731,48
600	03	1	2	58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	521.563.527,10
600	03	1	2	99	Diğer Hizmet Gelirleri	26.148,34
600	**03**	**6**			**KİRA GELİRLERİ**	**9.880.245,85**
600	03	6	1		Taşınmaz Kiraları	4.990.243,07
600	03	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	4.990.243,07
600	03	9	9		Diğer Gelirler	4.890.002,78
600	03	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.890.002,78
600	**04**				**ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER**	**53.209,98**
600	**04**	**4**			**KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR**	**53.209,98**
600	04	4	1		Cari	37.408,20
600	04	4	1	1	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	37.403,48
600	04	4	1	2	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4,72
600	04	4	2		Sermaye	15.801,78
600	04	4	2	2	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	15.801,78
600	**05**				**DİĞER GELİRLER**	**97.457.999,85**
600	**05**	**1**			**FAİZ GELİRLERİ**	**1.544.610,74**
600	05	1	4		Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	305.474,00
600	05	1	4	01	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	305.474,00
600	05	1	9		Diğer Faizler	1.239.136,74
600	05	1	9	01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	4.542,85
600	05	1	9	03	Mevduat Faizleri	1.234.593,89
600	**05**	**2**			**KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR**	**83.061.040,89**
600	05	2	2		Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	65.407.136,87
600	05	2	2	51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	65.407.136,87
600	05	2	4		Kamu Harcamalarına Katılma Payları	17.653.904,02
600	05	2	4	51	Kamu Harcamalarına Katılma Payları	6.700.850,64
600	05	2	4	52	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	10.953.053,38
600	**05**	**3**			**PARA CEZALARI**	**6.045.000,52**
600	05	3	2		İdari Para Cezaları	2.120.259,24
600	05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	2.120.259,24
600	05	3	4		Vergi Cezaları	3.861.892,01
600	05	3	4	01	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	3.861.892,01
600	05	3	9		Diğer Para Cezaları	62.849,27
600	05	3	9	02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınıcak Gecikme Zamları	5.741,12
600	05	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	57.108,15
600	**05**	**9**			**DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER**	**6.807.347,70**
600	05	9	1		Diğer Çeşitli Gelirler	6.807.347,70
600	05	9	1	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	519.581,64
600	05	9	1	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	817.123,00
600	05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	291.989,77
600	05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5.178.653,29
600	**11**				**DEĞER VE MİKTAR DEĞİŞİMLERİ GELİRLERİ**	**994.628,67**
600	**11**	**6**			**Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Azalışlar**	**994.628,67**
600	11	6	5		Hazineye Ait Dış Borçların Değerlemesinden Kaynaklananlar	924.493,35
600	11	6	99		Diğer Borçların Değerlemesinden Kaynaklananlar	70.135,32
					TOPLAM	**630.422.164,20**

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA			FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46										BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER	0,00	1.055.961.200,00	54.000.000,00	112.696.795,09	112.696.795,09	1.109.961.200,00	733.016.693,52	733.016.693,52	0,00	376.944.506,48	0,00
46	35									İZMİR	0,00	1.055.961.200,00	54.000.000,00	112.696.795,09	112.696.795,09	1.109.961.200,00	733.016.693,52	733.016.693,52	0,00	376.944.506,48	0,00
46	35	03								Su ve Kanalizasyon İdareleri	0,00	1.055.961.200,00	54.000.000,00	112.696.795,09	112.696.795,09	1.109.961.200,00	733.016.693,52	733.016.693,52	0,00	376.944.506,48	0,00
46	35	03	02							ÖZEL KALEM	0,00	3.827.500,00	0,00	327.221,40	202.721,40	3.952.000,00	2.858.334,24	2.858.334,24	0,00	1.093.665,76	0,00
46	35	03	02	01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	228.200,00	0,00	74.860,70	360,70	302.700,00	228.870,02	228.870,02	0,00	73.829,98	0,00
46	35	03	02	01	3					Genel Hizmetler	0,00	228.200,00	0,00	74.860,70	360,70	302.700,00	228.870,02	228.870,02	0,00	73.829,98	0,00
46	35	03	02	01	3	9				Diğer genel hizmetler	0,00	228.200,00	0,00	74.860,70	360,70	302.700,00	228.870,02	228.870,02	0,00	73.829,98	0,00
46	35	03	02	01	3	9	000000			Tanımsız	0,00	228.200,00	0,00	74.860,70	360,70	302.700,00	228.870,02	228.870,02	0,00	73.829,98	0,00
46	35	03	02	01	3	9	000000	5		MAHALLİ İDARELER	0,00	228.200,00	0,00	74.860,70	360,70	302.700,00	228.870,02	228.870,02	0,00	73.829,98	0,00
46	35	03	02	01	3	9	000000	5	01	Personel Giderleri	0,00	183.000,00	0,00	74.860,70	360,70	257.500,00	194.955,17	194.955,17	0,00	62.544,83	0,00
46	35	03	02	01	3	9	000000	5	01	1 Memurlar	0,00	183.000,00	0,00	74.860,70	360,70	257.500,00	194.955,17	194.955,17	0,00	62.544,83	0,00
46	35	03	02	01	3	9	000000	5	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	22.373,62	22.373,62	0,00	2.826,38	0,00
46	35	03	02	01	3	9	000000	5	02	1 Memurlar	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	22.373,62	22.373,62	0,00	2.826,38	0,00
46	35	03	02	01	3	9	000000	5	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.541,23	11.541,23	0,00	8.458,77	0,00
46	35	03	02	01	3	9	000000	5	03	3 Yolluklar	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.541,23	11.541,23	0,00	8.458,77	0,00
46	35	03	02	06						İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	3.599.300,00	0,00	252.360,70	202.360,70	3.649.300,00	2.629.464,22	2.629.464,22	0,00	1.019.835,78	0,00
46	35	03	02	06	3					Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	3.599.300,00	0,00	252.360,70	202.360,70	3.649.300,00	2.629.464,22	2.629.464,22	0,00	1.019.835,78	0,00
46	35	03	02	06	3	0				Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	3.599.300,00	0,00	252.360,70	202.360,70	3.649.300,00	2.629.464,22	2.629.464,22	0,00	1.019.835,78	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000			Tanımsız	0,00	3.599.300,00	0,00	252.360,70	202.360,70	3.649.300,00	2.629.464,22	2.629.464,22	0,00	1.019.835,78	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5		MAHALLİ İDARELER	0,00	3.599.300,00	0,00	252.360,70	202.360,70	3.649.300,00	2.629.464,22	2.629.464,22	0,00	1.019.835,78	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	01	Personel Giderleri	0,00	804.500,00	0,00	200.360,70	360,70	1.004.500,00	822.356,45	822.356,45	0,00	182.143,55	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	01	1 Memurlar	0,00	754.500,00	0,00	200.360,70	360,70	954.500,00	808.269,33	808.269,33	0,00	146.230,67	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	01	5 Diğer Personel	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.087,12	14.087,12	0,00	35.912,88	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	91.283,26	91.283,26	0,00	13.516,74	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	02	1 Memurlar	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	91.283,26	91.283,26	0,00	13.516,74	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	2.690.000,00	0,00	52.000,00	202.000,00	2.540.000,00	1.715.824,51	1.715.824,51	0,00	824.175,49	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	03	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	2.476,44	2.476,44	0,00	9.523,56	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	03	3 Yolluklar	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.673,00	2.673,00	0,00	17.327,00	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	03	4 Görev Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	425,72	425,72	0,00	574,28	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	03	5 Hizmet Alımları	0,00	2.547.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.347.000,00	1.629.105,45	1.629.105,45	0,00	717.894,55	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	03	6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	140.000,00	80.251,82	80.251,82	0,00	59.748,18	0,00
46	35	03	02	06	3	0	000000	5	03	7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	892,08	892,08	0,00	19.107,92	0,00
46	35	03	04							DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	0,00	8.143.600,00	0,00	375.275,66	375.275,66	8.143.600,00	5.348.351,53	5.348.351,53	0,00	2.795.248,47	0,00
46	35	03	04	06						İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	8.143.600,00	0,00	375.275,66	375.275,66	8.143.600,00	5.348.351,53	5.348.351,53	0,00	2.795.248,47	0,00
46	35	03	04	06	3					Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	8.143.600,00	0,00	375.275,66	375.275,66	8.143.600,00	5.348.351,53	5.348.351,53	0,00	2.795.248,47	0,00
46	35	03	04	06	3	0				Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	8.143.600,00	0,00	375.275,66	375.275,66	8.143.600,00	5.348.351,53	5.348.351,53	0,00	2.795.248,47	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000			Tanımsız	0,00	8.143.600,00	0,00	375.275,66	375.275,66	8.143.600,00	5.348.351,53	5.348.351,53	0,00	2.795.248,47	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5		MAHALLİ İDARELER	0,00	8.143.600,00	0,00	375.275,66	375.275,66	8.143.600,00	5.348.351,53	5.348.351,53	0,00	2.795.248,47	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	01	Personel Giderleri	0,00	903.100,00	0,00	70.275,66	275,66	973.100,00	787.350,16	787.350,16	0,00	185.749,84	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	01	1 Memurlar	0,00	631.100,00	0,00	70.275,66	275,66	701.100,00	682.112,87	682.112,87	0,00	18.987,13	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	01	3 İşçiler	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	105.237,29	105.237,29	0,00	166.762,71	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	127.071,15	127.071,15	0,00	18.428,85	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	02	1 Memurlar	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	103.968,12	103.968,12	0,00	5.031,88	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	02	3 İşçiler	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	23.103,03	23.103,03	0,00	13.396,97	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	3.745.000,00	0,00	135.000,00	90.000,00	3.790.000,00	3.078.261,71	3.078.261,71	0,00	711.738,29	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	03	2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	638.000,00	0,00	115.000,00	70.000,00	683.000,00	335.701,25	335.701,25	0,00	347.298,75	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	03	3 Yolluklar	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.891,48	1.891,48	0,00	13.108,52	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	03	4 Görev Giderleri	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	03	5 Hizmet Alımları	0,00	2.740.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.720.000,00	2.594.777,94	2.594.777,94	0,00	125.222,06	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	03	7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	270.000,00	0,00	20.000,00	0,00	290.000,00	134.370,98	134.370,98	0,00	155.629,02	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	03	8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	11.520,06	11.520,06	0,00	64.479,94	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	05	Cari Transferler	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	285.000,00	2.815.000,00	946.322,85	946.322,85	0,00	1.868.677,15	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	05	3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	285.000,00	2.815.000,00	946.322,85	946.322,85	0,00	1.868.677,15	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	06	Sermaye Giderleri	0,00	250.000,00	0,00	170.000,00	0,00	420.000,00	409.345,66	409.345,66	0,00	10.654,34	0,00
46	35	03	04	06	3	0	000000	5	06	7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	250.000,00	0,00	170.000,00	0,00	420.000,00	409.345,66	409.345,66	0,00	10.654,34	0,00
46	35	03	05							İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	0,00	122.747.900,00	0,00	7.294.501,18	194.501,18	129.847.900,00	100.369.076,21	100.369.076,21	0,00	29.478.823,79	0,00
46	35	03	05	01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	122.747.900,00	0,00	7.294.501,18	194.501,18	129.847.900,00	100.369.076,21	100.369.076,21	0,00	29.478.823,79	0,00
46	35	03	05	01	3					Genel Hizmetler	0,00	122.747.900,00	0,00	7.294.501,18	194.501,18	129.847.900,00	100.369.076,21	100.369.076,21	0,00	29.478.823,79	0,00
46	35	03	05	01	3	1				Genel personel hizmetleri	0,00	122.747.900,00	0,00	7.294.501,18	194.501,18	129.847.900,00	100.369.076,21	100.369.076,21	0,00	29.478.823,79	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000			Tanımsız	0,00	122.747.900,00	0,00	7.294.501,18	194.501,18	129.847.900,00	100.369.076,21	100.369.076,21	0,00	29.478.823,79	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5		MAHALLİ İDARELER	0,00	122.747.900,00	0,00	7.294.501,18	194.501,18	129.847.900,00	100.369.076,21	100.369.076,21	0,00	29.478.823,79	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	01	Personel Giderleri	0,00	11.032.200,00	0,00	7.278.501,18	63.700,00	18.247.001,18	11.795.619,56	11.795.619,56	0,00	6.451.381,62	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	01	1 Memurlar	0,00	600.900,00	0,00	178.501,18	63.700,00	715.701,18	613.364,87	613.364,87	0,00	102.336,31	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	01	2 Sözleşmeli Personel	0,00	1.596.600,00	0,00	7.100.000,00	0,00	8.696.600,00	6.070.802,18	6.070.802,18	0,00	2.625.797,82	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	01	3 İşçiler	0,00	8.344.700,00	0,00	0,00	0,00	8.344.700,00	4.745.778,89	4.745.778,89	0,00	3.598.921,11	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	01	4 Geçici Personel	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	365.673,62	365.673,62	0,00	124.326,38	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	455.700,00	0,00	0,00	0,00	455.700,00	103.075,48	103.075,48	0,00	352.624,52	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	02	1 Memurlar	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	91.271,42	91.271,42	0,00	14.028,58	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	02	2 Sözleşmeli Personel	0,00	331.800,00	0,00	0,00	0,00	331.800,00	0,00	0,00	0,00	331.800,00	0,00

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	02	3	İşçiler	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	11.804,06	11.804,06	0,00	6.795,94	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	109.510.000,00	0,00	16.000,00	130.801,18	109.395.198,82	87.237.402,42	87.237.402,42	0,00	22.157.796,40	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	5.700,00	0,00	12.000,00	0,00	17.700,00	11.196,85	11.196,85	0,00	6.503,15	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	6.000,60	6.000,60	0,00	15.599,40	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.059,18	3.059,18	0,00	6.940,82	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	109.466.300,00	0,00	4.000,00	130.801,18	109.339.498,82	87.217.145,79	87.217.145,79	0,00	22.122.353,03	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	05		Cari Transferler	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.232.978,75	1.232.978,75	0,00	517.021,25	0,00
46	35	03	05	01	3	1	000000	5	05	1	Görev Zararları	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.232.978,75	1.232.978,75	0,00	517.021,25	0,00
46	**35**	**03**	**10**								**BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**7.605.200,00**	**0,00**	**594.143,90**	**594.143,90**	**7.605.200,00**	**6.482.214,95**	**6.482.214,95**	**0,00**	**1.122.985,05**	**0,00**
46	35	03	10	01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	7.605.200,00	0,00	594.143,90	594.143,90	7.605.200,00	6.482.214,95	6.482.214,95	0,00	1.122.985,05	0,00
46	35	03	10	01	3						Genel Hizmetler	0,00	7.605.200,00	0,00	594.143,90	594.143,90	7.605.200,00	6.482.214,95	6.482.214,95	0,00	1.122.985,05	0,00
46	35	03	10	01	3	9					Diğer genel hizmetler	0,00	7.605.200,00	0,00	594.143,90	594.143,90	7.605.200,00	6.482.214,95	6.482.214,95	0,00	1.122.985,05	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000				Tanımsız	0,00	7.205.200,00	0,00	594.143,90	594.143,90	7.205.200,00	6.240.088,25	6.240.088,25	0,00	965.111,75	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	7.205.200,00	0,00	594.143,90	594.143,90	7.205.200,00	6.240.088,25	6.240.088,25	0,00	965.111,75	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	208.600,00	0,00	14.143,90	14.143,90	208.600,00	164.934,98	164.934,98	0,00	43.665,02	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	208.600,00	0,00	14.143,90	14.143,90	208.600,00	164.934,98	164.934,98	0,00	43.665,02	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	24.549,70	24.549,70	0,00	7.050,30	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	24.549,70	24.549,70	0,00	7.050,30	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	5.965.000,00	0,00	580.000,00	380.000,00	6.165.000,00	5.381.106,49	5.381.106,49	0,00	783.893,51	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	310.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	310.000,00	201.978,80	201.978,80	0,00	108.021,20	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.006,00	1.006,00	0,00	18.994,00	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	5.215.000,00	0,00	550.000,00	350.000,00	5.415.000,00	4.967.158,02	4.967.158,02	0,00	447.841,98	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	400.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	400.000,00	210.963,67	210.963,67	0,00	189.036,33	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	669.497,08	669.497,08	0,00	130.502,92	0,00
46	35	03	10	01	3	9	000000	5	06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	669.497,08	669.497,08	0,00	130.502,92	0,00
46	35	03	10	01	3	9	040303				Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	242.126,70	242.126,70	0,00	157.873,30	0,00
46	35	03	10	01	3	9	040303	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	242.126,70	242.126,70	0,00	157.873,30	0,00
46	35	03	10	01	3	9	040303	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	242.126,70	242.126,70	0,00	157.873,30	0,00
46	35	03	10	01	3	9	040303	5	06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	242.126,70	242.126,70	0,00	157.873,30	0,00
46	**35**	**03**	**11**								**MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**50.767.400,00**	**0,00**	**3300263,74**	**800263,74**	**53.267.400,00**	**50.139.016,82**	**50.139.016,82**	**0,00**	**3.128.383,18**	**0,00**
46	35	03	11	01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	50.767.400,00	0,00	3300263,74	800263,74	53.267.400,00	50.139.016,82	50.139.016,82	0,00	3.128.383,18	0,00
46	35	03	11	01	3						Genel Hizmetler	0,00	50.767.400,00	0,00	3300263,74	800263,74	53.267.400,00	50.139.016,82	50.139.016,82	0,00	3.128.383,18	0,00
46	35	03	11	01	3	9					Diğer genel hizmetler	0,00	50.767.400,00	0,00	3300263,74	800263,74	53.267.400,00	50.139.016,82	50.139.016,82	0,00	3.128.383,18	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000				Tanımsız	0,00	48.892.400,00	0,00	3300263,74	200263,74	51.992.400,00	49.364.261,55	49.364.261,55	0,00	2.628.138,45	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	48.892.400,00	0,00	3300263,74	200263,74	51.992.400,00	49.364.261,55	49.364.261,55	0,00	2.628.138,45	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	3.087.200,00	0,00	200263,74	263,74	3.287.200,00	2.599.882,86	2.599.882,86	0,00	687.317,14	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	464.600,00	0,00	200263,74	263,74	664.600,00	640.765,42	640.765,42	0,00	23.834,58	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	01	3	İşçiler	0,00	2.622.600,00	0,00	0,00	0,00	2.622.600,00	1.959.117,44	1.959.117,44	0,00	663.482,56	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	624.200,00	0,00	0,00	0,00	624.200,00	545.326,64	545.326,64	0,00	78.873,36	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	102.800,00	96.002,72	96.002,72	0,00	6.797,28	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	02	3	İşçiler	0,00	521.400,00	0,00	0,00	0,00	521.400,00	449.323,92	449.323,92	0,00	72.076,08	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	45.181.000,00	0,00	3100000,00	200000,00	48.081.000,00	46.219.052,05	46.219.052,05	0,00	1.861.947,95	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	03	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.331.500,00	0,00	0,00	0,00	1.331.500,00	1.321.829,36	1.321.829,36	0,00	9.670,64	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	29.077.500,00	0,00	3100000,00	200000,00	31.977.500,00	31.778.655,80	31.778.655,80	0,00	198.844,20	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	14.906,60	14.906,60	0,00	7.593,40	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	601.137,03	601.137,03	0,00	128.862,97	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	11.244.500,00	0,00	0,00	0,00	11.244.500,00	10.693.751,76	10.693.751,76	0,00	550.748,24	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	1.658.931,79	1.658.931,79	0,00	966.068,21	0,00
46	35	03	11	01	3	9	000000	5	03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.839,71	149.839,71	0,00	160,29	0,00
46	35	03	11	01	3	9	010205				Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	600000,00	400.000,00	49.442,00	49.442,00	0,00	350.558,00	0,00
46	35	03	11	01	3	9	010205	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	600000,00	400.000,00	49.442,00	49.442,00	0,00	350.558,00	0,00
46	35	03	11	01	3	9	010205	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	600000,00	400.000,00	49.442,00	49.442,00	0,00	350.558,00	0,00
46	35	03	11	01	3	9	010205	5	06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	600000,00	400.000,00	49.442,00	49.442,00	0,00	350.558,00	0,00
46	35	03	11	01	3	9	010304				Atölye Bakım Onarım Çalışmaları	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	725.313,27	725.313,27	0,00	149.686,73	0,00
46	35	03	11	01	3	9	010304	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	725.313,27	725.313,27	0,00	149.686,73	0,00
46	35	03	11	01	3	9	010304	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	725.313,27	725.313,27	0,00	149.686,73	0,00
46	35	03	11	01	3	9	010304	5	06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	725.313,27	725.313,27	0,00	149.686,73	0,00
46	**35**	**03**	**20**								**TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**462.400,00**	**0,00**	**135,08**	**135,08**	**462.400,00**	**188.939,60**	**188.939,60**	**0,00**	**273.460,40**	**0,00**
46	35	03	20	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	462.400,00	0,00	135,08	135,08	462.400,00	188.939,60	188.939,60	0,00	273.460,40	0,00
46	35	03	20	06	3						Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	462.400,00	0,00	135,08	135,08	462.400,00	188.939,60	188.939,60	0,00	273.460,40	0,00
46	35	03	20	06	3	0					Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	462.400,00	0,00	135,08	135,08	462.400,00	188.939,60	188.939,60	0,00	273.460,40	0,00
46	35	03	20	06	3	0	000000				Tanımsız	0,00	462.400,00	0,00	135,08	135,08	462.400,00	188.939,60	188.939,60	0,00	273.460,40	0,00
46	35	03	20	06	3	0	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	462.400,00	0,00	135,08	135,08	462.400,00	188.939,60	188.939,60	0,00	273.460,40	0,00
46	35	03	20	06	3	0	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	357.500,00	0,00	135,08	135,08	357.500,00	163.520,05	163.520,05	0,00	193.979,95	0,00
46	35	03	20	06	3	0	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	357.500,00	0,00	135,08	135,08	357.500,00	163.520,05	163.520,05	0,00	193.979,95	0,00
46	35	03	20	06	3	0	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	21.196,65	21.196,65	0,00	30.803,35	0,00
46	35	03	20	06	3	0	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	21.196,65	21.196,65	0,00	30.803,35	0,00
46	35	03	20	06	3	0	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	4.222,90	4.222,90	0,00	48.677,10	0,00
46	35	03	20	06	3	0	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46	35	03	20	06	3	0	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	2.920,80	2.920,80	0,00	13.579,20	0,00
46	35	03	20	06	3	0	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.302,10	1.302,10	0,00	1.197,90	0,00
46	35	03	23								STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	103.437.000,00	54.000.000,00	505.620,18	37.985.242,18	119.957.378,00	78.597.179,98	78.597.179,98	0,00	41.360.198,02	0,00
46	35	03	23	01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	103.437.000,00	54.000.000,00	505.620,18	37.985.242,18	119.957.378,00	78.597.179,98	78.597.179,98	0,00	41.360.198,02	0,00
46	35	03	23	01	3						Genel Hizmetler	0,00	103.437.000,00	54.000.000,00	505.620,18	37.985.242,18	119.957.378,00	78.597.179,98	78.597.179,98	0,00	41.360.198,02	0,00
46	35	03	23	01	3	2					Genel planlama ve istatistik hizmetleri	0,00	103.437.000,00	54.000.000,00	505.620,18	37.985.242,18	119.957.378,00	78.597.179,98	78.597.179,98	0,00	41.360.198,02	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000				Tanımsız	0,00	103.437.000,00	54.000.000,00	505.620,18	37.985.242,18	119.957.378,00	78.597.179,98	78.597.179,98	0,00	41.360.198,02	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	103.437.000,00	54.000.000,00	505.620,18	37.985.242,18	119.957.378,00	78.597.179,98	78.597.179,98	0,00	41.360.198,02	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	1.888.400,00	0,00	200.620,18	620,18	2.088.400,00	2.068.873,20	2.068.873,20	0,00	19.526,80	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	1.888.400,00	0,00	200.620,18	620,18	2.088.400,00	2.068.873,20	2.068.873,20	0,00	19.526,80	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	352.900,00	0,00	0,00	0,00	352.900,00	325.402,66	325.402,66	0,00	27.497,34	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	352.900,00	0,00	0,00	0,00	352.900,00	325.402,66	325.402,66	0,00	27.497,34	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	478.000,00	0,00	305.000,00	0,00	783.000,00	456.896,43	456.896,43	0,00	326.103,57	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	67.192,96	67.192,96	0,00	78.807,04	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.084,39	2.084,39	0,00	17.915,61	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	52.000,00	0,00	300.000,00	0,00	352.000,00	314.081,58	314.081,58	0,00	37.918,42	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	68.602,74	68.602,74	0,00	164.397,26	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	27.000,00	0,00	5.000,00	0,00	32.000,00	4.934,76	4.934,76	0,00	27.065,24	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	04		Faiz Giderleri	0,00	4.112.000,00	0,00	0,00	0,00	4.112.000,00	3.935.939,54	3.935.939,54	0,00	176.060,46	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	04	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.838.886,16	3.838.886,16	0,00	161.113,84	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	04	3	Dış Borç Faiz Giderleri	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	97.053,38	97.053,38	0,00	14.946,62	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	05		Cari Transferler	0,00	30.866.200,00	54.000.000,00	0,00	500.000,00	84.366.200,00	71.810.068,15	71.810.068,15	0,00	12.556.131,85	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	05	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	33.711,05	33.711,05	0,00	666.288,95	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	05	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	0,00	29.866.200,00	54.000.000,00	0,00	200.000,00	83.666.200,00	71.776.357,10	71.776.357,10	0,00	11.889.842,90	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	09		Yedek Ödenekler	0,00	65.739.500,00	0,00	0,00	37.484.622,00	28.254.878,00	0,00	0,00	0,00	28.254.878,00	0,00
46	35	03	23	01	3	2	000000	5	09	6	Yedek Ödenek	0,00	65.739.500,00	0,00	0,00	37.484.622,00	28.254.878,00	0,00	0,00	0,00	28.254.878,00	0,00
46	35	03	24								HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	0,00	1.186.600,00	0,00	301.626,78	1.626,78	1.486.600,00	1.278.750,96	1.278.750,96	0,00	207.849,04	0,00
46	35	03	24	01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	1.186.600,00	0,00	301.626,78	1.626,78	1.486.600,00	1.278.750,96	1.278.750,96	0,00	207.849,04	0,00
46	35	03	24	01	3						Genel Hizmetler	0,00	1.186.600,00	0,00	301.626,78	1.626,78	1.486.600,00	1.278.750,96	1.278.750,96	0,00	207.849,04	0,00
46	35	03	24	01	3	9					Diğer genel hizmetler	0,00	1.186.600,00	0,00	301.626,78	1.626,78	1.486.600,00	1.278.750,96	1.278.750,96	0,00	207.849,04	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000				Tanımsız	0,00	1.186.600,00	0,00	301.626,78	1.626,78	1.486.600,00	1.278.750,96	1.278.750,96	0,00	207.849,04	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.186.600,00	0,00	301.626,78	1.626,78	1.486.600,00	1.278.750,96	1.278.750,96	0,00	207.849,04	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	553.700,00	0,00	120.226,78	226,78	673.700,00	547.498,74	547.498,74	0,00	126.201,26	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	475.400,00	0,00	120.226,78	226,78	595.400,00	503.975,98	503.975,98	0,00	91.424,02	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	01	3	İşçiler	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	43.522,76	43.522,76	0,00	34.777,24	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	84.551,67	84.551,67	0,00	22.548,33	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	74.473,18	74.473,18	0,00	10.126,82	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	02	3	İşçiler	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	10.078,49	10.078,49	0,00	12.421,51	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	525.800,00	0,00	181.400,00	1.400,00	705.800,00	646.700,55	646.700,55	0,00	59.099,45	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	6.300,26	6.300,26	0,00	14.299,74	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	4.600,00	0,00	1.400,00	0,00	6.000,00	5.315,43	5.315,43	0,00	684,57	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	475.000,00	0,00	180.000,00	1.400,00	653.600,00	635.059,61	635.059,61	0,00	18.540,39	0,00
46	35	03	24	01	3	9	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25,25	25,25	0,00	25.574,75	0,00
46	35	03	30								ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	0,00	33.955.800,00	0,00	1.901.556,03	1.901.556,03	33.955.800,00	23.720.985,94	23.720.985,94	0,00	10.234.814,06	0,00
46	35	03	30	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	33.955.800,00	0,00	1.901.556,03	1.901.556,03	33.955.800,00	23.720.985,94	23.720.985,94	0,00	10.234.814,06	0,00
46	35	03	30	06	3						Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	33.955.800,00	0,00	1.901.556,03	1.901.556,03	33.955.800,00	23.720.985,94	23.720.985,94	0,00	10.234.814,06	0,00
46	35	03	30	06	3	0					Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	33.955.800,00	0,00	1.901.556,03	1.901.556,03	33.955.800,00	23.720.985,94	23.720.985,94	0,00	10.234.814,06	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000				Tanımsız	0,00	33.955.800,00	0,00	1.901.556,03	1.901.556,03	33.955.800,00	23.720.985,94	23.720.985,94	0,00	10.234.814,06	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	33.955.800,00	0,00	1.901.556,03	1.901.556,03	33.955.800,00	23.720.985,94	23.720.985,94	0,00	10.234.814,06	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	11.021.200,00	0,00	401.556,03	1.556,03	11.421.200,00	11.051.153,73	11.051.153,73	0,00	370.046,27	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	5.970.000,00	0,00	401.556,03	1.556,03	6.370.000,00	6.266.373,43	6.266.373,43	0,00	103.626,57	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	01	3	İşçiler	0,00	5.051.200,00	0,00	0,00	0,00	5.051.200,00	4.784.780,30	4.784.780,30	0,00	266.419,70	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	2.327.400,00	0,00	0,00	0,00	2.327.400,00	2.072.754,10	2.072.754,10	0,00	254.645,90	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	1.112.400,00	0,00	0,00	0,00	1.112.400,00	978.836,35	978.836,35	0,00	133.563,65	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	02	3	İşçiler	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	1.093.917,75	1.093.917,75	0,00	121.082,25	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	20.607.200,00	0,00	1.500.000,00	1.900.000,00	20.207.200,00	10.597.078,11	10.597.078,11	0,00	9.610.121,89	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	03	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	8.662.500,00	0,00	0,00	1.500.000,00	7.162.500,00	3.024.498,15	3.024.498,15	0,00	4.138.001,85	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	235.814,17	235.814,17	0,00	154.185,83	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	18.847,76	18.847,76	0,00	13.052,24	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.650.000,00	761.892,58	761.892,58	0,00	888.107,42	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	11.110.300,00	0,00	0,00	400.000,00	10.710.300,00	6.468.647,51	6.468.647,51	0,00	4.241.652,49	0,00
46	35	03	30	06	3	0	000000	5	03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	87.377,94	87.377,94	0,00	175.122,06	0,00
46	35	03	31								ATIKSU ARITMA DAİRE BAŞKANLIĞI	0,00	92.502.000,00	0,00	4.075.226,51	39.118.686,51	57.458.540,00	41.788.679,75	41.788.679,75	0,00	15.669.860,25	0,00
46	35	03	31	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	92.502.000,00	0,00	4.075.226,51	39.118.686,51	57.458.540,00	41.788.679,75	41.788.679,75	0,00	15.669.860,25	0,00
46	35	03	31	06	3						Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	92.502.000,00	0,00	4.075.226,51	39.118.686,51	57.458.540,00	41.788.679,75	41.788.679,75	0,00	15.669.860,25	0,00
46	35	03	31	06	3	0					Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	92.502.000,00	0,00	4.075.226,51	39.118.686,51	57.458.540,00	41.788.679,75	41.788.679,75	0,00	15.669.860,25	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000				Tanımsız	0,00	28.982.000,00	0,00	1.805.226,51	1.885.226,51	28.902.000,00	26.755.454,35	26.755.454,35	0,00	2.146.545,65	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	28.982.000,00	0,00	1.805.226,51	1.885.226,51	28.902.000,00	26.755.454,35	26.755.454,35	0,00	2.146.545,65	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	1.684.600,00	0,00	75.226,51	226,51	1.759.600,00	1.346.429,67	1.346.429,67	0,00	413.170,33	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	464.700,00	0,00	75.226,51	226,51	539.700,00	490.604,16	490.604,16	0,00	49.095,84	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	01	3	İşçiler	0,00	1.219.900,00	0,00	0,00	0,00	1.219.900,00	855.825,51	855.825,51	0,00	364.074,49	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	283.200,00	0,00	25.000,00	0,00	308.200,00	263.231,66	263.231,66	0,00	44.968,34	0,00

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00	71.195,77	71.195,77	0,00	8.204,23	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	02	3	İşçiler	0,00	203.800,00	0,00	25.000,00	0,00	228.800,00	192.035,89	192.035,89	0,00	36.764,11	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	27.014.200,00	0,00	1.705.000,00	1.885.000,00	26.834.200,00	25.145.793,02	25.145.793,02	0,00	1.688.406,98	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	03	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.500.000,00	3.908.565,51	3.908.565,51	0,00	591.434,49	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	15.958.500,00	0,00	1.680.000,00	0,00	17.638.500,00	17.465.569,95	17.465.569,95	0,00	172.930,05	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	24.200,00	0,00	5.000,00	0,00	29.200,00	22.193,29	22.193,29	0,00	7.006,71	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	2.085.500,00	0,00	20.000,00	525.000,00	1.580.500,00	1.118.702,45	1.118.702,45	0,00	461.797,55	0,00
46	35	03	31	06	3	0	000000	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	3.445.000,00	0,00	0,00	360.000,00	3.085.000,00	2.630.761,82	2.630.761,82	0,00	454.238,18	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020401				Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	0,00	21.210.000,00	0,00	370.000,00	2.233.460,00	19.346.540,00	14.475.557,40	14.475.557,40	0,00	4.870.982,60	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020401	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	21.210.000,00	0,00	370.000,00	2.233.460,00	19.346.540,00	14.475.557,40	14.475.557,40	0,00	4.870.982,60	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020401	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020401	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020401	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	12.210.000,00	0,00	370.000,00	2.233.460,00	10.346.540,00	5.475.557,40	5.475.557,40	0,00	4.870.982,60	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020401	5	06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	1.060.000,00	0,00	370.000,00	290.000,00	1.140.000,00	590.793,67	590.793,67	0,00	549.206,33	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020401	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.166.515,41	1.166.515,41	0,00	2.833.484,59	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020401	5	06	6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	949.286,40	949.286,40	0,00	713,60	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020401	5	06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	1.943.460,00	4.256.540,00	2.768.961,92	2.768.961,92	0,00	1.487.578,08	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020402				Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020402	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020402	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020402	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020403				Merkezi Scada Sistemi İşi	0,00	750.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	2.650.000,00	557.668,00	557.668,00	0,00	2.092.332,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020403	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	750.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	2.650.000,00	557.668,00	557.668,00	0,00	2.092.332,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020403	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	750.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	2.650.000,00	557.668,00	557.668,00	0,00	2.092.332,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	020403	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	750.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	2.650.000,00	557.668,00	557.668,00	0,00	2.092.332,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	030101				Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	030101	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	030101	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	030101	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	030203				A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	030203	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	030203	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00
46	35	03	31	06	3	0	030203	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00
46	**35**	**03**	**32**								**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**21.338.400,00**	**0,00**	**494.244,70**	**494.244,70**	**21.338.400,00**	**16.606.729,33**	**16.606.729,33**	**0,00**	**4.731.670,67**	**0,00**
46	35	03	32	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	21.338.400,00	0,00	494.244,70	494.244,70	21.338.400,00	16.606.729,33	16.606.729,33	0,00	4.731.670,67	0,00
46	35	03	32	06	3						Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	21.338.400,00	0,00	494.244,70	494.244,70	21.338.400,00	16.606.729,33	16.606.729,33	0,00	4.731.670,67	0,00
46	35	03	32	06	3	0					Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	21.338.400,00	0,00	494.244,70	494.244,70	21.338.400,00	16.606.729,33	16.606.729,33	0,00	4.731.670,67	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000				Tanımsız	0,00	16.575.600,00	0,00	494.244,70	494.244,70	16.575.600,00	15.540.298,25	15.540.298,25	0,00	1.035.301,75	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	16.575.600,00	0,00	494.244,70	494.244,70	16.575.600,00	15.540.298,25	15.540.298,25	0,00	1.035.301,75	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	1.565.100,00	0,00	160.244,70	244,70	1.725.100,00	1.594.494,75	1.594.494,75	0,00	130.605,25	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	764.000,00	0,00	160.244,70	244,70	924.000,00	904.546,29	904.546,29	0,00	19.453,71	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	01	3	İşçiler	0,00	801.100,00	0,00	0,00	0,00	801.100,00	689.948,46	689.948,46	0,00	111.151,54	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	343.000,00	0,00	3.000,00	0,00	346.000,00	288.214,32	288.214,32	0,00	57.785,68	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	130.700,00	0,00	3.000,00	0,00	133.700,00	132.677,52	132.677,52	0,00	1.022,48	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	02	3	İşçiler	0,00	212.300,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00	155.536,80	155.536,80	0,00	56.763,20	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	14.667.500,00	0,00	331.000,00	494.000,00	14.504.500,00	13.657.589,18	13.657.589,18	0,00	846.910,82	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	03	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	413.000,00	2.087.000,00	2.031.044,84	2.031.044,84	0,00	55.955,16	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	9.070.000,00	0,00	270.000,00	20.000,00	9.320.000,00	9.262.278,81	9.262.278,81	0,00	57.721,19	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	41.000,00	0,00	0,00	1.000,00	40.000,00	23.270,77	23.270,77	0,00	16.729,23	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	62.500,00	0,00	61.000,00	0,00	123.500,00	122.659,10	122.659,10	0,00	840,90	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	2.282.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.222.000,00	1.850.397,19	1.850.397,19	0,00	371.602,81	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	318.198,35	318.198,35	0,00	308.801,65	0,00
46	35	03	32	06	3	0	000000	5	03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	49.740,12	49.740,12	0,00	35.259,88	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010113				Yüzeysel sulardan sağlıklı içmesuyu üretimi	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	325.739,20	325.739,20	0,00	2.884.260,80	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010113	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	325.739,20	325.739,20	0,00	2.884.260,80	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010113	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	325.739,20	325.739,20	0,00	2.884.260,80	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010113	5	06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	325.739,20	325.739,20	0,00	2.884.260,80	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010114				Çamlı Baraj Havzası bilimsel etüdü	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010114	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010114	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010114	5	06	9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010115				Tahtalı Barajı mutlak koruma alanı ağaçlandırılması, bakım ve koruma işi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	269.565,16	269.565,16	0,00	230.434,84	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010115	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	269.565,16	269.565,16	0,00	230.434,84	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010115	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	269.565,16	269.565,16	0,00	230.434,84	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010115	5	06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	269.565,16	269.565,16	0,00	230.434,84	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010116				İçmesuyu havzalarının koruma ve kontrol çalışmaları	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010116	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010116	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010116	5	06	9	Diğer Sermaye Giderleri	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA			AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46	35	03	32	06	3	0	010202					Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	471.126,72	471.126,72	0,00	228.873,28	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010202	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	471.126,72	471.126,72	0,00	228.873,28	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010202	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	471.126,72	471.126,72	0,00	228.873,28	0,00
46	35	03	32	06	3	0	010202	5	06	1		Mamul Mal Alımları	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	471.126,72	471.126,72	0,00	228.873,28	0,00
46	35	03	34									ETÜD VE PLAN DAİRE BAŞKANLIĞI	0,00	17.324.400,00	0,00	3.482.782,17	9.415.504,34	11.391.677,83	7.540.100,41	7.540.100,41	0,00	3.851.577,42	0,00
46	35	03	34	06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	17.324.400,00	0,00	3.482.782,17	9.415.504,34	11.391.677,83	7.540.100,41	7.540.100,41	0,00	3.851.577,42	0,00
46	35	03	34	06	3							Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	17.324.400,00	0,00	3.482.782,17	9.415.504,34	11.391.677,83	7.540.100,41	7.540.100,41	0,00	3.851.577,42	0,00
46	35	03	34	06	3	0						Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	17.324.400,00	0,00	3.482.782,17	9.415.504,34	11.391.677,83	7.540.100,41	7.540.100,41	0,00	3.851.577,42	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000					Tanımsız	0,00	2.449.800,00	0,00	482.782,17	1.068.744,81	1.863.837,36	1.399.134,87	1.399.134,87	0,00	464.702,49	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	2.449.800,00	0,00	482.782,17	1.068.744,81	1.863.837,36	1.399.134,87	1.399.134,87	0,00	464.702,49	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	01			Personel Giderleri	0,00	1.372.800,00	0,00	366.382,17	503.366,00	1.235.816,17	1.085.397,60	1.085.397,60	0,00	150.418,57	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	01	1		Memurlar	0,00	1.372.800,00	0,00	366.382,17	503.366,00	1.235.816,17	1.085.397,60	1.085.397,60	0,00	150.418,57	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	257.900,00	0,00	43.200,00	118.087,88	183.012,12	170.157,44	170.157,44	0,00	12.854,68	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	02	1		Memurlar	0,00	257.900,00	0,00	43.200,00	118.087,88	183.012,12	170.157,44	170.157,44	0,00	12.854,68	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	818.100,00	0,00	73.200,00	447.290,93	444.009,07	143.579,83	143.579,83	0,00	300.429,24	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	03	2		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	13.000,00	0,00	4.000,00	4.100,00	12.900,00	8.083,73	8.083,73	0,00	4.816,27	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	03	3		Yolluklar	0,00	50.100,00	0,00	11.200,00	22.836,91	38.463,09	31.865,79	31.865,79	0,00	6.597,30	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	03	4		Görev Giderleri	0,00	35.000,00	0,00	0,00	7.000,00	28.000,00	8.179,90	8.179,90	0,00	19.820,10	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	03	5		Hizmet Alımları	0,00	628.000,00	0,00	28.000,00	324.854,02	331.145,98	87.721,41	87.721,41	0,00	243.424,57	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	03	7		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	92.000,00	0,00	30.000,00	88.500,00	33.500,00	7.729,00	7.729,00	0,00	25.771,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	000000	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010101					İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010101	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010101	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010101	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010102					Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010102	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010102	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010102	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010103					Çamlı Barajı İsale Hattı Arıtma Tesisi	0,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010103	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010103	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010103	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010104					Değirmendere Barajı İsale Hattı İçmesuyu Arıtma Tesisi	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010104	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010104	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010104	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010105					Tuzlusu Arıtma Tesisleri	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010105	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010105	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010105	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010109					Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisi (Yenileme)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010109	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010109	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010109	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010111					Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	0,00	110.000,00	0,00	0,00	99.970,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010111	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	110.000,00	0,00	0,00	99.970,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010111	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	110.000,00	0,00	0,00	99.970,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010111	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	110.000,00	0,00	0,00	99.970,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010117					Kamulaştırmalar	0,00	5.951.000,00	0,00	3.000.000,00	350.000,00	8.601.000,00	5.397.009,67	5.397.009,67	0,00	3.203.990,33	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010117	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	5.951.000,00	0,00	3.000.000,00	350.000,00	8.601.000,00	5.397.009,67	5.397.009,67	0,00	3.203.990,33	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010117	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	5.951.000,00	0,00	3.000.000,00	350.000,00	8.601.000,00	5.397.009,67	5.397.009,67	0,00	3.203.990,33	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010117	5	06	4		Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0,00	5.951.000,00	0,00	3.000.000,00	350.000,00	8.601.000,00	5.397.009,67	5.397.009,67	0,00	3.203.990,33	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010406					İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	0,00	1.324.500,00	0,00	0,00	1.173.291,54	151.208,46	151.208,46	151.208,46	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010406	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.324.500,00	0,00	0,00	1.173.291,54	151.208,46	151.208,46	151.208,46	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010406	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	1.324.500,00	0,00	0,00	1.173.291,54	151.208,46	151.208,46	151.208,46	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010406	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.324.500,00	0,00	0,00	1.173.291,54	151.208,46	151.208,46	151.208,46	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010502					Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010502	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010502	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	010502	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020110					Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri	0,00	536.400,00	0,00	0,00	340.112,96	196.287,04	196.287,04	196.287,04	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020110	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	536.400,00	0,00	0,00	340.112,96	196.287,04	196.287,04	196.287,04	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020110	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	536.400,00	0,00	0,00	340.112,96	196.287,04	196.287,04	196.287,04	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020110	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	536.400,00	0,00	0,00	340.112,96	196.287,04	196.287,04	196.287,04	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020113					Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020113	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020113	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020113	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA			AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46	35	03	34	06	3	0	020212					Yağmursuyu Toplama Sistemleri	0,00	385.000,00	0,00	0,00	350.263,82	34.736,18	34.736,18	34.736,18	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020212	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	385.000,00	0,00	0,00	350.263,82	34.736,18	34.736,18	34.736,18	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020212	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	385.000,00	0,00	0,00	350.263,82	34.736,18	34.736,18	34.736,18	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020212	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	385.000,00	0,00	0,00	350.263,82	34.736,18	34.736,18	34.736,18	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020302					Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	0,00	388.900,00	0,00	0,00	257.192,71	131.707,29	131.707,29	131.707,29	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020302	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	388.900,00	0,00	0,00	257.192,71	131.707,29	131.707,29	131.707,29	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020302	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	388.900,00	0,00	0,00	257.192,71	131.707,29	131.707,29	131.707,29	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020302	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	388.900,00	0,00	0,00	257.192,71	131.707,29	131.707,29	131.707,29	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020404					Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları	0,00	600.800,00	0,00	0,00	600.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020404	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	600.800,00	0,00	0,00	600.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020404	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	600.800,00	0,00	0,00	600.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020404	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	600.800,00	0,00	0,00	600.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020501					Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	0,00	1.821.000,00	0,00	0,00	1.705.950,00	115.050,00	115.050,00	115.050,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020501	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.821.000,00	0,00	0,00	1.705.950,00	115.050,00	115.050,00	115.050,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020501	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	1.821.000,00	0,00	0,00	1.705.950,00	115.050,00	115.050,00	115.050,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	020501	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.821.000,00	0,00	0,00	1.705.950,00	115.050,00	115.050,00	115.050,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040101					Hizmet Binaları,Tesis Yapımı	0,00	230.000,00	0,00	0,00	142.178,50	87.821,50	87.821,50	87.821,50	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040101	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	230.000,00	0,00	0,00	142.178,50	87.821,50	87.821,50	87.821,50	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040101	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	230.000,00	0,00	0,00	142.178,50	87.821,50	87.821,50	87.821,50	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040101	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	230.000,00	0,00	0,00	142.178,50	87.821,50	87.821,50	87.821,50	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040201					Plan Proje Alımları / Dere Havzaları Taşkın Modelleme Projesi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040201	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040201	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040201	5	06	3		Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040508					Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin Kurulması	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.115,40	17.115,40	0,00	182.884,60	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040508	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.115,40	17.115,40	0,00	182.884,60	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040508	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.115,40	17.115,40	0,00	182.884,60	0,00
46	35	03	34	06	3	0	040508	5	06	3		Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.115,40	17.115,40	0,00	182.884,60	0,00
46	**35**	**03**	**35**									**KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**168.582.200,00**	**0,00**	**21.430.284,75**	**4.110.284,75**	**185.902.200,00**	**75.270.716,15**	**75.270.716,15**	**0,00**	**110.631.483,85**	**0,00**
46	35	03	35	06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	168.582.200,00	0,00	21.430.284,75	4.110.284,75	185.902.200,00	75.270.716,15	75.270.716,15	0,00	110.631.483,85	0,00
46	35	03	35	06	3							Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	168.582.200,00	0,00	21.430.284,75	4.110.284,75	185.902.200,00	75.270.716,15	75.270.716,15	0,00	110.631.483,85	0,00
46	35	03	35	06	3	0						Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	168.582.200,00	0,00	21.430.284,75	4.110.284,75	185.902.200,00	75.270.716,15	75.270.716,15	0,00	110.631.483,85	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000					Tanımsız	0,00	101.054.100,00	0,00	21.430.284,75	4.110.284,75	118.374.100,00	57.713.276,92	57.713.276,92	0,00	60.660.823,08	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	101.054.100,00	0,00	21.430.284,75	4.110.284,75	118.374.100,00	57.713.276,92	57.713.276,92	0,00	60.660.823,08	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	01			Personel Giderleri	0,00	6.027.800,00	0,00	200.284,75	284,75	6.227.800,00	5.095.004,56	5.095.004,56	0,00	1.132.795,44	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	01	1		Memurlar	0,00	595.100,00	0,00	200.284,75	284,75	795.100,00	674.883,24	674.883,24	0,00	120.216,76	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	01	3		İşçiler	0,00	5.432.700,00	0,00	0,00	0,00	5.432.700,00	4.420.121,32	4.420.121,32	0,00	1.012.578,68	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	1.199.200,00	0,00	0,00	0,00	1.199.200,00	1.101.273,65	1.101.273,65	0,00	97.926,35	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	02	1		Memurlar	0,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00	106.654,96	106.654,96	0,00	3.445,04	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	02	3		İşçiler	0,00	1.089.100,00	0,00	0,00	0,00	1.089.100,00	994.618,69	994.618,69	0,00	94.481,31	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	31.783.200,00	0,00	8.630.000,00	310.000,00	40.103.200,00	21.345.271,22	21.345.271,22	0,00	18.757.928,78	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	03	1		Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	284.799,73	284.799,73	0,00	915.200,27	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	03	2		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	15.360.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.060.000,00	10.570.631,95	10.570.631,95	0,00	4.489.368,05	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	03	3		Yolluklar	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	37.542,58	37.542,58	0,00	9.057,42	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	03	4		Görev Giderleri	0,00	201.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	301.000,00	233.140,99	233.140,99	0,00	67.859,01	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	03	5		Hizmet Alımları	0,00	4.098.600,00	0,00	520.000,00	0,00	4.618.600,00	2.176.837,19	2.176.837,19	0,00	2.441.762,81	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	03	7		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	7.777.000,00	0,00	0,00	0,00	7.777.000,00	2.435.256,38	2.435.256,38	0,00	5.341.743,62	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	03	8		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	3.100.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	11.100.000,00	5.607.062,40	5.607.062,40	0,00	5.492.937,60	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	62.043.900,00	0,00	12.600.000,00	3.800.000,00	70.843.900,00	30.171.727,49	30.171.727,49	0,00	40.672.172,51	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	06	1		Mamul Mal Alımları	0,00	22.048.900,00	0,00	12.600.000,00	3.800.000,00	30.848.900,00	20.931.087,87	20.931.087,87	0,00	9.917.812,13	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	06	6		Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46	35	03	35	06	3	0	000000	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	21.795.000,00	0,00	0,00	0,00	21.795.000,00	9.240.639,62	9.240.639,62	0,00	12.554.360,38	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020114					İzmir İli I, II ve III. Kısım İlçelerin Cadde , Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	0,00	12.580.600,00	0,00	0,00	0,00	12.580.600,00	4.261.682,32	4.261.682,32	0,00	8.318.917,68	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020114	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	12.580.600,00	0,00	0,00	0,00	12.580.600,00	4.261.682,32	4.261.682,32	0,00	8.318.917,68	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020114	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	12.580.600,00	0,00	0,00	0,00	12.580.600,00	4.261.682,32	4.261.682,32	0,00	8.318.917,68	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020114	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	12.580.600,00	0,00	0,00	0,00	12.580.600,00	4.261.682,32	4.261.682,32	0,00	8.318.917,68	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020115					İzmir İli I, II ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	0,00	2.533.400,00	0,00	0,00	0,00	2.533.400,00	795.910,02	795.910,02	0,00	1.737.489,98	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020115	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	2.533.400,00	0,00	0,00	0,00	2.533.400,00	795.910,02	795.910,02	0,00	1.737.489,98	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020115	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	2.533.400,00	0,00	0,00	0,00	2.533.400,00	795.910,02	795.910,02	0,00	1.737.489,98	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020115	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	2.533.400,00	0,00	0,00	0,00	2.533.400,00	795.910,02	795.910,02	0,00	1.737.489,98	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020116					İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi	0,00	17.924.200,00	0,00	0,00	0,00	17.924.200,00	205.055,56	205.055,56	0,00	17.719.144,44	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020116	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	17.924.200,00	0,00	0,00	0,00	17.924.200,00	205.055,56	205.055,56	0,00	17.719.144,44	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020116	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	17.924.200,00	0,00	0,00	0,00	17.924.200,00	205.055,56	205.055,56	0,00	17.719.144,44	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020116	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	17.924.200,00	0,00	0,00	0,00	17.924.200,00	205.055,56	205.055,56	0,00	17.719.144,44	0,00

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA			AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46	35	03	35	06	3	0	020117					İzmir İli I,II ve III. Kısım İlçelerinde Cadde , Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi	0,00	2.477.500,00	0,00	0,00	0,00	2.477.500,00	23.675,98	23.675,98	0,00	2.453.824,02	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020117	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	2.477.500,00	0,00	0,00	0,00	2.477.500,00	23.675,98	23.675,98	0,00	2.453.824,02	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020117	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	2.477.500,00	0,00	0,00	0,00	2.477.500,00	23.675,98	23.675,98	0,00	2.453.824,02	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020117	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	2.477.500,00	0,00	0,00	0,00	2.477.500,00	23.675,98	23.675,98	0,00	2.453.824,02	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020118					İzmir İli I,II ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	0,00	3.673.100,00	0,00	0,00	0,00	3.673.100,00	835.312,56	835.312,56	0,00	2.837.787,44	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020118	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	3.673.100,00	0,00	0,00	0,00	3.673.100,00	835.312,56	835.312,56	0,00	2.837.787,44	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020118	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	3.673.100,00	0,00	0,00	0,00	3.673.100,00	835.312,56	835.312,56	0,00	2.837.787,44	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020118	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	3.673.100,00	0,00	0,00	0,00	3.673.100,00	835.312,56	835.312,56	0,00	2.837.787,44	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020204					İzmir İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	0,00	1.776.600,00	0,00	0,00	0,00	1.776.600,00	55.641,88	55.641,88	0,00	1.720.958,12	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020204	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.776.600,00	0,00	0,00	0,00	1.776.600,00	55.641,88	55.641,88	0,00	1.720.958,12	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020204	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	1.776.600,00	0,00	0,00	0,00	1.776.600,00	55.641,88	55.641,88	0,00	1.720.958,12	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020204	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	1.776.600,00	0,00	0,00	0,00	1.776.600,00	55.641,88	55.641,88	0,00	1.720.958,12	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020205					İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Kırılan ve Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı İnşaatı İşi	0,00	6.732.400,00	0,00	0,00	0,00	6.732.400,00	2.231.939,64	2.231.939,64	0,00	4.500.460,36	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020205	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	6.732.400,00	0,00	0,00	0,00	6.732.400,00	2.231.939,64	2.231.939,64	0,00	4.500.460,36	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020205	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	6.732.400,00	0,00	0,00	0,00	6.732.400,00	2.231.939,64	2.231.939,64	0,00	4.500.460,36	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020205	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	6.732.400,00	0,00	0,00	0,00	6.732.400,00	2.231.939,64	2.231.939,64	0,00	4.500.460,36	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020213					İzmir İli I,II ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi	0,00	1.972.300,00	0,00	0,00	0,00	1.972.300,00	1.312.197,82	1.312.197,82	0,00	660.102,18	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020213	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.972.300,00	0,00	0,00	0,00	1.972.300,00	1.312.197,82	1.312.197,82	0,00	660.102,18	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020213	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	1.972.300,00	0,00	0,00	0,00	1.972.300,00	1.312.197,82	1.312.197,82	0,00	660.102,18	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020213	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	1.972.300,00	0,00	0,00	0,00	1.972.300,00	1.312.197,82	1.312.197,82	0,00	660.102,18	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020214					İzmir İli I,II ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi	0,00	1.758.700,00	0,00	0,00	0,00	1.758.700,00	1.166.562,82	1.166.562,82	0,00	592.137,18	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020214	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.758.700,00	0,00	0,00	0,00	1.758.700,00	1.166.562,82	1.166.562,82	0,00	592.137,18	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020214	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	1.758.700,00	0,00	0,00	0,00	1.758.700,00	1.166.562,82	1.166.562,82	0,00	592.137,18	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020214	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	1.758.700,00	0,00	0,00	0,00	1.758.700,00	1.166.562,82	1.166.562,82	0,00	592.137,18	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020301					Dere Temizlikleri için İş Makinalarının Çalıştırılması ve İş Gücü Temini	0,00	16.099.300,00	0,00	0,00	0,00	16.099.300,00	6.669.460,63	6.669.460,63	0,00	9.429.839,37	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020301	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	16.099.300,00	0,00	0,00	0,00	16.099.300,00	6.669.460,63	6.669.460,63	0,00	9.429.839,37	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020301	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	16.099.300,00	0,00	0,00	0,00	16.099.300,00	6.669.460,63	6.669.460,63	0,00	9.429.839,37	0,00
46	35	03	35	06	3	0	020301	5	06	7		Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	16.099.300,00	0,00	0,00	0,00	16.099.300,00	6.669.460,63	6.669.460,63	0,00	9.429.839,37	0,00
46	**35**	**03**	**38**									**SU TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**82.823.700,00**	**0,00**	**14.661.728,51**	**9.961.728,51**	**87.523.700,00**	**72.225.974,73**	**72.225.974,73**	**0,00**	**15.297.725,27**	**0,00**
46	35	03	38	06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	82.823.700,00	0,00	14.661.728,51	9.961.728,51	87.523.700,00	72.225.974,73	72.225.974,73	0,00	15.297.725,27	0,00
46	35	03	38	06	3							Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	82.823.700,00	0,00	14.661.728,51	9.961.728,51	87.523.700,00	72.225.974,73	72.225.974,73	0,00	15.297.725,27	0,00
46	35	03	38	06	3	0						Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	82.823.700,00	0,00	14.661.728,51	9.961.728,51	87.523.700,00	72.225.974,73	72.225.974,73	0,00	15.297.725,27	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000					Tanımsız	0,00	63.216.500,00	0,00	9.161.728,51	1.811.728,51	70.566.500,00	61.744.394,03	61.744.394,03	0,00	8.822.105,97	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	63.216.500,00	0,00	9.161.728,51	1.811.728,51	70.566.500,00	61.744.394,03	61.744.394,03	0,00	8.822.105,97	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	01			Personel Giderleri	0,00	31.484.450,00	0,00	570.528,51	140.528,51	31.914.450,00	26.355.945,29	26.355.945,29	0,00	5.558.504,71	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	01	1		Memurlar	0,00	1.343.000,00	0,00	570.528,51	140.528,51	1.773.000,00	1.671.629,32	1.671.629,32	0,00	101.370,68	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	01	3		İşçiler	0,00	30.141.450,00	0,00	0,00	0,00	30.141.450,00	24.684.315,97	24.684.315,97	0,00	5.457.134,03	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	6.342.800,00	0,00	28.000,00	0,00	6.370.800,00	5.785.957,19	5.785.957,19	0,00	584.842,81	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	02	1		Memurlar	0,00	237.150,00	0,00	28.000,00	0,00	265.150,00	253.333,03	253.333,03	0,00	11.816,97	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	02	3		İşçiler	0,00	6.105.650,00	0,00	0,00	0,00	6.105.650,00	5.532.624,16	5.532.624,16	0,00	573.025,84	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	25.389.250,00	0,00	8.563.200,00	1.671.200,00	32.281.250,00	29.602.491,55	29.602.491,55	0,00	2.678.758,45	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	03	1		Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.863.769,49	2.863.769,49	0,00	136.230,51	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	03	2		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	15.463.000,00	0,00	3.100.000,00	121.200,00	18.441.800,00	17.046.009,81	17.046.009,81	0,00	1.395.790,19	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	03	3		Yolluklar	0,00	39.200,00	0,00	13.200,00	0,00	52.400,00	42.171,52	42.171,52	0,00	10.228,48	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	03	4		Görev Giderleri	0,00	77.000,00	0,00	100.000,00	0,00	177.000,00	144.585,51	144.585,51	0,00	32.414,49	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	03	5		Hizmet Alımları	0,00	1.347.550,00	0,00	0,00	550.000,00	797.550,00	473.514,69	473.514,69	0,00	324.035,31	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	03	7		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	892.500,00	0,00	2.300.000,00	0,00	3.192.500,00	2.494.487,03	2.494.487,03	0,00	698.012,97	0,00
46	35	03	38	06	3	0	000000	5	03	8		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	3.570.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00	6.620.000,00	6.537.953,50	6.537.953,50	0,00	82.046,50	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010203					Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	0,00	7.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	2.000.000,00	1.835.100,63	1.835.100,63	0,00	164.899,37	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010203	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	7.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	2.000.000,00	1.835.100,63	1.835.100,63	0,00	164.899,37	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010203	5	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	7.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	2.000.000,00	1.835.100,63	1.835.100,63	0,00	164.899,37	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010203	5	03	8		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	7.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	2.000.000,00	1.835.100,63	1.835.100,63	0,00	164.899,37	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010402					5216 sayılı yasa ile ilave edilen ilçe ve beldelerde uzaktan okuma sistemi kurulması	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010402	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010402	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010402	5	06	5		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010403					İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	0,00	7.289.800,00	0,00	0,00	2.200.000,00	5.089.800,00	3.847.416,68	3.847.416,68	0,00	1.242.383,32	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010403	5				MAHALLİ İDARELER	0,00	7.289.800,00	0,00	0,00	2.200.000,00	5.089.800,00	3.847.416,68	3.847.416,68	0,00	1.242.383,32	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010403	5	06			Sermaye Giderleri	0,00	7.289.800,00	0,00	0,00	2.200.000,00	5.089.800,00	3.847.416,68	3.847.416,68	0,00	1.242.383,32	0,00

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46	35	03	38	06	3	0	010403	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010403	5	06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	6.914.800,00	0,00	0,00	2.200.000,00	4.714.800,00	3.847.416,68	3.847.416,68	0,00	867.383,32	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010405				Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), SCADA ve Uzaktan Okuma Sistemi Entegrasyon Yazılımı İşi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010405	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010405	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
46	35	03	38	06	3	0	010405	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
46	35	03	38	06	3	0	040304				Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	0,00	4.017.400,00	0,00	5.500.000,00	0,00	9.517.400,00	4.799.063,39	4.799.063,39	0,00	4.718.336,61	0,00
46	35	03	38	06	3	0	040304	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	4.017.400,00	0,00	5.500.000,00	0,00	9.517.400,00	4.799.063,39	4.799.063,39	0,00	4.718.336,61	0,00
46	35	03	38	06	3	0	040304	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	4.017.400,00	0,00	5.500.000,00	0,00	9.517.400,00	4.799.063,39	4.799.063,39	0,00	4.718.336,61	0,00
46	35	03	38	06	3	0	040304	5	06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	4.017.400,00	0,00	5.500.000,00	0,00	9.517.400,00	4.799.063,39	4.799.063,39	0,00	4.718.336,61	0,00
46	**35**	**03**	**39**								**YATIRIMLAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**279.958.900,00**	**0,00**	**40.388.924,74**	**3.445.464,74**	**316.902.360,00**	**196.734.982,75**	**196.734.982,75**	**0,00**	**120.167.377,25**	**0,00**
46	35	03	39	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	279.958.900,00	0,00	40.388.924,74	3.445.464,74	316.902.360,00	196.734.982,75	196.734.982,75	0,00	120.167.377,25	0,00
46	35	03	39	06	3						Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	279.958.900,00	0,00	40.388.924,74	3.445.464,74	316.902.360,00	196.734.982,75	196.734.982,75	0,00	120.167.377,25	0,00
46	35	03	39	06	3	0					Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	279.958.900,00	0,00	40.388.924,74	3.445.464,74	316.902.360,00	196.734.982,75	196.734.982,75	0,00	120.167.377,25	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000				Tanımsız	0,00	3.275.400,00	0,00	265.464,74	265.464,74	3.275.400,00	2.530.770,10	2.530.770,10	0,00	744.629,90	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	3.275.400,00	0,00	265.464,74	265.464,74	3.275.400,00	2.530.770,10	2.530.770,10	0,00	744.629,90	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	1.282.700,00	0,00	150.464,74	464,74	1.432.700,00	1.402.875,71	1.402.875,71	0,00	29.824,29	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	1.282.700,00	0,00	150.464,74	464,74	1.432.700,00	1.402.875,71	1.402.875,71	0,00	29.824,29	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	228.800,00	215.802,12	215.802,12	0,00	12.997,88	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	228.800,00	215.802,12	215.802,12	0,00	12.997,88	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.762.900,00	0,00	115.000,00	265.000,00	1.612.900,00	912.092,27	912.092,27	0,00	700.807,73	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	308.500,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00	4.386,23	4.386,23	0,00	304.113,77	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	37.015,72	37.015,72	0,00	22.384,28	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	350.000,00	0,00	70.000,00	0,00	420.000,00	309.007,71	309.007,71	0,00	110.992,29	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	1.022.000,00	0,00	45.000,00	265.000,00	802.000,00	550.484,41	550.484,41	0,00	251.515,59	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.198,20	11.198,20	0,00	10.801,80	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	000000	5	06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010106				İçmesuyu (Yeraltısuyu) Arıtma Tesisi	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010106	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010106	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010106	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010108				Sarıkız (Gördes) İçmesuyu Arıtma Tesisi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010108	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010108	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010108	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010111				Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.397.725,10	1.397.725,10	0,00	252.274,90	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010111	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.397.725,10	1.397.725,10	0,00	252.274,90	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010111	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.397.725,10	1.397.725,10	0,00	252.274,90	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010111	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.397.725,10	1.397.725,10	0,00	252.274,90	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010401				Muhtelif İçmesuyu Hatlarının Revizyonu ve Boru Alımı	0,00	70.000.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	73.180.000,00	73.169.328,99	73.169.328,99	0,00	10.671,01	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010401	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	70.000.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	73.180.000,00	73.169.328,99	73.169.328,99	0,00	10.671,01	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010401	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	70.000.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	73.180.000,00	73.169.328,99	73.169.328,99	0,00	10.671,01	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010401	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	70.000.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	73.180.000,00	73.169.328,99	73.169.328,99	0,00	10.671,01	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010406				İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	0,00	83.663.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	80.483.000,00	41.912.304,03	41.912.304,03	0,00	38.570.695,97	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010406	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	83.663.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	80.483.000,00	41.912.304,03	41.912.304,03	0,00	38.570.695,97	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010406	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	83.663.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	80.483.000,00	41.912.304,03	41.912.304,03	0,00	38.570.695,97	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010406	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	83.663.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	80.483.000,00	41.912.304,03	41.912.304,03	0,00	38.570.695,97	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010407				Su Depoları	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010407	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010407	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010407	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010502				Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010502	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010502	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	010502	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020110				Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri	0,00	33.690.200,00	0,00	0,00	0,00	33.690.200,00	21.590.105,27	21.590.105,27	0,00	12.100.094,73	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020110	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	33.690.200,00	0,00	0,00	0,00	33.690.200,00	21.590.105,27	21.590.105,27	0,00	12.100.094,73	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020110	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	33.690.200,00	0,00	0,00	0,00	33.690.200,00	21.590.105,27	21.590.105,27	0,00	12.100.094,73	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020110	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	33.690.200,00	0,00	0,00	0,00	33.690.200,00	21.590.105,27	21.590.105,27	0,00	12.100.094,73	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020212				Yağmursuyu Toplama Sistemleri	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	11.763.033,70	11.763.033,70	0,00	18.736.966,30	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020212	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	11.763.033,70	11.763.033,70	0,00	18.736.966,30	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020212	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	11.763.033,70	11.763.033,70	0,00	18.736.966,30	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020212	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	11.763.033,70	11.763.033,70	0,00	18.736.966,30	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020302				Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	0,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	10.541.842,12	10.541.842,12	0,00	14.858.157,88	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020302	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	10.541.842,12	10.541.842,12	0,00	14.858.157,88	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020302	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	10.541.842,12	10.541.842,12	0,00	14.858.157,88	0,00

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46	35	03	39	06	3	0	020302	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	10.541.842,12	10.541.842,12	0,00	14.858.157,88	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020401				Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	0,00	0,00	0,00	1.943.460,00	0,00	1.943.460,00	0,00	0,00	0,00	1.943.460,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020401	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	1.943.460,00	0,00	1.943.460,00	0,00	0,00	0,00	1.943.460,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020401	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.943.460,00	0,00	1.943.460,00	0,00	0,00	0,00	1.943.460,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020401	5	06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.943.460,00	0,00	1.943.460,00	0,00	0,00	0,00	1.943.460,00	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020404				Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları	0,00	24.636.400,00	0,00	0,00	0,00	24.636.400,00	22.382.938,98	22.382.938,98	0,00	2.253.461,02	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020404	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	24.636.400,00	0,00	0,00	0,00	24.636.400,00	22.382.938,98	22.382.938,98	0,00	2.253.461,02	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020404	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	24.636.400,00	0,00	0,00	0,00	24.636.400,00	22.382.938,98	22.382.938,98	0,00	2.253.461,02	0,00
46	35	03	39	06	3	0	020404	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	24.636.400,00	0,00	0,00	0,00	24.636.400,00	22.382.938,98	22.382.938,98	0,00	2.253.461,02	0,00
46	35	03	39	06	3	0	030101				Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	10.495.621,65	10.495.621,65	0,00	24.504.378,35	0,00
46	35	03	39	06	3	0	030101	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	10.495.621,65	10.495.621,65	0,00	24.504.378,35	0,00
46	35	03	39	06	3	0	030101	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	10.495.621,65	10.495.621,65	0,00	24.504.378,35	0,00
46	35	03	39	06	3	0	030101	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	10.495.621,65	10.495.621,65	0,00	24.504.378,35	0,00
46	35	03	39	06	3	0	040101				Hizmet Binaları,Tesis Yapımı	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	951.312,81	951.312,81	0,00	4.548.687,19	0,00
46	35	03	39	06	3	0	040101	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	951.312,81	951.312,81	0,00	4.548.687,19	0,00
46	35	03	39	06	3	0	040101	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	951.312,81	951.312,81	0,00	4.548.687,19	0,00
46	35	03	39	06	3	0	040101	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	951.312,81	951.312,81	0,00	4.548.687,19	0,00
46	**35**	**03**	**40**								**TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**1.965.700,00**	**0,00**	**153.255,71**	**153.255,71**	**1.965.700,00**	**1.371.970,99**	**1.371.970,99**	**0,00**	**593.729,01**	**0,00**
46	35	03	40	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	1.965.700,00	0,00	153.255,71	153.255,71	1.965.700,00	1.371.970,99	1.371.970,99	0,00	593.729,01	0,00
46	35	03	40	06	3						Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	1.965.700,00	0,00	153.255,71	153.255,71	1.965.700,00	1.371.970,99	1.371.970,99	0,00	593.729,01	0,00
46	35	03	40	06	3	0					Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	1.965.700,00	0,00	153.255,71	153.255,71	1.965.700,00	1.371.970,99	1.371.970,99	0,00	593.729,01	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000				Tanımsız	0,00	1.965.700,00	0,00	153.255,71	153.255,71	1.965.700,00	1.371.970,99	1.371.970,99	0,00	593.729,01	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.965.700,00	0,00	153.255,71	153.255,71	1.965.700,00	1.371.970,99	1.371.970,99	0,00	593.729,01	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	619.400,00	0,00	113.255,71	60.255,71	672.400,00	598.033,37	598.033,37	0,00	74.366,63	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	619.400,00	0,00	113.255,71	60.255,71	672.400,00	598.033,37	598.033,37	0,00	74.366,63	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	98.776,51	98.776,51	0,00	19.823,49	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	118.600,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	98.776,51	98.776,51	0,00	19.823,49	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	1.227.700,00	0,00	40.000,00	93.000,00	1.174.700,00	675.161,11	675.161,11	0,00	499.538,89	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	29.700,94	29.700,94	0,00	23.299,06	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	9.270,66	9.270,66	0,00	24.429,34	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	1.129.000,00	0,00	40.000,00	93.000,00	1.076.000,00	635.593,61	635.593,61	0,00	440.406,39	0,00
46	35	03	40	06	3	0	000000	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	595,90	595,90	0,00	11.404,10	0,00
46	**35**	**03**	**41**								**SU İSALE VE DAĞITIM DAİRE BAŞKANLIĞI**	**0,00**	**36.428.300,00**	**0,00**	**2.380.225,44**	**2.380.225,44**	**36.428.300,00**	**27.270.933,56**	**27.270.933,56**	**0,00**	**9.157.366,44**	**0,00**
46	35	03	41	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	36.428.300,00	0,00	2.380.225,44	2.380.225,44	36.428.300,00	27.270.933,56	27.270.933,56	0,00	9.157.366,44	0,00
46	35	03	41	06	3						Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	36.428.300,00	0,00	2.380.225,44	2.380.225,44	36.428.300,00	27.270.933,56	27.270.933,56	0,00	9.157.366,44	0,00
46	35	03	41	06	3	0					Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	36.428.300,00	0,00	2.380.225,44	2.380.225,44	36.428.300,00	27.270.933,56	27.270.933,56	0,00	9.157.366,44	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000				Tanımsız	0,00	30.328.300,00	0,00	2.030.225,44	880.225,44	31.478.300,00	26.338.234,47	26.338.234,47	0,00	5.140.065,53	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	30.328.300,00	0,00	2.030.225,44	880.225,44	31.478.300,00	26.338.234,47	26.338.234,47	0,00	5.140.065,53	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	3.316.100,00	0,00	165.225,44	225,44	3.481.100,00	2.547.659,12	2.547.659,12	0,00	933.440,88	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	332.600,00	0,00	165.225,44	225,44	497.600,00	466.625,46	466.625,46	0,00	30.974,54	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	01	3	İşçiler	0,00	2.983.500,00	0,00	0,00	0,00	2.983.500,00	2.081.033,66	2.081.033,66	0,00	902.466,34	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	628.500,00	0,00	10.000,00	0,00	638.500,00	530.428,35	530.428,35	0,00	108.071,65	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	60.700,00	0,00	10.000,00	0,00	70.700,00	69.242,77	69.242,77	0,00	1.457,23	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	02	3	İşçiler	0,00	567.800,00	0,00	0,00	0,00	567.800,00	461.185,58	461.185,58	0,00	106.614,42	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	18.578.700,00	0,00	1.755.000,00	430.000,00	19.903.700,00	17.985.203,30	17.985.203,30	0,00	1.918.496,70	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	03	1	Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	922.367,19	922.367,19	0,00	477.632,81	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	15.364.700,00	0,00	1.500.000,00	0,00	16.864.700,00	15.887.287,40	15.887.287,40	0,00	977.412,60	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	25.847,56	25.847,56	0,00	9.552,44	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	17.473,83	17.473,83	0,00	19.726,17	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	1.100.300,00	0,00	55.000,00	430.000,00	725.300,00	668.594,00	668.594,00	0,00	56.706,00	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	565.100,00	0,00	0,00	0,00	565.100,00	268.178,49	268.178,49	0,00	296.921,51	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	76.000,00	0,00	200.000,00	0,00	276.000,00	195.454,83	195.454,83	0,00	80.545,17	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	7.805.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00	7.455.000,00	5.274.943,70	5.274.943,70	0,00	2.180.056,30	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	955.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.055.000,00	1.012.699,55	1.012.699,55	0,00	42.300,45	0,00
46	35	03	41	06	3	0	000000	5	06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	6.850.000,00	0,00	0,00	450.000,00	6.400.000,00	4.262.244,15	4.262.244,15	0,00	2.137.755,85	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010112				Yeraltı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	447.539,78	447.539,78	0,00	152.460,22	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010112	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	447.539,78	447.539,78	0,00	152.460,22	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010112	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	447.539,78	447.539,78	0,00	152.460,22	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010112	5	06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	447.539,78	447.539,78	0,00	152.460,22	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010201				İzmir İçmesuyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	850.000,00	441.027,31	441.027,31	0,00	408.972,69	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010201	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	850.000,00	441.027,31	441.027,31	0,00	408.972,69	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010201	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	850.000,00	441.027,31	441.027,31	0,00	408.972,69	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010201	5	06	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	850.000,00	441.027,31	441.027,31	0,00	408.972,69	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010204				Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesis Etmek	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	44.132,00	44.132,00	0,00	3.455.868,00	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010204	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	44.132,00	44.132,00	0,00	3.455.868,00	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010204	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	44.132,00	44.132,00	0,00	3.455.868,00	0,00
46	35	03	41	06	3	0	010204	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	44.132,00	44.132,00	0,00	3.455.868,00	0,00
46	**35**	**03**	**42**								**KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ AMİRLİĞİ**	**0,00**	**22.904.200,00**	**0,00**	**1.575.934,44**	**1.225.934,44**	**23.254.200,00**	**22.945.255,30**	**22.945.255,30**	**0,00**	**308.944,70**	**0,00**

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46	35	03	42	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	22.904.200,00	0,00	1.575.934,44	1.225.934,44	23.254.200,00	22.945.255,30	22.945.255,30	0,00	308.944,70	0,00
46	35	03	42	06	3						Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	22.904.200,00	0,00	1.575.934,44	1.225.934,44	23.254.200,00	22.945.255,30	22.945.255,30	0,00	308.944,70	0,00
46	35	03	42	06	3	0					Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	22.904.200,00	0,00	1.575.934,44	1.225.934,44	23.254.200,00	22.945.255,30	22.945.255,30	0,00	308.944,70	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000				Tanımsız	0,00	22.904.200,00	0,00	1.575.934,44	1.225.934,44	23.254.200,00	22.945.255,30	22.945.255,30	0,00	308.944,70	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	22.904.200,00	0,00	1.575.934,44	1.225.934,44	23.254.200,00	22.945.255,30	22.945.255,30	0,00	308.944,70	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	7.982.200,00	0,00	1.549.033,17	2.211,01	9.529.022,16	9.523.208,64	9.523.208,64	0,00	5.813,52	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	7.982.200,00	0,00	1.549.033,17	2.211,01	9.529.022,16	9.523.208,64	9.523.208,64	0,00	5.813,52	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	1.226.000,00	0,00	16.901,27	0,00	1.242.901,27	1.238.782,28	1.238.782,28	0,00	4.118,99	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	1.226.000,00	0,00	16.901,27	0,00	1.242.901,27	1.238.782,28	1.238.782,28	0,00	4.118,99	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	13.615.000,00	0,00	10.000,00	1.146.822,16	12.478.177,84	12.179.165,65	12.179.165,65	0,00	299.012,19	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	465.000,00	0,00	0,00	301.822,16	163.177,84	153.883,50	153.883,50	0,00	9.294,34	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	13.035.000,00	0,00	10.000,00	735.000,00	12.310.000,00	12.025.282,15	12.025.282,15	0,00	284.717,85	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	03	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	81.000,00	0,00	0,00	76.901,27	4.098,73	4.098,73	4.098,73	0,00	0,00	0,00
46	35	03	42	06	3	0	000000	5	06	1	Mamul Mal Alımları	0,00	81.000,00	0,00	0,00	76.901,27	4.098,73	4.098,73	4.098,73	0,00	0,00	0,00
46	35	03	45								PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	0,00	0,00	0,00	9.453.844,17	336.000,00	9.117.844,17	2.278.500,32	2.278.500,32	0,00	6.839.343,85	0,00
46	35	03	45	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	9.453.844,17	336.000,00	9.117.844,17	2.278.500,32	2.278.500,32	0,00	6.839.343,85	0,00
46	35	03	45	06	3						Su Temini İşleri ve Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	9.453.844,17	336.000,00	9.117.844,17	2.278.500,32	2.278.500,32	0,00	6.839.343,85	0,00
46	35	03	45	06	3	0					Su temini işleri ve hizmetleri	0,00	0,00	0,00	9.453.844,17	336.000,00	9.117.844,17	2.278.500,32	2.278.500,32	0,00	6.839.343,85	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000				Tanımsız	0,00	0,00	0,00	1.257.084,64	36.000,00	1.221.084,64	903.757,79	903.757,79	0,00	317.326,85	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	1.257.084,64	36.000,00	1.221.084,64	903.757,79	903.757,79	0,00	317.326,85	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5	01		Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	567.583,83	0,00	567.583,83	468.175,81	468.175,81	0,00	99.408,02	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5	01	1	Memurlar	0,00	0,00	0,00	567.583,83	0,00	567.583,83	468.175,81	468.175,81	0,00	99.408,02	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5	02		Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	118.087,88	0,00	118.087,88	68.923,82	68.923,82	0,00	49.164,06	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5	02	1	Memurlar	0,00	0,00	0,00	118.087,88	0,00	118.087,88	68.923,82	68.923,82	0,00	49.164,06	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5	03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	571.412,93	36.000,00	535.412,93	366.658,16	366.658,16	0,00	168.754,77	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5	03	2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	5.824,18	5.824,18	0,00	3.275,82	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5	03	3	Yolluklar	0,00	0,00	0,00	23.836,91	0,00	23.836,91	12.184,68	12.184,68	0,00	11.652,23	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5	03	4	Görev Giderleri	0,00	0,00	0,00	56.122,00	3.000,00	53.122,00	50.452,59	50.452,59	0,00	2.669,41	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5	03	5	Hizmet Alımları	0,00	0,00	0,00	448.854,02	12.000,00	436.854,02	286.986,71	286.986,71	0,00	149.867,31	0,00
46	35	03	45	06	3	0	000000	5	03	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	33.500,00	21.000,00	12.500,00	11.210,00	11.210,00	0,00	1.290,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010101				İzmir İçmesuyu Master Planının Hazırlanması	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010101	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010101	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010101	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010102				Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010102	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010102	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010102	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010103				Çamlı Barajı İsale Hattı Arıtma Tesisi	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010103	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010103	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010103	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010104				Değirmendere Barajı İsale Hattı İçmesuyu Arıtma Tesisi	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010104	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010104	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010104	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010105				Tuzlusu Arıtma Tesisleri	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010105	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010105	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010105	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010109				Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisi (Yenileme)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010109	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010109	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010109	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010111				Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini	0,00	0,00	0,00	99.970,00	0,00	99.970,00	12.944,60	12.944,60	0,00	87.025,40	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010111	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	99.970,00	0,00	99.970,00	12.944,60	12.944,60	0,00	87.025,40	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010111	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	99.970,00	0,00	99.970,00	12.944,60	12.944,60	0,00	87.025,40	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010111	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	99.970,00	0,00	99.970,00	12.944,60	12.944,60	0,00	87.025,40	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010406				İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	0,00	0,00	0,00	1.173.291,54	0,00	1.173.291,54	263.566,68	263.566,68	0,00	909.724,86	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010406	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	1.173.291,54	0,00	1.173.291,54	263.566,68	263.566,68	0,00	909.724,86	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010406	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.173.291,54	0,00	1.173.291,54	263.566,68	263.566,68	0,00	909.724,86	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010406	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.173.291,54	0,00	1.173.291,54	263.566,68	263.566,68	0,00	909.724,86	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010502				Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010502	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010502	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	010502	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020110				Atıksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri	0,00	0,00	0,00	340.112,96	0,00	340.112,96	147.464,88	147.464,88	0,00	192.648,08	0,00

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CEVTELİ (TL)

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK	EK VE OLAĞAN ÜSTÜ VERİLEN ÖDENEK	AKTARMAYLA EKLENEN (+)	AKTARMAYLA DÜŞÜLEN (-)	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ	ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA	İPTAL EDİLEN ÖDENEK	SONRAKİ YILA DEVREDEN ÖDENEK
46	35	03	45	06	3	0	020110	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	340.112,96	0,00	340.112,96	147.464,88	147.464,88	0,00	192.648,08	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020110	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	340.112,96	0,00	340.112,96	147.464,88	147.464,88	0,00	192.648,08	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020110	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	340.112,96	0,00	340.112,96	147.464,88	147.464,88	0,00	192.648,08	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020113				Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020113	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020113	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020113	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020212				Yağmursuyu Toplama Sistemleri	0,00	0,00	0,00	350.263,82	0,00	350.263,82	251.055,27	251.055,27	0,00	99.208,55	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020212	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	350.263,82	0,00	350.263,82	251.055,27	251.055,27	0,00	99.208,55	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020212	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	350.263,82	0,00	350.263,82	251.055,27	251.055,27	0,00	99.208,55	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020212	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	350.263,82	0,00	350.263,82	251.055,27	251.055,27	0,00	99.208,55	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020302				Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)	0,00	0,00	0,00	357.192,71	0,00	357.192,71	267.021,73	267.021,73	0,00	90.170,98	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020302	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	357.192,71	0,00	357.192,71	267.021,73	267.021,73	0,00	90.170,98	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020302	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	357.192,71	0,00	357.192,71	267.021,73	267.021,73	0,00	90.170,98	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020302	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	357.192,71	0,00	357.192,71	267.021,73	267.021,73	0,00	90.170,98	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020404				Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları	0,00	0,00	0,00	600.800,00	0,00	600.800,00	39.241,37	39.241,37	0,00	561.558,63	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020404	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	600.800,00	0,00	600.800,00	39.241,37	39.241,37	0,00	561.558,63	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020404	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	600.800,00	0,00	600.800,00	39.241,37	39.241,37	0,00	561.558,63	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020404	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	600.800,00	0,00	600.800,00	39.241,37	39.241,37	0,00	561.558,63	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020501				Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	0,00	0,00	0,00	1.705.950,00	0,00	1.705.950,00	227.982,50	227.982,50	0,00	1.477.967,50	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020501	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	1.705.950,00	0,00	1.705.950,00	227.982,50	227.982,50	0,00	1.477.967,50	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020501	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.705.950,00	0,00	1.705.950,00	227.982,50	227.982,50	0,00	1.477.967,50	0,00
46	35	03	45	06	3	0	020501	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.705.950,00	0,00	1.705.950,00	227.982,50	227.982,50	0,00	1.477.967,50	0,00
46	35	03	45	06	3	0	040101				Hizmet Binaları,Tesis Yapımı	0,00	0,00	0,00	242.178,50	0,00	242.178,50	165.465,50	165.465,50	0,00	76.713,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	040101	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	242.178,50	0,00	242.178,50	165.465,50	165.465,50	0,00	76.713,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	040101	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	242.178,50	0,00	242.178,50	165.465,50	165.465,50	0,00	76.713,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	040101	5	06	5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	0,00	0,00	242.178,50	0,00	242.178,50	165.465,50	165.465,50	0,00	76.713,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	040201				Plan Proje Alimlari / Dere Havzaları Taşkın Modelleme Projesi	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	040201	5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	040201	5	06		Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46	35	03	45	06	3	0	040201	5	06	3	Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

KARŞILAŞTIRMALI İLLER BANKASI PAYLARI

AYLAR	2009		2010		2011		2012	
	TAHAKKUK	TAHSİL	TAHAKKUK	TAHSİL	TAHAKKUK	TAHSİL	TAHAKKUK	TAHSİL
Ocak	3.514.003,82 TL	2.108.402,29 TL	2.937.811,01 TL	1.762.686,61 TL	5.557.991,12 TL	3.334.794,67 TL	6.370.700,17 TL	4.551.049,97 TL
Şubat	2.496.199,36 TL	1.497.719,62 TL	3.539.719,14 TL	2.123.831,48 TL	4.401.422,38 TL	2.640.853,43 TL	4.720.088,68 TL	2.900.438,49 TL
Mart	2.872.438,76 TL	1.723.463,26 TL	3.371.261,32 TL	2.022.756,79 TL	4.844.281,05 TL	2.906.568,63 TL	5.632.706,01 TL	3.813.055,82 TL
Nisan	2.159.702,48 TL	1.295.821,49 TL	3.680.274,32 TL	2.208.164,59 TL	5.169.715,38 TL	3.101.829,23 TL	5.459.462,59 TL	3.639.812,39 TL
Mayıs	1.772.933,95 TL	1.063.760,37 TL	3.626.545,08 TL	2.175.927,05 TL	4.066.752,85 TL	3.660.077,56 TL	4.387.774,24 TL	2.632.664,54 TL
Haziran	2.107.195,73 TL	1.264.317,44 TL	3.837.718,50 TL	3.837.718,50 TL	4.727.038,86 TL	4.254.334,97 TL	4.791.672,70 TL	2.970.153,38 TL
Temmuz	2.575.469,74 TL	1.545.281,84 TL	4.902.898,58 TL	4.804.840,61 TL	5.707.689,08 TL	5.136.920,17 TL	6.356.878,38 TL	5.721.190,54 TL
Ağustos	2.166.585,68 TL	1.299.951,41 TL	3.972.136,01 TL	3.892.693,29 TL	5.564.669,55 TL	5.008.202,59 TL	4.868.333,57 TL	4.381.500,21 TL
Eylül	2.433.795,94 TL	1.460.277,56 TL	4.258.997,91 TL	4.173.817,95 TL	4.221.655,29 TL	3.057.830,87 TL	5.831.427,03 TL	5.248.284,32 TL
Ekim	3.257.061,18 TL	1.954.236,70 TL	5.819.987,88 TL	3.491.992,73 TL	7.244.391,52 TL	5.403.696,54 TL	6.422.802,96 TL	4.482.378,50 TL
Kasım	2.110.498,22 TL	1.266.298,93 TL	3.768.558,50 TL	2.261.135,10 TL	4.638.969,26 TL	2.820.787,98 TL	4.744.710,72 TL	2.846.826,43 TL
Aralık	2.693.907,58 TL	1.616.344,54 TL	4.168.443,00 TL	2.501.065,80 TL	4.842.372,46 TL	3.020.085,11 TL	5.820.579,82 TL	3.878.713,49 TL
TOPLAM :	**30.159.792,44 TL**	**18.095.875,45 TL**	**47.884.351,25 TL**	**35.256.630,50 TL**	**60.986.948,80 TL**	**44.345.981,75 TL**	**65.407.136,87 TL**	**47.066.068,08 TL**

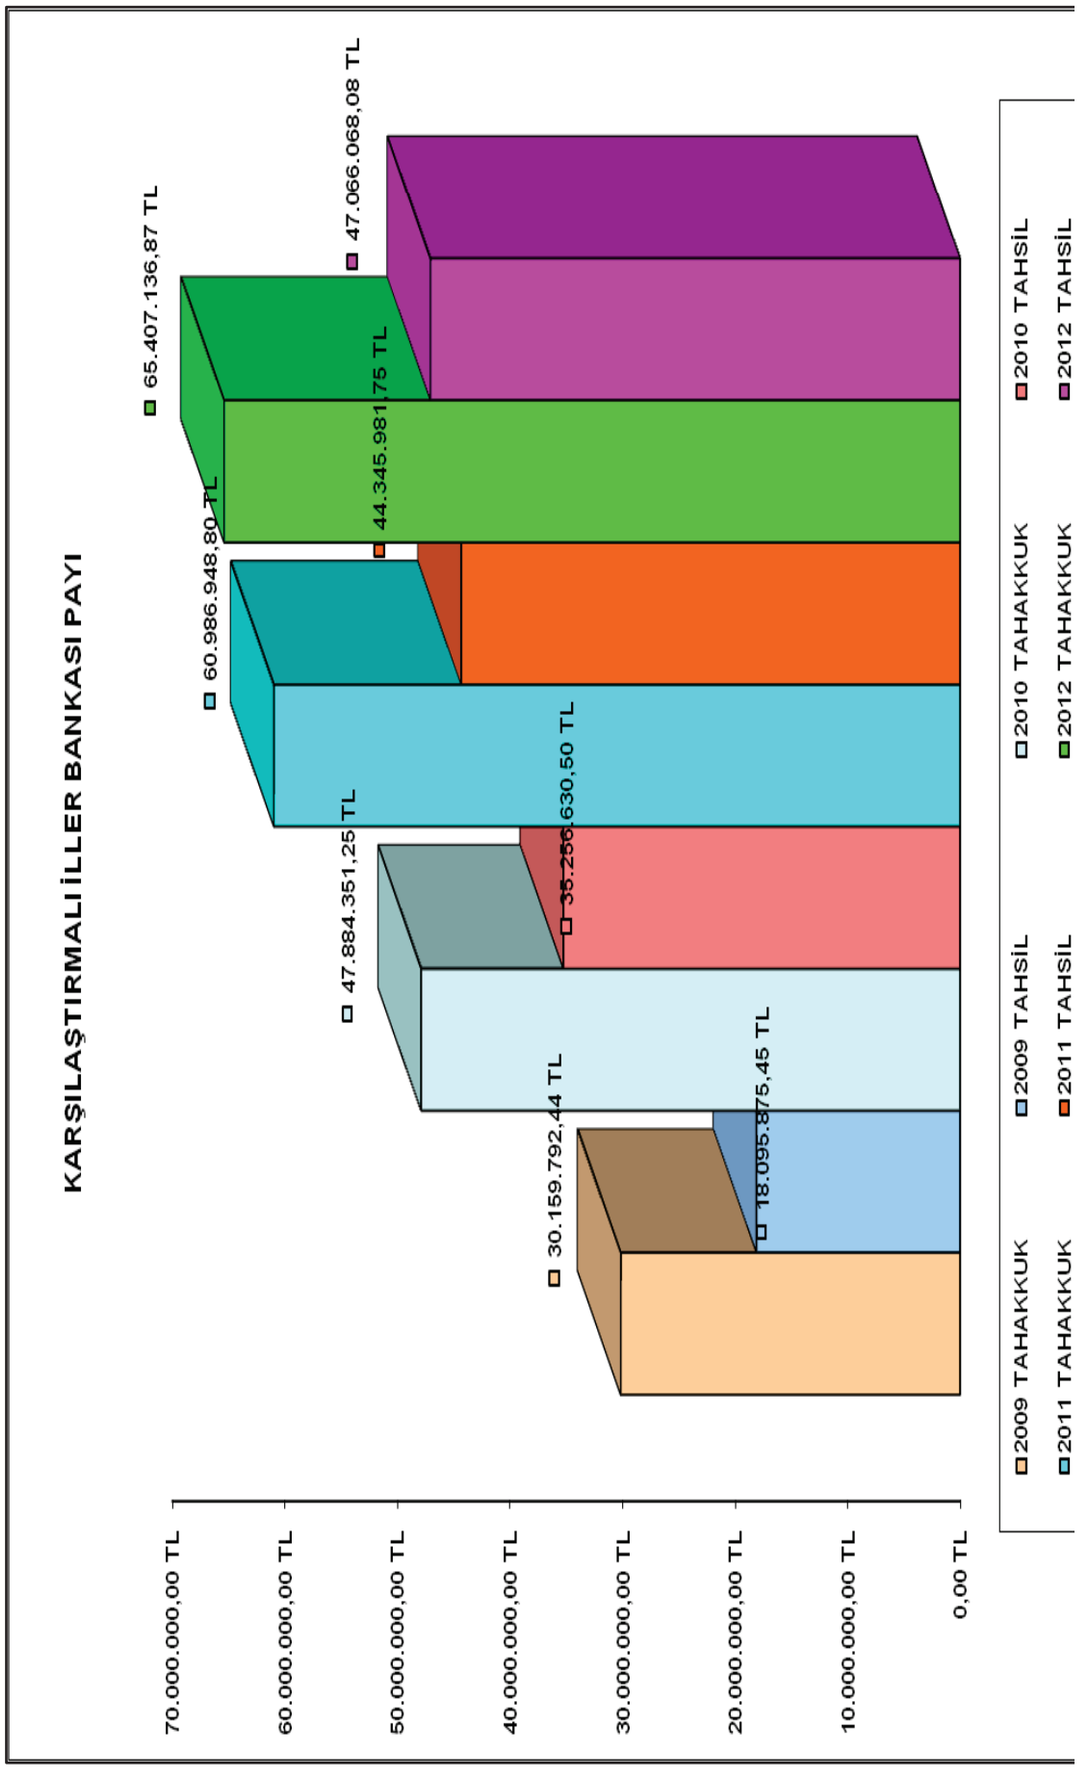
KARŞILAŞTIRMALI İLLER BANKASI PAYI
70.000.000,00 TL
60.000.000,00 TL
50.000.000,00 TL
40.000.000,00 TL
30.000.000,00 TL
20.000.000,00 TL
10.000.000,00 TL
0,00 TL
65.407.136,87 TL
47.066.068,08 TL
60.986.948,80 TL
44.345.981,75 TL
47.884.351,25 TL
35.256.630,50 TL
30.159.792,44 TL
18.095.875,45 TL
2009 TAHAKKUK
2009 TAHSİL
2010 TAHAKKUK
2010 TAHSİL
2011 TAHAKKUK
2011 TAHSİL
2012 TAHAKKUK
2012 TAHSİL

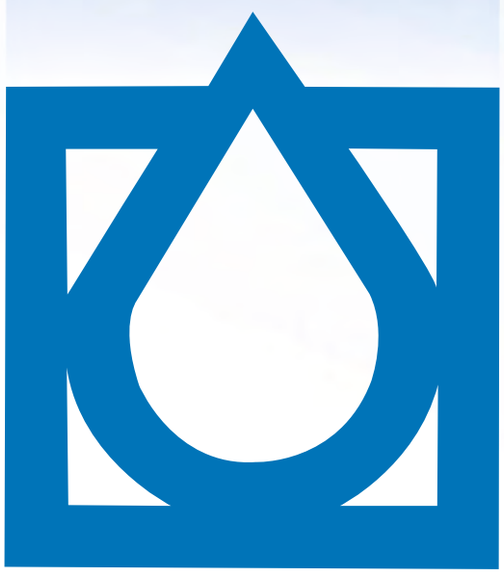

İZSU

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü



B-Performans Bilgileri

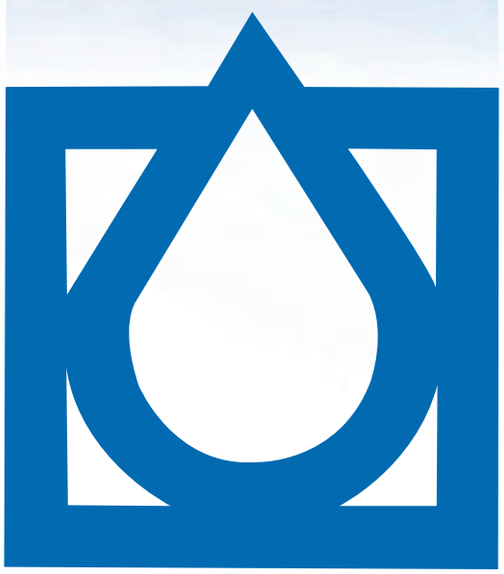

İZSU

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

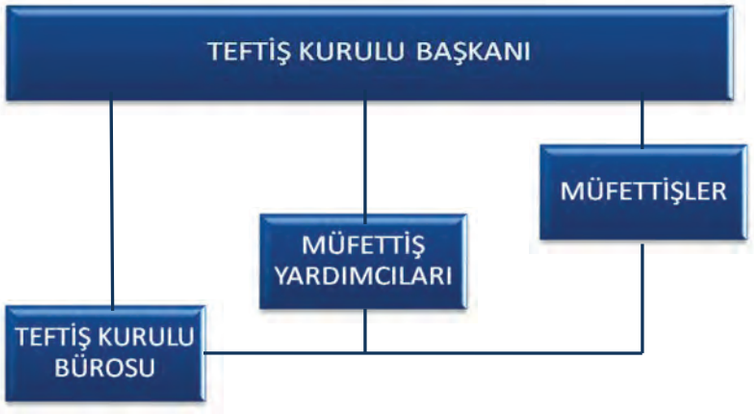

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İZSU Teftiş Kurulu Yönetmeliği, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 29.03.2012 tarih ve M.35.0.İBB.5.01.11.04-50.02.04/201 sayılı, Genel Kurulun 14.05.2012 tarih ve M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/07sayılı kararları ile kabul edilmiş ve 22.05.2012 tarihinde www.izsu.gov.tr adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu Yönetmelik,Yönetim Kurulunun 16.12.2005 tarih ve 06/483 sayılı Genel Kurulun 17.02.2006 tarih ve M.35.0.İBB.0.10.01.02.162 sayılı kararları ile kabul edilen ve 9/3/2006 tarihli Ege Telgraf Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren İzsu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile Yönetim Kurulunun 15/10/2009 tarih ve 21/629 sayılı, Genel Kurulun 20/11/2009 tarih ve M.35.0.İBB.0.10.04.301.05.01–02.09 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2/12/2009 tarihinde www.izsu.gov.tr adresinde yayımlanarak yürürlüğe giren İzsu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır. Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, İZSU Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve kurumun ve çalışanlarının görevleri sebebiyle ilgili ya da ilişkili oldukları çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklere dayanarak;

≠ Genel Müdürlük birimlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda genel ilkeleri saptamak, bu ilkeler çerçevesinde yanlışlık, eksiklik, usulsüzlük ve yolsuzlukların saptanması ile giderilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek, etkinliklerin ölçülü, hesaplı ve verimli şekilde yürütülmesi önlemlerini araştırıp belirtmek ve personelin verimli çalışmasını özendirici teftiş sistemini geliştirmek,

≠ Genel Müdürlük birimlerinin iş ve işlemlerini, çalışmalarını, hesaplarını, personelin görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarını; ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararı, genelge ve emirlerin uygulanmasını teftiş etmek, denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak,

≠ Memur, işçi ve diğer personel hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

≠ Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,

≠ Teftiş raporlarını incelemek, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

≠ Teftiş rehberi hazırlamak,

≠ Genel Müdür tarafından verilen teftiş ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek,

≠ Görev standartlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINCA 2012 YILI İTİBARİYLE YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLER AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR.

Teftiş Kurulu Başkanlığına, 2010 yılından 5 adet, 2011 yılından 30 adet devreden işin haricinde 2012 yılında 56 adet araştırma, inceleme ve soruşturma konusu intikal etmiş ve devreden dosyalarla birlikte 46 adedi 2012 yılında sonuçlandırılmış olup (2010 yılından devredenlerin tamamı, 2011 yılından devredenlerin 14 adedi) bunlardan 10 adedi Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiş (2 adedi tevdi raporu, 1 adedi suç duyurusu), 1 adet tazmin raporu düzenlenmiş, 19 adediyle ilgili disiplin cezası uygulanmıştır. Ayrıca 9 adedinin incelemesi yapılarak sonucunda ilgili Daire Başkanlıklarına tesis edilecek işlere esas olmak üzere yazı yazılmış; 18 adedi ise işlemden kaldırılmıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığından, devreden 35 işle birlikte yürütülen 91 adet inceleme, araştırma ve soruşturma konuları içinde yer alan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Valilik Makamının Kurul Başkanını İZSU haricindeki diğer kamu kurumlarının iş ve işlemlerine yönelik ön inceleme yapılmasına esas doğrudan görevlendirmesi suretiyle yürütülen işlemler sonucunda 1 adet ön inceleme, 3 adet araştırma ve 1 adet disiplin raporu olmak üzere toplam 5 adet rapor düzenlenerek eki dosyalar ile birlikte Valilik Makamına ve disiplin yönüyle de ilgili kurumuna teslim edilmiştir.

Söz konusu çalışma bilgileri aşağıdaki tabloda da gösterilmiştir:

Yıl	Gelen	Ceza Sorş.	Disp.	4483 Sy.Kn.	Taz.	Tevdi	Birimlere Yazı Gönd.	İşl. Kalk.	Devreden	TOPLAM İŞLEM SAYISI
2010	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–
2011	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–
2012	56	10	19	5	1	2	9	18	–	64

27.11.2011 tarihli ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi hükmü gereğince, uygun görüş alınması bakımından İzmir Valiliğine gönderilmiş olan İzsu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hakkındaki İçişleri Bakanlığının 29.02.2012 tarih, B.05.0.MAH.0.07.01.00/5892 sayılı yazısı ve ekindeki görüş, İzmir Valiliğinin 07.03.2012 tarih ve B.05.4.VLK.0.35.07.00-250-602 sayılı yazısı ekinde teslim alınmış olup söz konusu uygun görüşe esas değerlendirmelere ilişkin Teftiş Kurulu Yönetmelik Taslağı hazırlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin kararların alınması için 28.03.2012 tarihinde Yönetim Kuruluna havalesi sağlanmıştır.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığının uygun görüş ve değerlendirme cetvellerine göre hazırlanan 96 maddeden ibaret İzsu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmelik Taslağı, Yönetim Kurulunun 29.03.2012 tarih ve M.35.1.İBB.5.01.11.04-50.02.04/201 sayılı, Genel Kurulun 14.05.2012 tarih ve M.35.1.İBB.5.01.-050.01.04/07 sayılı kararları ile kabul edilerek 3011 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda 22.05.2012 tarihinde yayımı yapılarak yürürlüğe girmiştir.

8-12 Şubat 2012 tarihlerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen '6. Su ve Kanalizasyon İdareleri İstişare Toplantısı'na katılım sağlanmış

olup toplantı öncesinde idarelere bildirilen komisyon gündemlerinden Teftiş ve Hukuk Komisyonu gündemi görüşülmüş ve Sonuç Bildirgesine eklenen komisyon kararları alınmıştır.

Yazılı aşaması 12.09.2012, sözlü aşaması 17.09.2012 tarihlerinde yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yeterlik Sınavı, Teftiş Kurulu Başkanı Nedim GÜRAL ve Müfettiş Zeynep YÜCEL'in de üyesi oldukları sınav kurulunca gerçekleştirilmiş; Teftiş Kurulu Başkanı Nedim GÜRAL'ın üyesi olduğu sınav kurulunca Eshot Genel Müdürlüğü Müfettiş Yeterlik Sınavı 15.10.2012 tarihinden başlayarak yapılmıştır.

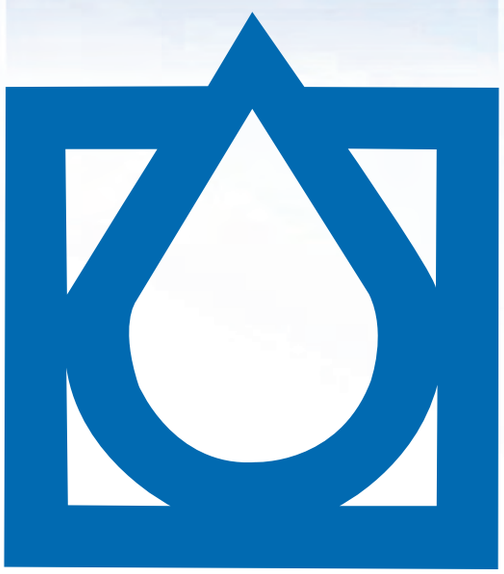

İZSU

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ



YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

Hukuk Müşavirliği 1987 yılında 2560 Sayılı Yasa çerçevesinde kurulan İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp 25.05.1990 tarihli Ege Telgraf Gazetesinde yayınlanan ve 15.03.1990 Tarih G-K-1 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü "Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği"ne göre kurulmuş Genel Müdürlük makamına direkt bağlı bir birimdir.

Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği uyarınca; aşağıdaki görevleri yerine getirir.

≠ Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,

≠ İdare tarafından veyahut idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idari ve mali kaza mercileri, hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,

≠ Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh tekliflerini temyiz, tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak,

≠ Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek,

≠ İdarenin görevlerine ait ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek,

≠ Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak 1.Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak,

≠ Genel Müdürlüğe gelen her türlü tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak,

≠ Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerine katılmak, Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek,

≠ Dava ve icra takipleri vesair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunmak,

≠ Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri ifa etmektir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

2012 YILINDA AÇILAN DAVALAR:

2012 yılında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından adli yargıda 418, idari yargıda 22 dava açılmıştır. 3.kişiler tarafından İZSU Genel Müdürlüğü aleyhine de adli yargıda 132, idari yargıda 116 dava açılmıştır. 2012 yılında açılmış olup takibi yapılan dava dosya sayısı 688'dir.

2012 YILINDA DERDEST OLAN DAVALAR:

2012 yılında açılan ve önceki yıllardan devreden toplam 1.260 adet dava derdest durumdadır. Bunlardan 1032 tanesi adli yargıda açılan davalar, 228 tanesi ise idari yargıda açılan davalardır.

YAZIŞMALAR VE HUKUKİ MÜTALAALAR:

2012 yılı içerisinde Hukuk Müşavirliğine gelen ve giden evrak sayısı 3.891adete ulaşmıştır. Hukuk Müşavirliği tarafından bunların işlemleri yerine getirilmiştir. Genel Müdürlük Makamının, Daire Başkanlıklarının ve diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu konularda mütalaa alınmak üzere Hukuk Müşavirliğine 2012 yılı içinde 55 adet yazı intikal etmiş ve bunların cevapları verilmiştir.

İCRA TAKİPLERİ :

	ANALİZ BEDELİ	SU+ATIKSU+KÖP	KAÇAKSU	TOPLAM
2012 Yılı Takip Açılmak Üzere Gelen Evrak	151	2.259	151	2.561
2012 Yılı Takip Açılmak Üzere Dağıtılan Evrak	151	1.981	151	2.283
Takip Açılmadan Ödenen ve İade Edilen		257	21	278
2012 Yılı Açılan Takip Sayısı	151	1.981	130	2.262
	GEÇMİŞ YILLARA AİT		**2012 YILINA AİT**	
2012 İnfaz Olan Dosya Adeti	545		450	995
Toplam İnfaz Adeti	545		450	995
Tahsil Edilen Tutar	**ANA PARA**	**GECİKME**	**KDV**	**TOPLAM**
Su Bedeli	442.755,23	187.981,68	33.837,45	664.574,36
Atık Su Bedeli	11.663,57	8.290,97	1.492,33	21.446,87
K.Ö.P Bedeli	6.071,64	1.710,41	307,88	8.089,93
TOPLAM TUTAR	**460.490,44**	**197.983,06**	**35.637,66**	**694.111,16**

KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ



YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliğimizce, Kurumumuza bağlı olan tüm tesislerin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun yönetmelikleri doğrultusunda koruma ve güvenliğini sağlamaktır.

Güvenlik Amirliğimiz 24.07.1981- tarih ve 17410 sayılı bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması hakkındaki 2495 sayılı kanuna istinaden kurumumuz bünyesinde 1992 yılında oluşturulmuştur.

10.06.2004 tarihinde 2495 sayılı kanunun iptal edilip yerine 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve bu kanuna ilişkili olarak çıkartılan yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.

Koruma ve Güvenlik Amirliğimizin Koruma ve Güvenlik personeli ile ilgili tüm yazışmaları ilgisine göre, T.C İZMİR Valiliği Emniyet Müdürlüğü ne bağlı; Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü – İl Jandarma Komutanlığı ve T.C, MANİSA Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ile yapmaktadır.

İlgisine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlar ve mermiler ile Türk Ceza Kanunu ve **4857 sayılı** İş Kanunu kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

2012 Yılı içerisinde Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz bünyesinde gerçekleşen faaliyet ve projeler;

1.Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz nöbet yerlerinde kullanılmak üzere 500 adet pano, 200 adet Atatürk posteri alımı gerçekleştirilmiştir.

2.Koruma ve Güvenlik personellerinin yıl için de yazlık ve kışlık olmak üzere giyim alımları gerçekleştirilmiştir.

3.Tahtalı barajı nöbet yerlerinde görev yapan personellerin ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için 12 ton kömür ve 1,5 ton odun alımı gerçekleştirilmiştir.

4.Yine Tahtalı barajı nöbet yerlerine elektrik enerjilerinin sağlanması için 12 adet akü alımı gerçekleştirilmiştir.

5.Tüm nöbet yerleri ve amirliğimiz yazı işleri için gerekli olan kırtasiye malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir.

6.Nöbet yerlerini denetlemek üzere 400 cilt nöbet denetleme formu alımı gerçekleştirilmiştir.

7.2012 Yılı içerinde Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz personellerinin hizmet içi eğitim atışları yaptırılmıştır.

8.Güvenlik Amirliği odasında ve güvenlik yazı işlerinde kullanılmak üzere mobilya malzemesi alım işi gerçekleştirilmiştir.

9. Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz sorumluluk alanlarından nöbet yerlerinde kullanılmak üzere 2000 adet Türk Bayrağı, 500 adet İzsu flaması ve 20 adet Bayrak ipi alım işi gerçekleştirilmiştir.

10.Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz sorumluluk alanlarındaki tesislerde kullanılmak üzere toplam 60 adet İnfrared Isıtıcı alımı gerçekleştirilmiştir.

11.Güvenlik amirliği odasında kullanılmak üzere laminent parke alım işi gerçekleştirilmiştir.

12.Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz sorumluluk alanlarından nöbet yerlerinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alım işi gerçekleşmiştir.

13.Tahtalı barajında kullanılan tekne için döşeme, tente ve projektör alım ve montaj işi gerçekleştirilmiştir.

14.Sorumluluk alanlarımızdan Tahtalı barajının, geniş bir alan içerisinde olması, etrafında köylerin bulunması ve bu köylerde insanların geçimleri arasında hayvancılığın büyük bir yer tutması, haliyle baraj sahasının korunmasının daha özverili olarak yapılmasını gerektirmektedir. Kaçak hayvan girişlerinin önlenmesi, baraj sahasında dikili olan ağaçlar ve yeni dikilen fidanların korunması, avlanmak, piknik yapmak, define aramak, serinlemek isteyenler gibi kaçak giriş yapan insanların engellenmesi başlıca görevlerimiz arasındadır. Bu yüzden tahtalı barajında 91 koruma ve güvenlik personeli görev yapmaktadır. Ayrıca personelin devriyede kullanmaları için 2 adet araç tahsis edilmiştir. Faaliyetlerimiz arasında buradaki personellerin sürekli denetim ve kontrollerinin yapılması ve buradaki personellerin daha verimli görev yapabilmeleri için her türlü teçhizat ve donanımlarının temin edilmesi, ısınma ihtiyaçlarının karşılanması çalışmaları titizlikle yapılmaktadır.

15.Sorumluluk alanımız 7 bölgeden oluşmaktadır. Manisa Bölgesi, Bornova Bölgesi, Karşıyaka Bölgesi, Menderes Bölgesi, Buca Bölgesi, Narlıdere Bölgesi ve Merkez Bölgesidir. Her bölgeden sorumlu şefler vardır. Her bölge şefi nöbet yerlerinin, denetim ve kontrollerini yapmaktadır. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Amirinin talimatıyla belirli günlerde rutin denetim ve kontrollerin haricinde tüm şefler ekstra denetim ve kontrollere çıkmaktadır. Denetim ve kontrol sonucunda yapılan tüm tutanaklar amirliğimize getirilmekte, denetimde görülen eksiklikler belirlenip, bu eksikliklerin giderilmesine çalışılmaktadır.

16.Amirliğimizce, Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda yeni nöbet yerlerinin açılması çalışmaları yapılmakta ve bu nöbet yerlerinin Özel Güvenlik İzin belgelerinin çıkarılması için emniyet ve jandarma ile gereken yazışmalar yapılarak korunması istenen tesis nöbete açılmaktadır.

17.Yeni açılan nöbet yerlerinin koruma planları hazırlanarak emniyet ve jandarmaya gönderilmektedir. Ayrıca mevcut tesislerin koruma ve güvenlik planlarının güncellemeleri yapılmaktadır.

18.Birimimizce, Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde mevcut olan ve alımı gerçekleştirilen malzemelerin tesliminin yapılması, ilgili personellere zimmetlenmesi işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır.

19.Amirliğimizce hem kendi bünyemizdeki personellerin hem de hizmet satın alımı ile çalışan personellerin puantajları her ay düzenli olarak yapılmakta ve ödemeleri zamanında çıkartılmaktadır.

20.Amirliğimize gelen vatandaş dilekçeleri, mahkeme yazıları, resmi kurum yazıları incelenerek, gerekli bilgi ve belgeler zamanında ilgili yerlere gönderilmektedir.

21.Gerekli görüldüğü hallerde, nöbet yerleri arasında personel yer değişikleri yapılmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Daire Başkanlığımız 22 Nisan 2006 gün ve 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esasların Yürürlüğe konulması hakkındaki 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Meclisin 11.09.2006 gün ve 02.719 Sayılı kararı ile Personel Daire Başkanlığı ünvanı değiştirilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ünvanını almıştır.

Daire Başkanlığımız Memur Personel Şube Müdürlüğü, işçi Personel Şube Müdürlüğü, Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı şefliklerden oluşur.

Başkanlığımızın ana işlevi, idaremizin personel istihdamı politikasının en iyi şekilde yürütümünün sağlanması olup, Kanunla, (Yönetmelikler, Yönergeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda) Genel Müdürlük çalışanlarının özlük hakları, mali ve sosyal haklarıyla ilgili iş ve işlemleri, çalışanla işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, personel planlaması, işgücü temini ile çalışanların bilgi ve verimini arttırmak amacıyla her türlü eğitime yönelik faaliyetleri koordine ve takip etmekle görevlidir.

MEMUR PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

Genel Müdürlüğümüzün teşkilat yapısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer almakta olup, memur sicil şefliği ve maaş tahakkuk şefliklerinden oluşmaktadır. Memur Personel Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları; İdaremizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre görev yapan memurların ilgili kanun hükümleri çerçevesinde, atama, nakil, terfi, intibak, görevlendirme, asalet tasdiki, görevden uzaklaştırma, izin, disiplin cezalarına ilişkin işlemler ile 2829 sayılı kanuna istinaden memurun sigortalı ve Bağkur hizmetlerinin birleştirilmesi ve 5434 sayılı kanunun EK.18 maddesine göre bu sürelerin değerlendirilmesi, 5434 sayılı kanuna göre emeklilik işlemleri, aynı yasaya göre emekli ikramiyesi ve emekli ölüm yardımlarına ilişkin işlemler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi çerçevesinde sözleşmeli personelin işe alınmasına ilişkin işlemler, 5682 sayılı pasaport kanununun hükümleri doğrultusunda memurlara yeşil pasaport verme ve pasaport süresinin uzatılması işlemleri, 5510 sayılı kanun çerçevesinde memurun bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının sağlık aktivasyon işlemleri, İdaremizden emekli olan veya emekli olduktan sonra vefat edenlerin dul ve yetimlerine makam tazminatı, 4505 Sayılı Kanun gereğince temsil tazminatı 631 sayılı KHK gereğince görev tazminatı ödemelerine ilişkin işlemler, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde söz konusu sınavlara memurlarımızın katılımının sağlanmasına ilişkin işlemler, Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde ihtiyaca göre boş kadro değişikliği, dolu kadro değişikliği, kadro iptali, yeni kadro ihdas cetvellerinin hazırlanması ve onaya sunulması, 17 Nisan 2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar gereğince personele ünvanlarına göre ödenecek oranların tespiti, cetvellerin hazırlanması ve onaya sunulması, aynı karar gereğince arazi çalışması yapan teknik personele 3 ayda bir ek tazminat ödemesinin yapılmasına ilişkin işlemler, 666 sayılı KHK' ye göre ödenen ek ödeme oranlarının tespiti ve memurun ünvanına ve bulunduğu dereceye uygun olarak ödenmesi, personel maaşlarından icra, lojman kirası, yemek bedeli kesintilerinin yapılması, özel sigorta primlerinin personelin maaş

hesabında değerlendirilmesi 4688 sayılı kanun çerçevesinde memur sendikalarına ilişkin işlemler, kefalet kesintilerinin kayıt altına alınması ve yatırılması, fazla mesai ödemeleri, emekli keseneklerinin yatırılması işlemleri ve memur personelin her türlü özlük, sosyal ve mali haklarına ilişkin diğer iş ve işlemler Memur Personel Şube Müdürlüğünün görev alanına girmektedir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

Memurların terfi tarihleri itibarıyla her ay kademe, derece ve kıdem terfileri yapılmış derecesel olarak ek göstergeleri tespit edilerek maaşlarına yansıtılmıştır.

2012 yılı içerisinde çeşitli nedenlerle idaremizden ayrılan 15 memurumuzun mevzuat çerçevesinde işlemleri gerçekleştirilmiştir.

5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi hükümlerine göre 2012 yılı içerisinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Statüsünde çalıştırılacak 27 sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenileme işlemleri yapılmış, Haziran 2012 ayında 113 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilmiştir.

İdaremize naklen tayin olan memurlara Kimlik kartı çıkarılması ile emekliye ayrılan personelimizin emekli kimlik kartlarına ilişkin iş ve işlemler sonuçlandırılmıştır.

15 özürlü personelin atama işlemleri sonuçlandırılmış olup, buna ilişkin onaylı ÖMSS Yerleştirme Bildirim Raporu T.C. Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir.

Memur Disiplin Kurulu ve Genel Müdürlük Makamınca verilen disiplin cezaları ile ilgili işlemler mevzuat çerçevesinde(Toplam 23 personel)sonuçlandırılmıştır.

İdaremizde görev yapan memurların sigortalı hizmetlerinin değerlendirilmesinin ardından 1425 Sayılı Kanunla eklenen Ek 18.madde çerçevesinde intibaklarının yapılarak emekliğe esas aylıklarının tespit edilmesi neticesinde İdaremize giriş tarihinden bugüne emekli kesenek farkları hesaplanmış ve Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılmıştır.

Bir üst öğrenimi bitiren 21 memurumuzun intibak işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından derece ve kademeleri maaşlarına yansıtılmıştır

İdaremizde boş bulunan 66 adet şef kadrosu ile 5 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şefi kadroları için görevde yükselme sınavı açılmış ve talepler değerlendirilerek sınava katılmaya hak kazanan personelin isimlerinin duyurulmasının ardından isimler İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere İzmir Valiliğine yazı ile bildirilmiştir. Eylül 2012 ayında söz konusu sınava iştirak eden idaremiz personelinin sınav sonuçları Sınav Kurulumuzca değerlendirilmesinin ardından başarı listesi Sınav Kurulu Kararıyla imza altına alınmış ve tüm birimlere duyurusu yapılmış olup atama işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İdaremiz memurlarının yemek kartlarına yükleme yapılması amacıyla istenen bilgiler 2012 Nisan ayına kadar ay be ay hazırlanarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

İdaremize iş başvurusu yapan 1849 vatandaşlarımıza gerekli bilgi verilmiştir. İdaremiz memurlarının her türlü izin, istirahat vb. iş ve işlemleri sonuçlandırılmıştır.

İdaremizden emekliye ayrılan personelimizin almış oldukları ikramiye tutarları ile makam-görev-temsil tazminatlarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen belgeler, incelemesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir

Sayıştay Denetim Raporlarına karşılık gerekli savunmalar yapılmıştır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 maddesi çerçevesinde İdaremizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan öğretim elemanının ücretleri ay be ay tahakkuk ettirilerek ödenmesi sağlanmıştır. Yine aynı kanun hükümlerinden hareketle Dr.Gökdeniz NEŞER ve Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ'nin idaremize yönetim kurulu üyesi olarak atama işlemleri gerçekleştirilmiştir

5510 Sayılı Yasa çerçevesinde İdaremize giren ve ayrılan personel internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş, her ay olmak üzere yine internet ortamında emekli keseneklerinin SGK sitesine aktarılmasının ardından bankaya yatırılması sağlanmıştır.

SGK'nın HİTAP Proje kapsamında gerekli bilgiler memurların özlük bilgilerine yüklenmesinin ardından bilgiler HİTAP programına aktarılmıştır.

Memur personelin maaşları, mevzuatlarında yapılan değişikliklerde takip edilerek ay be ay tahakkuk ettirilmesinin ardından ödenmesi sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzde teknik hizmetler sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden açık mahallerde fiilen çalışanlara 3 aylık dönemler itibarıyla ek tazminat ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin kuruluşuna dair kanun gereğince İdaremizde görev yapan iki denetçimize her ay ücretleri muntazam olarak ödenmiştir.

Ocak ve Temmuz aylarında katsayı artısından kaynaklanan maaş farklarının tahakkukları yapılarak ödenmesi sağlanmıştır.

15 personelimize doğum yardımı yapılmıştır.

2012 yılında kefaletli göreve başlayan memurlara cüzdan istenmiş olup, kefilli memurların maaşlarından yapılan kefalet kesintileri her ay muntazam bankaya yatırılmıştır. Ayrıca 3 ayda bir listeler düzenlenerek makbuzlarla birlikte kefalet sandığına gönderilmiş ve kesintileri ilgililerin cüzdanlarına işlenmiştir

4688 sayılı Memur Sendikaları Kanunu çerçevesinde memur sendikaları ile ilgili sendika üyesi personelin takibi ve kayıt altına alınması sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz personeli hakkında çeşitli kurumlardan istenilen istatistik bilgileri hazırlanarak ilgililere gönderilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz memur personeli için 2012 yılı fazla çalışma teklifleri hazırlanarak İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.

5188 Sayılı yasaya göre görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin her ay puantajları esas alınarak fazla mesailerinin ödenmesi sağlanmıştır.

Memurlara 2011 yılına ait fazla mesai ödemeleri yapılmıştır.

27.11.2011 tarih, 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasıyla 796 olan memur kadro sayısının 1384'e yükseltilmesinin ardından kadro ihdası ve Dolu-Boş kadro değişiklikleri yapılmıştır. Ayrıca memurlar mükteseplerine uygun kadrolara yerleştirilmişlerdir.

2013 yılı memur personel giderleri bütçesi hazırlanarak cetveller, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

Memur ve sözleşmeli personelin verdiği ek mal bildirimlerinin kontrolü düzenli olarak yapılmıştır.

Yeni kurulan Projeler Dairesi Başkanlığı ile ilgili personel aktarımı ve diğer işlemler sonuçlandırılmış, ayrıca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden resmi mühür temin edilmiştir.

Memur Personel Şube Müdürlüğünde 01.Ocak.2012 – 30.Haziran.2012 tarihleri arasında 3243 gelen, 2302 giden olmak üzere toplam 5545 evrak işlem görmüştür.

İŞÇİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

İşçi Personel Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz teşkilat yapısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer almakta olup, İşçi Sicil Şefliği, ücret tahakkuk şefliği, hizmet alımları şefliği ve taşınır kayıt ve kontrol şefliği birimlerinden oluşmaktadır. İşçi personel Şube Müdürlüğü 4857 sayılı iş kanunu, 5510 ve 506 sayılı Sigortalar kanunu çerçevesinde kadrolu işçileri ile 5393 sayılı kanunun 49.maddesi çerçevesinde İdaremizde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya atama, özlük dosyalarının hazırlanması, saklanması, işe giriş bildirgelerinin internet üzerinden girişinin yapılması, izin, istirahat, terfi işlemleri, kadro nakil, iş akdi, fesih, emeklilik işlemleri, aylık ücret, ikramiye, fazla mesai ödemeleri, kıdem ve ihbar tazminat ödemeleri, sigorta e-bildirgelerinin internet ortamında toplam 54 işyeri bazında SGK' ya gönderilmesi, yeni kurulan işyerlerinin tescillerinin yapılması, sözleşmeli personelin sözleşmelerinin her yıl yenilenmesi işlemlerini yapmakla görevlidir.

Ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde hizmet alımı yoluyla çeşitli şirketlerden temin edilen personelin ihale çalışmalarının yürütülmesi, personelin çalışma birimlerinin tespiti, bu kişilerin sisteme girilmesi, özlük bilgi değişikliklerinin kontrolü ve tahakkuk değerlerinin hazırlanması ile aylık hak ediş tutarlarının hesaplanarak ilgili şirketlere ödenmesinin sağlanmasına ilişkin iş ve işlemlerde görevleri arasında yer almaktadır.

Diğer taraftan kadrolu işçi ve şirket personeline dağıtılması öngörülen iş giyimi, iş sağlığı ve iş güvenliği Kurulu Kararlarıyla belirlenen koruyucu malzeme ile ilgili taleplerin oluşturulması ve ihale işlemlerinin yürütülerek ilgili personele dağıtımının sağlanması da sorumluluk alanındadır.

Bütün bu görevlerden ayrı olarak, 3308 Sayılı Çıraklık ve Eğitim Yasası gereği kış dönemi meslek lisesinde okuyan öğrenciler ile üniversitede okuyan yaz dönemi öğrencilerine staj yapma olanağı sağlanarak çalıştıkları süre ile sınırlı kalacak şekilde aylık ücret tahakkuklarının hazırlanması özlük bilgilerinin sisteme yüklenmesi, izin ve rapor işlemlerinin yürütülmesini sağlamakla da yükümlüdür.

Son olarak çalışma statülerine bakılmaksızın İdaremizde görev yapan tüm personelin Personel Devam Kontrol Sisteminde kullandıkları personel kartlarının hazırlanması devam kontrol sisteminin kurulması, bilgi ağına alınması, bozukların onarılması ve yeni açılan birimlere yeni sistemlerin takılması ve puantaj bilgilerinin ilgili birimlere gönderilmesi de görevleri arasındadır.

2012 YILI FAALİYETLERİ

2012 yılı içerisinde idaremizin çeşitli birimlerinde çalışmakta iken emeklilik gerekçesi ile ayrılan 66 kadrolu işçimizin, Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir İl Müdürlüğüne verilmesi gereken, personelin son 1 yılına ait sigorta matrahları ile sigorta prim tutarlarını gösteren "emeklilik sigorta hesap fişleri" hazırlanmıştır.

Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir İl Müdürlüğünden emekli olabileceklerine dair yazı getiren emekli personellerimizin kendilerine ödenmesi gereken kıdem tazminat tahakkuk bordroları hazırlanarak, ilgili personellere ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

2012 yılında, kendi istekleri ile emekli olan 66 kadrolu işçimize 6245 sayılı harcırah yasası gereği ödenmesi öngörülen yolluk tazminat tahakkuk tutarları hazırlanarak ilgili personele ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

İhale sonrasında şirketlere verilen işler kapsamında, Genel Müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde şirket personeli konumunda çalışmakta iken çeşitli nedenlerle işten ayrılan 203 personelin işten çıkış işlemleri yapılmıştır.

İhale sonrasında şirketlere verilen işler kapsamında, Genel Müdürlüğümüz çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 2012 yılında iş'e alınan 492 şirket personelinin iş'e giriş işlemleri sonuçlandırılmıştır.

Her ayın 15'inde sözleşmeli personel aylık ücretleri, her ayın 19'unda kadrolu işçi aylık ücretleri, her ayın 5'inde kadrolu işçi özel avans tutarları ile her ayın 25'inde, kadrolu işçi yıllık ücretli izin avans ödemeleri yapılmıştır.

Kadrolu işçilere Toplu İş Sözleşmesinin 39.maddesi gereğince yılda iki defa ödenmesi gereken, her biri 30 yevmiye tutarındaki sözleşme ikramiyeleri hazırlanarak ilgili personele ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

6772 sayılı yasa doğrultusunda, Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen 4 farklı tarihte ödenmesi gereken 13 yevmiye tutarındaki yasal ikramiye tahakkuk bordroları hazırlanarak, ilgili personellere ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

İzelman, İzbelcom (1),İzbelcom (2), İzbeton, İzenerji ve Has Özel Güvenlik ile Teknolojik Yapılar Şirketlerine ihale sonrasında verilen işler kapsamında, çeşitli birimlerimizde çalışan şirket personellerinin aylık boş puantaj formları hazırlanarak ilgili birimlere dağıtılmış, onaylı dolu puantaj bilgilerinin her ayın ilk mesai günü ilgili birimlerden toplanarak, bilgisayar ortamında ücret tahakkuk bordrolarına dönüştürülerek, aylık şirket hak ediş değerleri onaylı dolu puantaj bilgileri doğrultusunda hazırlanmış ve hak ediş tutanaklarının basılması ve ilgili birimlere onaylatılarak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi sağlanmıştır.

Çeşitli birim amirliklerimizce birimler arası nakilleri önerilen ve Genel Müdürlüğümüzce nakilleri uygun görülen kadrolu yada şirket personelinin izleyen aybaşından itibaren nakil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Disiplin kuruluna intikal eden dosyaların Toplu İş Sözleşmesi 72.Maddesi uyarınca karara bağlanarak uygulama aşamasına getirilmiştir.

Toplu sözleşme yada şirket teknik şartnameleri gereği, Genel Müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde kadrolu işçi konumunda çalışan personelimiz ile şirket personelinin Eshot, İzulaş ve İzdeniz ile Metro toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmeleri için yıllık toplu taşım kartları temin edilmiştir

Eshot Genel Müdürlüğünden temin edilerek ilgili personellere dağıtılan toplu taşım kartlarından ay içerisinde meydana gelen değişiklikler izlenerek, aylık ödeme faturalarına yansıtılmış ve aylık hak ediş tutarlarının Genel Müdürlük Oluru sonrasında ilgili kuruma ödenmesi sağlanmıştır.

Yaz dönemi boyunca, eğitim branşlarına uygun stajyerlik çalışmalarını İdaremizde tamamlamaları Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunan üniversite öğrencilerinin her türlü özlük kayıtlarının yapılması ve puantaj formlarının hazırlanması sağlanmıştır.

Çeşitli birimlerde çalışan 420 stajyer öğrencimizin her ay aylık ücret ödemelerinin 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası gereği hazırlanması sağlanmıştır.

4857 Sayılı İş Kanununun 80.maddesi gereği her ay yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği toplantılarına katılınmış ve sonucu takibi ile gerekli alımların yapılması sağlanmıştır.

Kadrolu işçiler ile sözleşmeli personelin aylık ücretlerinden yapılan yasal ve özel kesinti tutarları yasal süresi içinde ilgili kurumlara ödenmiştir.

Kadrolu işçilerimiz ile İZELMAN, İZBETON, İZBELCOM, İZENERJİ HAS ÖZEL GÜVENLİK ve TEKNOLOJİK YAPILAR şirket personellerinin izin, istirahat işlemleri sonuçlandırılmıştır.

Şirket personellerinin 2012 yılı aile bildirimleri toplanmış, sistem bilgilerinin güncellenerek ilgili şirkete gönderilmesi sağlanmıştır.

İZELMAN Anonim Şirketi ile diğer şirketlerde çalışan özürlü personelin 2012 yılına ait yıllık periyodik muayeneleri yapılmış, muayene sonuçları ilgili şirkete gönderilmiştir.

Kadrolu işçiler ile sözleşmeli personelin periyodik yıllık güncelleme bilgi formlarının sisteme yüklenmesi ve askeri geçim indirimi formları toplanarak ilgili şirkete gönderilmiştir.

Hizmet alımı yoluyla temin edilen İZELMAN, İZBELCOM, İZBETON, İZENERJİ, HAS ÖZEL GÜVENLİK şirketlerinin aylık hak ediş ödemeleri her ayın ilk 3 günü içerisinde, eksiksiz bir şekilde yapılmıştır

Mülakatı tamamlanan 321 personel Teknolojik Yapılar Limited Şirketinde işe başlatılmış, Has Güvenlikte işe başlayan 48 personelin iş ve işlemleri sonuçlandırılmıştır.

.Şirket personeli ile kadrolu işçilerin fazla çalışma formları ile tatil çalışma formları her ay Başkanlık Oluruna sunularak onay aşaması tamamlanmıştır.

Taşınır Kayıt Kontrol Sisteminde İşçi Personel Şube Müdürlüğü adına alınması öngörülen tetanos aşısı ile yoğurt, el havlusu, yüz havlusu ve sabun satın alma talepleri oluşturulmuş, ihale işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili personele dağıtılması sağlanmıştır

.Kadrolu işçilerin kendi veya çocuklarına ait eğitim belgeleri toplanarak eğitim yardımlarının ödenmesi sağlanmıştır

.Kadrolu işçilerimizin ücret grup değişiklikleri ile toplu iş sözleşmesi uygulama tahakkukları işleme konulmuştur.

EKAT Eğitim Belgesi olan kadrolu ve şirket personelinin eğitim sonunda almış oldukları sertifikaları ilgili personele gönderilmiş ve özlük bilgilerine yüklenmesi sağlanmıştır.

Kadrolu işçilerin toplu sözleşme görüşmelerine katılım sağlanmış ve buna ilişkin iş ve işlemler sonuçlandırılmıştır.

Çalışma kontenjanının eksik olması nedeni ile 2 eski hükümlü, 2 özürlü personel alımı yapılmıştır.

15 Haziran'da göreve başlatılan 113 yeni sözleşmeli personeli ile çalışan 27 eski sözleşmeli personelin sözleşmeleri 2013 yılı için yenilenmesi sağlanmıştır.

Kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan günlük ücret değişiklikleri 01.03.2012 tarihi itibarı ile sisteme yüklenmiştir.

2012 yılı içerisinde tadilat gören çeşitli birimlerdeki kart okuma sistemlerinin yeni yerlerine nakledilmesi kamera sistemlerinin devreye sokulması sağlanmıştır

Taşınır Kayıt Kontrol Sistemindeki İşçi Personel Şube Müdürlüğü adına çelik burunlu bot, iş ayakkabısı, elektrikçi ayakkabısı ve iş giyimlerinin satın alma talepleri oluşturularak, Satın Alma Şube Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmıştır

Yıl içerisinde çeşitli birimlerde iş kazası geçiren personelimizin belgeleri hazırlanarak ilgili şirketler ile Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmıştır.

Kadrolu ve sözleşmeli personel ile şirket personellerine iş yeri hekimlerinin öngördüğü tetanos aşısı temin edilerek aşılanmaları sağlanmıştır.

Sendika sözleşmesi gereği Cumhuriyet altını alımı için ihale onay belgesi oluşturulması, toplu iş sözleşmesi gereği çocuklarını sünnet ettiren işçilerimize cumhuriyet altını verilmesi sağlanmıştır

2012 yılında kart okuyucu sisteminde arıza meydana gelen birimlerin sistemlerinin yenilenmesi ve mevcut programların güncellenmesi sağlanmış

Kadrolu işçi ile sözleşmeli personel konumunda çalışan işçilerimizin aylık sigorta prim ve hizmet belgeleri hazırlanarak elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir

İşçi Personel Şube Müdürlüğüne gelen yazı yada dilekçelerin yanıtları hazırlanarak ilgili birim yada kurumlara gönderilmesi sağlanmıştır

EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Eğitim Şube Müdürlüğümüz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin belirlenen misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlenen ilkeleri ile stratejik amaç ve hedeflerini içeren performans programlarının, Harcama Birimlerince yürütülmesi aşamalarında, bu birimlerde görevli personelin, ortaya çıkabilecek eğitim ihtiyaçlarının bildirilmesi üzerine, bunların yapılan eğitim plan ve programlarına alınması, programların uygulanması aşamaları ile eğitim faaliyetlerinin Genel Müdürlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak ve diğer konularda da, eğitime ihtiyacı olan harcama birimlerine, bu konuda destek hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir.

Eğitim Şube Müdürlüğünün, daha evvelki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da, gerçekleştirdiği faaliyetlerde; Harcama Birimlerinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmeleri ve eğitiminin sağlanması, bilgilerinin tazelenmesi ve güncelleştirilmesi, hizmet alanındaki verimliliklerinin artırılması, yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılması ilke ve hedeflerini ön planda tutulmuştur.

Yukarıda sayılan ilke ve hedeflerin gerçekleştirilmesi, eğitimde koordinasyon ile uygulamada birliğin sağlanması, etkinlik ve verimin artırılması amacıyla Genel Müdürlük Makamının 07.07.2010 tarih ve 2010/23 Genelgesi çerçevesinde, faaliyetlerini sürdürmüştür. Harcama Birimi Amirlerince, (Daire Başkanlıklarınca) 2012 yılı bütçe ödenek ve tespit ve teklif çalışmaları sırasında, bağlı personelin 2012 yılı eğitim ihtiyaçları tespit edilmiş ve bunların karşılanması için gerekli ödenekleri sağlanmıştır. Birimlerinin eğitim plan ve projelerini oluşturan eğitim konuları ve katılacak personeli içeren eğitim İhtiyacı tespit, talep tabloları düzenlenerek, Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilmesini müteakiben, İzsu Genel Müdürlüğü Harcama Birimleri 2012 Yılı Eğitim Plan ve Projeleri İcmal Tablosu düzenlenerek, Eğitim Kuruluna karar için sunulmuştur. Eğitim Kurulunca alınan Karar, Genel Müdürlük Makamınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2012 yılı Eğitim Kurulu Kararı, uygulanması için Harcama Birimi, Başkanlıklarına gönderilmiş ve kurumumuz internet sitesinde yayınlanması sağlanmıştır.

Eğitim Şube Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 215. maddesine dayanılarak kurulmuş olup; faaliyetlerini yine aynı kanununun 214.md.' si ve bu md.' ye istinaden Devlet Personel Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlanan 25.05.1990- 05/117 tarihinde onaylanan Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliğine göre yerine getirmektedir.

Genel Müdürlük Makamının 07.07.2010 tarih ve 2010/23 sayılı Genelgesi hükümleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri, 2012 yılı eğitim faaliyetlerinde uygulanmıştır.

2012 faaliyet yılı içinde, Eğitim Şube Müdürlüğü ve faaliyeti ile ilgili mevzuat değişikliği olmamıştır. Norm Kadro değişikliklerinin zamanla Daire Başkanlıkları isminde değişikliğe neden olması nedeniyle isim güncellemesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliğine Ek Madde:1 eklenmiştir.

Eğitim Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığına bağlı olup faaliyetlerini, 1 Müdür personeli ile sürdürmektedir.

Birimin kuruluşundan 2012 yılı faaliyet raporu dönemine kadar, Organizasyon yapısı aynı olup, herhangi bir değişiklilik olmamıştır.

2012 YILI FAALİYETLERİ

12.01.2012 tarihinde Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonunda yarım gün süre ile ilgili ilçe belediye personeli, İzsu Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ilgili personelinin katıldığı "Katı Atık Ücretlerinin Tahsil Yöntemleri" konusunda gerekli koordinasyon ve bilgilendirmeyi sağlayıcı eğitim verilmiş olup eğitim için bütçeden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

14.03.2012 tarihinde saat:13.30-16.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan İlçe Belediyelerinin Mali İşler ve Bilgi İşlem birimlerinde ve İzsu Genel Müdürlüğünde görevli personeli için su abonelerinin (abone tipi değişen ve yeni abonelerin) Katı Atık Bedeli Tipinin internet ortamında sisteme girilmesi ve değiştirilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlayıcı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş olup eğitime 54 personel katılmış ve faaliyet için bütçeden herhangi bir ücret ödenmemiştir.

27.03.2012 tarihinde Torbalı Cumhuriyet İlköğretim Okulun geliştirdiği proje olup Kurumların ve mesleklerin öğrencilere tanıtılmasını hedefleyen çalışmaya Okulunun talebi üzerine Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Torbalı Şb. Müdürü ile birlikte katılım sağlandı. Çalışmada Kurumumuz öğrencilere tanıtılmış, yapılan genel ve bölgesel hizmetler hakkında bilgi verilmiştir. Kurumumuzda çalışan personelin meslekleri tanıtılmış ve bunlarla ilgili öğrencilerin soruları yanıtlanarak bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.

28-29 Ağustos 2012 tarihinde 2 gün süre ile Ege Belediyeler Birliği tarafından İzmir' de düzenlenen "Kamu Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı" konulu ücretsiz eğitime İdaremiz adına 27 personelin katılımı ile ilgili iş ve işlemler yerine getirilmiştir.

Daire Başkanlıklarının birim içi eğitim faaliyetlerine eğitim salonu tahsis edilmiş, araç, gereç ve eğitim ile ilgili konularda gerekli destek sağlanmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı; Araştırma Geliştirme ve Strateji Planlama Şube Müdürlüğü, Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü, Banka ve Finansman Şube Müdürlüğü, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüklerinden oluşmuştur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlükleri;

- İZSU Genel Müdürlüğü stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerinin ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İZSU Genel Müdürlüğü faaliyet raporunu hazırlamak,
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- İZSU Genel Müdürlüğü yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- İZSU Genel Müdürlüğünün, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

görevleriyle sorumludur.

Ayrıca Daire Başkanlığına bağlı Evrak Kayıt Biriminde; Daire Başkanlığı'na kurum içi ve dışından gelen - giden evrakların takibi yapılmaktadır. 2012 yılı içinde 12.985 gelen evrak,6.466 giden evrak olmak üzere toplam 19.451 adet evrak girişi ve çıkışı yapılmıştır.

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) VE STRATEJİ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kurulan ARGE ve Strateji Planlama Şube Müdürlüğü;
Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirleme; İdare Stratejik Planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaları koordine ve konsolide etme; İdarenin yönetim ve hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ve performans gibi kurumsal ve hizmetlerle ilgili durum ve gelişime yönelik bilgi ve verileri toplama, analiz etme ve yorumlama, bu verilere dayalı yıllık faaliyet raporlarını hazırlama; görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceleme; kurum içi kapasite araştırması yapma; hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etme ve genel araştırma yapma; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları gerçekleştirme çalışmalarını yürütmekle görevlidir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

≠ 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

≠ Stratejik Plan 2010-2014 ve Yıllık Performans Programları çerçevesinde İdaremizde gerçekleştirilen faaliyetlerin yıl içinde üçer aylık periyodlarla izlenmesi ve mali/fiziksel gerçekleşmelerin raporlanması, İdaremiz birimlerinden temin edilen veriler doğrultusunda ve müdürlüğümüzce geçtiğimiz yıllarda kurulan veri tabanı ve raporlama sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, gerektikçe izleme ve raporlama sistemimizde ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır.

≠ İl düzeyinde yatırımcı kuruluşların yatırım projelerini izlemeye yönelik İzmir Valiliğince yürütülen İl Koordinasyon Kurulu çalışmaları için İdaremizden talep edilen veri ve raporlar, 2012 sonu itibariyle hazırlanarak sunulmuştur.

≠ 2012 Yılı Kamu Yatırım Programında yer alan İdaremiz projelerinin dönemsel izlemeleri, Kalkınma Bakanlığının ilgili yazı ve çağrıları ile ilettiği talimat ve yönlendirmeler doğrultusunda gerçekleştirilerek raporlanmıştır.

≠ 2013-2015 Orta Vadeli Mali Plan kapsamında, ilgili dönem Kamu Yatırım Programına alınması teklif edilen İdaremiz yatırım projeleri dosyası, ilgili birimlerle koordinasyon içinde hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

≠ İçişleri Bakanlığı Yerel Bilgi Projesi veri tabanı için çeşitli periyodlarda İdaremizden istenen veri ve istatistikler hazırlanarak ilgili makamlara iletilmiştir.

≠ 2012 Yılı Kuruluş Brifing Dosyası için İdaremizden çeşitli periyodlarla istenen veriler hazırlanarak sunulmuştur.

≠ İdaremiz 2013 Yılı Performans Programı çalışmalarına, programda yer alacak faaliyet ve performans göstergeleri bilgileri hazırlıkları çerçevesinde destek amaçlı katılım sağlanmıştır.

≠ TÜİK vb. yetkili kuruluşlardan gelen anket, istatistik vb. taleplere yönelik veriler hazırlanarak gönderilmiştir.

≠ İdare ve/veya Üst Yönetici için, çeşitli konularda istenen rapor, sunum vb. çalışmalar hazırlanmıştır.

≠ Araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında, belirlenen temalar doğrultusunda bazı hazırlık ve araştırma çalışmaları sürdürülmüş, bu temalar çerçevesinde çeşitli ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

≠ İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulunun gerçekleştirdiği Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet temalı etkinleri çerçevesindeki "Küresel Değişim Dinamikleri ve Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma" konulu panelde "Kamu Yönetiminde Değişim ve Stratejik Planlama Yönetişim İlkelerinin Uygulanabilme Durumu Açısından Sahadan Gözlemler" konulu bildiri sunulmuştur. Ayrıca, bu kapsamda yıl içinde İdaremize dinleyici katılımı çağrısı yapılan diğer panel, konferans vb. etkinliklere katılım organize edilmiştir.

≠ İdare içi ve dışından yetkili makamlarca talep edilen diğer çeşitli bilgi ve verinin hazırlanması ve sunulması çalışmaları ilgili birimlerle koordinasyon içinde yürütülmüştür.

≠ Birim personelinin; kurum içinde düzenlenen hizmet içi eğitimlerin yanı sıra, çeşitli akademik ve uygulamacı kurumlarca verilen, birimin görevlerine veya güncel çalışmalarının gereklerine uygun eğitimlere katılımı sağlanmıştır. Ayrıca, görev alanına veya personelin gelişimine yönelik çeşitli toplantı, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalara katılım gerçekleştirilmiştir.

MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü'ne bağlı Muhasebe, Tahsilat,Resmi Daire ve Maliyet Muhasebesi Şeflikleri mevcuttur.

5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5436 – 4734 Sayılı ve 2560 Sayılı Kanunla eklenen 3305 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişlerinin kanuna uygun olarak kesilmesi, demirbaş sayımı yapılması, Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir ve Kasa Defterlerinin yazılması, her ay aylık mizanlar alınıp, hesap hareketlerinin kontrol edilmesi, Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının hazırlanması görevlerini yürütmektedir.

İZSU Genel Müdürlüğü Yönetmeliği'ne uygun abonelik sıfatını kazanmış olan Su, Atık su, K.Ö.P ve Resmi Daire aboneliklerinin tükettiği su ya da uzaklaştırılacak atık su hizmet bedeli miktarına karşılık çıkarılan faturaların zamanında tahsil edilebilmesi için; hem geleneksel vezne ödeme noktalarından, hem de teknolojinin sunduğu imkanlar çerçevesinde anlaşmalı bankalardan nakit - otomatik, web sayfasından İnternet ağı aracılığı ile online olarak ve beldelerimizde mobil vezne aracılığı ile ödenebilirliğin sağlanmasından yükümlüdür.

Su ve Kanalizasyon Şebeke Tesislerine verilen zararların Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlıklarınca bildirilmesinden sonra Tarifeler Yönetmeliğinin 46.maddesine uygun olarak hasar bedelleri tespit edilerek, ilgililere tebliğ edilmesinden itibaren tahsil işlemlerini gerçekleştirmekle görevlidir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

≠ Muhasebe işlem fişi ve ödeme fişi olmak üzere toplam 32743 adet fiş kanuna uygun olarak kesilmiştir.

≠ Her ay aylık mizanlar alınıp, hesap hareketleri kontrol edilmiştir.

≠ 2012 Yılı tutmakla zorunlu olduğumuz Yevmiye Defteri hazırlanmıştır.

≠ 2012 Yılı Bilanço ve Dönem Faaliyet tabloları hazırlanmıştır.

≠ Tüm personelin aylık ücret, sosyal yardım alacakları ve tazminat ödemeleri tahakkukları yapılarak ödenmiştir.

≠ İdaremizce ihalesi yapılan yapım işleri ve hizmet alımlarıyla ilgili hakedişler ve faturalar ilgili hesaplara alınarak ödemeleri yapılmıştır.

≠ Abonelerle ilgili tahsilat ve ödemeler yapılmıştır.

≠ Merkez ve Şube Müdürlüklerimize bağlı veznelerden yapılan su tahakkukları ve günlük su tahsilatlarının fişleri kesilip ilgili hesaplara alınmıştır.

≠ Banka hesapları düzenli olarak takip edilip ilgili fişleri kesilmiştir.

≠ İdaremize ait giderlerden Tedaş, Türk Telekom vb. faturalar hesaba alınarak dönemi içersinde ödenmesi sağlanmıştır.

≠ İdaremize ait aylık KDV ve Muhtasar Beyannameleri doldurularak ödemeleri yapılmıştır.

≠ ÇTV bedelleri hesaplara alınarak ilgili belediyelere ve Büyükşehir Belediyesine ödemeleri yapılmıştır.

≠ Katı Atık bedelleri hesaba alınarak ilgili belediyelere ödemeleri yapılmıştır.

≠ Su tahsilatlarının %1 pay karşılığı olan tutar ilgili kuruma ödenmiştir.

≠ DSİ Genel Müdürlüğü ile 6111 yasa kapsamındaki yapılandırma tutarı taksitlendirilerek ilgili kuruma ödenmiştir.

≠ Hazine kredi faiz ödemesi ve İller Bankası pay bedelleri hesaba alınarak ilgili kuruma ödemesi yapılmıştır.

≠ 6111 yasa kapsamında borcu olan abonelerin su borçları taksitlendirilmiştir.

≠ 2012 yılına ait tüm sabit kıymetlerde amortisman ve yeniden değerlendirme işlemleri yapılmıştır.

≠ Taşınır Mal Yönetmeliğine göre dönem sonu işlemleri yapılmıştır.

≠ Geçici ve Kati Teminatlar ilgili nazım hesaplarda takip edilerek giriş ve çıkışları yapılmıştır.

≠ Mizan Cetveli, Faaliyet sonuçları tablosu, Bütçe uygulama sonuçları tablosu, Nakit akış tablosu, Mali varlık ve yükümlülükler değişim tablosu, İç borç değişim tablosu, Dış borç değişim tablosu, Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu, Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu, Giderlerin Kurumsal sınıflandırılması tablosu, Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, Giderlerin ekonomik sınıflandırması tablosu, Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırması tablosu, Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu, Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu, Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması, Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu, çıkarılmıştır.

≠ Borcu olan abonelerin talepleri doğrultusunda su borçları taksitlendirilmiştir.

≠ Su borçlarını ödemeyen abonelere uyarı mektubu gönderilip, ödenmeyen su borçlarının yasal yoldan takibinin temini için Hukuk Müşavirliği'ne havalesi yapılmıştır.

≠ Dekontlar günlük olarak ilgili veznelerden toplanır ve dekontların raporlarla karşılaştırılması ve tablolaştırılması gerçekleştirilmiştir.

≠ Aylık ve yıllık istatistik raporları hazırlanmıştır.

≠ Günlük vezne tahsilat dökümleri ile aylık banka ve PTT tahsilat dökümleri alınarak, ilgili birimlere iletilmeleri sağlanmıştır.

≠ Bilgisayar sisteminde Resmi aboneler sınıflandırılır ve birim kodları belirlenerek, her ayın 5'i ile 10'u arasında Resmi Daire abonelerinin listeleri ve faturaları basılmıştır

- ≠ Adres ve abone değişikliği olan kurumların düzenlemeleri yapılır, kurumlardan yapılan havalelerin ay sonlarında aylık ekstreleri toplanmıştır.
- ≠ Resmi Kurumlara ilgili borçlarının ödenmesi yönünde mektup gönderilip, ellerinde fatura bulunmayan Resmi Kurumların faturaları yeniden düzenlenerek gönderilmiştir.
- ≠ Günlük bazda tahsilat toplamı alınmıştır.
- ≠ Aylık tahsilat ve borç raporları alınarak üst makamlara iletilmiştir.
- ≠ Yıl içinde vidanjör ücretleri hesaplanması, tahsili ile Kanal İade Bedellerinin Hesaplanması ve tahsilatı yapılmıştır.
- ≠ İş makinesi ve cihazlarının kiraya verilmesi işlemi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Kararıyla değişen iş makine ve kira bedelleri bilgisayara tanımlanmıştır.
- ≠ Su ve Kanalizasyon Tesislerine çeşitli nedenlerle verilen zararların Su Tesisleri ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlıklarının tanzim ettikleri hasar bildirim raporlarına istinaden ilgililerden tahsil edilip, tahsil edilemeyen hasar bedelleri Hukuk servisine gönderilerek tahsil edilmesi sağlanmıştır.
- ≠ Yönetim Kurulu Kararı ile değişen tamir ve ayar ücretleri bilgisayara tanımlanmıştır.
- ≠ Çeşitli kurumlara tankerle satılan su bedellerinin hesaplanması ve tahsili, branşman tedil ücretlerinin hesaplanması, tahsilinin kontrolü yapılmıştır.
- ≠ Malzeme birim fiyatları bilgisayara tanımlandırılıp ve fiyatlandırılması yapılmıştır.

BÜTÇE ve PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca işletme ve yatırım faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması amacı ile işletmeci ve yatırımcı daire başkanlıklarından alınan bilgiler doğrultusunda gelir-gider ve yatırım kalemlerinden oluşan yıllık Bütçe Programı ve Performans Programını hazırlamak, 2560 Sayılı Su İdareleri Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Tarifeler Yönetmeliği ve 27.10.2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde su ve atıksu tarifelerinin fiyat ayarlamalarını yapmakla yükümlüdür.

2012 YILI FAALİYETLERİ

- ≠ 2012 Mali Yılı İdare Performans Programı ve Bütçesinin uygulanmasına yönelik çalışma ve gerekli faaliyetler yapılmıştır.
- ≠ İdare Performans Programı ve Bütçesinin Oracle programı üzerinden hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmalarının entegrasyonu çalışmaları tamamlanmıştır.
- ≠ 2013 Mali Yılı İdare Bütçesi tüm birimlerin koordinasyonunda hazırlanmıştır.
- ≠ 2013 Mali Yılı İdare Performans Programı tüm birimlerin koordinasyonunda hazırlanmıştır.
- ≠ Ödenek kayıtlarının kontrol ve takibi gerçekleştirilmiştir.
- ≠ 2012 mali yılı içerisinden ek ödenek hazırlanarak, uygulamaya konulmuştur.
- ≠ Bütçe kalemleri arası ödenek aktarımlarının kontrol ve uygulanması gerçekleştirilmiştir.
- ≠ İZSU Genel Müdürlüğü su ve atıksu tarife belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- ≠ Çeşitli kuruluşlardan gelen bütçe ve kesin hesap ile ilgili anket ve sorular cevaplandırılmıştır.

BANKA VE FİNANSMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

5018 ve 4749 sayılı yasa gereği;

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü adına bankalar nezdinde hesap açma ve kapatma işlemlerini yapmak, İdarenin bankalardaki hesap bakiyelerinin günlük olarak belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi iş ve işlemlerini yapmak, günlük kullanılabilir bakiyelerin belirlenerek üst yönetime sunulması ve hesaplar arası aktarmalar ile bunlara ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek, iç ve dış borçlanmaların kullanımlarını ve geri ödemelerini gerçekleştirmek, bunlarla ilgili belge ve bilgileri ilgili kurumlara gönderme işlemlerini yapmaktır.

2012 YILI FAALİYETLERİ

≠ İZSU Genel Müdürlüğüne ait banka hesaplarının her gün bakiyeleri tespit edilerek kasa çıkarılmış ve Özel Bankalardan Kamu bankalarındaki hesaplarımıza bakiyelerin aktarılması ve bunların interaktif ortamda takibinin yapılması sağlanmıştır.

≠ Abone Bilgi ve Yönetimi Sistemine, bankalardan gelen verilerle hesap ekstreleri karşılaştırılmış, hata var ise düzeltilmesi sağlanmıştır.

≠ İZSU Genel Müdürlüğüne ait bankalardaki hesaplara ait hareketlerin muhasebeleştirilmesi işlemleri yapılmıştır.

≠ Gün sonunda kamu bankalarında kalan bakiyeler Vadeli Mevduata bağlanarak bununla ilgili görüşmeler ve yazışmalar yapılmıştır.

≠ Gönderme talimatları hazırlanarak ilgili bankaya gönderilmiş ve gerçekleştirilmesinin takibi yapılmıştır.

≠ Yıl sonunda bankalar ile İZSU Genel Müdürlüğü arasında mutabakatlaşarak, yıl sonu likiditenin belirlenmesi işlemleri yapılmıştır.

≠ İç ve dış borçların geri ödemeleri gerçekleştirilmiş, yeni borçlanmalarla ilgili taleplerde bulunma işlemleri yapılmıştır.

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

Yönetim Kurulunun 09.11.2009 Tarihli ve 663 Sayılı kararı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 19.11.2009 Tarihli ve 9972-11356 Sayılı yazısıyla İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Kurulmuştur.

Müdürlüğümüz 10.12.2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55-56-57-58 ve 60. Maddelerine göre işlem yapmakta olup;

İZSU Genel Müdürlüğünde İç Kontrol sisteminin kurulması ve standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesini sağlamak; ön mali kontrole tabi işlemlerde idarenin bütçesi ,bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarının merkezi yönetim bütçe kanununa uygunluğu ve kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını denetlemek ; diğer mali mevzuatla kendisine verilen iş ve işlemleri etkin , etkili ve eksiksiz olarak yürütmek ile görevlidir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

- ≠ 2012 yılı içerisinde, Genel Müdürlük bünyemizde İç Kontrol sistemi çalışmalarına süreç yaklaşımı ile başlanmış olup tüm harcama birimlerinin mevcut süreçleri tespit edilerek bununla ilgili İş Akış Şemalarının çizimleri tamamlanmıştır.
- ≠ Müdürlüğümüzce tüm harcama birimlerinin çalışma yönergeleri gözden geçirilmiş olup, eksik olan birimler ile görüşülerek tamamlatılmış ve dosyalanmıştır.
- ≠ Müdürlüğümüzce 2012 yılı içerisinde Ön Mali Kontrole tabi 35 Adet mali karar ve işlem tarafımızdan kontrol edilerek Ön Mali Kontrol formu düzenlenip uygun görülmüştür şerhi düşerek ilgili harcama birimlerine gönderilmiştir.

TAŞINIR MAL KAYIT VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol kanununun 44.maddesine istinaden İdaremiz Yönetim Kurulunun 17.07.2009 tarih M.35.0.İBB.5.01.21/419 sayılı kararı ile kurulmuştur.

İdaremize ait taşınır işlemlerinin 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılması ve yürütülesi ile görevlidir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

- ≠ İdaremiz Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri ve ambar adresleri Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir.
- ≠ Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve her yıl güncellenen Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Genel Tebliğ ve Taşınır mal yönetmeliğinde yapılan değişiklikler tüm Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine bildirilmiştir. İşlemlerini bu çerçevede yapmaları için bilgilendirilmiştir.
- ≠ Tüm harcama birimlerinin yıl sonu fiili envanter sayımlarını yaparak Sayım tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli ile Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini oluşturmaları ve onaylamaları sağlanmıştır.
- ≠ Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe ile uygunluğu için gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır. Muhasebe yetkilisi tarafından imzalanan cetvelin ilgili nüshaları ilgili birimlerce dosyalanmıştır.
- ≠ İdaremiz adına Taşınır Hesap Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli oluşturularak konsolide edilmiştir.
- ≠ Tüm harcama birimlerindeki işlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun ve tek tipte yapılması sağlanmıştır.
- ≠ Tüm Harcama birimlerinin 3'er aylık dönemlerde Tüketime Sevk Onaylı listelerinin Muhasebe Mutabakat raporu ile uygunluğu sağlanmış, Muhasebeleşmesi için tüm listeler Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- ≠ İdaremize ilk defa alınmış olan yaklaşık 3381 adet malzemenin kodlanması yapılmıştır.
- ≠ İdaremize yeni alınan veya Daire Başkanlıkları arasında devir yapılan demirbaş malzemeler için yaklaşık 12.314 adet demirbaş etiketi basılarak ilgili Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine teslim edilmiştir.
- ≠ Harcama birimleri arasında yapılan devir işlemleri, hurdaya ayırma işlemleri, sayım fazlalığı girişleri, bağış girişleri gibi işlemlere ait TİF'lerin muhasebeleşmesi sağlanmıştır.
- ≠ Daire Başkanlığımız bünyesindeki taşınır ve demirbaş malzeme ile ilgili Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri yerine getirilmiştir.
- ≠ Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin mevzuat ve işlem ile ilgili soruları cevaplandırılmıştır.

2012 YILI TAHAKKUK TAHSİLAT ORANLARI

	RESMİ			SİVİL			TOPLAM		
	TAHAKKUK	TAHSİLAT	ORAN	TAHAKKUK	TAHSİLAT	ORAN	TAHAKKUK	TAHSİLAT	ORAN
2012 (01) Ocak	6.262.362,75	4.341.761,85	69,33%	45.314.859,51	42.474.717,95	93,73%	51.577.222,26	46.816.479,80	82,18%
2012 (02) Şubat	4.682.069,88	4.005.505,33	85,55%	43.986.465,35	40.606.616,36	92,32%	48.668.535,23	44.612.121,69	101,27%
2012 (03) Mart	5.406.054,97	6.001.420,66	111,01%	43.836.981,60	42.911.746,05	97,89%	49.243.036,57	48.913.166,71	103,17%
2012 (04) Nisan	5.381.648,20	5.557.628,72	103,27%	47.525.619,19	45.359.283,37	95,44%	52.907.267,39	50.916.912,09	92,91%
2012 (05) Mayıs	6.281.299,68	5.750.895,20	91,56%	47.332.715,85	44.426.583,24	93,86%	53.614.015,53	50.177.478,44	94,94%
2012 (06) Haziran	7.764.536,17	5.447.053,85	70,15%	57.570.153,40	48.894.878,14	84,93%	65.334.689,57	54.341.931,99	90,86%
2012 (07) Temmuz	9.514.461,20	7.755.118,90	81,51%	57.071.682,93	57.109.646,64	100,07%	66.586.144,13	64.864.765,54	91,38%
2012 (08) Ağustos	9.386.555,02	7.842.599,20	83,55%	58.135.609,69	53.686.980,72	92,35%	67.522.164,71	61.529.579,92	96,59%
2012 (09) Eylül	10.332.596,02	9.152.649,21	88,58%	57.612.865,76	53.960.024,72	93,66%	67.945.461,78	63.112.673,93	89,34%
2012 (10) Ekim	7.980.428,89	9.565.807,47	119,87%	50.513.089,10	54.739.934,96	108,37%	58.493.517,99	64.305.742,43	120,81%
2012 (11) Kasım	7.053.260,69	9.878.344,47	140,05%	54.355.585,39	51.880.388,42	95,45%	61.408.846,08	61.758.732,89	99,72%
2012 (12) Aralık	3.760.742,53	10.538.204,65	280,22%	49.461.122,69	49.870.576,90	100,83%	53.221.865,22	60.408.781,55	111,66%
TOPLAM	**83.806.016,00**	**85.836.989,51**	**102%**	**617.716.750,46**	**585.921.377,47**	**95.63%**	**504.856.334,56**	**671.758.366,98**	**96,44%**

31.12.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE RESMİ DAİRE DEVİR RAKAMI								
BELEDİYELER								
10		İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		96.065,65		0,00		96.065,65
60		MENDERES BELEDİYESİ		11.825,83		5,68		11.831,51
70		BAYINDIR BELEDİYESİ		173.765,16		7.395,05		181.160,21
74		FOÇA BELEDİYESİ		117.580,26		4.527,40		122.107,66
80		SEFERİHİSAR BELEDİYESİ		395.068,41		18.947,50		414.015,91
90		KEMALPAŞA BELEDİYESİ		683.117,04		35.619,50		718.736,54
93		ARMUTLU BELEDİYESİ		116,66		14,90		131,56
100		MENEMEN BELEDİYESİ		156.451,89		6.355,29		162.807,18
103		İ.B.B.PARKLAR VE BAH. Ş.MÜD.		983.046,73		924,48		983.971,21
104		İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		476.822,20		20,20		476.842,40
105		KONAK BELEDİYESİ		81.533,42		585,71		82.119,13
106		KARABAĞLAR BELEDİYESİ		81.394,40		2,09		81.396,49
107		BORNOVA BELEDİYESİ		315.108,39		0,00		315.108,39
108		URLA BELEDİYESİ		100.663,85		2.200,96		102.864,81
110		GAZİEMİR BELEDİYESİ		280.323,91		10.299,70		290.623,61
112		ALİAĞA BELEDİYESİ		83.665,47		266,08		83.931,55
114		TORBALI BELEDİYESİ		30.993,84		161,75		31.155,59
123		SELÇUK BELEDİYESİ		8.791,35		26,69		8.818,04
124		BAYRAKLI BELEDİYESİ		96.789,57		155,90		96.945,47
126		BUCA BELEDİYESİ		124.353,20		0,00		124.353,20
127		KARŞIYAKA BELEDİYESİ		146.203,51		33,50		146.237,01
128		ÇİĞLİ BELEDİYESİ		285.650,63		8.720,43		294.371,06
130		NARLIDERE BELEDİYESİ		112.913,68		1.833,29		114.746,97
131		GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ		275.149,33		11.453,72		286.603,05
132		BALÇOVA BELEDİYESİ		56.194,89		2,73		56.197,62
135		ESHOT		180.225,07		471,96		180.697,03
		TOPLAM		**5.353.814,34**		**110.024,51**		**5.463.838,85**

DİĞER KURUMLAR								
138		BAŞBAKANLIK F-02 MİT		995,67		0,00		995,67
140		İL SOSYAL HİZMETLER MÜD.		78.372,41		8.161,76		86.534,17
141		AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL		1.264,64		0,00		1.264,64
142		SSYB.YAŞLILAR HUZUREVİ		13.810,21		0,00		13.810,21
143		ETİ MADEN İŞLT.GEN.MÜD.		6.735,54		0,00		6.735,54
144		TC. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK M		3.128,11		2.024,08		5.152,19
198		D.S.İ. 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		249,53		0,00		249,53
199		GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ.İZM.		35.849,50		155,20		36.004,70
200		TEİAŞ 3.İLETİM TES.İŞL.GRUP MÜ		7.293,24		19,56		7.312,80
201		TEDAŞ İZM.ELEKTRİK DAĞITIM MÜ		4.749,25		0,00		4.749,25
202		T.C.D.D. 3. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ		171.161,67		17,09		171.178,76
203		GAYRİMENKUL A.Ş.YAPRAK TÜTÜN		1.261,31		0,00		1.261,31
204		P.T.T		30.415,07		84,42		30.499,49
206		T.S.E.		576,87		0,00		576,87
208		HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ		1.129,12		0,00		1.129,12
209		KARAYOLLARI MÜDÜRLÜĞÜ		464.186,69		434.870,29		899.056,98
213		ESNAF VE SANATKARLAR ODASI		85,54		0,00		85,54
214		DEFTERDARLIK DAİRELERİ		26.643,05		449,73		27.092,78
215		ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		6.827,02		0,00		6.827,02
216		TARIM KREDİ KOOPERATİFİ		52,43		68,20		120,63
217		TC.BAŞB.HAZİNE DIŞ TİCARET İZM		469,35		59,48		528,83
220		SAHİL SIHHİYE DAİRESİ		361,66		0,00		361,66
222		SEÇİM KURUL BAŞKANLIKLARI		38,47		0,00		38,47
223		İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI		1.507,93		0,00		1.507,93
224		DİYANET İŞLERİ		34.483,27		198,63		34.681,90
225		TİCARET ODASI		338,03		0,00		338,03
227		LİMAN İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞ		77.007,35		0,00		77.007,35
228		DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI İDARE VE M		37,16		0,00		37,16
229		KÜTÜPHANE		1.668,99		4,81		1.673,80
230		DEVLET TİYATROSU		542,16		0,00		542,16
231		HALK EĞİTİM MERKEZİ		20.083,75		9.196,85		29.280,60
232		MÜZELER		2.632,79		0,00		2.632,79
236		KÜLTÜR SANAT MERKEZİ		63,38		0,00		63,38
237		DEVLET OPERA VE BALESİ		4.611,01		0,00		4.611,01
238		VAKIFLAR		547,83		0,00		547,83
239		REHBERLİK ARAŞTIRMA SERVİSİ		3.595,70		94,27		3.689,97
242		GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL M		164.273,97		0,00		164.273,97
243		T.R.T.		7.111,46		0,00		7.111,46
244		İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU		1.378,97		0,00		1.378,97
245		T.M.O.		1.110,75		0,00		1.110,75
247		VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ BAŞ		3.825,73		0,00		3.825,73
248		NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜD.		1.569,49		0,00		1.569,49

DİĞER KURUMLAR				
249	ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ	9.381,43	1.189,95	10.571,38
250	DİN GÖREVLİLERİ YARDIM DERNEĞİ	58,48	0,00	58,48
251	TARIM ORMAN KÖYİŞLERİ MÜDÜR	239.211,47	392.749,18	631.960,65
252	ZİRAİ DONATIM KURUMU	10.127,44	94,27	10.221,71
253	TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ	15.262,13	675,27	15.937,40
256	İZMİR.ADLİYESİ-SAVCILIK	9.033,06	95,37	9.128,43
257	EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI	2.880,72	0,00	2.880,72
258	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	507,75	0,00	507,75
259	KÖY HİZMETLERİ	428,63	0,00	428,63
261	BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKE	1.277,81	0,00	1.277,81
262	İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	3,29	0,42	3,71
263	DOĞA KORUMA GELİŞTİRME BİRLİĞİ	247,81	84,65	332,46
266	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İZMİR İL M	16.765,45	0,00	16.765,45
267	GÜMRÜK MUHAFAZA MÜDÜRLÜĞ	2.809,61	34,08	2.843,69
268	GÜMRÜK BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ	4.201,27	0,00	4.201,27
269	KÜLTÜR BAKANLIĞI BİRİMLERİ	851,77	8,65	860,42
271	ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BİRİMLER	837,10	0,00	837,10
272	GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKAN	3.351,98	2,50	3.354,48
277	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	6.596,78	0,00	6.596,78
281	Ö.S.Y.M.	1,53	0,25	1,78
282	TASİŞ İZMİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	4.377,23	0,00	4.377,23
302	SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ	28.976,87	1.223,99	30.200,86
303	SAĞLIK OCAKLARI	52.442,75	2.948,11	55.390,86
304	SOSYAL GÜVENLİK KURUMU	213.721,33	330,29	214.051,62
305	POLİSEVİ	18.488,47	0,00	18.488,47
306	POLİS OKULLARI	13.817,56	0,00	13.817,56
307	DİSPANSERLER	3.090,83	84,17	3.175,00
308	İZMİR İLİ KAMU HAST.BİRL.KUZEY K.	476.926,30	930,72	477.857,02
309	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.036,84	0,00	1.036,84
310	VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ	4.357,91	328,34	4.686,25
311	KREŞ VE BAKIM EVLERİ	129,18	165,94	295,12
312	BİLİM SAN.TEKN.BAKANLIĞI	266,80	43,99	310,79
313	KIZILAY	3.959,11	282,43	4.241,54
314	KONSOLOSLUKLAR	61,94	0,00	61,94
315	EMNİYET MÜD.BİRİMLERİ	50.168,83	24.406,32	74.575,15
316	DEVLET HAVA MEYDANLARI	909,39	0,00	909,39
317	A.Ü.TÖMER İZMİR MERKEZ ŞB.	1.157,43	0,00	1.157,43
320	ÖĞRETMENEVLERİ	100.449,60	21.189,59	121.639,19
321	R.T.Ü.K.	245,22	0,00	245,22
323	ÇOCUK ISLAHEVİ	5.647,07	0,00	5.647,07
324	CEZAEVLERİ	5.088.992,45	7.211.381,34	12.300.373,79
326	SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.417,11	0,00	1.417,11
328	KAYMAKAMLIKLAR	22.762,94	458,09	23.221,03
332	ÖĞRENCİ YURTLARI	127.392,82	1.322,16	128.714,98
334	T.C.ZİRAAT BANKASI	17.896,37	2,08	17.898,45
338	İLLER BANKASI 3.BÖLGE MÜD.	18.543,85	0,00	18.543,85
339	T.HALK BANKASI A.Ş.	12.790,44	14,09	12.804,53
340	VAKIFLAR BANKASI	1.865,00	0,00	1.865,00
341	ELÇİLİKLER	513,51	0,00	513,51
346	ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI	237,07	0,00	237,07
348	ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABER	6,46	0,00	6,46
349	TÜRKİYE EMLAK BANKASI	377,37	0,00	377,37
426	TÜRK TARİH KURUMU	15.153,04	13.218,65	28.371,69
520	KÖY ABONELERİ	93.471,26	24.443,56	117.914,82
	TOPLAM	**7.887.531,93**	**8.153.112,82**	**16.040.644,75**

ASKERİYELER				
379	ÖZEL KORUMA BİRLİĞİ KOMUTANLIĞI	183,67	0,00	183,67
395	SAHİL GÜVENLİK HAVA KOMUTANL	6.555,61	729,88	7.285,49
396	SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE	3.752,31	126,51	3.878,82
397	HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANL	907,02	45,30	952,32
398	İZMİR TERSANE KOMUTANLIĞI	8.456,36	0,00	8.456,36
399	DZ.KK.İZM.BAK.ONR.İSTH.KOMUTAN	95,34	0,00	95,34
400	KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI	1.555,96	0,25	1.556,21
401	FOÇA MERKEZ KOMUTANLIĞI	3.783,31	0,00	3.783,31
402	DENİZ KOMUTANLIĞI	132.337,87	0,00	132.337,87
403	HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI	75.731,57	1.314,29	77.045,86
404	GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI	16.003,02	14,25	16.017,27
406	EGE ORDU KOMUTANLIĞI	1.870,73	139,72	2.010,45
408	57.TOPÇU TUĞAY KOMUTANLIĞI	109.217,66	2.244,58	111.462,24
409	NATO (ŞİRİNYER)	22.954,69	0,00	22.954,69
410	ABD HAVA KUVVET KOMUTANLIĞI	522,58	3.137,58	3.660,16
411	JANDARMA	49.767,23	0,00	49.767,23
412	ASKERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	7.989,63	249,67	8.239,30
414	MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI	301,12	0,00	301,12
416	ORDUEVİ	85.023,80	0,00	85.023,80
417	ULAŞTIRMA	7.133,99	0,00	7.133,99
418	ASKERİ HASTANELER	1.737,87	0,00	1.737,87
	TOPLAM	**535.881,34**	**8.002,03**	**543.883,37**

OKULLAR				
497	NEVVAR SALİH İŞGÖREN EĞİTİM KA	220.669,87	52.764,77	273.434,64
498	İŞ OKULU	822,87	0,00	822,87
500	ANAOKULLARI	20.509,07	239,88	20.748,95
501	İLKÖĞRETİM OKULLARI	81.071,20	545.582,35	626.653,55
502	ORTAOKULLAR	9.275,34	38.351,58	47.626,92
503	LİSELER	1.120.063,64	71.816,21	1.191.879,85
504	MESLEK LİSELERİ	445.863,45	72.091,97	517.955,42
505	ÖZÜRLÜLER OKULLARI	58.880,49	5.706,97	64.587,46
530	İLKÖĞRETİM	3.069.118,15	2.995.174,39	6.064.292,54
	TOPLAM	**4.805.604,21**	**3.728.963,35**	**8.808.002,20**
ÜNİVERSİTELER				
506	DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ	224.944,05	70.512,62	295.456,67
507	DOKUZ EYLÜL ÜNV.HASTANESİ	116.396,80	333,42	116.730,22
508	EGE ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ	13.633,74	0,00	13.633,74
509	EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	1.241.478,51	25.196,03	1.266.674,54
510	ANADOLU ÜNİVERSİTESİ	87,16	0,00	87,16
511	İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ	52.831,75	0,00	52.831,75
512	YAŞAR ÜNİVERSİTESİ	39.849,93	0,00	39.849,93
513	GEDİZ ÜNİVERSİTESİ	475,19	21,45	496,64
514	TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ	1.754,06	0,00	1.754,06
515	KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	12.798,36	0,00	12.798,36
516	ŞİFA ÜNİVERSİTESİ	48.877,84	95,88	48.973,72
517	İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİ	52.359,17	0,00	52.359,17
	TOPLAM	**1.805.486,56**	**96.159,40**	**1.901.645,96**

	GENEL TOPLAM	**20.388.318,38**	**12.096.262,11**	**32.758.015,13**

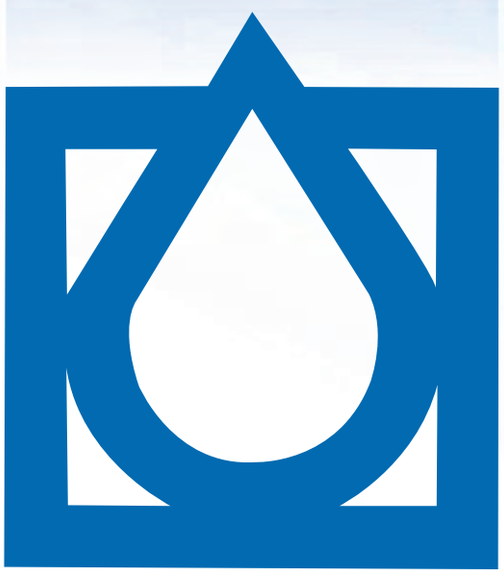

İZSU

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Abone İşleri Dairesi Başkanlığı İZSU Genel Müdürlüğü' nün kuruluşundan itibaren yapısında olan ve Müdürlükleri aracılığı ile abonelerin ilk müracaat yaptıkları İZSU birimidir.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın görevini yürütürken uyması gereken kanunlar; 3009 Sayılı kanunla değişik 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun, 4857 Sayılı İş Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunudur.

Ayrıca İZSU Disiplin Yönetmeliği, Kamu İhale Kanunu ile ilgili tüm yönetmelikler, 3194 Sayılı İmar Yönetmelikleri, İZSU Tarifeler Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanununa bağlı tüm yönetmelikler, Teşkilat Yönetmeliği, Yönetim Kurulu Toplanma ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, Memur Sicil Yönetmeliği, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ve Evrak Yönetimi Hakkında Yönetmelikler kullanılan yönetmelikler arasındadır.

İZSU Genel Müdürlüğü Katılım Payları Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi de çalışmalarımız sırasında kullanılmaktadır.

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı birimlerde yürütülen iş ve işlemler aşağıda ifade edildiği şekildedir;

- ≠ Yeni bina yapan veya daha önce yaptığı binasına su bağlatmak isteyen vatandaşlarımızın abonelik müracaatlarını alarak abonelik oluşturmak,
- ≠ Abonelerin sayaçlarını okuyarak tüketimlerini belirleyip, tüketim bildirilerini bırakmak,
- ≠ Sayaç okuma işleminden sonra her türlü tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, yapılan itirazları değerlendirip sonuçlandırmak,
- ≠ Konak Şube Müdürlüğü hizmet alanı dışındaki bölgelerde abonelere yapılan tahakkukların tahsilatını yapmak,
- ≠ Borçlu kalan abonelerin suyunu kesmek, ödeme yapıldığında suyunu açmak, uzun süre borcun ödenmemesi durumunda hukuksal işlemleri başlatmak,
- ≠ Arızalı, patlak ve çalışmayan sayaçları değiştirerek, sayaç yanında oluşan arızaları gidermek,
- ≠ Usulsüz ve kaçak su kullanan abonelerin tespitini yapmak,

- ≠ İçme suyu şebekesi dışındaki kaynaklardan (artezyen, tankerle taşıma vb.) temin ettiği suyu kullandıktan sonra kanalizasyon şebekesine deşarj edenlerin tespiti ve atıksu aboneliği işlemlerini yapmak,
- ≠ Şebekeden veya başka kaynaklardan temin ederek üretimde kullandığı suyu kanalizasyona deşarj edenlerden, atık sularının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından standart üstü kirlilik içerdiği tespit edilenlere KÖP (Kirlilik Önlem Payı) tahakkuku yapmak,
- ≠ İZSU Genel Müdürlüğü sayaç ihtiyacını belirleyip karşılamak, sayaçlarla ilgili her türlü kontrol işlemlerini Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün vereceği raporlar doğrultusunda sonuçlandırmak,
- ≠ Tarifeler Yönetmeliğini uygulamak, gerekli ilave ya da değişiklikleri yönetim kuruluna sunmak,
- ≠ Aylık su ve atıksu tarifelerinin tanımlanıp uygulanması ve sayaç okuma planının hazırlanıp uygulanmasını gerçekleştirmek,
- ≠ Taşınmaz sahiplerinden 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2560 Sayılı yasa ve İZSU Genel Müdürlüğü Katılım Payları Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi gereğince Büyükşehir Belediye sınırları içinde yürütme yetkisi Su ve Kanalizasyon İdarelerine verilen içme suyu ve kanalizasyon katılım paylarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütmek,
- ≠ Halkla İlişkiler Birimine gelen her türlü talep ve şikayeti değerlendirip sonuçlandırmak,
- ≠ 5018 Sayılı Kanun gereğince Daire Başkanlığına tahsis edilen bütçenin planlanan çerçevede kullanılmasını sağlamak,
- ≠ Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yerine getirmektir.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Organizasyon yapısı aşağıdaki 2012 yılı itibariyle aşağıdaki şekilde olup, söz konusu 10 Şube Müdürlüğü ile görev ve sorumluluklarını gerçekleştirmektedir.

Konak Bölgesi Şube Müdürlüğü,

Halkla İlişkiler Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Mevcut Hizmet Bölgesi

Karşıyaka Bölgesi Şube Müdürlüğü,

Karşıyaka Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Karşıyaka

Çiğli Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Çiğli, Sasalı, Harmandalı, Ulukent

Bayraklı Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Bayraklı

Menemen Bölgesi Şube Müdürlüğü

Menemen Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Menemen, Seyrek, Emiralem, Asarlık, Koyundere, Maltepe, Türkelli.

Foça Şefliği

Abone İsleri Birimi
Hizmet Alanı: Foça, Yeni Foça, Bağarası, Gerenköy

Aliağa Şefligi

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Aliağa, Helvacı

Bornova Bölgesi Şube Müdürlüğü

Bornova Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Bornova

Yenişehir Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Yenişehir, Altındağ, Çamdibi, Pınarbaşı, Işıkkent

Kemalpaşa Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Kemalpaşa, Ulucak, Yukarı Kızılca, Armutlu, Ören, Bağyurdu

Buca Bölgesi Şube Müdürlüğü

Buca Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Buca, Kaynaklar

Karabağlar Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Eşrefpaşa, Gaziemir, Sarnıç

Menderes Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Menderes, Görece, Değirmendere, Oğlananası, Tekeli.

Torbalı Bölgesi Şube Müdürlüğü

Torbalı Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Torbalı, Karakuyu, Çaybaşı, Subaşı, Ayrancılar, Pancar, Yazıbaşı.

Bayındır Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Bayındır,Canlı Çırpı

Selçuk Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Selçuk

Narlıdere Bölgesi Şube Müdürlüğü

Narlıdere Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Yelki

Urla Şefliği

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Urla

Seferihisar Şefliği

Abone İsleri Birimi
Hizmet Alanı: Seferihisar

Ürkmez Şefligi

Abone İşleri Birimi
Hizmet Alanı: Ürkmez, Gümüldür, Özdere, Doğanbey

Katılım Payları Şube Müdürlüğü

Katılım Payları Şefliği

Sayaç Okuma Şube Müdürlüğü

Sayaç Okuma Şefliği
Açma-Kesme Şefliği

Sayaç Bakım Onarım ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Sayaç Atölye Şefliği

2012 YILI FAALİYETLERİ

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı 2012 yılı boyunca 10 Şube Müdürlüğü aracılığı ile yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmiştir.

İZSU Genel Müdürlüğü adına Başkanlığımızın gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği her çalışmanın bağlı bulunan bütün Daire Başkanlıkları tarafından desteklenmesi sonuçta; doğru tespit ve önerilerin yapılması Genel Müdürlüğümüzün hizmet verilen bütün abonelerine olumlu yansıyacak ve olumlu bir kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

2012 YILI KATILIM PAYLARI TAHSİLATLARI		
	AÇIKLAMA	TUTAR(TL)
1	Katılım Payları Keşif Ücreti	416.108,75
2	İçme Suyu Kat.Bed.(%100)	11.793.839,36
3	İçme Suyu Kat.Bed.(%25)	359.071,58
4	Kanal Kat.Bed. (%100)	6.730.158,56
5	Kanal Kat.Bed. (%25)	385.198,57
6	Altyapı Kat.Prj.İnceleme Ücr.	1.757.713,77
7	Dış Kanal Bağ.Keşif Ücreti	27.744,46
8	İçme Suyu Kat.Bed.(%75)	770.243,58
9	Kanal Kat.Bed. (%75)	380.993,62
TOPLAM		22.621.072,25

Katılım Payları Toplam Belge Adedi	6.070
Kanal Ruhsatnamesi Top.Belge Ad.	4.508

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUKAYESELİ ŞEBEKE SARFİYATLAR

AYLAR	2009 YILI	2010 YILI	2011 YILI	2012 YILI
OCAK	10.227.506	10.730.016	12.369.918	11.153.757
SUBAT	9.798.046	10.604.335	9.476.916	10.554.242
MART	9.654.886	9.073.276	10.199.490	10.710.998
NISAN	10.349.937	11.154.528	11.389.259	11.664.467
MAYIS	11.414.058	12.070.775	11.687.492	12.634.016
HAZIRAN	12.318.642	12.748.855	13.092.332	12.544.002
TEMMUZ	13.300.650	13.362.960	13.972.298	14.391.092
AGUSTOS	13.457.958	14.404.544	14.167.092	14.489.700
EYLUL	12.011.948	14.108.134	15.411.148	14.418.768
EKIM	11.670.450	11.718.550	11.825.274	11.968.837
KASIM	10.635.012	11.723.651	12.076.366	13.024.258
ARALIK	10.554.803	10.921.805	10.461.866	11.221.536
TOPLAM	135.393.896	142.621.429	146.129.451	148.775.673

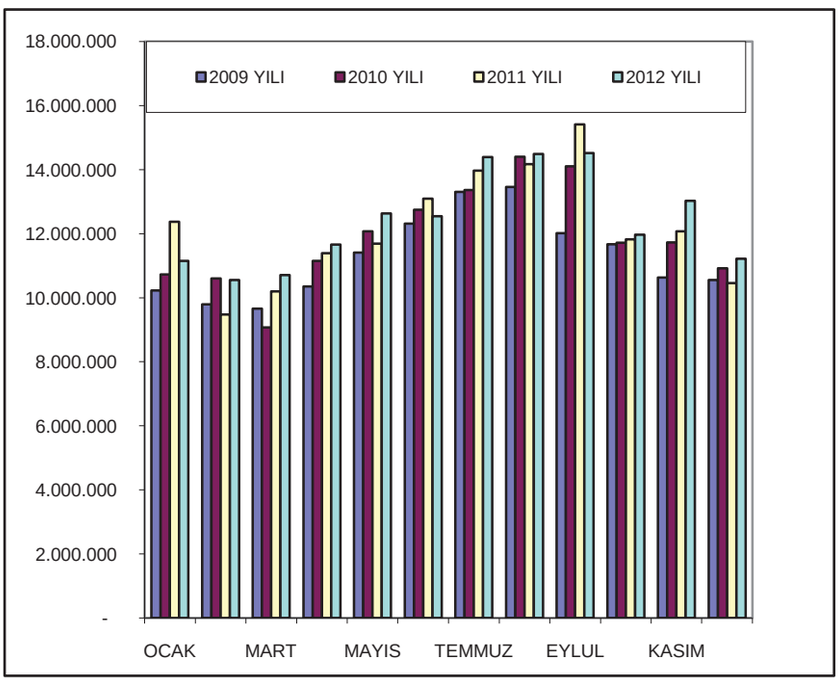

TİPLERİNE GÖRE SARFİYAT TUTARLARI 2012 (TL)

K.D.V. HARİÇ

AYLAR	KONUT	KONUT DIŞI	BELD. PARK	RESMİ DAİRE	KDV SİZ ABONE	SANAYİ	ÖZEL OKL. HAST.	RES.OKL. HAST.	TURST. TESİS	FIRIN HAMAM	TOPLAM
OCAK	22.375.872	6.199.876	1.266.481	2.152.983	59.672	1.009.310	186.496	2.068.418	174.274	287.954	**35.781.336**
ŞUBAT	21.614.510	6.106.282	741.282	1.739.656	51.076	1.094.336	134.578	1.885.628	184.755	292.450	**33.844.553**
MART	21.597.062	6.151.436	910.696	2.025.594	63.790	1.028.847	168.329	1.870.773	190.442	279.426	**34.286.395**
NİSAN	23.383.766	6.602.366	787.272	1.879.698	59.582	1.154.536	212.982	2.020.330	159.198	309.550	**36.569.280**
MAYIS	25.380.402	6.826.424	2.216.334	2.163.294	76.532	1.133.792	180.312	2.747.454	252.258	312.076	**41.288.878**
HAZİRAN	32.988.615	7.184.222	2.211.946	2.485.925	79.346	1.672.829	231.777	1.765.851	588.971	398.677	**49.608.159**
TEMMUZ	32.263.908	7.597.088	3.868.696	3.280.650	136.269	1.918.331	163.394	2.229.245	500.524	345.973	**52.304.078**
AĞUSTOS	32.960.032	7.499.926	3.532.162	2.808.918	113.326	1.456.878	148.028	2.376.422	481.416	356.736	**51.733.844**
EYLÜL	32.117.576	7.707.470	3.679.596	2.753.001	103.463	1.669.104	167.799	3.148.112	476.036	363.330	**52.185.487**
EKİM	26.799.593	6.765.831	2.245.596	2.401.685	113.534	1.636.846	176.934	2.479.195	271.545	317.578	**43.208.337**
KASIM	30.155.770	6.943.321	1.933.176	1.975.912	98.610	1.116.546	198.382	3.123.022	248.486	344.428	**46.137.653**
ARALIK	25.918.978	6.667.742	1.021.029	1.101.018	28.256	1.413.431	216.230	1.524.034	236.240	308.940	**38.435.898**
TOPLAM	**327.556.084**	**82.251.984**	**24.414.266**	**26.768.334**	**983.456**	**16.304.786**	**2.185.241**	**27.238.484**	**3.764.145**	**3.917.118**	**515.383.898**

TİPLERİNE GÖRE SARFİYAT (M3) 2012

AYLAR	KONUT	KONUT DIŞI	BELD. PARK	RESMİ DAİRE	KDV SİZ ABONE	SANAYİ	ÖZEL OKL. HAST.	RES.OKL. HAST.	TURST. TESİS	FIRIN HAMAM	TOPLAM
OCAK	8.951.386	751.272	381.563	321.146	4.651	254.325	35.148	383.632	29.659	40.975	**11.153.757**
ŞUBAT	8.649.901	733.387	184.109	257.437	3.981	278.041	26.146	348.202	31.427	41.611	**10.554.242**
MART	8.653.990	742.701	250.703	344.132	4.972	263.607	32.122	346.640	32.388	39.743	**10.710.998**
NİSAN	9.628.982	792.317	187.042	282.800	4.644	286.154	37.980	373.502	27.074	43.972	**11.664.467**
MAYIS	9.867.802	817.358	709.579	320.642	5.965	283.127	34.089	508.223	42.901	44.330	**12.634.016**
HAZİRAN	10.114.644	850.980	537.527	296.590	4.956	340.050	34.759	261.929	56.976	45.591	**12.544.002**
TEMMUZ	11.109.905	903.077	1.051.225	436.687	8.565	406.319	29.799	330.821	68.659	46.035	**14.391.092**
AĞUSTOS	11.509.222	892.783	917.813	364.457	7.123	305.409	26.840	352.122	66.398	47.533	**14.489.700**
EYLÜL	11.254.894	921.062	999.000	257.928	6.503	357.825	30.205	487.424	55.483	48.444	**14.418.768**
EKİM	9.433.615	809.597	572.060	312.880	7.136	351.448	33.141	369.367	37.249	42.344	**11.968.837**
KASIM	10.646.217	830.404	470.154	256.439	6.198	233.990	37.173	463.673	34.086	45.924	**13.024.258**
ARALIK	9.379.622	798.315	255.656	142.924	1.776	304.460	39.590	225.595	32.406	41.192	**11.221.536**
TOPLAM	**119.200.180**	**9.843.253**	**6.516.431**	**3.594.062**	**66.470**	**3.664.755**	**396.992**	**4.451.130**	**514.706**	**527.694**	**148.775.673**

2012 TİPLERİNE GÖRE ABONE ADETLERİ(Basılan Fatura)

AYLAR	KONUT	KONUT DIŞI	BELD. PARK	RESMİ DAİRE	KDV SİZ ABONE	SANAYİ	ÖZ.OKL. HAST.	RES.OKL. HAST.	TURST. TESİS	FIRIN HAMAM	TOPLAM
OCAK	1.030.746	99.911	2.991	1.283	11	778	487	1.310	70	1.399	**1.138.986**
ŞUBAT	1.029.574	99.805	2.992	1.286	11	776	489	1.318	70	1.394	**1.137.715**
MART	1.032.612	99.859	3.024	1.289	11	770	491	1.319	70	1.397	**1.140.842**
NİSAN	1.031.939	99.540	3.033	1.306	11	765	497	1.322	69	1.403	**1.139.885**
MAYIS	1.032.534	100.222	3.063	1.280	11	762	497	1.319	73	1.414	**1.141.175**
HAZİRAN	1.022.636	99.510	2.987	1.053	5	763	498	1.180	74	1.409	**1.130.115**
TEMMUZ	767.646	81.362	2.456	799	10	388	454	880	54	1.063	**855.112**
AĞUSTOS	1.038.273	100.632	3.109	1.274	11	747	500	1.324	75	1.418	**1.147.363**
EYLÜL	1.028.876	99.561	3.115	1.276	11	712	502	1.330	75	1.408	**1.136.866**
EKİM	1.012.130	98.899	3.133	1.278	11	730	502	1.331	75	1.381	**1.119.470**
KASIM	1.018.987	99.171	3.162	1.266	10	729	502	1.340	75	1.397	**1.126.639**
ARALIK	1.013.143	97.408	3.171	1.269	10	721	508	1.349	75	1.384	**1.119.038**
TOPLAM	**12.059.096**	**1.175.880**	**36.236**	**14.659**	**123**	**8.641**	**5.927**	**15.322**	**855**	**16.467**	**13.333.206**

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI GENEL TAHAKKUK (TL)

K.D.V. HARİÇ										
	ŞEBEKE			ATIKSU			ŞEB.+ATIKSU		K. Ö. P.	TOPLAM
	Adet	m3	Tutar	Adet	m3	Tutar	Top.Adet	Top.m3		Toplam
OCAK	1.138.986	11.153.757	45.655.183	2.879	846.999	1.797.920	1.141.865	12.000.756	43.061	**47.496.164**
ŞUBAT	1.137.715	10.554.242	43.268.659	2.912	785.789	1.481.478	1.140.627	11.340.031	27.484	**44.777.621**
MART	1.140.840	10.710.898	44.010.881	2.939	911.576	1.557.143	1.143.779	11.622.474	30.304	**45.598.328**
NİSAN	1.139.885	11.664.467	46.907.968	2.944	818.136	1.476.147	1.142.829	12.482.603	34.600	**48.418.715**
MAYIS	1.141.175	12.634.016	49.431.494	2.980	870.289	1.582.951	1.144.155	13.504.305	26.316	**51.040.761**
HAZİRAN	1.130.115	12.544.002	57.212.732	2.974	902.061	2.372.219	1.133.089	13.446.063	54.175	**59.639.126**
TEMMUZ	1.119.395	14.391.092	60.214.654	2.943	909.626	1.947.737	1.122.338	15.300.718	68.514	**62.230.905**
AĞUST.	1.147.363	14.489.700	60.213.225	2.989	878.397	1.987.665	1.150.352	15.368.097	59.190	**62.260.080**
EYLÜL	1.136.866	14.518.768	61.444.759	2.985	944.849	1.918.471	1.139.851	15.463.617	34.370	**63.397.600**
EKİM	1.119.470	11.968.837	52.114.729	3.013	886.519	1.832.910	1.122.483	12.855.356	37.304	**53.984.943**
KASIM	1.126.639	13.024.258	55.085.324	2.984	861.104	1.739.779	1.129.623	13.885.362	50.476	**56.875.579**
ARALIK	1.119.038	11.221.536	46.750.745	2.976	744.191	1.571.659	1.122.014	11.965.727	33.002	**48.355.406**
TOPLAM	**13.597.487**	**148.875.573**	**622.310.353**	**35.518**	**10.359.536**	**21.266.079**	**13.633.005**	**159.235.109**	**498.796**	**644.075.228**

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 HANE SAYILARI (merkez)

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
KONAK	180.253	180.218	180.176	180.282	180.534	179.645	180.954	181.120	181.217	181.354	182.092	182.239
ESREFPASA	159.479	160.106	160.228	160.244	160.660	160.830	161.120	162.246	162.361	162.564	163.097	163.334
KARŞIYAKA	172.056	172.254	172.479	172.598	173.107	173.558	174.112	174.474	174.636	175.082	175.826	176.098
BORNOVA	114.266	114.301	114.351	114.582	114.693	114.799	114.940	115.134	115.214	115.371	115.817	116.051
BAYRAKLI	39.219	39.427	39.456	39.471	39.514	39.539	39.605	39.628	39.664	39.687	39.732	39.790
BUCA	149.928	150.055	150.350	150.438	150.796	151.132	151.553	152.154	152.307	152.614	153.171	153.493
NARLIDERE	72.956	73.004	73.068	73.166	73.258	73.335	73.401	73.482	73.540	73.637	73.720	73.769
YENISEHIR	113.918	113.902	113.947	113.990	114.153	114.248	114.357	114.477	114.500	114.569	114.684	114.703
CIGLI	63.241	63.404	63.591	63.735	63.811	63.864	64.045	64.281	64.426	64.544	64.821	64.928
TOPLAM	**1.065.316**	**1.066.671**	**1.067.646**	**1.068.506**	**1.070.526**	**1.070.950**	**1.074.087**	**1.076.996**	**1.077.865**	**1.079.422**	**1.082.960**	**1.084.405**

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 HANE SAYILARI (ilçeler)

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
MENDERES	19.122	19.191	19.215	19.336	19.421	19.463	19.613	19.703	19.758	19.824	19.936	19.844
BAYINDIR	14.348	14.338	14.351	14.359	14.372	14.373	14.383	14.395	14.394	14.417	14.425	14.289
SEFERİHİSAR	15.545	15.574	15.564	15.595	15.662	15.746	15.813	15.927	15.958	16.045	16.131	16.112
URLA	23.707	23.763	23.588	23.700	23.804	23.877	24.114	24.199	24.248	24.314	24.578	24.525
MENEMEN	46.692	46.810	46.975	47.073	47.210	47.337	47.492	47.677	47.737	47.879	48.197	48.307
FOÇA	18.165	18.168	18.176	18.210	18.199	18.276	18.319	18.345	18.369	18.395	18.431	18.393
ALİAĞA	24.792	24.878	24.939	24.999	25.202	25.290	25.412	25.484	25.534	25.608	25.762	25.678
KEMALPAŞA	36.507	36.571	36.776	36.833	36.827	36.899	36.983	37.135	37.165	37.282	37.436	37.140
TORBALI	50.387	50.471	50.614	50.740	50.931	51.053	51.254	51.438	51.508	51.632	51.739	51.686
SELÇUK	13.469	13.466	13.473	13.490	13.495	13.527	13.560	13.573	13.581	13.612	13.637	13.643
ÜRKMEZ	24.217	24.008	24.071	24.135	24.257	24.414	24.597	24.792	24.876	24.944	25.171	25.242
TOPLAM	**286.951**	**287.238**	**287.742**	**288.470**	**289.380**	**290.255**	**291.540**	**292.668**	**293.128**	**293.952**	**295.443**	**294.859**

İDARİ SÖKÜMLER

İDARİ SÖKÜMÜ OLUPTA MUAYENESİ YAPILAN SAYAÇLARIN BÖLGELERE , İŞ TİPİNE VE MUAYENE SONUÇLARINA GÖRE DAGILIMI

BÖLGE	DAMGA	ABYS Toplu İşlem	Aparatı Kırık	BORÇ	PATLAK	ÇALIŞMIYOR	ÇALIŞMIYOR - ABONE DİLEKÇELİ	Dilekceli Sökme	İlişik Kesme	Endeks Okunmuyor	KAÇAK SU	Kat Tespiti	MİYADİ	CAMI KIRIK	DİGER	TOPLAM	ORAN %
01-KONAK	14.616	553	31	1.235	787	1.165	389	904	793	155	4	130	32	41	42	20.877	16,66
02-E.PAŞA	674	331	31	1.024	561	59	1.206	495	850	114	11	174	136	120	78	5.864	4,68
04-K.YAKA	6.368	2.202	18	596	1.217	1.235	0	336	2.675	798	8	21	2	0	19	15.495	12,37
05-BORNOVA	734	455	9	305	640	1.065	3	307	1.200	571	10	54	22	26	20	5.421	4,33
06-BAYRAKLI	4.105	182	14	202	164	361	2	67	210	339	5	0	0	0	8	5.659	4,52
07-BUCA	12.903	3	24	750	460	1.370	564	316	1.455	227	0	127	1	5	22	18.227	14,55
08-N.DERE	3.196	64	8	342	193	463	225	136	637	99	0	51	4	41	11	5.470	4,37
09-Y.ŞEHİR	4.208	231	24	1.126	258	1.882	38	262	461	1.665	37	87	12	23	10	10.324	8,24
10-ÇİĞLİ	2.185	10	1	276	210	1.051	24	66	988	236	27	0	0	2	87	5.163	4,12
11-MENDERES	0	13	0	174	185	29	150	69	70	10	0	2	374	40	1	1.117	0,89
12-BAYINDIR	0	21	29	295	341	25	2	57	159	9	1	2	1.511	139	13	2.604	2,08
13-S.HİSAR	0	2	0	127	43	54	25	67	16	41	0	0	188	18	11	592	0,47
14-URLA	0	10	21	175	98	142	29	82	104	95	0	8	2.012	34	16	2.826	2,26
15-MENEMEN	0	125	20	484	280	364	1	155	600	83	6	135	4.827	40	23	7.143	5,70
16-FOÇA	0	0	4	287	63	139	0	26	186	49	0	16	167	5	12	954	0,76
17-ALİAĞA	0	112	11	261	199	193	0	66	317	55	2	21	1.027	19	10	2.293	1,83
18-K.PAŞA	0	237	22	493	585	494	16	175	111	437	0	19	1.237	53	2	3.881	3,10
19-TORBALI	0	56	22	798	538	322	30	241	722	62	5	6	3.913	42	14	6.771	5,40
20-SELÇUK	0	51	0	114	6	42	3	59	114	50	0	0	1.381	1	5	1.826	1,46
22-ÜRKMEZ	0	12	86	523	74	166	22	54	48	121	1	4	1.661	16	7	2.795	2,23
TOPLAM	48.989	4.670	375	9.587	6.902	10.621	2.729	3.940	11.716	5.216	117	857	18.507	665	411	125.302	100

2012 YILI AYLARA GÖRE KAPATILAN İŞ EMRİ SAYILARI		
AY	ADET	Gün.ort.
OCAK	13.253	602
ŞUBAT	9.824	468
MART	8.955	407
NİSAN	11.083	554
MAYIS	10.957	498
HAZİRAN	7.733	368
TEMMUZ	9.389	418
AĞUSTOS	12.206	643
EYLÜL	11.008	550
EKİM	7.482	374
KASIM	12.642	575
ARALIK	10.770	513
YIL TOPLAMI	125.302	498

YAPILAN MUAYENE SONUÇLARININ DAĞILIMI		
NETİCE	ADET	YÜZDE%
SAĞLAM/ NORMAL	103.912	82,93
BOZUK/İSLEMİYOR	13.335	10,64
PATLAK/ YANIK	8.012	6,39
TAHRİP / MUAYENE RED	43	0,03
TOPLAM	125.302	100,00

2012 YILI ABONELERE YANSITILAN SAYAÇ TAMİR VE TEST ÜCRETLERİ	
Tamir ve Test bedeli	3.257.806 TL
KDV %18	586.405 TL
TOPLAM	**3.844.211 TL**

SÖKME NEDENİ	YILI						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ABYS Toplu işlem	4.282	4.107	7.797	8.755	10.304	5.040	4.670
BORÇ	13.466	10.255	11.821	16.464	15.805	9.436	9.962
ÇALIŞMIYOR	6.780	11.440	12.340	9.459	12.896	13.684	13.350
DAMGA (10 Yıllık per. bakım	18.451	21.435	10.856	16.523	56.204	88.805	48.989
ENDEKS OKUNMUYOR	7.335	8.056	8.250	7.147	10.213	6.203	5.216
İLİŞİK KESME	2.190	2.966	4.266	5.119	7.089	9.484	11.716
KAÇAK SU (Frod),SAYAÇ TERS	329	265	323	276	620	208	117
KAT TESPİTİ	337	268	283	454	480	731	857
MİYADİ (Kuru tip)	510	6.225	14.780	16.587	18.258	32.894	18.507
PATLAK, CAMI KIRIK	6.590	8.266	10.202	7.950	8.894	5.202	7.567
SAYAÇ SÖKME (Dilekçeli)	1.586	2.726	3.529	3.855	4.015	3.564	3.940
DİĞER (Sayaç çap değ.,yıkım, sayaç serino okun., V.S)	309	134	166	359	1.008	184	411
İDARİ SÖKÜM YIL TOPLAMI	**61.856**	**76.009**	**84.447**	**92.590**	**144.778**	**175.251**	**125.302**
YÜKSEK TÜK. İTİRAZ	7.495	5.753	6.171	7.039	8.558	7.914	6.278
GENEL TOPLAM	**69.351**	**81.762**	**90.618**	**99.629**	**153.336**	**183.165**	**131.580**

BÖLGE	TOPLAM	ORAN %
01-KONAK	**886**	14,11
02-E.PAŞA	**887**	14,13
04-K.YAKA	**568**	9,05
05-BORNOVA	**514**	8,19
06-BAYRAKLI	**121**	1,93
07-BUCA	**776**	12,36
08-N.DERE	**266**	4,24
09-Y.ŞEHİR	**500**	7,96
10-ÇİĞLİ	**244**	3,89
11-MENDERES	**81**	1,29
12-BAYINDIR	**67**	1,07
13-S.HİSAR	**52**	0,83
14-URLA	**136**	2,17
15-MENEMEN	**244**	3,89
16-FOÇA	**95**	1,51
17-ALİAĞA	**158**	2,52
18-K.PAŞA	**210**	3,35
19-TORBALI	**324**	5,16
20-SELÇUK	**31**	0,49
22-ÜRKMEZ	**118**	1,88
TOPLAM	**6.278**	**100,00**

NETİCE	ADET	ORAN%
SAĞLAM/ NORMAL	4.680	74,55
BOZUK/İSLEMİYOR	1.375	21,90
PATLAK/ YANIK	7	0,11
TAHRİP / MUAYENE RED	143	2,28
OKUMA HATASI	73	1,16
TOPLAM	**6.278**	**100,00**
YERİNDE KONTROL	135 ADET	

SAYAÇ ATÖLYELERİNDE TAMİR ve BAKIMI YAPILAN SAYAÇLAR

REVİZYON VE DAMGA ADEDİ

ÇAPI	SEVK	DAMGA
20	9.678	15.898
25	136	102
40	81	72
50	71	48
65	5	3
80 VE ÜZERİ	21	5
TOPLAM	9.992	16.128

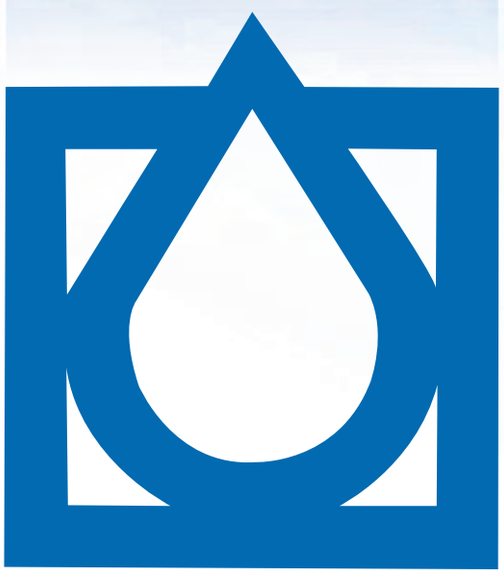

İZSU

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



A. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKAR

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2560 sayılı kuruluş kanunu ile ve 5018 kanunlarla belirlenen hizmetlerini, görev ve sorumluluklarının yerine getirebilmesi için organizasyon yapısı içerisinde tanımlanan tüm birimlerindeki bilişim sistemlerinin gerçekleştirilmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluğundadır. 15.02.2012 tarih ve 01 Sayılı İzsu Genel Kurul Kararı ile Bilgi Ağları ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü kurulmuş olup , Daire Başkanlığımız, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ve Bilgi Ağları ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü ile görevlerini gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda;

- ≠ Dış kaynak kullanımı (outsourcing) yoluyla Bilgi İşlem Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu sözleşme kapsamında bulunan tüm bilgisayar uygulamalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasının temini ve takibi,
- ≠ Birimler arasında koordinasyonu sağlayarak, bilgisayar uygulamalarındaki iş akışlarının düzenlenmesi, entegrasyon eksikliklerinin giderilmesi ve kullanıcılara birim amirlerince belirlenen yetkilerde uygulama şifrelerinin verilmesi,
- ≠ Yeni istek ve değişiklik taleplerinin incelenip, gerekli düzenlemeler ve alt yapısı oluşturularak uygulamaya sokuluncaya kadar takibi,
- ≠ İnternet hizmetlerinin takibi, düzenlenmesi, şifrelerin veya mail adreslerinin verilmesi veya iptali, virüslere karşı gerekli önlemlerin alınması,
- ≠ İnternet üzerinden yapılan tahsilatların takibi, arıza/şikayet/istek gibi bildirimlerin ilgili birimlerimize aktarımı, İdaremiz işlemlerine ilişkin bilgilendirmelerin ve haberlerin duyurulması ve takibi,
- ≠ İdaremiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgi işlem donanımlarının bakımı ve onarımının yapılması/yaptırılması, sistem yedeklemelerinin takibi,
- ≠ Birimlerin gereksinimi olan ve Genel Müdürlük OLUR'u alınmış bilgisayar donanım taleplerinin belirli periyotlarla, teknik şartnamelerinin hazırlanarak satın alınması ve hizmete sunulması
- ≠ Birimlerin bilgisayar sarf malzemelerinin takibi, tüm birimlerin kartuş ve toner gereksinimlerinin tespiti, temini ve dağıtımı,
- ≠ Birimlerce istenen bilgi veya istatistiki listelerin ön çalışmalarının yapılarak, isteğe uygun şekilde devreye alınması
- ≠ Bilgisayar uygulamalarında, aksaklık veya eksikliklerin tespit edilerek düzeltilmesi
- ≠ Sayaç okuma dosyalarının hazırlanması, okunan endekslerin geri alınması, tahsilat bilgilerinin bankalara gönderilmesi ve bankalardan tahsil edilenlerin bilgilerinin alınması gibi işlemlerin takibi,

- İdaremizin daha iyi hizmet verebilmesi konusunda, Bilgi İşlem Hizmetleri hakkında araştırmalar yapılıp, teknolojik gelişmelerin takibi ve önerilerde bulunulması,
- Uygulamaya konulan bilgisayar projelerinin hizmet içi eğitimlerin planlanması ve takibi,
- İdaremizce kullanılan telefon santrallerinin bakımı ve güncellenmesinin sağlanması
- İdaremiz hizmet alanı içerisinde bulunan tüm idari ve teknik iş ve işlemlerin hızlı, sağlıklı, güvenilir ve entegre bir biçimde yasalar, yönetmelikler ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde bilgisayarlar marifetiyle aksaksız olarak yapılmasının sağlanması amacıyla gereken her türlü önlemin alınması,
- Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak,
- Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların İdare bünyesine aktarımını konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
- İdarenin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini artırmak ,zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek.
- Bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak/yaptırmak,
- Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.
- Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

2012 Yılı Faaliyetleri

- ≠ Bilgi İşlem hizmet alımı ihalesi ile uygulamada bulunan tüm bilgisayar projelerinin geliştirilmesi, yeni istek ve değişliklerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
- ≠ El terminali ile sayaç okuma işlemleri hazırlanarak okuma bilgileri sisteme aktarılmıştır.
- ≠ Uygun görülen bilgisayarlara internet erişim hakkı verilmiş, Kurumsal web sitesi işlemleri yapılmıştır.
- ≠ Uygulamaya konulan bilgisayar projelerinin hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve takibi yapılmıştır.
- ≠ PTT ve BANKA çevrim-içi (online) tahsilatları ile ilgili işlemler yapılmıştır.
- ≠ Birimlerin, uygulamalardan doğan donanım gereksinmelerinin karşılanması ve kullanılan yazıcı kartuş/tonerlerinin temini için gerekli satın alma işlemleri ve birimlere dağıtımı yapılmıştır.
- ≠ İZSU ile anlaşmalı Bankalardan gelen tahsilât bilgilerinin kontrolü yapılıp, istatistikî bilgiler oluşturulmuştur.
- ≠ İZSU Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi www.izsu.gov.tr üzerinden yapılan su faturası tahsilatlarında bu yıl e-tahsilat uygulaması büyük artış gözlenmiştir. 2012 yılında aşağıdaki tutar e- tahsilatı yolu ile gerçekleştirilmiş.

YIL	ADET	TUTAR
2012	1.204.068	56.518.912,03 TL

- ≠ 2012 yılında abonelerimiz, bankalar ve PTT aracılığı ile yapılan tahsilatlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YIL	ADET	TOPLAM
2012	6.816.546	344.807.551,93 TL

- ≠ Veznelerimizde kredi kartı ile tahsilat yapılması için geliştirilen programlar devreye alınmış, abonelerimize nakit ödeme yanında kredi kartı ile ödeme yapabilme kolaylığı sağlanmıştır

YIL	ADET	TUTAR
2012	66254	8.928.765,97 TL

- ≠ Tüm PC'lerin sunucu (server) üzerinden yönetimi ve denetimi, dosya ve yazıcı paylaşımlarının düzenlenmesi, virüs taramaları ve kontrolleri sağlanmıştır.
- ≠ İnternet sitemizdeki, ihale ilanlarının girilebilmesi için ilgili birimler yetkilendirilmiştir.
- ≠ İnternet sitemiz üzerinden yapılan tahsilatlarla ilgili abonelerimizin soruları yanıtlanmış, oluşan sorunlar giderilmiş ve takibi yapılmıştır.

≠ Birimler arasında koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan uygulama hatalarının giderilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

≠ 185 Çağrı Merkezinin daha sağlıklı ve verimli çalışabilmesi, abonelerimizi anında bilgilendirilerek 24 saat kesintisiz hizmet verilebilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

≠ Veznelerimizin bulunmadığı yerlere, abonelerimize ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla Mobil (gezici) Vezne hizmeti götürülerek, yerinde çevrimiçi (online) tahsilât uygulaması yapılmıştır.

≠ Abonelerimizin mobil telefonlar aracılığı ile İZSU fatura bilgilerini sorgulayabildiği ve borç yada planlı su kesintilerinden dolayı gerçekleştirilecek su kesintilerini önceden öğrenebildiği "İZSU Cebinizde" sistemi kurularak devreye alınmıştır.

Kurumumuzda kullanılan temel uygulamalar Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), Finans ve Lojistik, Bakım Yönetim Sistemi (BYS), Arıza Takip Yönetim Sistemi, Araç/Ekipman Kontrol Yönetim Sistemi, Personel Yönetim Sistemi, Su Kontrol Yönetim Sistemi, Endüstriyel Kontrol Yönetim Sistemi, İştirak Payları Yönetim Sistemi, Evrak Kayıt ve Yönetim Sistemi, İhale Takip Sistemi, Proje Takip Sistemi, Emlak Kamulaştırma Takip Sistemi, Yönetim Bilgilendirme Sistemi"dir.

Bunun yanı sıra, İZSU Genel Müdürlüğü kurumsal internet ve intranet sayfalarının, yayımlanması Ünibel Özel Eğitim ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığı ile hizmet alımı yoluyla birimimiz kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Abonelerimizin internet sitemiz üzerinden bildirdikleri arıza ve şikayetler anında Hemşehri İletişim Merkezi'ne iletilmektedir.

Tüm bu yapının çalışması için gereken network altyapısı, donanımlar (Sunucu, Bilgisayar, Yazıcı, Router, Modem, Switch vb.), sarf malzemeleri, bakım ve onarım işleri yüklenici firma tarafından yapılmaktadır.

Uygulamalarda kullanılan veritabanı Oracle 10g'dir. ABYS ve FİLYS uygulamaları ise Oracle 10i As uygulama sunucusu üzerinden çalışmaktadır.

Sistem bileşenleri, donanım, iletişim ve yazılımdan oluşmaktadır. Sistem bileşenlerinin kısa açılımları aşağıdaki gibidir:

Donanım Bileşenleri:

SUNUCULAR	MİKTAR
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ABYS, DB)	2 Adet
Kümelenmiş Fujitsu SES M4000 (ERP, DB)	2 Adet
Web Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
Sanallaştırma Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2 Adet
Etki Alanı Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	2 Adet
Dosya Sunucusu Fujitsu Primergy RX 300 S	1 Adet
Yönetim Bilgilendirme Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
Uygulama ve Veritabanı Test Sunucusu Fujitsu SES T1000	2 Adet
Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu FibreCat CX4-120	1 Adet
Yedekleme Ünitesi Fujitsu Eternus LT40	1 Adet
Sistem Yönetim Sunucusu Fujitsu Primergy RX100 S5i	1 Adet
ABYS Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
ERP Felakate Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu SES M3000	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S5	1 Adet
FKM Harici Veri Depolama Ünitesi Fujitsu Eternuz DX60	1 Adet
Evrak Kayıt Server	1 Adet
Hemşehri İletişim Merkezi Server	1 Adet
Trend Micro Anti-Virüs Server	1 Adet
Websense-Checkpoint Server	1 Adet
Felaket Kurtarma Merkezi Sunucusu Fujitsu Primergy RX300 S6	2 Adet
İnternet Log Sunucusu HP Proliant DL 160 G6	1 Adet
IBM Sunucu Upluance Server (Santral Sunucuları)	4 Adet

İSTEMCİLER (İZSU+Yülenici Firma)	*MİKTAR*
PC	1310 Adet
Nokta vuruşlu yazıcı (205 adet 80 kolon, 65 adet 132 kolon)	297 Adet
Hızlı Satır Yazıcı	20 Adet
Deskjet/laserjet yazıcı	362 Adet

İletişim Bileşenleri
YEREL AĞ (LAN)
Bina içi kablolama
Switchlerle omurga
GENİŞ AĞ (WAN)
Fiber optik altyapı
G.SHDSL modemler
Routerlar ve ses entegrasyonu
3 G Mobil Modemler ile VPN
Radyo-Link Altyapısı

Yazılım Bileşenleri
ABONE BİLGİ YÖENTİM SİSTEMİ (ABYS)
Su, Atıksu ve KÖP Abonelik İşlemleri
Sayaç Okuma İşlemleri
Sayaç İşlemleri
Abone İtirazları İşlemleri
Faturalama ve Tahsilat İşlemleri
Hukuk İşlemleri
Kanal Katılım Payları İşlemleri
Entegrasyon
Raporlama
BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)
İş Emri Yönetimi
Arıza Bakım Yönetimi
Araç Kontrol
Malzeme Yönetimi
Entegrasyon
Raporlama

FİNANS VE LOJİSTİK İŞ YÖNETİM SİSTEMİ (FLİYS)
Finans (Muhasebe)
Genel Muhasebe/ Bütçeleme
Borçlar Muhasebesi
Sabit Kıymetler
Lojistik
Satın Alma
Ambar

Personel ve Bordro Sistemi (PBS)
Memur Personel Sistemi
İşçi Personel Sistemi
Şirketler Personel Sistemi
Stajyer Sistemi
Ruhsat Denetim ve Laboratuar Sistemi
Endüstri kuruluşları kayıt ve takibi
Periyodik analiz bilgileri

SİSTEM MİMARİSİ

Sistem mimarisi teknolojik altyapı, ağ mimarisi ve uygulama mimarisinden oluşmaktadır ve aşağıdaki gibidir :



I.Teknolojik Altyapı

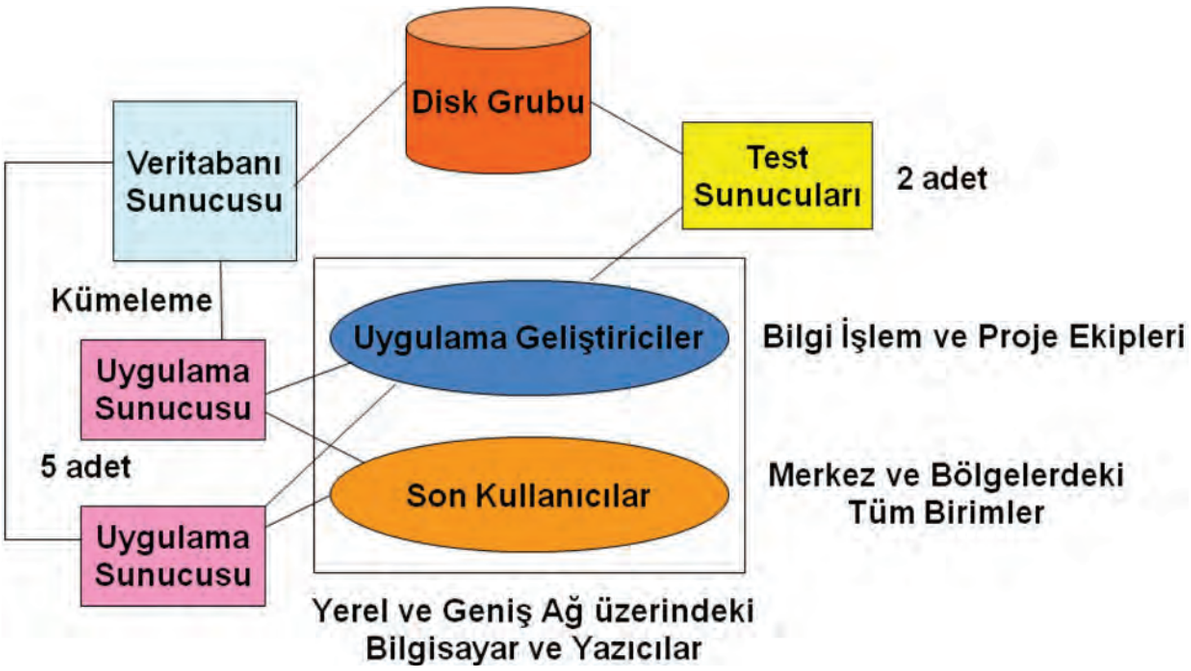

II. Uygulama Entegrasyon Mimarisi

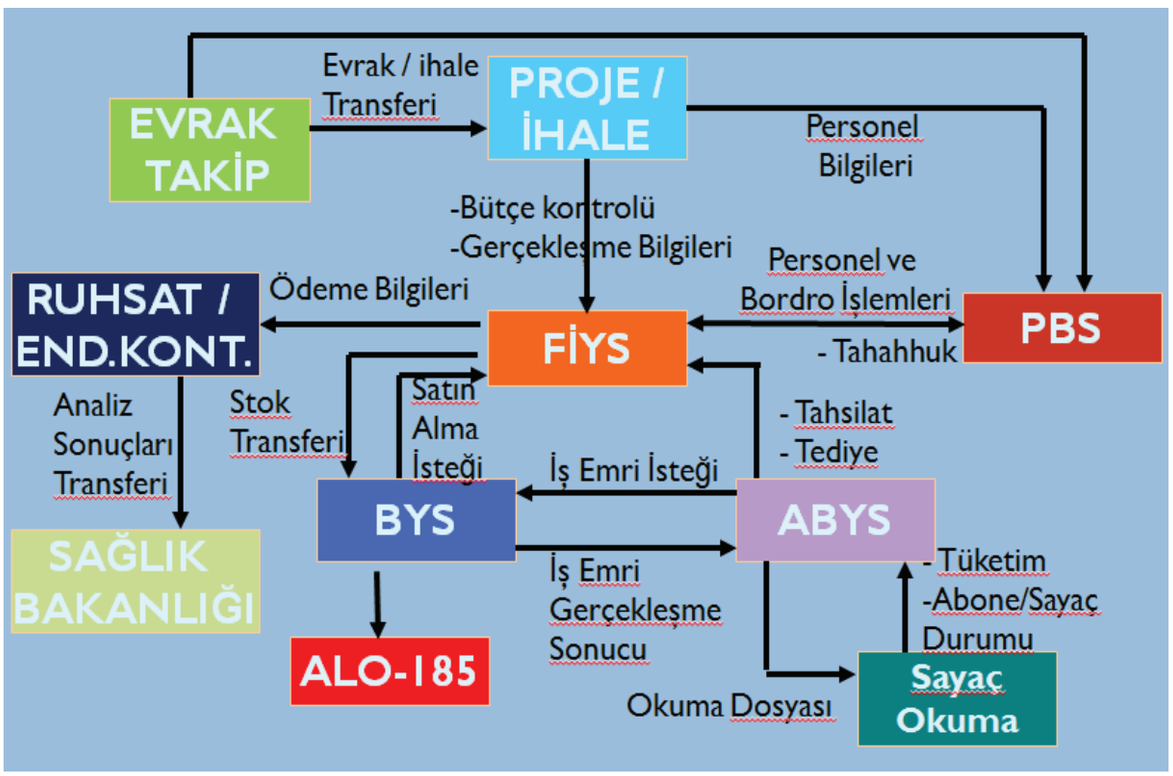

I.Ağ Mimarisi

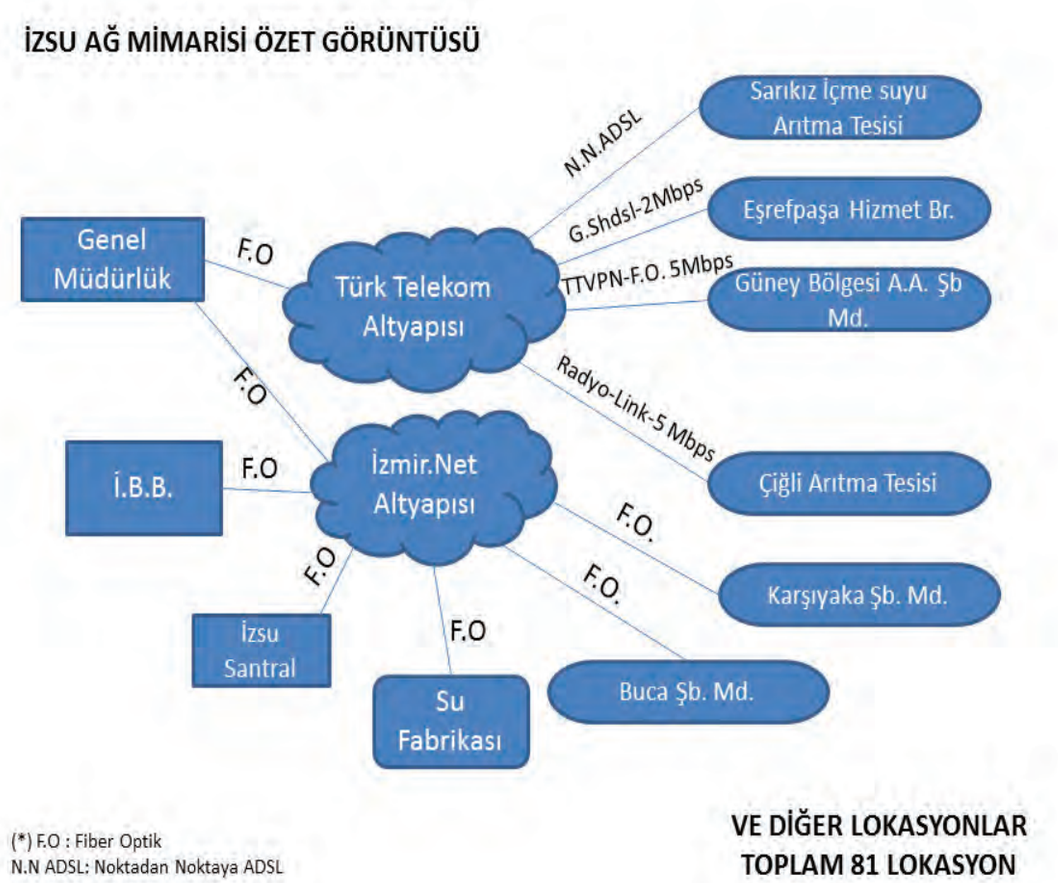

AĞ MİMARİSİ - GENEL YAPI

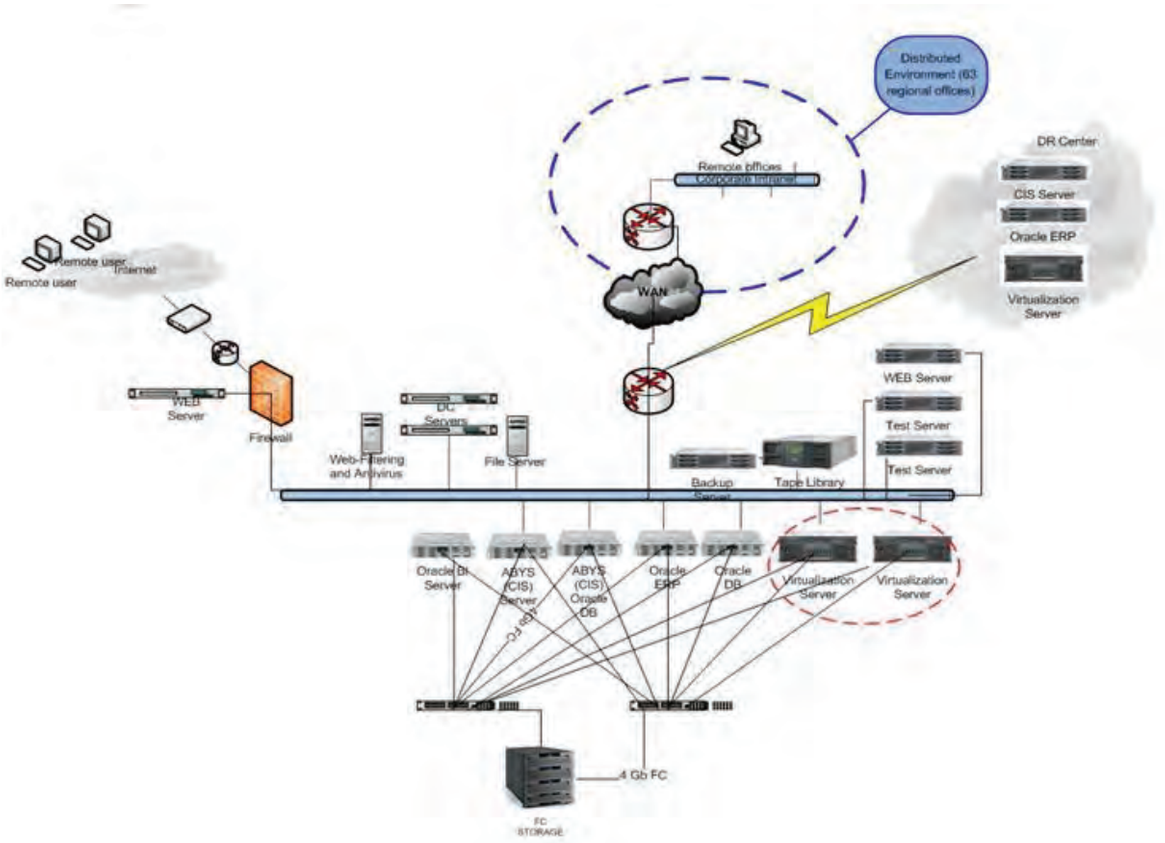

Ağ Mimarisi – Merkez ile uzak bağlantı noktaları bağlantı alt yapısı

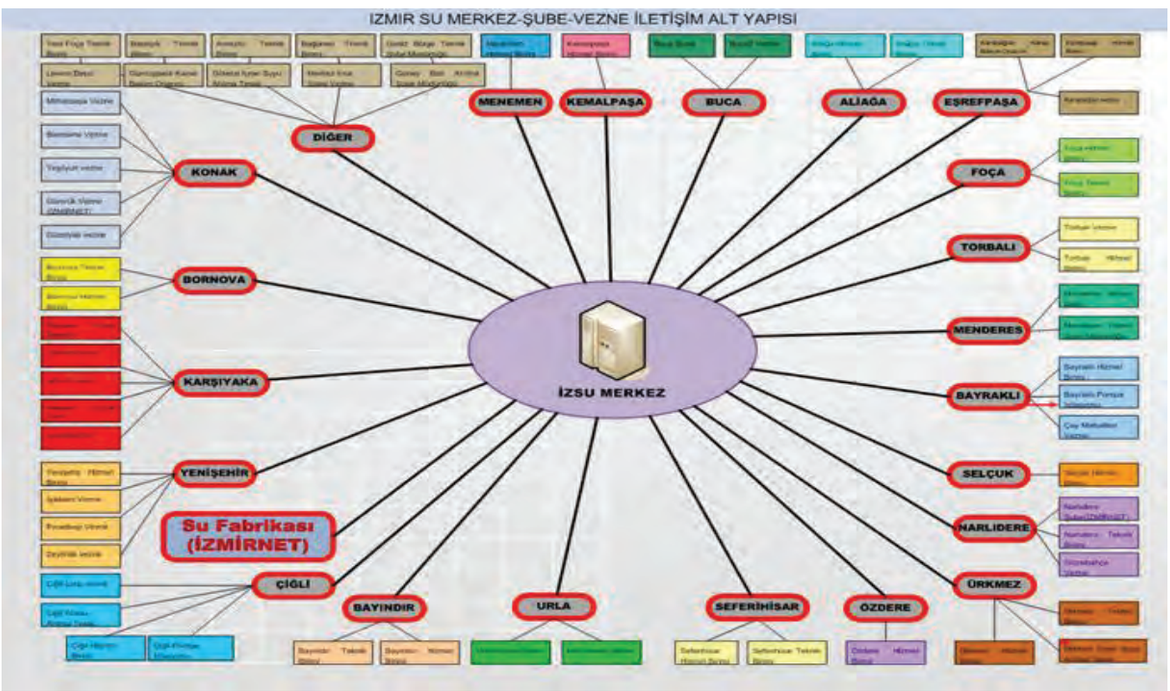



LOKASYONLAR

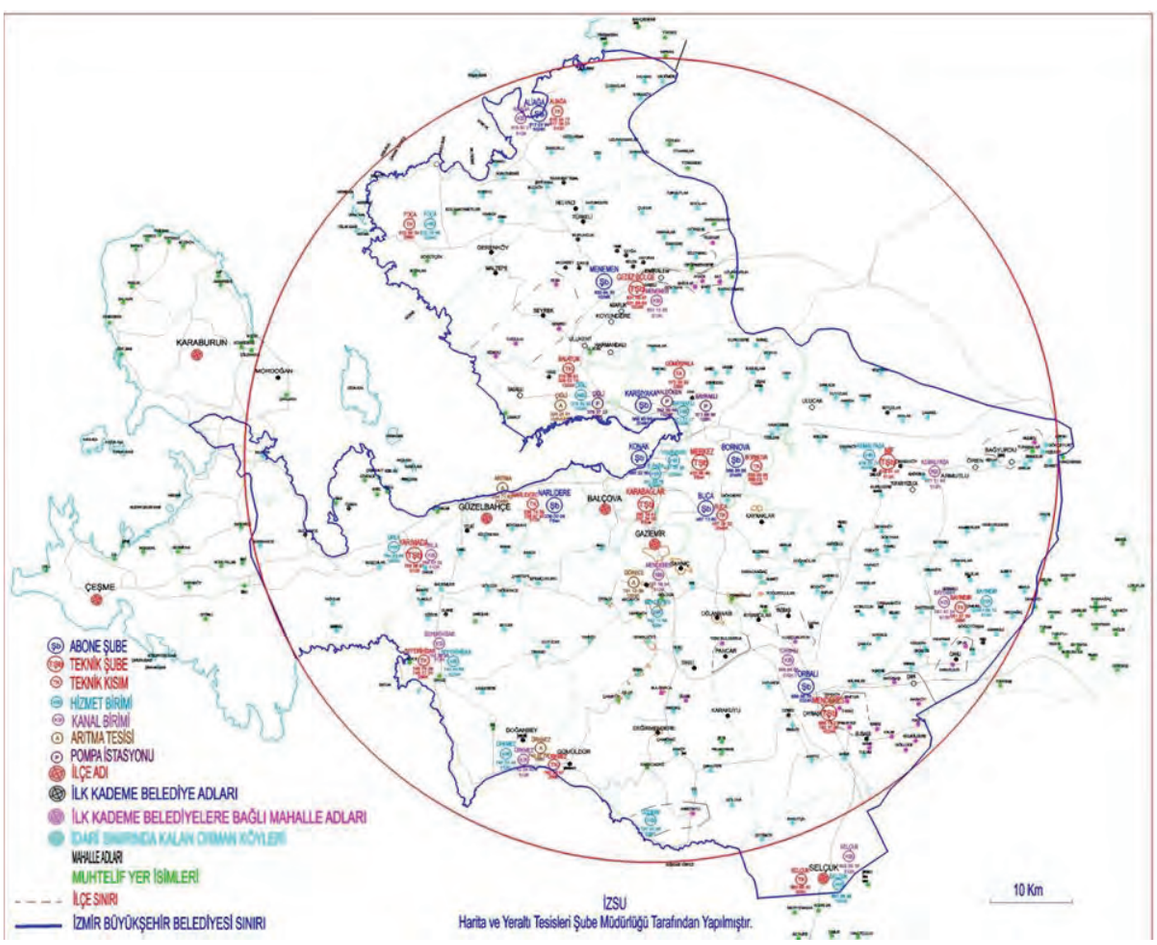

Kurumsal İnternet Hizmetleri



www.izsu.gov.tr internet sitemiz üzerinden verilen kurumsal hizmetler ve bilgilendirme sayfalarımız genel olarak aşağıdaki başlıklar altındadır:

- e-bilgi / e-tahsilat
- e-arıza bildirim/ e-arıza takip
- e-itiraz
- Su Kesintileri Bildirimi
- İZSU Cebinizde
- Alo 185
- Abonelik İşlemleri
- İtiraz Bilgilendirme
- Genel Fatura Bilgileri
- Tarifeler
- Anlaşmalı Bankalar
- Laboratuvar İşlemleri

- E-Bilgi – E- Tahsilat



Abonelerimizin faturalarını internet sitemiz aracılığı ile sorgulayıp kredi kartı aracılığı ile ödeyebildiği bölümdür



➢ E-Arıza Bildirim / E-Arıza Takip

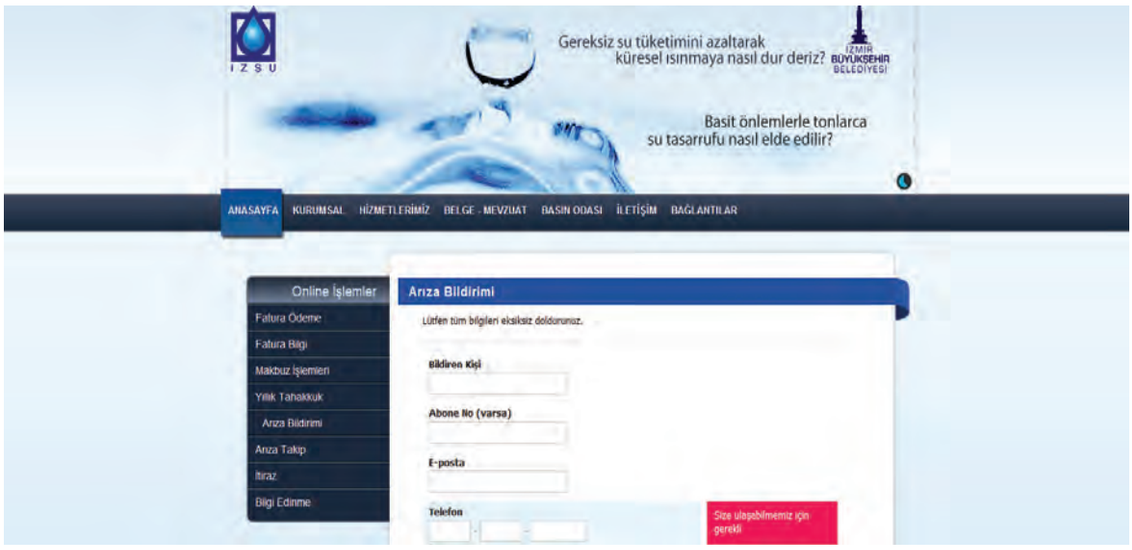

Abonelerimizin arızalarını (su arıza , kanal arıza) bildirdikleri ve takip ettikleri bölümdür.



➢ E-İtiraz

Abonelerimizin faturalarına ilişkin itirazları (hatalı okuma,sayaç karışıklığı,sayaç bozuk,yüksek fatura,diğer) belirttikleri bölümdür.



➢ Su Kesintileri Bildirimi

İnternet sitemizin Su Kesintileri bölümünden İZSU hizmet sınırları içerisindeki planlı veya arıza kaynaklı tüm su kesintileri ile ilgili anlık bilgilere ve detaylara (kesinti bölgesi, kesinti sebebi, kesinti başlangıç ve bitiş zamanı vb.) ulaşılan bölümdür.



BİRİMİ	KESİNTİ TİPİ	KESİNTİ SÜRESİ	İLÇE	MAHALLE/KÖY	AÇIKLAMA	DURUMU
MERKEZ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA TEKNİK AMİRLİĞİ	Şebeke Yenileme/Döşeme	01.03.2013 saat 15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.	BORNOVA	EVKA 3	EVKA/3 MAHALLESİ MUHTELİF SOKAKLARDAKİ BRANŞMAN YENİLEME ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE GÜN İÇİNDE SAAT 08:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA KISA SÜRELİ SU KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR.	Devam Ediyor

➢ İZSU Cebinizde

İnternet sitemiz ve cep telefonu aracılığı ile abone olunan bu hizmette, abonelerimizin cep telefonlarına planlı su kesinti bilgileri ile borç bilgileri , ödeme yapılmaması durumunda faturalarının son ödeme tarihinin geçtiği bilgisi gönderilmektedir.





➢ Alo 185

İZSU 185Su ve Kanal Arıza, Bilgi ve Danışma Hattı'na hizmet eden uygulamadır.

Telefonla 185 veya 293 293 0 aranarak 24 saat operatörlerin hizmet verdiği İZSU 185 Çağrı merkezine ulaşıldığında;

Su ve Kanal Arızası,

Yağmur suyu kanalları,

Dere temizliği ve bakımı hakkında arıza,istek ve şikayetlerinizi bildirebilir;

Kesinti haberleri,

Abone No ile Borç Sorgulama,

Yeni Abonelik bilgileri ,

Su ve Atıksu Tarifeleri,

Vezne yerleri hakkındaki tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.

Belirtilen tüm istek ve şikayetler ,ilgililere anında iletilmekte ,tüm görüşmeler kayıt altına alınarak takibi yapılmaktadır.





- Abonelik İşlemleri

Abonelerin Yeni Su Aboneliği , İsim Değişikliği , Abone Tipi Değişikliği , İlişik Kesme , Abonelik Dondurma, Abonelik Dondurma İşlemini Erken Kaldırma , Çok Sayaçtan Tek Sayaca , Tek Sayaçtan Çok Sayaca konularında bilgi edindiği bölümdür.

- İtiraz Bilgilendirme

Abonelerin Yüksek Tüketime İtiraz , Mükerrer Ödeme , Tahakkuka İtiraz konularında bilgi aldığı bölümdür.

- Genel Fatura Bilgileri

Konut aboneleri veya diğer abone tipleri için su tahakkukunun hesaplanması , gecikme faizi ve suyun kesilme işlemlerine ait bilgilerin yer aldığı bölümdür.

- Tarifeler

Abonelerin Su ve Atıksu Tarifesi ,Laboratuvar Analiz Ücretleri , Makine ve Araç Kiralama , Keşif Proje ve Katılım Payı ile ilgili ücret bilgilerinin yer aldığı bölümdür.

- Anlaşmalı Bankalar

Kurumumuzla anlaşmalı bankaların listesinin yer aldığı bölümdür.

- Laboratuvar İşlemleri

Abonelerin laboratuvar işlemleri ile ilgili bilgi aldığı bölümdür.

Intranet Uygulamaları:



Kurumumuz personeline yönelik iç hizmet ve bilgilendirmelerin yapıldığı Intranet sayfalarımızda bulunan bölümler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

- Personelin Bordro ve İzin durumunu sorgulayabildiği bölüm
- Eşrefpaşa Hastanesi Poliklinik sıra alma (İBB'den)
- Eşrefpaşa Hastanesi Tahlil Sonucu Sorgulama (İBB'den)
- Kurum içerisinde kullanılan matbu kağıtların sipariş bölümü
- Kurum içi duyurular bölümü
- Telefon Rehber

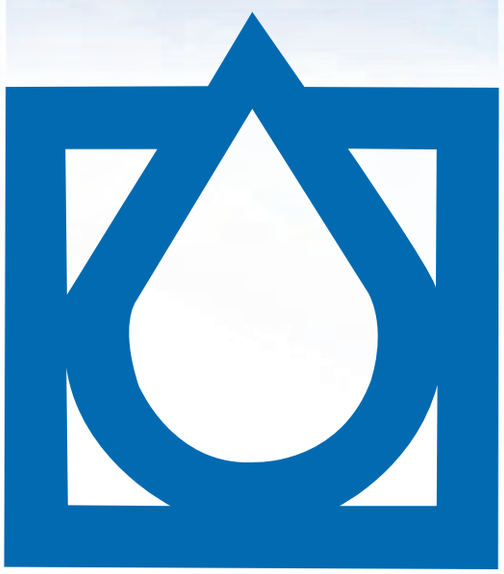

İZSU

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kararlar ve Tutanaklar Şube Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik, Sivil Savunma Uzmanlığı birimlerinden oluşmaktadır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 1 Adet Daire başkanı, 2 adet Şube Müdürü, 1 adet Birim Sorumlusu ve hekim, 3 adet Hekim, 2 adet İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Uzmanı, 3 adet Şef, 6 adet Memur, 2 adet Kadrolu İşçi,13 adet İzelman Personeli, 1 adet İzbelcom Personeli ve 95 adet Taşeron Firma elemanı olmak üzere toplam 129 personelden oluşmaktadır.

Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri; İZSU ana hizmet binası 1,4,5 ve zemin katları ile Halkapınar Sular İşletmesi'nde hizmet vermektedir.

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Ana Proje ve Faaliyetimiz olan; Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak akışının sağlanması, Çalışan Personele temiz sağlıklı güvenilir bir ortam hazırlaması, personelin motivasyonunu yükseltmek amacımız kapsamında. İlgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak, Genel Müdürlük Hizmet Binamız ve bağlı Birimlerin, temizlik, fotokopi, sağlık, Çay Ocağı Hizmetleri, Klimalar, Asansör, Jeneratör, ve Güç kaynaklarının sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını temin etmek. Ayrıca Genel Müdürlük Hizmet Binası gelen Giden Evrak Kaydı ve Posta ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaktır.

Genel Müdürlük Hizmet Binamız ve bağlı Birimlerin Temizlik işlerinin yaptırılması denetimi ve hak edişlerinin düzenlenmesi,
Fotokopi makinelerinin sağlıklı çalışmasını denetlemek hak edişlerini kontrol etmek ve düzenlemek,
Memur personele yapılacak giyim yardımlarının tespiti,
Memur personelin lojman taleplerinin tespiti,
Çay Ocağı Hizmetlerinin kontrolü ve denetimi,
Klimalar, Asansör, Jeneratör, Telefon santrali ve Güç kaynaklarının sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını temin etmek,
Genel Müdürlük Hizmet Binamızdaki Tesisat, Elektrik, Telefon arızalarına müdahale ederek onarımı sağlamak.
İzsu Genel Müdürlüğü Sivil Savunma hizmetlerini yürütmek,
Kuruma gelen tüm evrakların kayda alınması, kurum içi ve kurum dışı gönderilen evraklara numara vererek postaya verilmesini sağlamak İhale teklif zarflarını teslim almak ve kayıt yaparak Komisyon

Başkanına teslim etmek, Arşiv yönetmeliğine göre tasniflemeleri yapmak, Kurum içi ve dışı gelen ve giden bütün resmi yazışmalar kayıt altına aldıktan sonra zimmet defteri ile günlük dağıtımı yapmak, görevlerini yürütmektir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

Genel Müdürlük binasında bulunan Asansör, Jeneratör ve Güç kaynaklarının sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlanmış,bakımları yaptırılmış, kontrolleri yaptırılmış ve arızalara müdahale edilerek hizmetin aksamaması sağlanmıştır.

Genel Müdürlük Binasının arşiv bölümünde gerekli düzenleme ve düzeltmeler yapılarak dosya dolapları düzenli bir hala getirilmiştir.

Genel müdürlük ve çevre birimlerin fotokopi ihtiyacını karşılamak üzere 2013 yılından itibaren geçerli olmak üzere fotokopi ihalesi yapılmıştır.

Genel Müdürlük Hizmet binasında bulunan personelin kullandığı dolapların herhangi bir tehlike arz etmemesi için kenarlarına demir aparat takılarak sabitlenmiştir.

Genel Müdürlük Hizmet binasının 5 ve 6.katında talepler doğrultusunda tadilatlar yapılmıştır.

Genel Müd.Hizmet binasında bulunan VRV ve Çatı Tıpı havalandırma klima sistemleri bakım onarımı yazlık ve kışlık olmak üzere yapılmış. Bu bakımlar karşılığında firmaya **35.101,70** Tl ödeme yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerde 53 adet fotokopi makinesi ile **1.590.159** adet çekim yapılmış ve bunun karşılığında firmaya **48.371,51 Tl** ödeme yapılmıştır.

Genel Müdürlük Binası ve Çeşitli Birimlerin Temizlik İşleri için Hizmet Alımı işi ihalesi 16.05.2012 tarihinde sona ermiş olup, Yeni İhalenin sözleşmesi 28 aylık olarak NO-MED Firmasıyla 17.05.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Sözleşme gereğince, gerekli denetimler yapılmış ve temizlik hizmetleri yürütülmüştür. Bu hizmetler karşılığı firmaya **2.068.513,20 TL** ödeme yapılmıştır.

Değişik tarihlerde düzenlenen **Sivil Savunma ve Afet Acil Durum** konularında düzenlenen eğitimlere katılım sağlanmıştır.

12 / 14 / 19 / 21 / 26 / 27 Haziran 2012 tarihlerinde saat 14.30 ile 16.30 saatleri arasında Genel Müdürlüğümüzde ve Çevre Birimlerde görev yapan personellerin, dönüşümlü olmak üzere **" Temel Düzeyde Yangın Eğitimi " ve İleri Düzeyde Yangın** eğitimlerine katılıp gerekli eğitimi alabilmeleri için İzmir İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan Uzman Eğitmenlerce verilen yangın eğitimine gerekli malzeme, teçhizat ve teknolojik donanım konusunda birlikte çalışma yapılmıştır.

Kurum tarafından düzenlenen "Kamu İhale Kanunu" eğitim seminerine 8 personel ile katılım sağlanmıştır.

İzsu Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yangın Güvenliği ve Tesisatı Yenileme İhalesi neticesinde Firma ile 04.07.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Bu sözleşme kapsamında ;

Yangın algılama ve ihbar sistemleri,









Acil Aydınlatma sistemleri,



Acil yönlendirme,kaçış yollarının belirlenmesi,



Yeni yangın dolapları,

Riskli bölgelere kurulan gazlı söndürme sistemleri,









Yangın merdivenine açılan kapıların yangın kapılarına çevrilmesi,

Bodrum katta bulunan 2 adet jeneratörün mahallerinin revizyonu işleri yapılmış,

Hizmet Binası Yangın Güvenliği ve Tesisatı Yenileme İhalesi çalışmalarında sürekli olarak teknik personelimiz ile (Hafta sonları dahil olmak üzere) destek sağlanmıştır.Yenilen Yangın Güvenliği tesisatında bulunan Konversiyonel Yangın Algılama ve Söndürme sistemi ile ilgili , Güvenlik personeli ve teknik personele yetkili firma tarafından eğitim verilmesi sağlanmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda firmaya toplamda **346.903,10 TL**. ödeme yapılmıştır.

Genel Müdürlük Genel evrak birimimizde :

Normal posta gönderisi	6.049	Adet	
RR Gönderisi	5.198	Adet	
Kargo Gönderisi	2.1345	Adet	
Aps Gönderisi	810	Adet	işlem yapılmıştır.

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere;
Halkapınar Su Fabrikasının Sivil Savunma Planlarını,
24 Saat Devamlı Çalışma Planlarını,
Tahliye edilecek Milli Servet ve Kıymetler ile ilgili planları,
Genel Müdürlük ve Halkapınar Sular İşletmesinin İlk Yardım Ekiplerini
Savaş Hasarı Onarım Planlarının tamamı kontrol edilerek eksiklikler tamamlanmış, yenileri yapılmıştır.
Söz konusu Planlarda Genel Müdür Oluru ile görevlendirilen personelden emekli, tayin gibi sebeplerle ayrılanların yerine yenileri görevlendirilerek, görev belgeleri kendilerine ilgili oldukları Daire Başkanlıkları aracılığı ile iletilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde Yangınlara Karşı Korunma amacı ile alınan Yangın Tüplerinin yıllık periyodik bakımları yapılmış olup, eksilen, boşalan tüplerin yenileri ile değiştirilebilmeleri için ihale ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
956 adet Eski Yangın Söndürme Tüplerinin Dolum ve Bakım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

27 Aralık 2012 tarihinde, saat 14.30 da Konak' ta bulunan Genel Müdürlük binamızda, **Yangın Tatbikatı** başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.



Tatbikat öncesi bilgilendirme toplantısı



İlkyardım ekibinde görevli personelin kurtarma çalışması









Tahliye Şeridi ve Güvenlik Şeridi

KARAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan, içme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için, kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gerekli tesislerin etüd ve projelerinin yapılması, yaptırılması ve bu projelere göre tesisleri kurmak, kurdurmak ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde arıtma tesislerine ulaştırılması için gerekli tesislerin kurulması, dere ıslahları işlerinin yerine getirilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve mevzuatına uygun olarak ihaleler yapılması, ihalelerin sonuçlandırılması,
Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının, barajların ve yeraltı sularının, kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını Su Havzaları Koruma Yönetmeliği, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve bu yönetmeliklere bağlı olarak çıkarılan Yönergeler çerçevesinde önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik ömrü kalmamış araç ve gereçleri satmak,

Kuruluş amacına dönük çalışmaların yerine getirilmesi için her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek,
Konuları ile ilgili olarak, 2560 sayılı Kanunla Yönetim Kuruluna verilen görevler içerisinde gerekli kararların alınması, sonrasında bu kararların yazılması, kararların karar defterine raptedilmesi, saklanması ve uygulanması için ilgili birimlere ulaştırılması, Genel Kurul'a gönderilecek konuların yazışmalarının yapılması, Genel Kurul'ca alınan kararların, tespit edilmesi, karar defterine raptedilmesi ve ilgili birimlere ulaştırılması, Yönetmelik değişikliklerinin gazetede ilanının sağlanması gibi iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı' na bağlı olarak, bir müdür ve bir büro personeli ile yürütmek ve Yönetim Kurulunun sekretarya görevini yapmak,

2012 YILI FAALİYETLERİ

2012 Yılında İZSU Genel Kurulunca 19 önerge karara bağlanmış olup,

Yönetim Kurulunca 53 oturumda 811 karar alınmıştır.

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz, 27 Kasım 2010 Tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nde bahsi geçen görev ve sorumlulukları kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda birimimiz;
İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden, İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden, İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından, çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından, işçilerin yaptıkları

işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, sorumludur.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz, İZSU Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında kurulu bulunan işletmelerimizde görev yapan çalışanların ve görev yaptıkları birimlerin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda; iş sağlığı ve güvenliği kurulları faaliyetleri, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri, işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri, risk değerlendirme çalışmaları, kişisel koruyucu donanımların tespiti, işyerlerinde alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yürütmektedir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz 4 kurum/işyeri hekimi, 2 tam süreli iş güvenliği uzmanı ,4 büro personeli ve 1temizlik personelden oluşan toplam 11 personeli ile hizmet vermektedir.

İZSU Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulları 2012 Ekim, her ay olağan iş sağlığı ve güvenliği toplantılarını tamamlamıştır.

"Yangın Söndürücü Cihazlara Hidrostatik Test, Dolum, Bakım ve Periyodik Kontrol işlerinin yapılabilmesi için teknik şartname ve teslim alma aşamalarında teknik destek sağlanmıştır.





İZSU Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmakta olan kaldırma ve iletme ekipmanları ile basınçlı kapların periyodik kontrolü işinde yüklenici tarafından düzenlenen iş programı çerçevesinde periyodik kontrollerin yapılmasına devam edilmektedir. İZSU Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmakta olan kaldırma ve iletme ekipmanları ile basınçlı kapların 2.periyodik kontrolü 23.11.2012 tarihinde tamamlanmıştır. Raporlar ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilmiştir. 3.Periyot kontrollerine 21 Ocak 2013 tarihinde başlanacaktır.








"İzsu Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yangın Güvenliği ve Tesisatının Yenilenmesi" işi 09.10.2012 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

Hı-Up Eğitimleri kapsamında oluşturulan 3 gruptan 2. Grubun eğitimleri 17.09.2012-05.10.2012; 3. Grubun eğitimleri ise 08.10.2012-01.11.2012 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Kursu başarıyla tamamlayan 57 personelimize sertifikaları yazılı olarak gönderilmiştir.









İzsu personeline verilecek mesleki eğitimlerle ilgili hazırlanıp Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen yeni mesleki eğitim modülleri için onay beklenmektedir. Gerekli onayın gelmesinden sonra eğitimlere başlanacaktır.

Genel Müdürlüğümüz birimlerinde görev yapan 450 personelimize Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiştir.













Genel Müdürlük binası risk değerlendirme faaliyeti tamamlanmıştır. Oluşturulan Risk Değerlendirme Raporu hakkında bilgilendirme sunumu Ekim 2012 İSG Kurulunda yapılmıştır. Risk Değerlendirme Raporu ilgili tüm birimlere gönderilmiştir.



Yarımada içme suyu, kanalizasyon ve arıtma birimlerindeki risk değerlendirmesi faaliyeti tamamlanmıştır. Oluşturulan Risk Değerlendirme Raporu hakkında bilgilendirme sunumu Kasım 2012 İSG Kurulunda yapılmıştır. Risk Değerlendirme Raporu ilgili tüm birimlere gönderilmiştir.



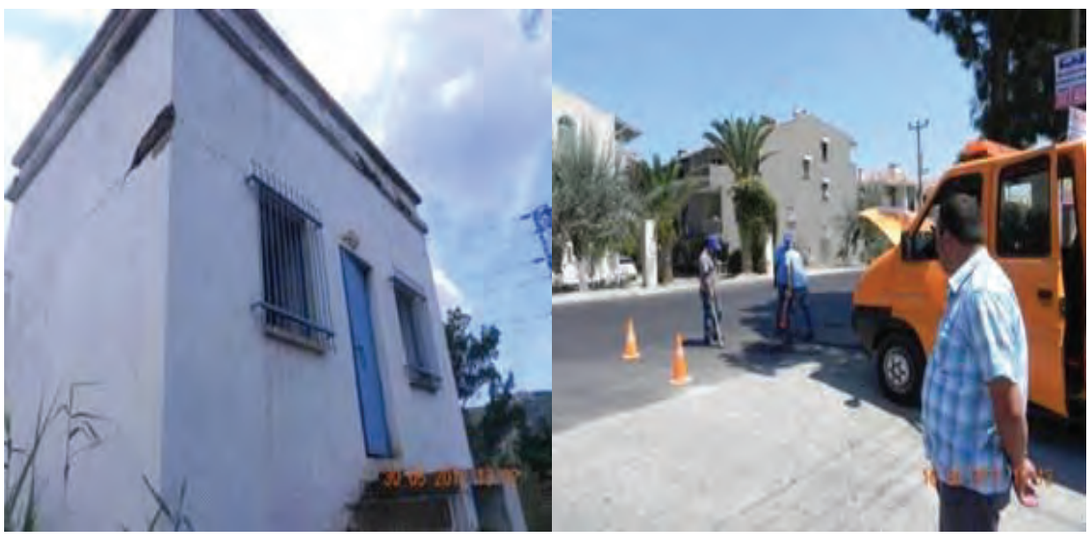





Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Kanal İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından bildirilen altyapı inşaatlarında kullanılan betonarme boruların stok sahalarında alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında inceleme yapmak üzere İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimimizde görev yapan İş Güvenliği Uzmanı Şebnem ÖZKULA ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığında görevli İSG kurul üyemiz İş Güvenliği Uzmanı Harun SEÇKİN 17-18.09.2012 tarihlerinde ilgili birimleri ziyaret ederek çalışmalara başlamıştır. Oluşturulan teknik rapor hakkında bilgilendirme sunumu Ekim 2012 İSG Kurulunda yapılmıştır.

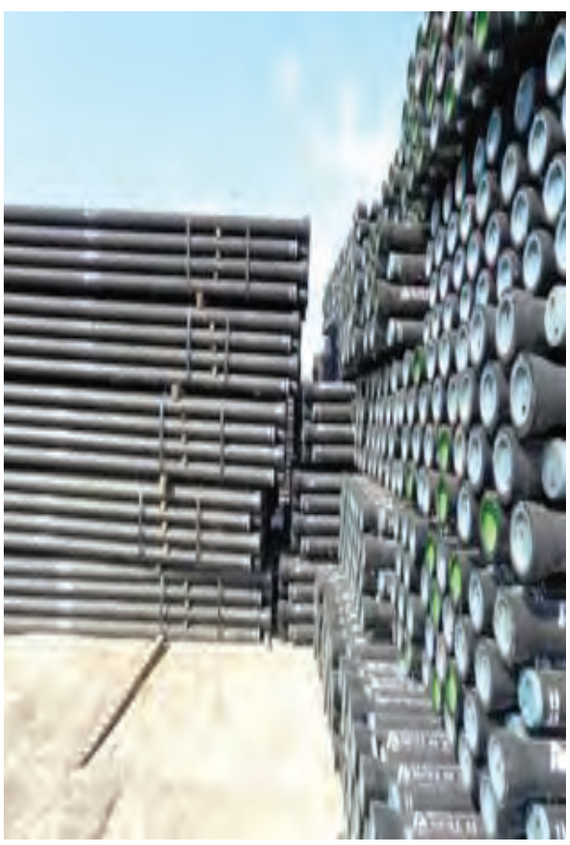

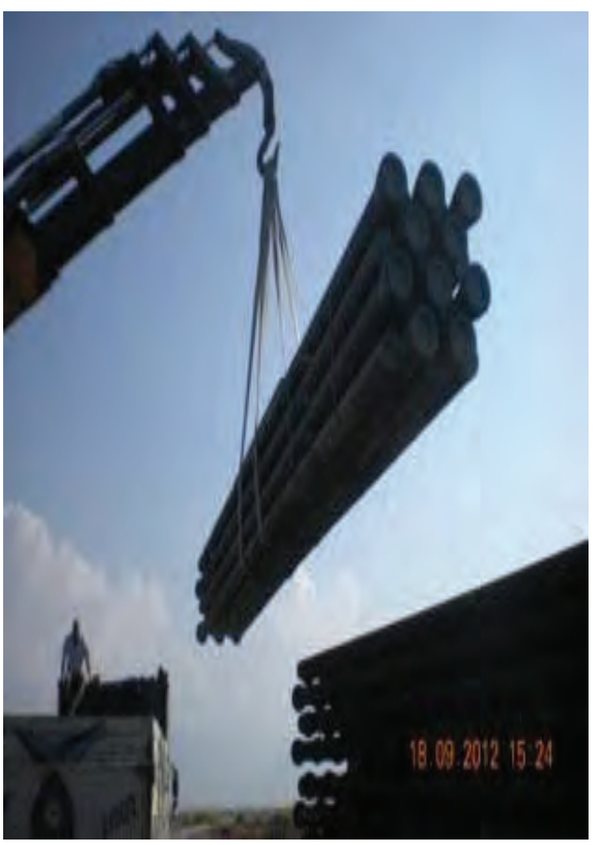

Gürültüye bağlı kişisel maruziyet ve ortam ölçümleri ekli programa göre 15.10.2012 tarihinde başlanmış olup ölçümler devam etmektedir. Ölçümleri tamamlanan Makine İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığı ile Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı'na ilgili raporlar gönderilmiştir.











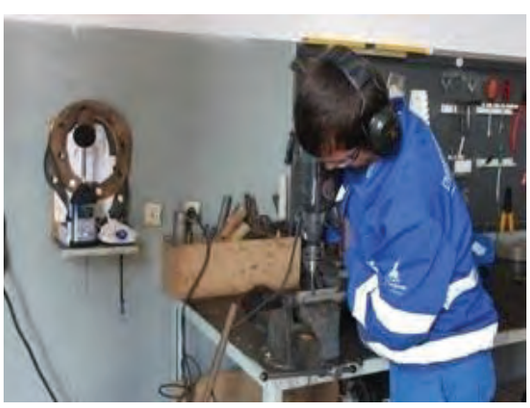

İSGB tarafından genel kapsamlı olarak Acil Eylem Planı hazırlanmıştır. Kasım ayı ISG kurulunda ilgili birimler tarafından kendi süreçlerinde belirleyeceği farklı acil durumlara yönelik planların eklenerek uygulamaya konulmasına ve yılda bir kez acil durum tatbikatı yapılmasına karar verilmiştir. Akabinde plan ilgili birimlere yazılı olarak gönderilmiştir.

İSGB tarafından daha önce yapılan koruyucu aşılama faaliyetlerine katılamayan ve devam eden süreçte işe girişleri yapılan yeni personelin belirlenmiş, bu personellerden atıksu ile teması olanlara hepatit A tahlillerinin yaptırılmış ve tahlil sonuçlarına göre Hepatit A aşılarının tamamlatılmış, tetanos aşıları eksik olan ve işe yeni başlayan personelin tetanos aşılarının takibi aşı takvimine uygun olarak devam etmektedir.

İZSU Halkapınar yerleşkesinde risk değerlendirme faaliyetine başlanmıştır.

İzsu Genel Müdürlüğümüz birimlerinde oluşan iş kazalarına ait kaza analiz raporları oluşturulması faaliyetine başlanmıştır.

İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluş çalışmaları tamamlanmıştır.

1570 kişinin poliklinik muayenesi, 176 kişiye enjeksiyon/pansuman yapılmıştır.

YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI



GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Görevleri

İdarenin Etüd Plan Daire Başkanlığı ve Projeler Daire Başkanlığı çalışması sonrası yatırım programına bağlı olarak ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan tüm içmesuyu şebeke, branşman borusu ve abone bağlantıları, terfi ve isale hatları, su depoları, kaptaj, maslak v.b. sanat yapıları, kanalizasyon şebeke, toplayıcı hat, terfi hattı ve kollektörleri, sanat yapıları, baraj inşaatları, dere ıslahları, tersip bentleri, yağmursuyu imalatları, pompa istasyonları, paket arıtma tesisleri, hizmet, arşiv ve işletme binaları, içmesuyu arıtma tesisleri, atıksu arıtma tesisleri, içmesuyu amaçlı sondaj kuyularının açılması ve enerji temini yatırımlarına ait inşaat yapım çalışmalarının yürütülmesi ve yapım işlerinin denetlenmesi Yatırım ve İnşaat Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda;

a. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesine göre bütçeyle ödenek tahsis edilen kalemlerde harcama yetkilisi sıfatı ve idari sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporunu ve performans programını hazırlamak,
b. Genel Müdürlük stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan Daire Başkanlığı ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak,
c. İZSU Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinde belirtilen yapmakla yükümlü olduğu görevleri mevzuata, yıllık planlara uygun olarak yürütmek,
d. Daire Başkanlığını temsil etmek,
e. Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek,Daire Başkanlığına bağlı birimlerin işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,
f. Daire Başkanlığı ile diğer birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
g. Çalışmaların etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
h. Genel Müdürlük Makamı ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
i. Üst Makamlara sunulacak yazıların onay ve olurların ilgili mevzuata uygunluğunu sağlamak.

Daire Başkanının Yetkileri

a. 5018 Sayılı Kanuna göre Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, bütçeyi harcama yetkisi ve performans değerlendirmesini yapma yetkisi,
b. Daire Başkanlıkları arasında yapılacak yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,
c. İmza yetkileri yönergesi ile yetki devri yapılan hususlarda imza yetkisi,
d. Daire Başkanlığına bağlı personelin her türlü izin kullanımında imza yetkisi,
e. Daire Başkanlığına bağlı personelin disiplin amiri olarak disiplin cezası verme yetkisi,Daire Başkanlığı çalışmalarının mali, sosyal ve özlük hakları ile ilgili konularda Genel Müdürlüğe öneride bulunma yetkisi ve gelen evraklarla ilgili Şube Müdürlüklerine havale etme yetkisi
f. Daire Başkanlığına bağlı personeli denetleme yetkisi,
g. Harcama yetkilisi sıfatıyla gerçekleştirme görevlerini tespit yetkisi,

h. Yatırımların Denetlenmesi hak ediş kontrol ve onaylama yetkisi,
i. Geçici, Kesin kabul, fesih, tasfiye kurulu oluşturma, teklif yazısı hazırlama yetkisi,

Daire Başkanının Sorumlulukları

a)Kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuatla belirlenmiş görevlerin yerine getirilmesinde ve imza yetkisi kullanımında Genel Müdür ile bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

2-Şube Müdürlükleri Görev Yetki ve Sorumlulukları

a. Sorumlu olduğu birimin yapmakla yükümlü olduğu görevleri bağlı personele yaptırmak, denetlemek ve gerektiğinde işlerin yürütülmesinde yer almak,
b. Daire Başkanınca kendisine iletilen her türlü evrakı inceleyerek ilgililere havale etmek,
c. Kendisine bağlı personelin verimli ve düzenli çalışmaları için gereken önlemleri almak, iş disiplini ve dengeli çalışmayı sağlamak,
d. Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel amirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
e. Müdürlüğü temsil etmek,
f. Müdürlüğü içerisinde görev dağılımı yapmak,
g. Müdürlüğünde çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
h. Personelinin işe devam durumunu takip etmek,
i. Şubesini ilgilendiren konularda diğer Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerle Daire Başkanlığının bilgisi dahilinde işbirliği yapmak,
j. Müdürlüğüne ait bilgi, belge, dosyaların derlenmesi ve korunması için gerekli tedbirleri aldırmak,
k. İlgili mevzuatla belirlenmiş kurullarda görev almak ve sekretarya görevini yapmak,
l. Müdürlüğünü ilgilendiren konularda istatistikî bilgiler düzenleyerek ilgili birimlere göndermek,
m. Personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlamak,
n. Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmak,

Şube Müdürlerinin Yetkileri

a) 5018 sayılı Kanun gereğince gerçekleştirme görevlisi olarak harcama belgelerini düzenleme yetkisi,
b) Müdürlüğe ait görevlerin uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme ve uygulatma yetkisi,
c) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele İZSU Disiplin Yönetmeliğinde belirli disiplin cezası verme yetkisi,
d) Müdürlükler arası yazışma yapma ve Müdürlüğüne ait bilgi ve belge tasdik etme yetkisi,
e) Müdürlüğüne bağlı personeli denetleme yetkisi
f) Kendi konusu ve görev alanı ile ilgili işlerin sözleşme ve eklerine, şartname ve projesine, fen, sanat ve teknik kurallara, ekonomik faktörlere, iş programına uygun olarak yürütülmesi ve bitirilmesini sağlar.Yapı Denetim Heyetince kendisine iletilen problemleri çözer, gerekli gördüklerini Daire Başkanına bildirir, talimatlar doğrultusunda gereğini yapar ve yaptırır.İş bünyesinde görev alan teknik elemanlar ve birimler arasında koordinasyonu, uyumlu ve verimli çalışmayı sağlar. Kendi sorumluluğundaki her türlü işin sözleşme, şartname ve projesine uygun, zamanında yapılıp yapılmadığını denetler. Bu doğrultuda:

≠ Yeni gelen işin yapı denetim heyetini, oluşturur, onaya sunar,
≠ Yer teslim yazısını hazırlatır,
≠ SGK, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Aykome, Ukome, Trafik Müdürlüğü, gerektiği takdirde diğer altyapı kuruluşlarına işle ilgili yazıları yazdırır,
≠ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığından arazi ölçümleri için harita mühendisi atanma yazısını paraflar, Daire Başkanının onayına sunar. Proje revizyonu gerekiyorsa Daire Başkanını

bilgilendirir.

- ≠ Yapı Denetim Heyetiyle beraber projenin araziye ve sözleşmeye uygunluğunu denetler, uygunsa imalatı başlatır, değilse proje revizyonu için Daire Başkanını bilgilendirir.
- ≠ İş programını imzalayarak Daire Başkanının onayına sunar,
- ≠ Yapı Denetim Heyetiyle beraber projenin araziye ve sözleşmeye uygunluğunun denetler, uygunsa imalatı başlatır, değilse proje revizyonu için Daire Başkanını bilgilendirip gerekli yazıları hazırlatır,
- ≠ Yapı denetim heyetince düzenlenen röleve, ataşman defteri, plankote, proje, hesap, tutanak ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrakların zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve kontrollük hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını, bu evrakların kontrol edilen tarih yazılarak imzalanmasını sağlar,
- ≠ İşleri bizzat veya Yapı Denetim Heyeti marifetiyle inceleterek, yapılan işlerin denetlenmesini ve yapı denetim heyetinin sorunlarının çözülmesini sağlar. İşlerin, idarece onaylanmış projeler ve detaylara göre yaptırılmasını takip eder,
- ≠ Keşif ilavesi, süre uzatımı, yeni fiyat hazırlanması, metraj artışı, özel fiyat hazırlanması gereken durumlarda gerekli bilgileri hazırlatarak Daire Başkanının onayına sunar. Onaydan gelen konuları uygulanmak üzere ilgili Yapı Denetim Heyeti ve yükleniciye gönderir,
- ≠ Şantiyede İdarece verilen malzemenin ve İdareye ait araç ve gereçlerin yerinde ve iyi bir şekilde kullanılması ve korunmasının denetlenmesini takip eder.
- ≠ Yıllık ödenekleri ve karşılığı fiziki gerçekleşmelerin izlenmesini takip eder
- ≠ Sözleşme uyarınca yüklenicinin teknik personellerinin işe devamlarının izlenip izlenmediğini, gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığını denetler.
- ≠ Yapı Denetim Görevlilerinin süreli ve süresiz ayrılışlarında işin yürütülmesini aksatmamak için gerekli önlemleri alır,
- ≠ Yapı denetim heyetince hak ediş raporlarının zamanında, usulüne göre ve noksansız olarak düzenlenmesini sağlar. Bunlar üzerinde gerekli incelemelerin ve düzeltmelerin yapılması veya yaptırılması için ara hak edişleri imzalayarak onaylamak üzere Daire Başkanlığına sevk eder.
- ≠ İşin Bitiminde İşletme Projelerini imzalar, geçici kabul için gerekli işlemleri tamamlattırır ve geçici kabul teklif belgesini imzalar geçici kabul heyetini oluşturur Daire Başkanlığının onayına sunar.
- ≠ Geçici Kabul sonrası yapı kullanma izin belgesi için İmar Kanunu ve Yönetmeliğe göre çalışmaları başlatır.
- ≠ Kabul teklif belgesinde saptanan noksan ve kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini sağlar ve sonucu raporla bildirir, İmalatın işletme gurubuna devrini gerçekleştirir.
- ≠ Kesin metrajların işin gidişine paralel olarak yürütülmesini sağlayarak sözleşmesinde belirlenen süre içinde kesin hesapların tamamlanması için her türlü önemi alır,
- ≠ Kesin Kabul süresi gelen işin Kesin Kabul Heyetini kurar.
- ≠ Kesin Kabul uygunsa teklif belgesini imzalar, Daire Başkanlığının onayına sunar.
- ≠ Kesin teminatın süresi dolmadan Kesin Hak edişin düzenlenmesini sağlar ve incelenmesini takip eder.
- ≠ Daire Başkanlığından gelen evraklarla ilgili dağıtımı yapmak ve her iş için dosya düzeninin sağlamak arşiv kontrol ve takibini sağlamak.

3- Yapı Denetim Görevlisi veya Görevlileri Görev ve Sorumlulukları

Kendisine verilen işleri sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen, sanat ve teknik kurallara, ekonomik faktörlere ve iş programlarına uygun olarak yürütüp süresinde bitirilmesine sağlamak için, Şube Müdürü ve Daire Başkanının da görüşünü alarak yürütmekle görevlidir. Bu doğrultuda;

- ≠ Görevli olduğu işlerle ilgili tüm yazışmaları, tutanakları, evrak tanzimini ve dosyalamayı tarih ve dizi pusulasına göre yapar,
- ≠ Sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 gün içinde yer teslimini yaptırır. Bir nüshasını ilgili Müdürüne ve Yatırım İzleme birimine verir.
- ≠ Yer teslimi yapılmasına müteakip, işte oluşabilecek kaza veya hasarların önlenmesi açısından iş ve emniyet tedbirlerinin alınmasını ve aldırılmasını sağlar.
- ≠ İş programı hazırlatır ve işin iş programına uygun yapımını denetler .İş aksadığında programın dışına çıkıldığında yükleniciye yazılı ikazda bulunur.
- ≠ Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 gün içinde SGK, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Aykome, Ukome, Trafik Müdürlüğü ve gerektiği takdirde diğer altyapı kuruluşlarına ilgili yazıları yazar.
- ≠ Projenin araziye ve sözleşmeye uygunluğunu denetler, uygunsa imalatı başlatır, değilse proje revizyonu için Şube Müdürünü bilgilendirip, gerekli yazıları hazırlar.
- ≠ Yapımda kullanılacak her türlü malzemenin iş için uygun olduğunu kabul etmeden işi başlatamaz. Uygun olmayan malzemenin işbaşına getirilmesine izin vermez.Onayı alınmayan malzemenin işin başına gelmesi durumunda malzemenin kaldırılması için yazılı talimat verir.
- ≠ Yüklenici ile birlikte işe ait ölçüm, metraj, röleve, ataşman defteri, plankote, proje, hesap, tutanakları işin ilerlemesine paralel olarak hazırlar ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrakları zamanında ve usulüne uygun olarak düzenler, bizzat kontrol eder ve bu evrakları kontrol edilen tarihi yazarak imzalar.
- ≠ Yüklenicinin teknik elemanlarının işin yapımı sırasında işbaşında olmasını denetler.
- ≠ Yüklenici tarafından işin teknik şartnamesine veya fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldığını tespit ettiği iş kısımlarını Şube Müdürüne bildirir ve uygun olmayan imalatları yeniden yaptırmak hususunda Şube Müdürü ile görüşerek gerekli talimatı yazısını yazar.
- ≠ Yüklenici ile birlikte hak ediş raporlarını zamanında, usulüne göre ve noksansız olarak düzenler. Bunlar üzerinde gerekli incelemelerin ve düzeltmelerin yapılması veya yaptırılması için ara hak edişleri imzalayarak, imzalanmak üzere Şube Müdürlerine gönderir.
- ≠ Görevlendirildiği her türlü işle ilgili her türlü sorunu ilk elden çözümler veya Şube Müdürüne ileterek çözümlenmesini sağlar,
- ≠ Artan iş kalemleriyle ilgili onay ve yeni birim fiyatları yükleniciyle birlikte hazırlayarak onaylanmak üzere ilgili Şube Müdürüne gönderir.
- ≠ Keşif artışı söz konusu olduğu durumlarda mukayeseli keşif cetvelini zamanında hazırlayarak şube müdürünün görüşüne sunar ve uygunsa İdareden olur yazısını alarak imalatı yaptırır.
- ≠ Süre uzatımlarında veya keşif artışlarında teminat süresinin uzatılması için Yönetim Kurulu Kararının alınmasının ardından 10 gün içinde yükleniciye uyarı yazısını yazar,
- ≠ Süre uzatımlarında all risk sigorta süresinin uzatılması için Yönetim Kurulu Kararının alınmasının ardından 10 gün içinde yükleniciye uyarı yazısını yazar.
- ≠ Süre uzatımlarında Yönetim Kurulu Kararının alınmasının ardından 10 gün içinde yükleniciye revize iş programı hazırlatır ve idarenin onayını alır.
- ≠ Kesin metrajların işe paralel bir şekilde yapılmasını denetler.
- ≠ İşletme projesini hazırlatır, kontrol ederek imzalar.
- ≠ Geçici kabul teklif belgesini hazırlar, onaya sunar.
- ≠ Yapı Kullanma izin belgesinin alınması için çalışmayı başlatır.

≠ Geçici kabulün onaylanmasının ardından 15 gün içinde işletme projelerinin ilgili dairelere gönderilmesini sağlar.
≠ Yüklenici tarafından hazırlanmış olan kesin hesapları süresi içinde kontrol edip imzalayarak Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere hazırlar.
≠ Kesin kabul tutanağının onaylanması ile birlikte kesin hakediş raporunu düzenler, yüklenici ile birlikte imzalar.
≠ Kesin hesabın onaylanmasının ardından, SSK ilişiksizlik belgesinin İdaremize gelmesinden sonra, yüklenicinin alacağı veya borcu olmadığına ilişkin ibranameyi aldıktan sonra, teminat iadesini sağlayarak biten işe ait arşive gidecek dosyaları hazırlayarak 30 gün içinde arşive ve arşiv sorumlusuna teslim eder.

Yatırım İzleme ve Bütçe Değerlendirme ve Taşınır Kayıt Kontrol Evrak Arşiv Birimi

1) <u>Yatırım İzleme ve Bütçe Değerlendirme Birimi Görevleri</u>

≠ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmakta olan her yatırımın yer teslim tutanağı, ,iş programı, ara hakedişi, işletme projeleri, geçici ve kesin kabul hak edişleri ile geçici ve kesin kabul tutanakları ile imalat fotoğrafları ve faaliyet raporlarından birer nüshanın Yapı denetim görevlilerinden alınarak, rapora işlenmesi için kayıtların tutulması veri girişinin anında yapılması,

≠ Yatırım projelerine ait gelen bilgilerin bilgisayar ortamında ilişkili bir veri tabanı haline getirilmesi ve dosya kodu olarak bütçe tertibine göre izlenmesi ve denetlenmesi,
≠ Daire Başkanlığı bünyesinde devam eden yapım işleri için her ay sonunda aylık olarak yapılan imalatların metraj, miktar ve yapılan ödemelerinin raporlanması ve bütçeye uygunluğunun denetlenmesi ve izlenmesi yapılarak ilgili Müdürlük ve Daire Başkanlığına raporlanarak sunulması,

Her üç ayda ,
≠ Yapılan dönemsel harcamalar ve imalatlarla ilgili genel raporların hazırlanması,

≠ Aylık gerçekleştirme ve aylık plan raporlarının hazırlanması ve Bütçe gerçekleşme ve performans programına uygunluğunun analizinin yapılarak ilgili Müdürlük ve Daire Başkanlığına raporlanarak sunulması,

Her Yıl Sonunda,
≠ Yatırım projelerindeki aylık nakdi ve fiziki gerçekleştirme raporlarının hazırlanması ve Bütçe Gerçekleştirme ve performans programına uygun olarak analizlerin yapılarak müdürlük ve daire Başkanlığına raporlanarak sunulması,
≠ Yıl sonunda Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde doğruluk ve tarafsızlık prensibine uygun, ilgi tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak, yıllar itibariyle karşılaştırmaya imkân verecek biçimde ve mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde yatırım projelerine yapılan tüm imalatların ilçelere göre gruplandırılarak ve fotoğraflar ile bütünleştirilerek yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
≠ Stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkeler göz önünde bulundurularak, ayrıca merkezi idarenin ekonomik verileri ve gelecek yıllara ilişkin öngörülerinden faydalanılarak bir sonraki yılın bütçe tahminin hazırlanması,

(2) Taşınır Kayıt ve Kontrol Evrak Arşiv Birimi

Daire Başkanlığımıza ve Şube Müdürlüklerimizin 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

- ≠ Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafazasını sağlamak.
- ≠ Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
- ≠ Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
- ≠ Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
- ≠ Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya , çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri alınmak ve alınmasını sağlamak.
- ≠ Ambarda çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen azalmalara harcama yetkilisine bildirmek.
- ≠ Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
- ≠ Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
- ≠ Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
- ≠ Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
- ≠ Yıllık evrak giriş çıkışı kayıt kontrolü, işlere ilişkin İdari hakediş dosyasının düzenli olarak oluşturulmasının kontrolü, arşiv sisteminin işlemesi

(3) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Sorumluluğu

Taşınır kayıt ve Kontrol Yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıt ve noksanlıklardan sorumludur.

2012 YILI
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET RAPORU ÖZETİ

2012 Yılında İzmir İlinde;

2 adet	Arıtma Tesisi (Özdere ve Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisleri)
1 adet	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı(Çiğli)
1 adet	Arıtma Tesisine Enerji Temini (Özdere Atıksu Arıtma Tesisi)
1 adet	Arıtma Tesisine Enerji Temini (Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi) imalatına başlanmış Olup, 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
723.044mt	İçmesuyu Şebekesi ve İletim Hattı,
130.724mt	Kanalizasyon Şebekesi,
18.919mt	Yağmursuyu Hattı,
18.458mt	Dere Islahı,
22.321mt	Dere kenarlarına korkuluk,
8.725,ton	İstifsiz taş dolgu,
67mt.	Koruma Çiti
4.740mt.	Tel Çit ve imalatı,
259mt.	Tel örgü ,ve Betonarme duvar imalatı ,
6 adet	Giriş kapısı
4 adet	Tersip Bendi,
2 adet	Tersip Bendi Onarımı
2 adet	Arsenik giderimi için paket arıtma sistemi ekipmanı temini ve montajı işi. (Bornova İlçesi Yaka Köyü-Menemen İlçesi Seyrek Köyü)
1 adet	Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Alanı Enerji Nakil Hattı Tadilatı ve 20.3/35kV 1X240/25mm² XLPE kablo=3000m mal alımı
10 adet	İçmesuyu Su deposu Bakım ve Onarımı
19 adet	İçmesuyu Su deposu Bakım ve Onarımı imalatına başlanmış olup 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
1 adet	İdari Bina ve Atölye Binası
1 adet	Güvenlik Kulübeleri Elektrik Temini,
3 adet	Atıksu Terfi Merkezine Elektrik Temini,
1 adet	Yağmursuyu Terfi Merkezi,
1 adet	Yağmursuyu Terfi Merkezi Alçak Gerilim Özel Anahtar Elektrik
20 adet	Su Sondaj Kuyusu (*)
10 adet	Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Temini ve Saç Kabin Yapılması,
9 adet	İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini,
1 adet	İçmesuyu Pompa İstasyonu Yapımı,
1 adet	İçmesuyu Pompa İstasyonu Güç Yükseltilmesi,
6 adet	İçmesuyu Kuyusuna Elektrik Temin Edilmesi,
1 adet	Kocapınar Kaptajı ve Çatalpınar Kaptaj Odaları Tadilatı(Bornova)
1 adet	Muhtelif İlçelerde Ambar, Arşiv ve İstinat Duvarı Yapımı imalatına başlanmış olup 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
1 adet	Hizmet Binası Subasman Seviyesi İkmal İnşaatı Yapımı imalatına başlanmış olup 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca Muhtelif Çaplarda İçmesuyu Borusu Alımı işi kapsamında **515.675,-mt** uzunluğunda muhtelif çaplarda içmesuyu borusu alımı yapılmış olup, alımlar tamamlanmıştır.

17 adet Su Sondaj Kuyusu Açılması;

1. Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1
2. Bayındır İlçesi Yakapınar Köyü Y2
3. Bayındır İlçesi Kızılcaova Köyü K2
4. Bornova İlçesi Beşyol Köyü B2
5. Kemalpaşa İlçesi Yenmiş Köyü Y1
6. Selçuk İlçesi S1
7. Selçuk İlçesi S2
8. Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3
9. Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S4
10. Menderes İlçesi Pirentepe P1
11. Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1
12. Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1
13. Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi S1
14. Torbalı İlçesi Ayrancılar S1
15. Torbalı İlçesi Ayrancılar S3
16. Menderes İlçesi Yeniköy Y2
17. Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2

3 adet Su Sondaj Kuyusu İmalatı 2012 yılında başlamış olup imalatların 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

1. Bayındır İlçesi Hisarlık Köyü H1
2. Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1
3. Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 2012 yılı
Sermaye Giderleri Bütçe Miktarı 313.626.960,00TL olup
Toplam 194.204.212,55TL lik harcama gerçekleşmiştir.
Bütçenin nakdi gerçekleşme oranı %62'dir.

Yukarıda Belirtilen Faaliyetlerin İlçe Bazındaki Dağılımları Şöyledir:

2012 yılında Balçova İlçesinde;

2.862mt. Yağmursuyu hattı imalatları yapılmıştır.
Toplam **1.852.402,28TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Bayraklı İlçesinde;

6.951,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, **1.914,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, imalatları yapılmıştır.
Toplam **3.555.820,51TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Bornova İlçesinde;

2.994,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, **63.516,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi, **5.513,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **452,-mt** uzunluğunda dere ıslahı, **3.288mt**. dere kenarına korkuluk, **1 adet** Tersip bendi onarımı, **1 adet** Su Sondaj kuyusu, **1 adet** İçmesuyu deposu, **1 adet** Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Temini ve Saç Kabin Yapılması, **1 adet** Arsenik giderimi için paket arıtma sistemi ekipmanı temini ve montajı, **2 adet** İçmesuyu terfi merkezi elektrik temini , **1 adet** Kocapınar Kaptajı ve Çatalpınar Kaptaj Odaları Tadilatı imalatları yapılmıştır.
Toplam **5.088.897,77TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Buca İlçesinde;

1.676,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, **982,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **305mt**. dere ıslahı, **13mt**. dere kenarına korkuluk, **1 adet** İçmesuyu Kuyusuna elektrik Temin Edilmesi, **1 adet** Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Temini ve Saç Kabin Yapılması, **1 adet** Yağmursuyu terfi merkezi alçak gerilim özel anahtar elektrik imalatları yapılmıştır.

Toplam **1.926.518,58TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Çiğli İlçesinde;

1.325,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, **462,-mt** uzunluğunda dere ıslahı, **1.980,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **917mt**. dere kenarına korkuluk imalatları yapılmıştır.
Toplam **12.097.844,63TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Gaziemir İlçesinde;

5.521,-mt uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **25mt.** dere ıslahı, **259mt**. tel örgü ,ve betonarme duvar imalatları yapılmıştır.
Toplam **929.593,84TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Güzelbahçe İlçesinde;

8.980,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, **797,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **195mt**.dere ıslahı, imalatları yapılmıştır.
Toplam **788.448,62TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Karabağlar İlçesinde;

9.171,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi **, 1.393,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve **1 adet** Su Sondaj kuyusu imalatları yapılmıştır.
Toplam **1.621.971,67TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Karşıyaka İlçesinde;

1.710,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, **535,-mt** dere kenarına korkuluk imalatı, **3.282,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **1 adet** tersip bendi, **1 adet** Pompa İstasyonu, **1 adet** Yağmursuyu terfi merkezi, **1 adet** pompa istasyonu güç yükseltilmesi, **1 adet** idari bina ve Atölye binası imalatları yapılmıştır.
Toplam **2.111.321,20TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Konak İlçesinde;

1.299,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, **405,-mt** uzunluğunda dere ıslahı, **324,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **2.836,-mt** dere kenarlarına korkuluk imalatı ve **1 adet** atıksu terfi merkezine elektrik temini imalatları yapılmıştır.
Toplam **920.798,16TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Narlıdere İlçesinde;

102,-mt uzunluğunda yağmursuyu hattı, **3.589,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **1 adet** tersip bendi onarımı, ve **1 adet** atıksu terfi merkezine elektrik temini imalatları yapılmıştır.
Toplam **2.089.736,60TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Aliağa İlçesinde;

21.749,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik, **1 adet** su sondaj kuyusuna motopomp temini ve montajı, **1 adet** içmesuyu depo onarımı, **1 adet** su sondaj kuyusu imalatları yapılmıştır.

Toplam **1.339.362,42TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Bayındır İlçesinde;

21.799,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi**, 1 adet** içmesuyu depo onarımı, **1 adet** içmesuyu kuyusuna elektrik temini, **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik, **4 adet** su sondaj kuyusu**, 3 adet** su sondaj kuyusuna motopomp temini ve montajı imalatları yapılmıştır. Toplam **923.645,05TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Foça İlçesinde;

16.550,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi**, 4.892,-mt** uzunluğunda dere ıslahı, **474mt**. dere kenarlarına korkuluk, **1 adet** tersip bendi, **1 adet** içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatları yapılmıştır.
Toplam **2.181.200,22TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Kemalpaşa İlçesinde;

69.487,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, **4.645,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi,**1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini, **1 adet** içmesuyu kuyusuna elektrik temini, **1 adet** su sondaj kuyusu, **1 adet** atıksu terfi istasyonuna elektrik temini **4 adet** içmesuyu depo onarımı imalatları yapılmıştır.
Toplam **3.515.113,98TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Menderes İlçesinde;

121.467,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, **188,-mt** uzunluğunda dere ıslahı, **203,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **4.740mt.** tel çit imalatı ve **6 adet** giriş kapısı **,1 adet** Atıksu Arıtma Tesisi ve tesise enerji temini , **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini, **1 adet** güvenlik kulübeleri elektrik temni, **1 adet** içmesuyu kuyusuna elektrik temini, **4 adet** su sondaj kuyusu, **1 adet** içmesuyu depo onarımı, **1 adet** Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Alanı Enerji Nakil Hattı Tadilatı ve 20.3/35kV 1X240/25mm² XLPE kablo=3000m mal alımı imalatları yapılmıştır.
Toplam **16.372.871,05TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Menemen İlçesinde;

77.671,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, **11.294,-mt** uzunluğunda dere ıslahı, **10.902,-mt** dere kenarına korkuluk, **8.725 ton** İstifsiz taş dolgu, **2.591,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **2 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini, **1 adet** su sondaj kuyusu, **1 adet** içmesuyu depo onarımı, **1 adet** Arsenik giderimi için paket arıtma sistemi ekipmanı temini ve montajı, **2 adet** tersip bendi imalatları yapılmıştır.
Toplam **13.157.242.38TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Seferihisar İlçesinde;

1 adet Atıksu Arıtma Tesisi, **190,-mt** uzunluğunda dere ıslahı, **3.356,-mt** dere kenarına korkuluk, **18.737,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **1 adet** su sondaj kuyusu imalatları yapılmıştır.
1 adet Atıksu Arıtma tesine enerji temini imalatı devam etmektedir.
Toplam **14.503.488,83TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Selçuk İlçesinde;

4.831,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi , **2 adet** su sondaj kuyusu imalatı yapılmıştır.
Toplam **280.279,26TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Torbalı İlçesinde;

46.407,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, **79.253,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, **1 adet** içmesuyu kuyusuna elektrik temini, **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini, **2 adet** su sondaj kuyusu, **1 adet** içmesuyu depo onarımı, **4 adet** su sondaj kuyusuna motopomp temini ve montajı imalatları yapılmıştır.
Toplam **10.684.842,04TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Urla İlçesinde;

261.416,-mt uzunluğunda içmesuyu şebekesi, **50,-mt** uzunluğunda dere ıslahı, imalatları yapılmıştır. Toplam **15.466.546,93TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 yılında Muhtelif İlçelerde Ortak Yürütülen işlerde;

Muhtelif içmesuyu hat revizyonu ve boru alımı işi kapsamında, **515.675,-mt** uzunluğunda muhtelif çaplarda içmesuyu borusu alımı yapılmış, kesin hesaptan gelen işler, içmesuyu, kanalizasyon imalatlarında dökülen asfalt bedellerini kapsayan yatırımlar gerçekleşmiştir.
Toplam **82.796.266,63TL** harcanmıştır. (Uygulama Yılı Birim Fiyatları İle)

2012 YILINDA METROPOL İLÇELERDE YAPILAN İMALATLARA AİT ÖDEMELER (TL)

İLÇE	ÖDENEN MİKTAR
BALÇOVA	1.852.402,28
BAYRAKLI	3.555.820,51
BORNOVA	5.088.897,77
BUCA	1.926.518,58
ÇİĞLİ	12.097.844,63
GAZİEMİR	929.593,84
GÜZELBAHÇE	788.448,62
KARŞIYAKA	2.111.321,20
KONAK	920.798,16
KARABAĞLAR	1.621.971,67
NARLIDERE	2.089.736,60
MUHTELİF İŞLER VE İLÇELERDE YAPILAN ORTAK İŞLER	82.796.266,63
ALİAĞA	1.339.362,42
BAYINDIR	923.645,05
FOÇA	2.181.200,22
KEMALPAŞA	3.515.113,98
MENDERES	16.372.871,05
MENEMEN	13.157.242,38
SEFERİHİSAR	14.503.488,83
SELÇUK	280.279,26
TORBALI	10.684.842,04
URLA	15.466.546,93
TOPLAM (TL)	194.204.212,65

NOT: 2012 Yılı Birim Fiyatlarıdır.

2012 YILINDA METROPOL İLÇELERDE YAPILAN İMALAT TABLOSU

İLÇE	HİZMET BİNALARI (Adet)	ARSENİK ARITIM ÜNİTESİ (Adet)	SONDAJ KUYULARI (Adet)	SONDAJ KUYUSUNA MOTOPOMP TEMİNİ ve SAÇ KABİN YAPILMASI (Adet)	DEPO (Adet)	İÇMESUYU ŞEBEKE (mt)	YAĞMURSUYU (mt)	DERE ISLAHI (mt)	KANALİZASYON ŞEBEKE (mt)	ENERJİ TEMİNİ (Adet)	DİĞER
BALÇOVA							2.862				
BAYRAKLI							6.951		1.914		
BORNOVA	*1 adet kocapınar kaptajı ve çatalpınar kaptaj kaptaj odaları tadilatı	1	1	1	1	63,516	2.994	452mt/ 3.288mt. Korkuluk 1 adet tersip bendi onarımı	5.513	*2 adet içmesuyu terfi merkezine	
BUCA				1			1.676	305mt/ 13mt. korkuluk	982	*1 adet içmesuyu kuyusuna *1 adet Yağmursuyu terfi merkezi alçak gerilim özel anahtar elektrik	
ÇİĞLİ							1.325	462mt/ 917mt korkuluk	1.980		
GAZİEMİR	*259mt.tel örgü ve betonarme duvar							25	5.521		
GÜZELBAHÇE						8.980		195	797		
KARŞIYAKA	*1 adet idari bina *1 adet atölye binası						1.710	535mt korkuluk 1 adet tersip bendi	3.282	*1 adet pompa istasyonu güç yükseltilmesi	*1 adet pompa istasyonu *1 adet Yağmursuyu terfi merkezi
KONAK							1.299	405mt/ 2.836mt. korkuluk	324	*1 adet atıksu terfi merkezine	
KARABAĞLAR	*67mt. koruma çiti		1			9.171			1,393		
NARLIDERE							102	1 adet tersip bendi onarımı	3.589	*1 adet atıksu terfi merkezine	

2012 YILINDA METROPOL İLÇELERDE YAPILAN İMALAT TABLOSU

İLÇE	HİZMET BİNALARI (Adet)	ARSENİK ARITIM ÜNİTESİ (Adet)	SONDAJ KUYULARI (Adet)	SONDAJ KUYUSUNA MOTOPOMP TEMİNİ ve SAÇ KABİN YAP.(Adet)	DEPO (Adet)	İÇMESUYU ŞEBEKE (mt)	YAĞMURSUYU (mt)	DERE ISLAHI (mt)	KANALİZASYON ŞEBEKE (mt)	ATIKSU ARITMA TESİSİ	DİĞER	ENERJİ TEMİNİ (Adet)
ALİAĞA				1	*1 adet içmesuyu depo onarımı	21.749						*1 adet içmesuyu terfi merkezine
BAYINDIR			4	3	*1 adet içmesuyu depo onarımı	21.799						*1 adet içmesuyu terfi merkezine *1 adet içmesuyu kuyusuna
FOÇA						16.550		4.892mt/ 474mt. Korkuluk 1 adet tersip bendi				*1 adet içmesuyu kuyusuna
KEMALPAŞA			1		*4 adet içmesuyu depo onarımı	69.487			4.645			*1 adet içmesuyu kuyusuna *1 adet içmesuyu terfi merkezine *1 adet atıksu terfi merkezine
MENDERES	*4.740mt.tel çit imalatı ve 6 adet giriş kapısı		4		*1 adet içmesuyu depo onarımı	121.467		188	203	1		* 1 adet atıksu arıtma tesisine *1 adet içmesuyu terfi merkezine *1 adet içmesuyu kuyusuna *1 adet güvenlik kulubelerine *1 adet atıksu arıtma tesisi enerji nakil hattı tadilatı ve kablo alımı
MENEMEN		1	1		*1 adet içmesuyu depo onarımı	77.671		11.294mt/ 10.902mt. Korkuluk 2 adet tersip bendi	2.591mt/ 8.725 ton istifsiz taş dolgu			*2 adet içmesuyu terfi merkezine
SEFERİHİSAR			1					190mt/ 3.356mt. Korkuluk	18.737	1		
SELÇUK			2			4.831						
TORBALI			2	4	*1 adet içmesuyu depo onarımı	46.407			79.253			*1 adet içmesuyu kuyusuna *1 adet içmesuyu terfi merkezine
URLA						261.416		50				

2012 YILINDA METROPOL İLÇELERDE YAPILAN İMALATLARA AİT ÖDEMELER (TL)

İLÇE	HİZMET BİNASI	İÇMESUYU SONDAJ KUYULARI AÇILMASI, MOTOPOMP ve ENERJİ TEMİN EDİLMESİ	DERE ISLAHLARI	DEPO	HAT REVİZYONU VE BORU ALIMI	ATIKSU TOPLAMA VE BERTARAF SİSTEMLERİ	İÇMESUYU ŞEBEKE VE İSALE HATTI	YAĞMURSUYU TOPLAMA SİSTEMLERİ	ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE DERİN DENİZ DEŞARJLARI	ÇİĞLİ ÇAMUR ÇÜRÜTME VE KURUTMA TESİSİ
BALÇOVA								1,852,402.28		
BAYRAKLI						477,875.44		3,077,945.07		
BORNOVA	70,389.99	66,763.38	631,770.48			912,455.37	2,165,023.77	1,242,494.78		
BUCA		297,309.85	168,543.07			171,925.72		1,288,739.94		
ÇİĞLİ			421,273.70			378,206.06	199,843.58	602,899.64		10,495,621.65
GAZİEMİR	59,948.01		26,481.04			843,164.79				
GÜZELBAHÇE			379,605.21			129,874.00	278,969.41			
KARŞIYAKA	271,087.21	82,725.13	211,918.74			374,283.61	427,160.00	744,146.51		
KONAK		66,345.50	163,399.50			150,903.18	40,606.95	499,543.03		
KARABAĞLAR	89,151.98	28,035.11				859,359.63	645,424.95			
NARLIDERE	108,831.44	66,345.50	190,109.44			1,642,789.74		81,660.48		
MUHTELİF İŞLER VE İLÇELERDE YAPILAN ORTAK İŞLER		894.10	232,597.50		73,169,328.99	3,454,394.05	3,583,964.29	2,340,712.90	14,374.80	
ALİAĞA		22,642.85	131,910.28				1,184,809.29			
BAYINDIR		152,970.54				24,687.63	745,986.88			
FOÇA		6,765.33	1,652,817.11				490,217.98		31,399.80	
KEMALPAŞA		129,357.46				614,185.35	2,771,571.17			
MENDERES	281,514.19	246,387.89	96,227.69			189,313.49	5,362,328.04		10,197,099.75	
MENEMEN	70,389.99	40,051.47	5,917,981.16			901,357.27	6,227,462.49			
SEFERİHİSAR		20,411.64	264,245.12			2,058,694.00	21,336.87		12,138,801.20	
SELÇUK		56,070.22					224,209.04			
TORBALI		114,649.13				7,927,268.65	2,642,924.26			
URLA			52,962.08			479,367.29	14,900,465.06	32,489.07	1,263.43	
TOPLAM (TL)	951,312.81	1,397,725.10	10,541,842.12	0.00	73,169,328.99	21,590,105.27	41,912,304.03	11,763,033.70	22,382,938.98	10,495,621.65

NOT: 2012 Yılı Birim Fiyatlarıdır.

SU İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan tüm içmesuyu şebeke, baraj inşaatları, pompa istasyonları, depolar, içmesuyu terfi ve isale hatları, içmesuyu temin amaçlı sondaj kuyuları, enerji teminleri imalatlarını yaptırıp denetlemek, bunlara ilave olarak su inşaat yatırım programlarının uygulanmasını denetleyerek gerektiği durumlarda program revizyonlarının planlanması ve koordinasyonunu sağlamak görevleriyle yükümlüdür.

İÇMESUYU ŞEBEKE VE İSALE HATTI

BALÇOVA İLÇESİ

Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi 17.10.2011 tarihinde 1.982.493,57TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.01.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

BAYRAKLI İLÇESİ

Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi 17.10.2011 tarihinde 1.982.493,57TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.01.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

BORNOVA İLÇESİ

Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi 17.10.2011 tarihinde 1.982.493,57TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.01.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **3.484,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi

Menderes İlçesi Şaşal, Efemçukuru, Küner, Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi 15.11.2011 tarihinde 2.686.794,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.01.2012 tarihinde başlayan ve 26.02.2013 tarihinde biten iş kapsamında **8.076,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Bornova İlçesi Yaka, Çiçekli, Kayadibi, Karaçam, Sarnıç ve Kavaklıdere Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi 18.05.2011 tarihinde 1.799.888,80TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 26.08.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.09.2011 tarihinde başlayan ve 20.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **51.142,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı ve **1 adet** içmesuyu deposu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Bozyaka T-20-H.Edip Adıvar Cad.Arası ve Bornova 1594/1 Sokak ile 252 Sokak Arası İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi 398.584,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 02.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 09.12.2011 tarihinde başlayan ve 07.03.2012 tarihinde biten iş kapsamında **814,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar tamamlanmıştır.

BUCA İLÇESİ

Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi 17.10.2011 tarihinde 1.982.493,57TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.01.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

ÇİĞLİ İLÇESİ

Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi 17.10.2011 tarihinde 1.982.493,57TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.01.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

GÜZELBAHÇE İLÇESİ

Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi 17.10.2011 tarihinde 1.982.493,57TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.01.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Menderes İlçesi Şaşal, Efemçukuru, Küner, Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi 15.11.2011 tarihinde 2.686.794,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.01.2012 tarihinde başlayan ve 27.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **8.076,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Köyü Gönen ve Evren Konutları İçmesuyu İnşaatı 30.05.2012 tarihinde 47.686,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.08.2012 tarihinde başlayan ve 22.10.2012 tarihinde biten iş kapsamında **904,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Köyü Gönen ve Evren Konutları İçmesuyu İnşaatı

GAZİEMİR İLÇESİ

Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi 17.10.2011 tarihinde 1.982.493,57TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.01.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

KARABAĞLAR İLÇESİ

Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi 17.10.2011 tarihinde 1.982.493,57TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.01.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Bozyaka T-20-H.Edip Adıvar Cad.Arası ve Bornova 1594/1 Sokak ile 252 Sokak Arası İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi 27.07.2011 tarihinde 398.584,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 02.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 09.12.2011 tarihinde başlayan ve 23.03.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.095,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar tamamlanmıştır.

Menderes İlçesi Şaşal, Efemçukuru, Küner, Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi 15.11.2011 tarihinde 2.686.794,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.01.2012 tarihinde başlayan ve 27.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **8.076,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

KARŞIYAKA İLÇESİ

Karşıyaka Onur-1 Mah.Pompa İstasyonu İnşaatı İşi 06.04.2012 tarihinde 362.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 30.05.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 08.06.2012 tarihinde başlayan ve 03.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında Karşıyaka İlçesinde **1 adet** pompa istasyonu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Karşıyaka Onur-1 Mah.Pompa İstasyonu İnşaatı İşi

KONAK İLÇESİ

Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi 17.10.2011 tarihinde 1.982.493,57TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.01.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

NARLIDERE İLÇESİ

Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi 17.10.2011 tarihinde 1.982.493,57TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.01.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

ALİAĞA İLÇESİ

Çaltılıdere Köyü (Aliağa İlçesi) Foçaköy Evleri (Bağarası Foça İlçesi) İçmesuyu İnşaatı 25.04.2012 tarihinde 1.187.795,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 17.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 27.08.2012 tarihinde başlayan ve 22.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Aliağa İlçesi İçmesuyu İnşaatı 20.01.2012 tarihinde 6.793.161.80,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 28.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 06.07.2012 tarihinde başlayan ve 13.09.2014 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **4.942,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.



Aliağa İlçesi İçmesuyu İnşaatı

Çıtak, Güzelhisar ve Karakuzu Köyleri (Aliağa İlçesi) - Kozbeyli ve Çakmaklı Köyleri (Foça İlçesi) - Emirâlem Beldesi ve Süleymanlı Köyü (Menemen İlçesi) - Barbaros Köyü (Urla İlçesi) İçmesuyu İnşaatı İşi 23.12.2011 tarihinde 2.440.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 21.02.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 02.03.2012 tarihinde başlayan ve 05.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **16.807,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi ve **1 adet** içmesuyu deposu tamir edilmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

BAYINDIR İLÇESİ

Bayındır İlçesi Çiftçigediği ve Çınardibi Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi 09.03.2012 tarihinde 849.459,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 20.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.06.2012 tarihinde başlayan ve 24.12.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **12.514,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.

Bayındır İlçesi Hasköy Mahallesi ve Elifli Köyü ile Torbalı İlçesi Aslanlar ve Taşkesik Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi 02.11.2011 tarihinde 1.148.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 08.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.03.2012 tarihinde başlayan ve 27.11.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **8.219,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi ve **1 adet** içmesuyu deposu tamir edilmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

Bayındır İlçesi Havuzbaşı Köyü ile Torbalı İlçesi Demirci Köyü İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı İşi 14.02.2012 tarihinde 91.200,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 03.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 11.04.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.066,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

FOÇA İLÇESİ

Çıtak, Güzelhisar ve Karakuzu Köyleri (Aliağa İlçesi) – Kozbeyli ve Çakmaklı Köyleri (Foça İlçesi) - Emiralem Beldesi ve Süleymanlı Köyü (Menemen İlçesi) - Barbaros Köyü (Urla İlçesi) İçmesuyu İnşaatı İşi 23.12.2011 tarihinde 2.440.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 21.02.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 02.03.2012 tarihinde başlayan ve 05.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **12.606,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Çaltılıdere Köyü (Aliağa İlçesi) Foçaköy Evleri (Bağarası Foça İlçesi) İçmesuyu İnşaatı 25.04.2012 tarihinde 1.187.795,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 17.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 27.08.2012 tarihinde başlayan ve 22.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **3.944,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.



Çaltılıdere Köyü (Aliağa İlçesi) Foçaköy Evleri (Bağarası Foça İlçesi) İçmesuyu İnşaatı

KEMALPAŞA İLÇESİ

Kemalpaşa İlçesi Örnekköy Mahallesi ve Yukarı Kızılca Beldesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları İnşaatı İşi 09.12.2009 tarihinde 2.111.908,98TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 19.07.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 27.07.2012 tarihinde başlayana ve 01.05.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.





,

Kemalpaşa İlçesi Örnekköy Mahallesi ve Yukarı Kızılca Beldesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları İnşaatı İşi

Kemalpaşa Nif Dağı Kaynakları İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi 22.12.2011 tarihinde 1.097.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 16.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.04.2012 tarihinde başlayan ve 13.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **20.567,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Kemalpaşa Nif Dağı Kaynakları İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi

Kemalpaşa İlçesi Sarılar, Vişneli, Akalan ve Yeşilyurt Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi 18.03.2011 tarihinde 1.377.075,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 12.05.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.05.2011 tarihinde başlayan ve 20.06.2012 tarihinde biten iş kapsamında **45.886,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi ve **4 adet** içmesuyu deposu tamir edilmesi imalatı gerçekleşmiştir.

Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi (Sazaklar Membaları ile 500m³ DM2 Arası) 14.10.2011 tarihinde 226.358,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 09.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.12.2011 tarihinde başlayan ve 21.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **3.034,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi (Sazaklar Membaları ile 500m³ DM2 Arası)

MENDERES İLÇESİ

Menderes İlçesi Değirmendere Beldesi ve Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi 22.02.2011 tarihinde 1.070.187,50,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,22.07.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 29.07.2011 tarihinde başlayan ve 23.02.2012 tarihinde biten iş kapsamında **40,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiştir.

İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Beldesi İçmesuyu Şebeke (Sayaç 1-2) ve İletim Hattı İnşaatı İşi 25.02.2011 tarihinde 2.996.023,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 21.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.04.2011 tarihinde başlayan ve 23.12.2011 tarihinde biten iş kapsamında **18.777,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Menderes İlçesi Özdere Beldesi İçmesuyu Şebeke (Sayaç 3-4-5-6) Ana Dağıtım Hatları Yapımı İnşaatı İşi 16.09.2011 tarihinde 1.965.879,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiştir. 25.11.2011 tarihinde başlayan ve 01.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **41.919,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Menderes İlçesi Özdere Beldesi İçmesuyu Şebeke (Sayaç 3-4-5-6) Ana Dağıtım Hatları Yapımı İnşaatı İşi

Menderes İlçesi Değirmendere Beldesi ve Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi 22.02.2011 tarihinde 1.088.185,62,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiştir. 26.03.2012 tarihinde başlayan ve 13.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **20.349,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı ve **1 adet** içmesuyu deposu tamir edilmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Menderes İlçesi Değirmendere Beldesi ve Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi

Menderes İlçesi Şaşal, Efemçukuru, Küner, Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi 15.11.2011 tarihinde 2.686.794,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.01.2012 tarihinde başlayan ve 27.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **40.382,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Menderes İlçesi Şaşal, Efemçukuru, Küner, Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi

MENEMEN İLÇESİ

Çıtak, Güzelhisar ve Karakuzu Köyleri (Aliağa İlçesi) - Kozbeyli ve Çakmaklı Köyleri (Foça İlçesi) - Emiralem Beldesi ve Süleymanlı Köyü (Menemen İlçesi) - Barbaros Köyü (Urla İlçesi) İçmesuyu İnşaatı İşi 23.12.2011 tarihinde 2.440.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 21.02.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 02.03.2012 tarihinde başlayan ve 05.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **6.303,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi ve **1 adet** içmesuyu deposu tamir edilmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Menemen İlçesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi 16.08.2010 tarihinde 9.485.661,76TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 25.03.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.04.2011 tarihinde başlayan ve 21.09.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **40.337,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Menemen İlçesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi

Menemen İlçesi Asarlık Beldesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları İnşaatı İşi 10.03.2011 tarihinde 2.524.877,85-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 13.05.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.05.2011 tarihinde başlayan ve 23.06.2012 tarihinde biten iş kapsamında **25.641,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.





Menemen İlçesi Asarlık Beldesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları İnşaatı İşi

Menemen İlçesi Maltepe İçmesuyu Şebeke ve Seyrek-Villakent İletim Hattı Yapım İşi 17.02.2012 tarihinde 690.260,98,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 19.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.04.2012 tarihinde başlayan ve 25.11.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **5.390,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Menemen İlçesi Maltepe İçmesuyu Şebeke ve Seyrek-Villakent İletim Hattı Yapım İşi

SELÇUK İLÇESİ

Selçuk İlçesi Pamucak Turizm Alanı İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi 03.06.2011 tarihinde 210.172,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 22.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.11.2011 tarihinde başlayan ve 03.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **4.831,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

TORBALI İLÇESİ

Menderes İlçesi Şaşal, Efemçukuru, Küner, Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi 15.11.2011 tarihinde 2.686.794,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.01.2012 tarihinde başlayan ve 27.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **16.152,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Bayındır İlçesi Hasköy Mahallesi ve Elifli Köyü ile Torbalı İlçesi Aslanlar ve Taşkesik Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi 02.11.2011 tarihinde 1.148.000,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup,08.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.03.2012 tarihinde başlayan ve 27.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında **8.218,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi ve **1 adet** içmesuyu deposu tamir

edilmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

İzmir İli Torbalı İlçesi Yazıbaşı Beldesi ve Kuşçuburun Mahallesi İçmesuyu Şebeke İkmal İnşaatı İşi 23.02.2011 tarihinde 933.225,90TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 25.04.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 04.05.2011 tarihinde başlayan ve 26.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **10.652,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Bayındır İlçesi Havuzbaşı Köyü ile Torbalı İlçesi Demirci Köyü İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı İşi 14.02.2012 tarihinde 91.200,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 03.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 11.04.2012 tarihinde başlayan ve 09.06.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.248,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve İmalatlar tamamlanmıştır.

Torbalı İlçesi Subaşı, Kırbaş, Naime ve Tulum Mahalleleri İçmesuyu İletim ve Şebeke Hattı İnşaatı İşi 11.03.2011 tarihinde 2.313.995,93,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 04.05.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 13.05.2011 tarihinde başlayan ve 06.02.2012 tarihinde biten iş kapsamında **10.137,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen İmalatlar tamamlanmıştır.

URLA İLÇESİ

Urla Zeytinalanı, İçmeler, Torasan Mahalleleri İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi 28.02.2011 tarihinde 13.241.632,47,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.06.2011 tarihinde başlayan ve 24.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **137.164,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve İmalatlar devam etmektedir.



Urla Zeytinalanı, İçmeler, Torasan Mahalleleri İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi

Urla Merkez, Çeşmealtı ve İskele Mahalleleri İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi 28.02.2011 tarihinde 13.241.632,47TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 26.06.2011 tarihinde başlayan ve 14.05.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **114.950,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve İmalatlar devam etmektedir.





Urla Merkez, Çeşmealtı ve İskele Mahalleleri İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi

Urla İlçesi 2.Kısım İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi 409.008,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 13.05.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.07.2011 tarihinde başlayan ve 22.02.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **2.999,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Urla İlçesi 2.Kısım İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi

Çıtak, Güzelhisar ve Karakuzu Köyleri (Aliağa İlçesi) - Kozbeyli ve Çakmaklı Köyleri (Foça İlçesi) - Emiralem Beldesi ve Süleymanlı Köyü (Menemen İlçesi) - Barbaros Köyü (Urla İlçesi) İçmesuyu İnşaatı İşi 23.12.2011 tarihinde 2.440.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 21.02.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 02.03.2012 tarihinde başlayan ve 05.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **6.303,-mt** uzunluğunda içmesuyu şebekesi döşenmesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

MUHTELİF İÇMESUYU HAT REVİZYONU VE BORU ALIMI

Yönetim Kurulunun 06.12.2011 tarih ve M.35.0.İBB.5.01.11.04/8 no'lu kararıyla **Samsun Makine San. A.Ş.** firmasına **57.687.481,00 USD** toplam bedelle ihalesi yapılan **"Muhtelif Çap ve miktarlarda Düktil Font Boru ve Ara Parçalarının Alımı"** işinde, 10.03.2011 tarihinde İdaremiz ile yüklenici firma arasında karşılıklı olarak sözleşmesi imzalanmıştır.

03.09.2010 tarih ve 1660 sayılı İhale Onay Belgesi ile İdaremizce talep edilen "**Muhtelif**



Çap ve Miktarlardaki Düktil Font Boru ve Ara Parçaları Alımı" işinde, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Esasları ve Teknik Şartnamede yazılı hususlar çerçevesinde 2012 yılında 5.- 6. -7.- 8. ve 9. Parti, Parti muayene ve kabul işlemi tamamlanmış olup, yapılan bu kabuller çerçevesinde **515.674,5,-** metre uzunluğunda Düktil boru ve **7.283** adet ara parçaları İdaremizce teslim alınarak İhaleli işler için idare Malı kullanılmak üzere ambarlarda stoklanmıştır.

Toplam **928.737,50** metre uzunluğunda içmesuyu ve **13.227** adet ara parçaları bu iş kapsamında temin edilmiştir.



Ömrünü tamamlayan eskimiş olan mevcut içmesuyu borularının daha sağlıklı, kalite standardı yüksek ve uzun ömürlü olan Düktil



Font içme suyu boruları ile yenilenerek İdaremizce satın alınmasıyla birlikte arızaların ve su kaçakların azaltılması hedeflenmiştir. Diğer taraftan İhaleye çıkıldığında boru temininin İdaremizce önceden sağlanması sayesinde yapım ihalesinin gerçekleşmesine müteakip işlere kısa sürede başlanması sağlanacaktır.

SU KUYUSU ARAŞTIRMA, SONDAJ KUYUSU AÇMA ve ENERJİ TEMİNİ

BORNOVA İLÇESİ

Bornova Eğridere Köyü, Menemen Uğur Mumcu Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Foça Kozbeyli Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi 34.500,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 30.11.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 09.12.2010 tarihinde başlayan ve 07.01.2011 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** İçmesuyu terfi Merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1 ile Yakapınar Köyü Y2, Kızılcaova Köyü K2 ile Bornova Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi 19.09.2012 tarihinde 170.710,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.12.2011 tarihinde başlayan ve 11.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Bornova İlçesi Yaka Köyü Yeni Kuyusuna Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini ve Montajı İşi 86.900,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 30.05.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.05.2012 tarihinde başlayan ve 29.07.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini ve Montajı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Bornova İlçesi Yaka Köyü Yeni Kuyusuna Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini ve Montajı İşi

Torbalı Yazıbaşı Mahallesi, Aliağa Karaköy Köyü, Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyuları ve Kemalpaşa Gökkaya Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Enerji Temini 26.07.2012 tarihinde 23.820,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 27.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.09.2012 tarihinde başlayan ve 03.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

BUCA İLÇESİ

İzmir İli Buca İlçesi İnkilap Mahallesi Yağmursuyu Terfi Merkezi Alçak Gerilim Özel Anahtar Elektrik İşi 24.02.2012 tarihinde 133.300,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 20.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 27.04.2012 tarihinde başlayan ve 31.08.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Yağmursuyu Terfi Merkezi Alçak Gerilim Özel Anahtar Elektrik İşi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Karaköy-Belenbaşı-Dağkızılca-Aşık Veysel Kısımları Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması 53.650,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 26.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.04.2012 tarihinde başlayan ve 02.05.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Buca İlçesi Belenbaşı Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini 03.10.2012 tarihinde 108.500,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 15.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.11.2012 tarihinde başlayan ve 05.01.2013 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.



Buca İlçesi Belenbaşı Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini

KARABAĞLAR İLÇESİ

İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi 19.01.2012 tarihinde 168.590,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 06.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 13.04.2012 tarihinde başlayan ve 10.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi

Karaköy-Belenbaşı-Dağkızılca-Aşık Veysel Kısımları Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması 53.650,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 26.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.04.2012 tarihinde başlayan ve 02.05.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

KARŞIYAKA İLÇESİ

Rüştü Şardağ Caddesi Yağmursuyu Terfi Merkezi,Elifli İçmesuyu Kuyusu ve Süleymanlı Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini 06.01.2012 tarihinde 13.350,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 20.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.01.2012 tarihinde başlayan ve 20.05.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Yağmursuyu terfi merkezi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

İzmir İli Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S8(Ömür) İçmesuyu Kuyusu Enerji Temini ve Karşıyaka İlçesi Cumhuriyet Pompa istasyonu Güç Yükseltilmesi İşi 25.08.2011 tarihinde 135.800,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 13.10.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.10.2011 tarihinde başlayan ve 01.03.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** İçmesuyu Pompa İstasyonu Güç Yükseltilmesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



İzmir İli Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S8(Ömür) İçmesuyu Kuyusu Enerji Temini ve Karşıyaka İlçesi Cumhuriyet Pompa istasyonu Güç Yükseltilmesi İşi

KONAK İLÇESİ

Arap Deresi ve Narlıdere Gürler Caddesi Terfi Merkezleri Elektrik Tesisatı Yapımı İşi 13.10.2011 tarihinde 112.450,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 09.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.12.2011 tarihinde başlayan ve 14.01.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** terfi merkezine elektrik tesisatı Yapımı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Arap Deresi ve Narlıdere Gürler Caddesi Terfi Merkezleri Elektrik Tesisatı Yapımı İşi

NARLIDERE İLÇESİ

Arap Deresi ve Narlıdere Gürler Caddesi Terfi Merkezleri Elektrik Tesisatı Yapımı İşi 13.10.2011 tarihinde 112.450,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 09.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.12.2011 tarihinde başlayan ve 14.01.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** terfi merkezine elektrik tesisatı Yapımı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

ALİAĞA İLÇESİ

Karaköy-Belenbaşı-Dağkızılca-Aşık Veysel Kısımları Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması 53.650,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 26.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.04.2012 tarihinde başlayan ve 02.05.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Torbalı Yazıbaşı Mahallesi, Aliağa Karaköy Köyü, Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyuları ve Kemalpaşa Gökkaya Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Enerji Temini 26.07.2012 tarihinde 23.820,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 27.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.09.2012 tarihinde başlayan ve 03.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

BAYINDIR İLÇESİ

Rüştü Şardağ Caddesi Yağmursuyu Terfi Merkezi,Elifli İçmesuyu Kuyusu ve Süleymanlı Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini 06.01.2012 tarihinde 13.350,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 20.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.01.2012 tarihinde başlayan ve 20.05.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** İçmesuyu Kuyusuna elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1 ile Yakapınar Köyü Y2, Kızılcaova Köyü K2 ile Bornova Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi 19.09.2011 tarihinde 170.710,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.12.2011 tarihinde başlayan ve 21.03.2012 tarihinde biten iş kapsamında **3 adet** su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1 ile Yakapınar Köyü Y2, Kızılcaova Köyü K2 ile Bornova Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi

Bayındır Hasköy Köyü, Menderes Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Torbalı Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi 05.06.2012 tarihinde 22.800,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 18.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 26.06.2012 tarihinde başlayan ve 24.08.2012 tarihinde biten iş kapsamında Bayındır İlçesinde **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Bayındır Hasköy Köyü, Menderes Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Torbalı Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi

İzmir İli Bayındır İlçesi Hisarlık Köyü H1, Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2, Menderes İlçesi Yeniköy Y2, Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1, Torbalı İlçesi Ayrancılar S1 ve S3, Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı 01.06.2012 tarihinde 243.840,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 22.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 31.08.2012 tarihinde başlayan ve 14.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **1 adet** su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.



İzmir İli Bayındır İlçesi Hisarlık Köyü H1, Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2, Menderes İlçesi Yeniköy Y2, Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1, Torbalı İlçesi Ayrancılar S1 ve S3, Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

Su Sondaj Kuyularına Motopomp ve Saç Kabin Temini 25.09.2012 tarihinde 63.990,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 09.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.11.2012 tarihinde başlayan ve 15.12.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Su Sondaj Kuyularına Motopomp ve Saç Kabin Temini

FOÇA İLÇESİ

Bornova Eğridere Köyü, Menemen Uğur Mumcu Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Foça Kozbeyli Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi 16.840,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 13.12.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.12.2010 tarihinde başlayan ve 11.01.2011 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Bornova Eğridere Köyü, Menemen Uğur Mumcu Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Foça Kozbeyli Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi

KEMALPAŞA İLÇESİ

Kemalpaşa İlçesi Sütçüler Mahallesi Atıksu Terfi Merkezi Elektrik Temini 28.10.2011 tarihinde 11.800,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 11.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 18.11.2011 tarihinde başlayan ve 17.12.2011 tarihinde biten iş kapsamında **1** adet atıksu terfi merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1 ile Yakapınar Köyü Y2, Kızılcaova Köyü K2 ile Bornova Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı İşi 19.09.2011 tarihinde 170.710,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.12.2011 tarihinde başlayan ve 21.03.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

İzmir İli Bayındır İlçesi Hisarlık Köyü H1, Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2, Menderes İlçesi Yeniköy Y2, Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1, Torbalı İlçesi Ayrancılar S1 ve S3, Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı 01.06.2012 tarihinde 243.840,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 22.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 31.08.2012 tarihinde başlayan ve 14.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **1 adet** su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.

İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Yakaköy Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi 67.200,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 15.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.03.2012 tarihinde başlayan ve 01.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Yakaköy Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi

Torbalı Yazıbaşı Mahallesi, Aliağa Karaköy Köyü, Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyuları ve Kemalpaşa Gökkaya Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Enerji Temini 26.07.2012 tarihinde 23.820,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 27.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.09.2012 tarihinde başlayan ve 03.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

MENDERES İLÇESİ

Bayındır Hasköy Köyü, Menderes Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Torbalı Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi 05.06.2012 tarihinde 22.800,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 18.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 26.06.2012 tarihinde başlayan ve 24.08.2012 tarihinde biten iş kapsamında Bayındır İlçesinde **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Bayındır Hasköy Köyü, Menderes Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Torbalı Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi

İzmir İli Bayındır İlçesi Hisarlık Köyü H1, Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2, Menderes İlçesi Yeniköy Y2, Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1, Torbalı İlçesi Ayrancılar S1 ve S3, Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı 01.06.2012 tarihinde 243.840,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 22.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 31.08.2012 tarihinde başlayan ve 14.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **1 adet** su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.

İzmir İli Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S8(Ömür) İçmesuyu Kuyusu Enerji Temini ve Karşıyaka İlçesi Cumhuriyet Pompa istasyonu Güç Yükseltilmesi İşi 25.08.2012 tarihinde 17.884,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 27.01.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 27.01.2011 tarihinde başlayan ve 25.02.2011 tarihinde biten iş kapsamında 1 adet içmesuyu kuyusuna elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.



İzmir İli Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S8(Ömür) İçmesuyu Kuyusu Enerji Temini ve Karşıyaka İlçesi Cumhuriyet Pompa istasyonu Güç Yükseltilmesi İşi

İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi 19.01.2012 tarihinde 168.590,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 06.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 13.04.2012 tarihinde başlayan ve 10.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **2 adet** Su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi

Menderes İlçesi Tahtalı Barajı Havzası 2,3 ve 4 nolu Güvenlik Kulübeleri Elektrik Temini 15.08.2012 tarihinde 39.750,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 02.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 09.11.2012 tarihinde başlayan ve 07.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **1 adet** güvenlik kulubelerine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.



Menderes İlçesi Tahtalı Barajı Havzası 2,3 ve 4 nolu Güvenlik Kulübeleri Elektrik Temini

MENEMEN İLÇESİ

Rüştü Şardağ Caddesi Yağmursuyu Terfi Merkezi,Elifli İçmesuyu Kuyusu ve Süleymanlı Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini 06.01.2012 tarihinde 13.350,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 20.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.01.2012 tarihinde başlayan ve 20.05.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** İçmesuyu terfi merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi 19.01.2012 tarihinde 168.590,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 06.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 13.04.2012 tarihinde başlayan ve 10.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi

Bornova Eğridere Köyü, Menemen Uğur Mumcu Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Foça Kozbeyli Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi 26.04.2011 tarihinde 159.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 13.07.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 20.07.2011 tarihinde başlayan ve 28.08.2011 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Menemen İlçesi Seyrek Su Deposu Elektrik Temini ve Ege-koop Villakent 1000m3 lük Depo Elektrik Temini İşi 5.450,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 02.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 10.01.2012 tarihinde başlayan ve 19.01.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Menemen İlçesi Seyrek Su Deposu Elektrik Temini ve Ege-koop Villakent 1000m3 lük Depo Elektrik Temini İşi

Menemen İlçesi Seyrek Köyü Deposu Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi 159.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 15.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.08.2012 tarihinde başlayan ve 28.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Menemen İlçesi Seyrek Köyü Deposu Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi

SEFERİHİSAR İLÇESİ

Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi S1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı 17.298,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 13.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.08.2012 tarihinde başlayan ve 20.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi S1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı

SELÇUK İLÇESİ

İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi 19.01.2012 tarihinde 168.590,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 06.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 13.04.2012 tarihinde başlayan ve 10.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **2 adet** Su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi

TORBALI İLÇESİ

İzmir İli Bayındır İlçesi Hisarlık Köyü H1, Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2, Menderes İlçesi Yeniköy Y2, Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1, Torbalı İlçesi Ayrancılar S1 ve S3, Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı 01.06.2012 tarihinde 243.840,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 22.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 31.08.2012 tarihinde başlayan ve 14.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında 2 **adet** su sondaj kuyusu imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.



İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi

Karaköy-Belenbaşı-Dağkızılca-Aşık Veysel Kısımları Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması 53.650,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 26.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.04.2012 tarihinde başlayan ve 02.05.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Bayındır Hasköy Köyü, Menderes Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Torbalı Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi 26.07.2012 tarihinde 23.820,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 27.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 26.06.2012 tarihinde başlayan ve 24.08.2012 tarihinde biten iş kapsamında Bayındır İlçesinde **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Bayındır Hasköy Köyü, Menderes Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Torbalı Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi

Su Sondaj Kuyularına Motopomp ve Saç Kabin Temini 25.09.2012 tarihinde 63.990,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 09.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.11.2012 tarihinde başlayan ve 15.12.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Su Sondaj Kuyularına Motopomp ve Saç Kabin Temini

Yazıbaşı Kısmı Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması 17.06.2011 tarihinde 103.800,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 10.10.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 18.10.2011 tarihinde başlayan ve 26.11.2011 tarihinde biten iş kapsamında Torbalı İlçesinde **1 adet** Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Torbalı Yazıbaşı Mahallesi, Aliağa Karaköy Köyü, Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyuları ve Kemalpaşa Gökkaya Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Enerji Temini 26.07.2012 tarihinde 23.820,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 27.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.09.2012 tarihinde başlayan ve 03.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** içmesuyu terfi merkezine elektrik temini imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

KANAL İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan tüm kanalizasyon yatırımları, dere ıslahları, yağmursuyu hatları, derin deniz deşarj imalatları ile kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına ait pompa istasyonları, enerji temini imalatlarını yaptırıp denetlemek, bunlara ilave olarak kanal inşaat yatırım programlarının uygulanmasını denetlemek ve gerektiği durumlarda program revizyonlarının planlanması ve koordinasyonunu sağlamak görevleriyle yükümlüdür.

ATIKSU TOPLAMA VE BERTARAF SİSTEMLERİ

BAYRAKLI İLÇESİ

Bayraklı Onur Mahallesi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon İnşaatı İşi 21.06.2012 tarihinde 441.481,84,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 29.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 06.09.2012 tarihinde başlayan ve 03.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **1.914,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.

BORNOVA İLÇESİ

Bornova Evka-3 Mah. Şeytan Deresi İçi Atıksu Kanalı Deplasmanı ile Ege Üniversitesi Kampüs İçi İtfaiye Grubu Atıksu Kanalı İnşaatı İşi 08.05.2012 tarihinde 333.141,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 18.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.06.2012 tarihinde başlayan ve 19.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.388,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar tamamlanmıştır.



Bornova Evka-3 Mah. Şeytan Deresi İçi Atıksu Kanalı Deplasmanı ile Ege Üniversitesi Kampüs İçi İtfaiye Grubu Atıksu Kanalı İnşaatı İşi

Altındağ Merkez Mah. 4499 Sokak Devamı Atıksu Kanalı İnşaatı İşi 09.03.2012 tarihinde 70.231,55,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 20.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 27.04.2012 tarihinde başlayan ve 25.06.2012 tarihinde biten iş kapsamında **518,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar tamamlanmıştır.

Bornova, Menemen Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Atıksu Kanalizasyon İnşaatı 18.06.2012 tarihinde 456.443,79,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 05.10.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 12.10.2012 tarihinde başlayan ve 26.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **2.154mt.** uzunluğunda kanalizasyon şebeke imalatı devam etmektedir.



Bornova, Menemen Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Atıksu Kanalizasyon İnşaatı

Bornova İlçesi Kavaklıdere-Yeşilçam-Gürpınar Mahalleleri Atıksu İnşaatı İşi 25.07.2011 tarihinde 641.872,20,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.11.2011 tarihinde başlayan ve 12.07.2012 tarihinde biten iş kapsamında **3.607,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

12.07.2012 tarihinde iş fesh edilmiş olup, eksik kalan atıksu imalatları idaremizce tamamlanacaktır.

BUCA İLÇESİ

Buca Atatürk ve Çamkule Mah. Muh. Sok. Atıksu İle Konak Vapur İskelesi Atıksu Hattı Bağlantı İnşaatı 07.05.2012 tarihinde 199.997,02TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 12.07.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 20.07.2012 tarihinde başlayan ve 16.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında **982,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

ÇİĞLİ İLÇESİ

Karşıyaka Mustafa Kemal Mah. Ve Çiğli Sasalı, Kaklıç Mah.Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Atıksu Şebeke İnşaatı 08.03.2012 tarihinde 427.466,28,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 30.05.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 07.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.614,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Karşıyaka Mustafa Kemal Mah. Ve Çiğli Sasalı, Kaklıç Mah.Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Atıksu Şebeke İnşaatı

Çiğli 2 Hava Jet Üssü Yolu Ø500 mm Atıksu Deplasmanı İnşaatı İşi 29.12.2011 tarihinde 165.000,00-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 30.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 06.04.2012 tarihinde başlayan ve 03.08.2012 tarihinde biten iş kapsamında **366,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

GAZİEMİR İLÇESİ

Gaziemir İlçesi Sarnıç Atıksu Şebeke İnşaatı 25.04.2012 tarihinde 1.196.779,64TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 27.08.2012 tarihinde başlayan ve 23.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **3.819,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Gaziemir İlçesi 9 Eylül Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı 13.10.2011 tarihinde 586.998,62TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 08.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.12.2011 tarihinde başlayan ve 20.06.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.702,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

GÜZELBAHÇE İLÇESİ

Narlıdere Sahilevleri Muhtelif Sokaklar ve Güzelbahçe Siteler 426 Sokak Atıksu Kanalizasyon İnşaatı İşi 11.04.2012 tarihinde 193.652,27TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 18.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.06.2012 tarihinde başlayan ve 22.10.2012 tarihinde biten iş kapsamında **161,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Narlıdere Sahilevleri Muhtelif Sokaklar ve Güzelbahçe Siteler 426 Sokak Atıksu Kanalizasyon İnşaatı İşi

Güzelbahçe İlçesi Kahramandere Mahallesi 753, 763, 747, 844 Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı İşi 17.02.2012 tarihinde 86.348,65TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 12.04.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 20.04.2012 tarihinde başlayan ve 18.06.2012 tarihinde biten iş kapsamında **636,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

KARABAĞLAR İLÇESİ

Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi Toplu Konut 1.Bölge Dolgu Alanları Stabilite İnşaatı İşi *16*.11.2011 tarihinde 728.251,38-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 22.02.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.03.2012 tarihinde başlayan ve 19.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.393,-mt** uzunluğunda yağmursuyu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

KARŞIYAKA İLÇESİ

Karşıyaka İlçesi İnönü ve Onur Mahalleleri Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı İşi 19.12.2011 tarihinde 174.281,58-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 09.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.03.2012 tarihinde başlayan ve 29.05.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.667,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Karşıyaka Mustafa Kemal Mah. Ve Çiğli Sasalı, Kaklıç Mah.Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Atıksu Şebeke İnşaatı 08.03.2012 tarihinde 427.466,28,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 30.05.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.07.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.09.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.615,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

KONAK İLÇESİ

Buca Atatürk ve Çamkule Mah. Muh. Sok. Atıksu İle Konak Vapur İskelesi Atıksu Hattı Bağlantı İnşaatı 07.05.2012 tarihinde 199.997,02TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 12.07.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 20.07.2012 tarihinde başlayan ve 16.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında Konak ilçesine yapılan imalat 324**,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi olup, imalat tamamlanmıştır.

NARLIDERE İLÇESİ

Narlıdere Sahilevleri Muhtelif Sokaklar ve Güzelbahçe Siteler 426 Sokak Atıksu Kanalizasyon İnşaatı İşi 11.04.2012 tarihinde 193.652,27TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 18.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.06.2012 tarihinde başlayan ve 22.10.2012 tarihinde biten iş kapsamında **929,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Narlıdere Sahilevleri Muhtelif Sokaklar ve Güzelbahçe Siteler 426 Sokak Atıksu Kanalizasyon İnşaatı İşi

Narlıdere İlçesi Gürler Caddesi ve Civarı Atıksu Şebeke İnşaatı İşi 15.04.2011 tarihinde 2.678.294,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 15.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.06.2011 tarihinde başlayan ve 06.03.2012 tarihinde biten iş kapsamında 2012 yılında **2.660,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve İmalatlar tamamlanmıştır.

KEMALPAŞA İLÇESİ

Kemalpaşa Yenmiş, Nazar, Çinili Köyleri ile Çınar Mahallesi Atıksu İnşaatı İşi 26.04.2011 tarihinde 612.612,63-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 15.09.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.09.2011 tarihinde başlayan ve 02.03.2012 tarihinde biten iş kapsamında **4.645,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve İmalat tamamlanmıştır.



Kemalpaşa Yenmiş, Nazar, Çinili Köyleri ile Çınar Mahallesi Atıksu İnşaatı İşi

MENEMEN İLÇESİ

Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi Kanalizasyon Deplasman İnşaatı İşi 09.09.2011 tarihinde 769.288,82-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 14.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.11.2011 tarihinde başlayan ve 24.06.2012 tarihinde biten iş kapsamında **2.591,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Menemen Alaniçi Köyü Kanalizasyon İnşaatı 24.09.2012 tarihinde 629.367,65-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 29.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 07.12.2012 tarihinde başlayan ve 05.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **4.246mt.** uzunluğunda kanalizasyon şebeke imalatı ve **2 adet** 1.000 Kişilik Fosseptik imalatları devam etmektedir.

Bornova, Menemen Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Atıksu Kanalizasyon İnşaatı 18.06.2012 tarihinde 456.443,79,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 05.10.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 12.10.2012 tarihinde başlayan ve 26.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **2.225mt.** uzunluğunda kanalizasyon şebeke imalatı devam etmektedir.

SEFERİHİSAR İLÇESİ

Ürkmez İlçesi Mersinalan Mahallesi 6048 Sokak ve Çevresine Ait Atıksu Şebeke İnşaatı İşi 09.05.2011 tarihinde 277.902,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.06.2011 tarihinde başlayan ve 11.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **438,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Ürkmez İlçesi Mersinalan Mahallesi 6048 Sokak ve Çevresine Ait Atıksu Şebeke İnşaatı İşi

Seferihisar İlçesi Muhtelif Sokaklarda Atıksu Şebekesi Yapılması İnşaatı İşi 30.03.2011 tarihinde 2.117.754,22-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 30.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.07.2011 tarihinde başlayan ve 23.10.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **18.299,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve İmalat tamamlamıştır.



Seferihisar İlçesi Muhtelif Sokaklarda Atıksu Şebekesi Yapılması İnşaatı İşi

TORBALI İLÇESİ

Torbalı Tepeköy Mahallesi Atıksu Kollektör İnşaatı İşi 14.02.2011 tarihinde 791.702,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 03.05.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 12.05.2011 tarihinde başlayan ve 05.01.2012 iş kapsamında **1.031,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Torbalı İlçesi Torbalı, Alpkent, Ertuğrul, Tepeköy ve Muratbey Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı İşi 14.03.2011 tarihinde 10.435.005,01-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 19.08.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.08.2011 tarihinde başlayan ve 04.06.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **68.840,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve İmalatlar devam etmektedir.





Torbalı İlçesi Pancar Beldesi ve Yeni Bulgurca Yerleşim Yerlerinin Atıksu Şebeke ve Kollektör Hatlarının Arıtma Tesisine Aktarılması ve Pompa İstasyonu İnşaatı İşi 17.05.2011 tarihinde 3.123.374,35-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 09.08.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 17.08.2011 tarihinde başlayan ve 07.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **9.382,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş olup, imalatlar devam etmektedir.

DERE ISLAHLARI

BALÇOVA İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

BORNOVA İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **452,-mt** uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi 22.04.2011 tarihinde 1.069.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.07.2011 tarihinde başlayan ve 27.12.2011 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** tersip bendi onarımı imalatı gerçekleşmiş ve İmalatlar tamamlanmıştır.

İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı 16.05.2012 tarihinde 696.154,96-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.08.2012 tarihinde başlayan ve 20.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **2.067,-mt** uzunluğunda dere kenarına korkuluk yapılması imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı

İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 1.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı 20.04.2012 tarihinde 278.154,34-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.07.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.08.2012 tarihinde başlayan ve 28.11.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **1.221,-mt** uzunluğunda dere kenarına korkuluk yapılması imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

BUCA İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **255,-mt** uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.

İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı 16.05.2012 tarihinde 696.154,96-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.08.2012 tarihinde başlayan ve 20.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **13,-mt** uzunluğunda dere kenarına korkuluk yapılması imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı

İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi 25.07.2011 tarihinde 599.419,06TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde başlayan ve 09.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **50,-mt** betonarme kutu menfez imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

ÇİĞLİ İLÇESİ

Çiğli Güzeltepe Mahallesi,Maltepe Deresi ve Yankolu (Peynircioğlu deresi) Islah ve Atıksu Kanalizasyonu İnşaatı 12.04.2012 tarihinde 925.812,00-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 11.09.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 19.09.2012 tarihinde başlayan ve 03.04.2013 tarihinde biten iş kapsamında **462,-mt** uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.

İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 1.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı 20.04.2012 tarihinde 278.154,34-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.07.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.08.2012 tarihinde başlayan ve 28.11.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **917,-mt** uzunluğunda dere kenarına korkuluk yapılması imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

GAZİEMİR İLÇESİ

İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi 25.07.2011 tarihinde 599.419,06TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde başlayan ve 09.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **25,-mt** betonarme kutu menfez imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

GÜZELBAHÇE İLÇESİ

İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi 25.07.2011 tarihinde 599.419,06TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde başlayan ve 09.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **195,-mt** betonarme kutu menfez imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

KARABAĞLAR İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Karabağlar İlçesi Uzundere Deresi Ana Kol ve Yan Kolları Yataklarının Düzenlenmesi ile Atıksu Kanal İnşaatı 29.06.2012 tarihinde 3.544.515,72,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 14.09.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.09.2012 tarihinde başlayan ve 17.07.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Karabağlar İlçesi Uzundere Deresi Ana Kol ve Yan Kolları Yataklarının Düzenlenmesi ile Atıksu Kanal İnşaatı

KARŞIYAKA İLÇESİ

İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı 16.05.2012 tarihinde 696.154,96-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.08.2012 tarihinde başlayan ve 20.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **131,-mt** uzunluğunda dere kenarına korkuluk yapılması imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı

Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi 22.04.2011 tarihinde 1.069.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.07.2011 tarihinde başlayan ve 27.12.2011 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** tersip bendi İmalatı tamamlanmıştır.



Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi

İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 1.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı 20.04.2012 tarihinde 278.154,34-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.07.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.08.2012 tarihinde başlayan ve 28.11.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **404,-mt** uzunluğunda dere kenarına korkuluk yapılması imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

KONAK İLÇESİ

Melez Deltası Taşkın Koruma Duvarı İnşaatı İşi 20.10.2011 tarihinde 33.900,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 01.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 09.12.2011 tarihinde başlayan ve 06.02.2012 tarihinde biten iş kapsamında **405,-mt** betonarme perde duvarı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı 16.05.2012 tarihinde 696.154,96-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.08.2012 tarihinde başlayan ve 20.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **2.836,-mt** uzunluğunda dere kenarına korkuluk yapılması imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı

NARLIDERE İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Urla ve Narlıdere İlçelerindeki Tabaklar ve İbrahimağa Derelerinin Islah İnşaatı 02.05.2012 tarihinde 3.842.177,75-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 28.09.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.10.2012 tarihinde başlayan ve 29.09.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi 22.04.2011 tarihinde 1.069.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.07.2011 tarihinde başlayan ve 27.12.2011 tarihinde biten iş kapsamında **1 adet** tersip bendi onarımı imalatı gerçekleşmiş ve İmalatlar tamamlanmıştır.

ALİAĞA İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

FOÇA İLÇESİ

İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi 25.07.2011 tarihinde 599.419,06TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde başlayan ve 09.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **50,-mt** betonarme kutu menfez imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

Yeni Foça İlçesi Dere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi 20.09.2011 tarihinde 2.815.000,07TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 23.12.2011 tarihinde başlayan ve 14.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **4.780,-mt** uzunluğunda dere ıslahı imalatı ve **474mt.** Korkuluk imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.





Yeni Foça İlçesi Dere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **62,-mt** uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleşmiş olup, öngörülen imalatlar devam etmektedir.

KEMALPAŞA İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

MENEMEN İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **255,-mt** uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleşmiş olup, öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Menemen İlçesi Asarlık Çayı ve Koyundere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi 20.04.2011 tarihinde 5.230.000,00TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.09.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.09.2011 tarihinde başlayan ve 01.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **10.964,-mt** uzunluğunda dere ıslahı imalatı ve **10.902mt**. Korkuluk imalatı gerçekleşmiş öngörülen imalatlar devam etmektedir.





Menemen İlçesi Asarlık Çayı ve Koyundere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi

Gediz Nehri Kıyısında Tahkimat Yapılması İşi 19.01.2012 tarihinde 194.000,00TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 09.05.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 17.05.2012 tarihinde başlayan ve 15.07.2012 tarihinde biten iş kapsamında **8.725,00,-ton** istifsiz taş dolgu imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi 25.07.2011 tarihinde 599.419,06TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde başlayan ve 09.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **75,-mt** betonarme kutu menfez imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

MENDERES İLÇESİ

İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi 25.07.2011 tarihinde 599.419,06TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde başlayan ve 09.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **25,-mt** betonarme kutu menfez imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **163,-mt** uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleşmiş olup, öngörülen imalatlar devam etmektedir.

SEFERİHİSAR İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **165,-mt** uzunluğunda dere ıslahı imalatı gerçekleşmiş olup, öngörülen imalatlar devam etmektedir.

İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi 25.07.2011 tarihinde 599.419,06TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde başlayan ve 09.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **25,-mt** betonarme kutu menfez imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı 16.05.2012 tarihinde 696.154,96-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.08.2012 tarihinde başlayan ve 20.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **3.356,-mt** uzunluğunda dere kenarına korkuluk yapılması imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar devam etmektedir.



İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı

TORBALI İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

URLA İLÇESİ

İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı 27.02.2012 tarihinde 1.490.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 07.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 10.04.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Urla ve Narlıdere İlçelerindeki Tabaklar ve İbrahimağa Derelerinin Islah İnşaatı 02.05.2012 tarihinde 3.842.177,75-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 28.09.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 05.10.2012 tarihinde başlayan ve 29.09.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

İzmir İli Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi 25.07.2011 tarihinde 599.419,06TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 18.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.11.2011 tarihinde başlayan ve 09.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **50,-mt** betonarme kutu menfez imalatı gerçekleşmiş ve öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

YAĞMURSUYU TOPLAMA SİSTEMLERİ

BALÇOVA İLÇESİ

Balçova İlçesi Korutürk, Fevzi Çakmak ve Onur Mahalleleri Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi 29.09.2011 tarihinde 1.957.735,86TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup 13.02.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.02.2012 tarihinde başlayan ve 18.10.2012 tarihinde biten iş kapsamında **2.862,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar tamamlanmıştır.



Balçova İlçesi Korutürk, Fevzi Çakmak ve Onur Mahalleleri Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi

BAYRAKLI İLÇESİ

Bayraklı İlçesi Çiçek, Tepekule, Bayraklı Mahalleleri Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı 22.03.2012 tarihinde 1.271.819,40,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 05.07.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 13.07.2012 tarihinde başlayan ve 09.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **1.828,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve İmalatlar devam etmektedir.



Bayraklı İlçesi Çiçek, Tepekule, Bayraklı Mahalleleri Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı

Karşıyaka; Yamanlar, Cumhuriyet Mah. Ve Bayraklı Cengizhan Mah. Muh. Sok. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 04.04.2012 tarihinde 1.396.860,61-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 15.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.06.2012 tarihinde başlayan ve 18.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.536,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Karşıyaka; Yamanlar, Cumhuriyet Mah. Ve Bayraklı Cengizhan Mah. Muh. Sok. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi

Bayraklı Yamanlar, Emek ve Orgeneral Nafiz Gürman Mahalleleri Muh. Sok. Yağmursuyu İnşaatı 02.10.2012 tarihinde 1.743.041,40-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 11.12.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 20.12.2012 tarihinde başlayan ve 18.05.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi ile Bornova Gürpınar ve Kemalpaşa Mahalleleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 12.04.2012 tarihinde 3.450.134,35-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 25.07.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.08.2012 tarihinde başlayan ve 15.04.2013 tarihinde bitmesi olanlanan iş kapsamında **1.481,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.



Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi ile Bornova Gürpınar ve Kemalpaşa Mahalleleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi

Bayraklı İlçesi R.Şevket İnce ve Muhittin Erener Mahallelerinin Muhtelif Sokaklarında Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 01.07.2011 tarihinde 1.462.542,45-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 17.10.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.10.2011 tarihinde başlayan ve 07.06.2012 tarihinde biten iş kapsamında **2.106,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve İmalat tamamlanmıştır.

BORNOVA İLÇESİ

Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi ile Bornova Gürpınar ve Kemalpaşa Mahalleleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 12.04.2012 tarihinde 3.450.134,35-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 25.07.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.08.2012 tarihinde başlayan ve 15.04.2013 tarihinde bitmesi olanlanan iş kapsamında **1.480,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.

Bornova İlçesi Atatürk Mah. Muhtelif Cadde ve Sokaklar Yağmursuyu Şebeke İnşaatı 08.06.2012 tarihinde 1.692.390,45TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 14.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.08.2012 tarihinde başlayan ve 04.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **1.514,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve İmalatlar devam etmektedir.



Bornova İlçesi Atatürk Mah. Muhtelif Cadde ve Sokaklar Yağmursuyu Şebeke İnşaatı

BUCA İLÇESİ

İzmir İli Buca İlçesi Çamlıpınar Mahallesi 254 Sokak Mevcut Yağmursuyu Izgarası Tamiratı ve Çamlıkule ve Çamlıpınar Mahalleleri Mevcut Kanalların Düzenlenmesi İnşaatı İşi 16.05.2011 tarihinde 546.837,04,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 28.10.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 03.11.2011 tarihinde başlayan ve 01.03.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **157,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Buca Menderes Mehmet Akif Caddeleri ile Şirinyer İstasyon ve Pazaryeri Çevresi Yağmursuyu İnşaatı İşi 07.12.2011 tarihinde 789.000-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 20.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.01.2012 tarihinde başlayan ve 07.08.2012 tarihinde biten iş kapsamında **743,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Buca Kırıklar Cezaevi Çevresi Yağmursuyu Kanalı İnşaatı 15.03.2012 tarihinde 184.105,63TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 06.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 15.06.2012 tarihinde başlayan ve 01.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında **776,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Buca Kırıklar Cezaevi Çevresi Yağmursuyu Kanalı İnşaatı

Buca ve Gaziemir İlçesileri Yağmursuyu Kanalı İnşaatı 18.09.2012 tarihinde 1.491.015,53TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 20.12.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.12.2012 tarihinde başlayan ve 26.05.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

ÇİĞLİ İLÇESİ

Çiğli İstasyonaltı Mah. ve Sasalı Merkez Mah. Muh. Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı 06.06.2012 tarihinde 435.727,21TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 18.09.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 26.09.2012 tarihinde başlayan ve 23.01.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **61,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalatlar devam etmektedir.



Çiğli İstasyonaltı Mah. ve Sasalı Merkez Mah. Muh. Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı

Çiğli İlçesi Egekent Mahallesi 8050-8836-8827 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 217.595,45-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.12.2011 tarihinde başlayan ve 27.05.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **1.264,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Çiğli İlçesi Egekent Mahallesi 8050-8836-8827 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi

GAZİEMİR İLÇESİ

Buca ve Gaziemir İlçesileri Yağmursuyu Kanalı İnşaatı 18.09.2012 tarihinde 1.491.015,53TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 20.12.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 28.12.2012 tarihinde başlayan ve 26.05.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.

KARABAĞLAR İLÇESİ

Karabağlar Tahsin Yazıcı ve A.Fuat Cebesoy Mah.Muh.Sokak Yağmursuyu İnş. İle Eskiizmir Cad. Yağmursuyu Kanalı İnş. İşi 12.07.2012 tarihinde 372.966,89TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 09.10.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 18.10.2012 tarihinde başlayan ve 21.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Karabağlar Tahsin Yazıcı ve A.Fuat Cebesoy Mah.Muh.Sokak Yağmursuyu İnş. İle Eskiizmir Cad. Yağmursuyu Kanalı İnş. İş

KARŞIYAKA İLÇESİ

İzmir İli Karşıyaka İlçesi Atakent Mahallesi Gölet ve Çevresi Yağmursuyu İnşaatı İşi 21.241-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.05.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 25.05.2012 tarihinde başlayan ve 22.07.2012 tarihinde biten iş kapsamında **78,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Karşıyaka; Yamanlar, Cumhuriyet Mah. Ve Bayraklı Cengizhan Mah. Muh. Sok. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 04.04.2012 tarihinde 1.396.860,61-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 15.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 22.06.2012 tarihinde başlayan ve 18.11.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.532,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

Karşıyaka İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1831/15 Sokak Yağmursuyu İnşaatı İşi 15.12.2011 tarihinde 58.316-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 03.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 12.01.2012 tarihinde başlayan ve 11.03.2012 tarihinde biten iş kapsamında **100,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

KONAK İLÇESİ

İzmir İli Konak İlçesi Küçükada Mahallesi 1433, 1139, 2228, 2225, 3558, 3559, 3557 Sokaklar Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi 05.09.2011 tarihinde 362.278,45-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 22.11.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 01.12.2011 tarihinde başlayan ve 28.04.2012 tarihinde biten iş kapsamında **1.299,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

NARLIDERE İLÇESİ

Narlıdere Limanreis Mahallesi Türker ve Limanreis Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi 16.04.2012 tarihinde 78.366,30,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 15.05.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 21.05.2012 tarihinde başlayan ve 18.08.2012 tarihinde biten iş kapsamında **102,-mt** uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

MENEMEN İLÇESİ

Menemen Mermerli, Ahihıdır, Camikebir, Seydinnasrullah Mah. Muh. Sokak Yağmursuyu Dere Islah İnşaatı İşi 05.07.2010 tarihinde 2.877.000,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 06.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 14.08.2012 tarihinde başlayan ve 02.05.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Menemen Mermerli, Ahihıdır, Camikebir, Seydinnasrullah Mah. Muh. Sokak Yağmursuyu Dere Islah İnşaatı İşi

MENDERES İLÇESİ

Menderes Özdere Orta Mah. 29 Ekim Cad. 8003 ve 8004 Sok. Yağmursuyu İnşaatı 20.06.2012 tarihinde 165.518,60TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 05.10.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 12.10.2012 tarihinde başlayan ve 08.02.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Menderes Özdere Orta Mah. 29 Ekim Cad. 8003 ve 8004 Sok. Yağmursuyu İnşaatı

TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırım ve İnşaat Dairesi bünyesinde ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan atıksu arıtma tesisleri, içmesuyu arıtma tesisleri, hizmet binaları, çevre düzenlemeleri, üst yapı binaları ve diğer tesislerin tadilat ve onarımları, temiz su temini için yapılacak her türlü (arsenik, Fe, Mn giderimi v.b) paket arıtma tesislerinin imalatlarını yaptırıp denetleyerek gerektiği durumlarda program revizyonlarının planlanması ve koordinasyonunu sağlamak görevleriyle yükümlüdür.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE DERİN DENİZ DEŞARJLARI

MENDERES İLÇESİ

Menderes İlçesi Özdere Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi 22.12.2010 tarihinde 8.987.978,28TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 23.02.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 04.03.2011 tarihinde başlayan ve 10.08.2012 tarihi itibari ile yapım işleri tamamlanmış olup, işletmeye alma ve eğitim faaliyetleri kapsamında Yapım İşletme süresi Deşarj hattının bitimine müteakip başlayacaktır.



Menderes İlçesi Özdere Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı



Tesis 125 bin kişinin evsel atığını arıtacak. İleri biyolojik atıksu arıtma tesisinde ayrıca koku giderim sistemi de yer alacak. Tesisin hizmete girmesi ile fosseptiklerle toplanarak alıcı ortama verilen evsel atıklar biyolojik arıtmadan sonra çöktürme işlemi uygulanacak ve ultraviyole ile dezenfekte edilerek doğaya verilecek

Özdere Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

Menderes İlçesi Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Temini İnşaatı İşi 03.10.2011 tarihinde 795.000,00,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 09.12.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 16.12.2011 tarihinde başlayan ve 22.08.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.



Menderes İlçesi Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Temini İnşaatı İşi

Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattı İnşaatı 13.06.2012 tarihinde 2.145.093,18,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 05.09.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 13.09.2012 tarihinde başlayan ve 11.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında **203,-mt** uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleşmiş ve imalat devam etmektedir.



Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattı İnşaatı

Özdere AAT Alanı Enerji Nakil Hattı Tadilatı İşi 03.10.2011 tarihinde 15.900,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 05.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 27.06.2012 tarihinde başlayan ve 26.07.2012 tarihinde biten iş kapsamında öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

XLPE Kablo Alımı İşi 08.05.2012 tarihinde 140.700,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 16.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 14.06.2012 tarihinde başlayan ve 14.07.2012 tarihinde biten iş kapsamında öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.



Özdere Atıksu Arıtma Tesisine kablo alımı

SEFERİHİSAR İLÇESİ

Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi 23.05.2011 tarihinde 9.249.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 27.06.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.06.2011 tarihinde başlayan ve 19.08.2012 tarihi itibari ile yapım işleri tamamlanmış olup, işletmeye alma ve eğitim faaliyetleri kapsamında Yapım İşletme süresi elektrik temininin bitimine müteakip başlayacaktır.

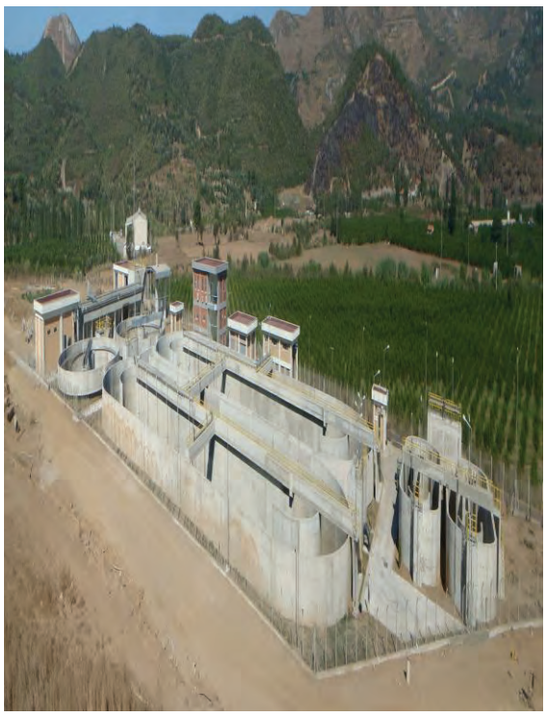



Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

Doğanbey (Ürkmez) Atıksu Arıtma Tesisi, Doğanbey-Payamlı-Ürkmez yerleşimlerinin yaz ve kış nüfusu dikkate alınarak birbirine paralel iki hattan oluşacak. Azot ve fosfor giderimi yapılacak tesiste koku giderim üniteleri de yer alacak. Tesise gelen ham atıksu, çeşitli ızgaralardan geçerek sonrasında havalandırmalı kum ve yağ tutucuda işlem görecek. Ardından içerdiği fosfor arıtılacak, uzun havalandırmanın yapıldığı aktif çamur ünitesinde arıtma işlemi yapıldıktan sonra çöktürme işlemi uygulanacak ve ultraviyole ile dezenfekte edilerek doğaya verilecek.

Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Temini İşi 08.06.2012 tarihinde 1.414.042,78,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 15.08.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 24.08.2012

tarihinde başlayan ve 21.12.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.



Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Temini İşi

ÇİĞLİ ARITMA TESİSİNDE ÇAMUR ÇÜRÜTME VE KURUTMA TESİSİ İNŞAATI İŞİ

30.03.2011 tarihinde 24.513.591,00TL +14.928.470,00€ ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 10.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 20.01.2012 tarihinde başlayan ve 18.01.2014 tarihinde tesisin yapımı tamamlanarak işletmeye alınacak ve sözleşme gereği 18.01.2015 tarihine kadar (1yıl) yüklenici sorumluluğunda işletilecektir.



Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi içinde yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni tesisin kurutma ünitesi 16 ayda, çürütme ünitesi ise 2 yılda tamamlanacak. Yatırımın hayata geçirilmesiyle, halen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi sahasında yapılan çamur depolama işlemi sona erdirilecek ve bu alanlar rehabilite edilecek. Çamurda kokuya neden olan organik bileşikler çamur çürütme işlemi sonrasında biogaz olarak tanımlanan ve yanabilen gaz bileşenine dönüşeceği için kalan çamurda koku problemi olmayacak. Ayrıca tesis içinde kurutma işlemi yapılırken kokuyu önlemek için ikili kimyasal ve biyolojik koku kontrol sistemi kurulacak.

Bu tesisle buradan çıkan günde yaklaşık 600 – 800 ton çamur önce gazlaştırılarak çürütülecek ve metan gazı çıkartılacak. Çıkan metan gazından enerji elde edilecek, kalan çamur ve diğer arıtmalardan gelen çamurlar da tesisin kurutma ünitesinde kurutulacak. Gerekli olan enerjinin yüzde 70'i de elde edilen enerjiyle karşılanacak.



Tesis hizmete girdiğinde, diğer arıtma tesisleriyle birlikte günlük 800 tona oluşan çamur miktarı yaklaşık 220 tona düşürülecek. Ayrıca yüzde 90 oranında kurutulmuş hale getirilen çamurlar "toprak iyileştirici" olarak yeşil alanlarda, arazi rehabilitasyonunda ve tarım alanlarında veya ek yakıt olarak çimento fabrikalarında kullanılabilecek.



HİZMET BİNASI

BORNOVA İLÇESİ

Karabağlar, Bornova, Menemende Ambar, Arşiv ve İstinat Duvarı Yapımı 11.07.2011 tarihinde 827.320,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 10.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 19.01.2012 tarihinde başlayan ve 16.06.2012 tarihinde bitmesi planlanan işte yüklenici firmanın sözleşme hükümlerini yerine getirememesi nedeniyle fesih aşamasındadır.

GAZİEMİR İLÇESİ

Gaziemir Dökü Sahası Etrafı Betonarme Direkli Kafes Tel İle Himaye Çiti ve Betonarme Duvar İnşaatı 08.02.2012 tarihinde 64.684,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 22.03.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.03.2012 tarihinde başlayan ve 28.05.2012 tarihinde biten iş kapsamında öngörülen imalatlar gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.

KARŞIYAKA İLÇESİ

Karşıyaka Pompa İstasyonu İdari Bina ve Atölye Binası İnşaatı İşi 23.06.2011 tarihinde 296.700,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 11.10.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 20.10.2011 tarihinde başlayan ve 17.03.2012 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar tamamlanmıştır.

KARABAĞLAR İLÇESİ

Karabağlar, Bornova, Menemende Ambar, Arşiv ve İstinat Duvarı Yapımı 11.07.2011 tarihinde 827.320,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 10.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 19.01.2012 tarihinde başlayan ve 16.06.2012 tarihinde bitmesi planlanan işte yüklenici firmanın sözleşme hükümlerini yerine getirememesi nedeniyle fesih aşamasındadır.

Karabağlar Kanal Bakım Şube Müdürlüğü Çevresine Koruma Çiti Yapım İşi 13.01.2012 tarihinde 15.900,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 27.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 02.02.2012 tarihinde başlayan ve 02.03.2012 tarihinde biten iş kapsamında öngörülen imalatlar gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



NARLIDERE İLÇESİ

İzsu Narlıdere Şube Müdürlüğü Binası Subasman Seviyesi İkmal İnşaatı 12.11.2012 tarihinde 365.000,00-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 26.11.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.11.2012 tarihinde başlayan ve 29.03.2013 tarihinde bitmesi planlanan iş kapsamında öngörülen imalatlar devam etmektedir.



İzsu Narlıdere Şube Müdürlüğü Binası Subasman Seviyesi İkmal İnşaatı

MENEMEN İLÇESİ

Karabağlar, Bornova, Menemende Ambar, Arşiv ve İstinat Duvarı Yapımı İşi 11.07.2011 tarihinde 827.320,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 10.01.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 19.01.2012 tarihinde başlayan ve 16.06.2012 tarihinde bitmesi planlanan işte yüklenici firmanın sözleşme hükümlerini yerine getirememesi nedeniyle fesih aşamasındadır.

MENDERES İLÇESİ

Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Tel Çit İnşaatı İşi 21.11.2011 tarihinde 239.000,-TL ihale bedeli ile ihale edilmiş olup, 02.02.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 10.02.2012 tarihinde başlayan ve 08.06.2012 tarihinde biten iş kapsamında öngörülen imalatlar gerçekleşmiş ve imalat tamamlanmıştır.



Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Tel Çit İnşaatı İşi

2012 YILINDA BALÇOVA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

2012

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçme suyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Balçova İlçesi Korutürk, Fevzi Çakmak ve Onur Mahalleleri Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi	Korutürk, Fevzi Çakmak Onur Mahalleleri	*Sakarya caddesi,Tarkan sokak,Mehmet efe sokak,çakır efe sokak,demirci efe sokak,hakan sokak,kaan sokak,Çağatay sokak,Mehmet paşa caddesi,karaoğlanoğlu sokak,palmiye sokak,lider sokak,hoca sokak,kauçuk sokak,öykü sokak,poyraz sokak,çağdaş caddesi,*	Ø400mm ECBB	116.16
			Ø500mm ECBB	39.11
			Ø600mm ECBB	32.34
			B=40cm delikli saç ızgaralı BA yağmursuyu kanalı	1,518.45
			B=60cm delikli saç ızgaralı BA yağmursuyu kanalı	551.24
			1,0X1,0 baks tipi prekast betonarme yağmursuyu kanalı	366.7
			1,5X1,0 baks tipi prekast betonarme yağmursuyu kanalı	94.00
			dere yatağı düzenlemesi	144.00
			TOPLAM İMALAT:	**2,862.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

2012 YILINDA BAYRAKLI İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bayraklı İlçesi Çiçek,Tepekule,Bayraklı Mahalleleri Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı	Çiçek Tepekule Bayraklı	*2073 sokak,2080 sokak,şehit hakan uysal caddesi,2091 sokak,1638 sokak,1631 sokak,1635/1 sokak,1638/1 sokak,*	Ø300mm ECBB	491.94
			Ø400mm ECBB	23.18
			Ø800mm ECBB	257.31
			Ø400mm HDPE	500.84
			Ø500mm HDPE	255.38
			Ø600mm HDPE	95.24
			1,5x1 baks kesit	203.75
Karşıyaka; Yamanlar, Cumhuriyet Mah. Ve Bayraklı Cengizhan Mah. Muh. Sok. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	Cengizhan Mah.	*1620/21 sokak,1620/26 sokak,1620/39 sokak*	Ø400mm HDPE	594.00
			Ø600mm HDPE	128.00
			B=0,40cm yağmursuyu ızgarası	275.62
			B:1mt delikli sac ızgaralı B.A. yağmursuyu kanalı	123.48
			B=0,80cm yağmursuyu ızgarası	414.90
Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi ile Bornova Gürpınar ve Kemalpaşa Mahalleleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	Mansuroğlu	*288, 288/1, 288/2, 286, 289, 293, 295, 1586/1, 1593/1, 1600 sokaklar*	Ø800mm ECBB	146.05
			Ø1000mm ECBB	52.79
			Ø400mm HDPE	589.92
			Ø500mm HDPE	225.55
			B.A kutu kesit yağmursuyu ızgarası	466.69

Bayraklı İlçesi R.Şevket İnce ve Muhittin Erener Mahallelerinin Muhtelif Sokaklarında Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	R.Şevket İnce Muhittin Erener	*2150 sokak,2145/2 sokak,2174 sokak,2140 sokak,2143 sokak,2179 sokak,*	Ø300mm ECBB	40.00
			Ø400mm ECBB	643.70
			Ø500mm ECBB	168.59
			B=0,40cm yağmursuyu ızgarası	889.81
			B=0,60cm yağmursuyu ızgarası	363.90
Bayraklı Yamanlar,Emek ve Org.Nafiz Gürman Mahallaleleri Muh.Sok.Yağmursuyu İnş.		*İmalatlar devam ediyor*		
Bayraklı İlçesi Bayraklı Mahallesi Anadolu Caddesi Evlendirme Dairesi Önü ve 1606 Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**6,950.64**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bayraklı Onur Mahallesi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon İnşaatı	Onur	*7368/5 sokak, 7384/5 sokak,7384 sokak,7382 sokak,*	Ø300mm ECBB	1,914.00
			TOPLAM İMALAT:	**1,914.00**

2012 YILINDA BORNOVA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

Hizmet Binaları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR
Karabağlar,Bornova,Menemende Ambar,Arşiv ve İstinat Duvarı Yapımı		*İmalatlar devam ediyor*		
Homeros Vadisi Kocapınar, Çatalpınar, Kererli, Bedesten, Deli Süleyman Kaptaj Odaları ve Toplama Odası Tadilatı	Kocapınar, Çatalpınar, Kererli, Bedesten, Deli Süleyman	*Homeros Vadisi*	Kaptaj Odaları ve Toplama Odası Tadilatı	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR
Bornova İlçesi Yaka Köyü Yeni Kuyusuna Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini ve Montajı İşi	Yaka Köyü		Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini ve Montajı	1 adet
Karaköy-Belenbaşı-Dağkızılca-Aşık Veysel Kısımları Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması		*Aşık Veysel Kısımları*	Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması	1 adet
Bornova Eğridere Köyü, Menemen Uğur Mumcu Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Foça Kozbeyli Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi	Eğridere Köyü		İçmesuyu Terfi Merkezine Elektrik temini	1 adet
Torbalı Yazıbaşı Mahallesi, Aliağa Karaköy Köyü, Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyuları ve Kemalpaşa Gökkaya Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Enerji Temini		*Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi*	İçmesuyu Terfi Merkezine Elektrik temini	1 adet
İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1,İle Yakapınar Köyü Y2,Kızılcaova Köyü K2 İle Bornova Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı	Beşyol Köyü		Su sondaj kuyusu	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi		*Naldöken*	Ø100mm DF boru	448.84
			Ø150mm DF boru	2,197.36
			Ø200mm DF boru	837.67
Bozyaka T-20-H.Edip Adıvar Cad.Arası ve Bornova 1594/1 Sokak ile 252 Sokak Arası İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi		*1594/1 Sokak ile 252 Sokak*	idare malı Ø1000 D.F Boru	160.12
			idare malı Ø300 D.F Boru	417.79
			idare malı Ø800 D.F Boru	99.39
			idare malı Ø900 D.F Boru	136.75
Bornova İlçesi Yaka, Çiçekli, Kayadibi, Karaçam, Sarnıç ve Kavaklıdere Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi	Yaka, Çiçekli, Kayadibi, Karaçam, Sarnıç Kavaklıdere	*Kavaklıdere caddesi,çıtak,kavak, Akgün,dilek,cemre,derya,dere,eylül sokak,emek,ören,kışla,orman,özen sokak,incir,ergen,kekik,yaka caddesi,ıhlamur, kiraz,özbek,yaprak,sevgi,asma,zeytin, Damla,ekin,güneş,kordon,ırmak, Yalı,limon,cumba,selin,tepe, Melisa,mine,Gündoğan,dibek,meltem, Karaçam caddesi,doğan.çitflik,fesleğen, Çağlayan,palmiye,kültür,kayadibi Caddesi,funda,zakkum,gündoğdu, Çiçekli caddesi,çamlık cd.,akasya cd.,pınar,manayla sokaklar*	Ø110 mm HPDE 100 (10 ATÜ)	16,288.84
			Ø160 mm HPDE 100 (10 ATÜ)	2,650.64
			Ø160 mm HPDE 100 (16 ATÜ)	1,199.25
			Ø225 mm HPDE 100 (10 ATÜ)	110.62
			Ø63 mm HPDE 100 (16 ATÜ)	17,655.04
			Ø75 mm HPDE 100 (10 ATÜ)	13,237.45
			500m3'lük İçmesuyu deposu	1 adet
Menderes İlçesi Şaşal,Efemçukuru,Küner,Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi	Gökdere	*Akgül sokak,güvercin sokak,anayol sokak,nehir sokak,erden sokak,inci sokak,ışık sokak,okul sokak,kale sokak,gökdere caddesi,*	Ø75mm HDPE(10 Atü)	5,527.83
			Ø400mm çelik boru ile yatay delgi	8.00
			Ø110mm HDPE(10 Atü)	1,483.77
			Ø110mm HDPE(16 Atü)	158.67
			Ø160mm HDPE(10 Atü)	730.20
			Ø225mm HDPE(10 Atü)	163.55
			Ø250mm çelik boru	4.20
Bornova İlçesi Homeros Vadisi Kererli, Çatalpınar, Bedesten, Deli Süleyman, Kocapınar Kaynakları İçmesuyu İletim Hatları İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**63,515.98**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi ile Bornova Gürpınar ve Kemalpaşa Mahalleleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	Gürpınar Kemalpaşa	*7057/3 Sokak, 7057 Sokak, 7055/8 Sokak, 7058/8 Sokak,*	Ø800mm ECBB	97.36
			Ø1000mm ECBB	26.39
			Ø400mm HDPE	589.92
			Ø500mm HDPE	206.06
			B.A kutu kesit yağmursuyu ızgarası	560.27
Bornova İlçesi Atatürk Mah. Muhtelif Cadde ve Sokaklar Yağmursuyu Şebeke İnşaatı	Atatürk	*513 sokak,514 sokak,yavuz caddesi,Barbaros caddesi,ziya Gökalp caddesi, 845 sokak*	Ø600mm ECBB	316.88
			Ø800mm ECBB	50.57
			Ø1000mm ECBB	923.08
			Ø400mm HDPE	95.88
			Ø500mm HDPE	127.89
İzmir İli Bornova İlçesi Ege Üniversitesi Kampüs İçerisinde İdare Malı Kutu Menfez İle Yağmursuyu Hattı Deplasmanı İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**2,994.30**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi		*Homeros*	Tersip bendi onarımı	1 adet
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı	Gökdere Kudurgan dereleri	*Gökdere Kudurgan,Kavacık dereleri*	B=2.00m H=1.50m B.A. Menfez	23.36
			B=2.00m H=1.50 Ç.H. Taş duvar ve B.A. Taban kaplaması	234.76
			B=4.50m Ç.H. Taş duvar	193.88

İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 1.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı İşi		*Manda deresi*	Dere kenarına profil korkuluk yapılması	1,221.00
İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı		*9210 sokak Arap deresi,170/17 sokak Taşpınar deresi*	Dere kenarına profil korkuluk yapılması	2,067.00
İzmir İli Bornova İlçesi İmar Planlı Alanlardan Geçen Şeytan Deresi, Taşpınar ve Malama Derelerinin Düzenlenmesi İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**3,740.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bornova Evka-3 Mah. Şeytan Deresi İçi Atıksu Kanalı Deplasmanı ile Ege Üniversitesi Kampüs İçi İtfaiye Grubu Atıksu Kanalı İnşaatı İşi	Evka-3	*119/21 sokak,119/26 sokak,129/19 sokak,Cengizhan caddesi*	Ø400mm ECBB boru	158.82
			Ø800mm ECBB boru	683.88
			Ø63 PE 100 boru	118.28
			Ø300mm ECBB boru	426.82
Bornova,Menemen Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Atıksu Kanalizasyon İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
Altındağ Merkez Mah. 4499 Sokak Devamı Atıksu Kanalı İnşaatı İşi	Merkez	4499 Sokak	Ø300mm ECBB boru	518.00
Bornova İlçesi Kavaklıdere-Yeşilçam-Gürpınar Mahalleleri Atıksu İnşaatı İşi		Kavaklıdere Sokak	Ø300mm ECBB boru	3,607.00
Bornova İlçesi Çimentaş Alanı İle Kemalpaşa, Altındağ Merkez ve Mevlana Mahalleleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
Bornova İlçesi Muhtelif Sokaklara Ait Atıksu Şebeke İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**5,512.80**

2012 YILINDA BUCA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir İli Buca İlçesi İnkilap Mahallesi Yağmursuyu Terfi Merkezi Alçak Gerilim Özel Anahtar Elektrik İşi	İnkilap		Yağmursuyu Terfi Merkezi Alçak Gerilim Özel Anahtar Elektrik İşi	1 adet
Karaköy-Belenbaşı-Dağkızılca-Aşık Veysel Kısımları Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması		*Belenbaşı Köyü*	Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması	1 adet
Buca İlçesi Belenbaşı Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini		*Belenbaşı Köyü*	İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Buca Menderes Mehmet Akif Caddeleri ile Şirinyer İstasyon ve Pazaryeri Çevresi Yağmursuyu İnşaatı İşi		*504 sokak,510 sokak,502/2 sokak*	Ø200mm HDPE koruge boru	207.04
			Ø500mm HDPE koruge boru	51.35
			Ø600mm HDPE koruge boru	177.83
			Ø800mm PE 100 boru	191.54
			B=40cm ızgara	4.00
			B=60cm ızgara	111.24
Buca Kırıklar Cezaevi Çevresi Yağmursuyu Kanalı İnşaatı		*Kırıklar Cezaevi Çevresi*	Ø400mm HDPE boru	372.12
			Ø1000mm EC betonarme boru	368.88
			B=0,40cm H=değişken B.A yağmursuyu kanalı	35.00
Buca ve Gaziemir İlçeleri Yağmursuyu Kanalı İnşaatı		*Yer Teslimi Yapıldı*		
İzmir İli Buca İlçesi Çamlıpınar Mahallesi 254 Sokak Mevcut Yağmursuyu Izgarası Tamiratı ve Çamlıkule ve Çamlıpınar Mahalleleri Mevcut Kanalların Düzenlenmesi İnşaatı İşi	Çamlıpınar Çamlıkule	*254 Sokak,kozağaç deresi*	Yağmursuyu ızgarası tamiratı	157.00
			TOPLAM İMALAT:	**1,676.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi		*Kırıklar*	Betonarme Kutu Menfez	50.00
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı			B=2.00m H=2,00m B.A. Menfez	44.03
			B=5.00m H=2,00m B.A. Menfez	55.50
			B.A Kanat duvarı	6.59
			Yatak düzenlenmesi	148.88
İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı		*677/12 sokak Otokent deresi,şirinyer terfi merkezi*	Dere kenarına profil korkuluk yapılması	13.00
İzmir İli Buca İlçesi Armutlu Deresi Tersip Bendi İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**318.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Buca Atatürk ve Çamkule Mah. Muh. Sok. Atıksu İle Konak Vapur İskelesi Atıksu Hattı Bağlantı İnşaatı	Atatürk Çamkule		Ø300mm ECBB	982.00
			TOPLAM İMALAT:	**982.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
Karşıyaka-Çiğli Muhtelif Sokaklar İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Çiğli İstasyonaltı Mah. ve Sasalı Merkez Mah. Muh. Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	İstasyonaltı Sasalı Merkez	*819/21 sokak,8229 sokak,8230 sokak,8231 sokak,8232 sokak,*	Ø400mm HDPE Koruge Boru	31.00
			Ø600mm HDPE Koruge Boru	30.00
Çiğli İlçesi Egekent Mahallesi 8050-8836-8827 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	Egekent	*8050-8836-8827 Sokaklar*	Ø400mm HDPE koruge boru	790.84
			Ø500mm HDPE koruge boru	375.33
			B:0,40mt delikli saç ızgaralı BA yağmursuyu kanalı	97.83
Çiğli İlçesi Balatçık Mahallesi Egekent Aktarma İstasyonu Yağmursuyu Kanalı Yapılması İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
Çiğli İlçesi Balatçık Mahallesi 8790/1 Sokak Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
Küçük Çiğli Anadolu Caddesi 8704, 8714/2, 8715, 8716 Sokaklar Yağmursuyu Şebeke İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**1,325.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Çiğli Güzeltepe Mahallesi,Maltepe Deresi ve Yankolu (Peynircioğlu deresi) Islah ve Atıksu Kanalizasyonu İnşaatı	Güzeltepe	*Maltepe Deresi ve Yankolu (Peynircioğlu deresi)*	Ø300mm ECBB Boru	262.06
			B.A. U Kesit	199.85
İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 1.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı İşi		*Harmandalı Deresi*	Dere kenarına profil korkuluk yapılması	917.00
Çiğli İlçesi Bostanlı, Maltepe ve Büyük Çiğli Dereleri Bakım ve Onarım İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**1,378.91**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Karşıyaka Mustafa Kemal Mah. Ve Çiğli Sasalı ,Kaklıç Mah.Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Atıksu Şebeke İnşaatı	Sasalı Kaklıç	*27 Sokak,27/1 Sokak,159,172,134,147,131,10302,118 Sokaklar,Gazi çiçek caddesi,10319 Sokak*	Ø300 mm ECBB	1,614.00
Çiğli 2 Hava Jet Üssü Yolu Ø500 mm Atıksu Deplasmanı İnşaatı İşi		*Hava jet üssü yolu*	Ø500mm ECBB	331.99
			Ø500mm HDPE	16.61
			Ø800mm çelik boru ile yatay delgi	17.00
İzmir İlçesi 8291, 8291/1, 8295 Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***	Ø300mm ECBB	
			TOPLAM İMALAT:	**1,979.60**

Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Çiğli Arıtma Tesisinde Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı İşi				
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

2012 YILINDA GAZİEMİR İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

Hizmet Binaları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR
Gaziemir Dökü Sahası Etrafı Betonarme Direkli Kafes Tel İle Himaye Çiti ve Betonarme Duvar İnşaatı		*Gaziemir Dökü Sahası*	tel örgü	200.88
			betonarme duvar	33.05
			Ø150 PVC boru	25.32
			TOPLAM İMALAT:	**401.76**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Buca ve Gaziemir İlçeleri Yağmursuyu Kanalı İnşaatı		*Yer teslimi yapıldı*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Gaziemir İlçesi Sarnıç Atıksu Şebeke İnşaatı	Sarnıç	140 sokak,199 sokak,193 sokak,195 sokak,369 sokak,191 sokak,198 sokak	Ø300mm ECBB boru	3,819.00
Gaziemir İlçesi 9 Eylül Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı İşi	9 Eylül	*316 sokak,311/1 sokak,Orhangazi caddesi,306 sokak,309 sokak,303 sokak,319 sokak,316 sokak*	Ø300mm ECBB boru	550.82
			Ø400mm ECBB boru	299.81
			Ø600mm ECBB boru	796.35
			Ø600mm HDPE boru	55.15
			TOPLAM İMALAT:	**5,521.13**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi			Betonarme Kutu Menfez	25.00
			TOPLAM İMALAT:	**25.00**

2012 YILINDA GÜZELBAHÇE İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Menderes İlçesi Şaşal,Efemçukuru,Küner,Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi	Payamlı	*Dedemezarı,kaya sokak,kayapınarı sokak,gazi sokak,çınar sokak,çelebi sokak,bayram sokak,elma belen sokak,kuyu sokak,kazım dirik,huzur sokak,kısıklar sokak,kuzey sokak,harman sokak,uzunca sokak,*	Ø75mm HDPE(10 Atü)	5,527.83
			Ø400mm çelik boru ile yatay delgi	8.00
			Ø110mm HDPE(10 Atü)	1,483.77
			Ø110mm HDPE(16 Atü)	158.67
			Ø160mm HDPE(10 Atü)	730.2
			Ø225mm HDPE(10 Atü)	163.55
			Ø250mm çelik boru	4.20
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Köyü Gönen ve Evren Konutları İçmesuyu İnşaatı	Çamlı Köyü	*Gönen ve Evren Konutları*	Ø110mm HDPE (10 Atü) Boru	904.00
			TOPLAM İMALAT:	**8,980.22**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Narlıdere Sahilevleri Muhtelif Sokaklar ve Güzelbahçe Siteler 426 Sokak Atıksu Kanalizasyon İnşaatı İşi		*Siteler 426 Sokak*	Ø300mm ECBB	161.00
Güzelbahçe İlçesi Kahramandere Mahallesi 753, 763, 747, 844 Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı İşi	Kahramandere	*753, 763, 747, 844 Sokaklar*	Ø300mm ECBB	636.00
			TOPLAM İMALAT:	**797.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi			Betonarme Kutu Menfez	195.00
			TOPLAM İMALAT:	**195.00**

2012 YILINDA KARŞIYAKA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

2012

Hizmet Binaları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Karşıyaka Atıksu Pompa İstasyonu İdari Bina ve Atölye Binası İnşaatı İşi			İdari Bina ve Atölye Binası	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir İli Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S8(Ömür) İçmesuyu Kuyusu Enerji Temini ve Karşıyaka İlçesi Cumhuriyet Pompa istasyonu Güç Yükseltilmesi İşi		*Cumhuriyet Pompa istasyonu*	Pompa istasyonu Güç Yükseltilmesi İşi	1 adet
Rüştü Şardağ Caddesi Yağmursuyu Terfi Merkezi,Elifli İçmesuyu Kuyusu ve Süleymanlı Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini		*Şardağ Caddesi*	Yağmursuyu Terfi Merkezi	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Karşıyaka Onur-1 Mah.Pompa İstasyonu İnşaatı İşi	Onur-1		Pompa İstasyonu yapımı	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir İli Karşıyaka İlçesi Atakent Mahallesi Gölet ve Çevresi Yağmursuyu İnşaatı İşi	Atakent	Gölet ve Çevresi	Ø315mm PE 100 boru	78.00
Karşıyaka; Yamanlar, Cumhuriyet Mah. Ve Bayraklı Cengizhan Mah. Muh. Sok. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	Yamanlar, Cumhuriyet	6700 sokak,6700/1 sokak,6700/2 sokak	Ø400mm HDPE	598.00
			Ø600mm HDPE	320.68
			B=0,40cm yağmursuyu ızgarası	255.00
			B:1mt delikli sac ızgaralı B.A. yağmursuyu kanalı	118.32
			B=0,80cm yağmursuyu ızgarası	240.00
Karşıyaka İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1831/15 Sokak Yağmursuyu İnşaatı İşi	Bahçelievler	1831/15 Sokak	delikli sac ızgaralı yağmursuyu kanalı	100.00
Karşıyaka İlçesi Cahar Dudayev Bulvarı Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
Karşıyaka İlçesi Cahar Dudayev Bulvarı ve 8291 Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**1,710.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi	Bostanlı deresi		Tersip bendi	1 adet
İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 1.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı İşi		*Bostanlı deresi*	Dere kenarına profil korkuluk yapılması	404.00
İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı		*7559 sokak,6733 sokak,7554 sokak, 7553 sokak,7552 sokak,7551 sokak,7549 sokak,7536 sokak,7535 sokak Bostanlı Deresi Yan Kolu*	Dere kenarına profil korkuluk yapılması	131.00
			TOPLAM İMALAT:	**535.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Karşıyaka İlçesi İnönü ve Onur Mahalleleri Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı İşi	İnönü Onur	*Mavişehir, Cumhuriyet*	Ø300mm ECBB	1,667.00
Karşıyaka Mustafa Kemal Mah. Ve Çiğli Sasalı ,Kaklıç Mah.Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Atıksu Şebeke İnşaatı	Mustafa Kemal	*6753/8 sokak,6753/6 sokak,6753/4 sokak,10319 sokak,118 sokak,gazi caddesi*	Ø300mm ECBB	1,615.00
			TOPLAM İMALAT:	**3,282.00**

2012 YILINDA KARABAĞLAR İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

Hizmet Binaları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Karabağlar,Bornova,Menemende Ambar,Arşiv ve İstinat Duvarı Yapımı				
Karabağlar Kanal Bakım Şube Müdürlüğü Çevresine Koruma Çiti Yapım İşi		*Şube Müdürlüğü Çevresine*	Koruma Çiti	67.00
			TOPLAM İMALAT:	**67.00**

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi		*Tırazlı köyü*	Su Sondaj Kuyusu	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
Menderes İlçesi Şaşal,Efemçukuru,Küner,Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi	Tırazlı	*Kekik sokak,çamlık sokak,menekşe sokak,şirin sokak,gökgedik sokak,fırıncı sokak,kutlu aktaş caddesi,sağlık sokak,*	Ø75mm HDPE(10 Atü)	5,527.83
			Ø400mm çelik boru ile yatay delgi	8.00
			Ø110mm HDPE(10 Atü)	1,483.77
			Ø110mm HDPE(16 Atü)	158.67
			Ø160mm HDPE(10 Atü)	730.20
			Ø225mm HDPE(10 Atü)	163.55
			Ø250mm çelik boru	4.20
Bozyaka T20-H.Edip Adıvar Cad.Arası ve Bornova 1594/1 Sokak ile 252 Sokak Arası İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi		*2918 sokak,2915 sokak,H.Edip Adıvar Caddesi,Eski İzmir caddesi,*	idare malı Ø1000 D.F Boru	160.12
			idare malı Ø300 D.F Boru	417.69
			idare malı Ø500 D.F Boru	120.30
			idare malı Ø800 D.F Boru	200.67
			idare malı Ø900 D.F Boru	136.75
			Ø800 çelik boru	59.43
			TOPLAM İMALAT:	**9,171.18**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Karabağlar Tahsin Yazıcı ve A.Fuat Cebesoy Mah.Muh.Sokak Yağmursuyu İnş. İle Eskiizmir Cad. Yağmursuyu Kanalı İnş. İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
Karabağlar İlçesi Uzundere Deresi Ana Kol ve Yan Kolları Yataklarının Düzenlenmesi ile Atıksu Kanal İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi Toplu Konut 1.Bölge Dolgu Alanları Stabilite İnşaatı İşi	Uzundere	*Toplu Konut 1.Bölge Dolgu Alanları*	B.A U Kanal	124,88
			Kafa Hendeği (B.A Trapez Kesit)	963,23
			B.A Trapez Kanal	247,60
			B.A İstinat Duvarı	50,00
			TOPLAM İMALAT:	**1.392,71**

2012 YILINDA KONAK İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR
Arap Deresi ve Narlıdere Gürler Caddesi Terfi Merkezleri Elektrik Tesisatı Yapımı İşi		Arap Deresi	Terfi Merkezine Elektrik Tesisatı Yapımı	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
İzmir İli Konak İlçesi Alsancak Kültür Mahallesi ile İnönü Caddesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir İli Konak İlçesi Küçükada Mahallesi 1433, 1139, 2228, 2225, 3558, 3559, 3557 Sokaklar Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi	Küçükada	*1433 sokak,1139 sokak,2228 sokak,2225 sokak,3558 sokak,3559 sokak,3557 sokak,*	Ø400 HDPE Koruge boru	533.45
			Ø500 HDPE Koruge boru	74.75
			Ø600 HDPE Koruge boru	98.42
			Ø800 HDPE Koruge boru	485.82
			b=40 ızgara	106.56
Konak İlçesi Şehit Fethibey Yağmursuyu Kanalı İnşaatı		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
İzmir İli Konak İlçesi Zeytinlik Mahallesi Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**1,299.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Melez Deltası Taşkın Koruma Duvarı İnşaatı İşi		*Melez Deltası*	betonarme perde duvar	405.00
İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı		*Melez Deresi*	Dere kenarına profil korkuluk yapılması	2,836.00
			TOPLAM İMALAT:	**3,241.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Buca Atatürk ve Çamkule Mah. Muh. Sok. Atıksu İle Konak Vapur İskelesi Atıksu Hattı Bağlantı İnşaatı		*Vapur İskelesi*	Ø300mm ECBB	324.00
İzmir İli Ana Kuşaklama Hattı Arap Deresi Sifon Geçişine İlave Kanalizasyon Hattı İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**324.00**

2012 YILINDA NARLIDERE İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

Hizmet Binaları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzsu Narlıdere Şube Müdürlüğü Binası Subasman Seviyesi İkmal İnşaat				
			TOPLAM İMALAT:	**0.000**

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR
Arap Deresi ve Narlıdere Gürler Caddesi Terfi Merkezleri Elektrik Tesisatı Yapımı İşi		*Gürler Caddesi*	Terfi Merkezine Elektrik Tesisatı Yapımı	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Konak, Buca, Bayraklı, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Narlıdere Limanreis Mahallesi Türker ve Limanreis Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	Limanreis	*Türker, Limanreis Sokak,oğuz Altay sokak*	B=1,50*1,00mt BA kutu kesit yağmursuyu kanalı	102.00
			TOPLAM İMALAT:	**102.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
Urla ve Narlıdere İlçelerindeki Tabaklar ve İbrahimağa Derelerinin Islah İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı İşi		*Bostanlı deresi*	Tersip bendi	1 adet
İzmir İli Narlıdere İlçesi Yabanyemişi Deresi Tersip Bendi İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Narlıdere İlçesi Gürler Caddesi ve Civarı Atıksu Şebeke İnşaatı İşi		*Gürler Caddesi,yıldırım kemal caddesi,yenikale sokak,Ferhan sokak,yosun sokak,Ali onbaşı deresi*	Ø400mm ECBB boru	37.62
			Ø500mm ECBB boru	1,882.76
			Ø600mm ECBB boru	55.19
			Ø315mm PE 100 boru	684.43
Narlıdere Sahilevleri Muhtelif Sokaklar ve Güzelbahçe Siteler 426 Sokak Atıksu Kanalizasyon İnşaatı İşi	Sahilevleri	Hızır reis sokak,çağlar yücel sokak,sülün sokak,asım bezirci sokak,levent sokak,kılıç ali sokak,zeybek sokak,	Ø300mm ECBB boru	618.67
			Ø300mm HDPE boru	310.33
			TOPLAM İMALAT:	**3,589.00**

2012 YILINDA ALİAĞA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR
Karaköy-Belenbaşı-Dağkızılca-Aşık Veysel Kısımları Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması		*Karaköy*	Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması	1 adet
Torbalı Yazıbaşı Mahallesi, Aliağa Karaköy Köyü, Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyuları ve Kemalpaşa Gökkaya Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Enerji Temini		*Karaköy Köyü*	İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Aliağa İlçesi İçmesuyu İnşaatı	Siteler		Ø110mm DF boru	4,942.00
Çıtak, Güzelhisar ve Karakuzu Köyleri (Aliağa İlçesi) - Kozbeyli ve Çakmaklı Köyleri (Foça İlçesi) - Emiralem Beldesi ve Süleymanlı Köyü (Menemen İlçesi) - Barbaros Köyü (Urla İlçesi) İçmesuyu İnşaatı İşi		*Çıtak, Güzelhisar Karakuzu Köyleri*	Ø75mm HDPE (10 Atü)	10,204.30
			Ø110mm HDPE (10 Atü)	1,256.64
			Ø160mm HDPE (10 Atü)	2,949.63
			Ø100mm DF (idare malı)	1,211.56
			Ø150mm DF (idare malı)	935.62
			Ø225mm HDPE (10 Atü)	249.64
			200m3'lük içmesuyu depo onarımı	1 adet
Çaltılıdere Köyü (Aliağa İlçesi) Foçaköy Evleri (Bağarası Foça İlçesi) İçmesuyu İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
Aliağa Helvacı Beldesi İçmesuyu İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**21,749.39**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islahı İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
İzmir İli Aliağa İlçesinde İmar Planlı Alanlardaki Dere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bayındır Hasköy Köyü, Menderes Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Torbalı Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi	Hasköy Köyü		İçmesuyu Terfi Merkezine Elektrik Temini	1 adet
İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1,İle Yakapınar Köyü Y2,Kızılcaova Köyü K2 İle Bornova Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı		*Söğütören Köyü Yakapınar Köyü Kızılcaova Köyü*	Su Sondaj Kuyusu	3 adet
Rüştü Şardağ Caddesi Yağmursuyu Terfi Merkezi,Elifli İçmesuyu Kuyusu ve Süleymanlı Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini	Elifli Köyü		İçmesuyu Kuyusu Enerji Temini	1 adet
İzmir İli Bayındır İlçesi Hisarlık Köyü H1, Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2, Menderes İlçesi Yeniköy Y2, Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1, Torbalı İlçesi Ayrancılar S1 ve S3, Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı		*Yeşilova Köyü*	Su Sondaj Kuyusu	1 adet
Su Sondaj Kuyularına Motopomp ve Saç Kabin Temini		*Söğütören Köyü Yakapınar Köyü Kızılcaova Köyü*	Su Sondaj Kuyularına Motopomp ve Saç Kabin Temini	3 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bayındır İlçesi Çiftçigediği ve Çınardibi Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi		*Çiftçigediği Çınardibi Köyleri*	Ø75mm HDPE (10 Atü)	7,288.65
			Ø110mm HDPE (10 Atü)	2,193.19
			Ø160mm HDPE (16 Atü)	677.27
			Ø100mm DF (idare malı)	2,354.89
Bayındır İlçesi Hasköy Mahallesi ve Elifli Köyü ile Torbalı İlçesi Aslanlar ve Taşkesik Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi	Hasköy Mahallesi	*Elifli köyü,*	Ø75mm HDPE(10 Atü)	3,009.19
			Ø110mm HDPE(10 Atü)	918.54
			Ø110mm HDPE(16 Atü)	2,831.00
			Ø160mm HDPE(10 Atü)	1,460.27
			75m3'lük İçmesuyu depo onarımı	1 adet
Bayındır İlçesi Havuzbaşı Köyü ile Torbalı İlçesi Demirci Köyü İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı İşi		*Havuzbaşı Köyü*	Ø110 mm HDPE (10 Atü)	1,066.00
			TOPLAM İMALAT:	**21,799.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bayındır İlçesi Çamlıbel Köyü Kanalizasyon Şebeke ve Fosseptik İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
Bayındır İlçesi Yakapınar Köyü Fosseptik İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

2012 YILINDA FOÇA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bornova Eğridere Köyü, Menemen Uğur Mumcu Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Foça Kozbeyli Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi		*Kozbeyli Köyü*	İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Çaltılıdere Köyü (Aliağa İlçesi) Foçaköy Evleri (Bağarası Foça İlçesi) İçmesuyu İnşaatı		*Mimoza sokak,palmiye sokak,*	Ø63mm HDPE (16 Atü)	1,590.20
			Ø75mm HDPE (16 Atü)	84.30
			Ø110mm HDPE (10 Atü)	587.42
			İdare Malı Ø150mm DF	1,682.08
Çıtak, Güzelhisar ve Karakuzu Köyleri (Aliağa İlçesi) - Kozbeyli ve Çakmaklı Köyleri (Foça İlçesi) - Emiralem Beldesi ve Süleymanlı Köyü (Menemen İlçesi) - Barbaros Köyü (Urla İlçesi) İçmesuyu İnşaatı İşi		*Akasya sokak,Atatürk caddesi,Burak reis sokak,Çamlık sokak,Gül sokak,Karacadağ sokak,karanfil sokak,lale sokak,Leylak,Manolya,Melisa,Menekşe, Merdivenli,Nilüfer,Orkide,Palmiye,Papatya,Sahil caddesi,Sarmaşık,Selman, Kardelen,Balkır sitesi,Nergiz,Pınar sitesi, Senakent sitesi,Zambak,Zeytinlik sokaklar*	Ø75mm HDPE (10 Atü)	7,653.22
			Ø110mm HDPE (10 Atü)	942.48
			Ø160mm HDPE (10 Atü)	2,212.22
			Ø100mm DF (idare malı)	908.67
			Ø150mm DF (idare malı)	701.71
			Ø225mm HDPE (10 Atü)	187.70
			TOPLAM İMALAT:	**16,550.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı		*Bağarası Çakal Deresi*	B=3.00m H=1,50m B.A. Menfez	6.00
			B=2.00m H=1,25m B.A. Menfez	14.65
			B.A Kanat duvarı	1.68
			Yatak düzenlenmesi	39.67
Yeni Foça İlçesi Dere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi		*Yeni Foça*	Ø500mm ECBB	58.14
			Ø300mm ECBB	116.97
			ızgaralı kapalı kutu menfez	947.86
			taş duvar	1,157.03
			betonarme u kesit	2,500.00
			Dere kenarına profil korkuluk yapılması	474.00
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi		*Yeni Foça*	Betonarme Kutu Menfez	49.50
			TOPLAM İMALAT:	**5,365.50**

Yeni Arıtma Tesislerinin İnşaatı

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir İli Foça İlçesi Bağarası Atıksu Arıtma Tesisi Havalandırma Havuzu İnşaatı işi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR
İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören Köyü S1,İle Yakapınar Köyü Y2,Kızılcaova Köyü K2 İle Bornova Beşyol Köyü B2 ve Kemalpaşa Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı	Yenmiş Köyü		Su Sondaj Kuyusu	1 adet
Torbalı Yazıbaşı Mahallesi, Aliağa Karaköy Köyü, Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyuları ve Kemalpaşa Gökkaya Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Enerji Temini	Gökkaya Köyü	*Gökkaya Köyü*	İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini	1 adet
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Yakaköy Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi	Yakaköy		İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini	1 adet
İzmir İli Bayındır İlçesi Hisarlık Köyü H1, Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2, Menderes İlçesi Yeniköy Y2, Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1, Torbalı İlçesi Ayrancılar S1 ve S3, Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
Kemalpaşa İlçesi Sütçüler Mahallesi Atıksu Terfi Merkezi Elektrik Temini	Sütçüler		Atıksu Terfi Merkezi Elektrik Temini	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Kemalpaşa Nif Dağı Kaynakları İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi	Nif Dağı	*Nif Dağı Kaynakları*	Ø200mm İdare Malı DF	20,567.00
Kemalpaşa İlçesi ile Örnekköy Mahallesi ve Yukarı Kızılca Beldesi İçmesuyu Şebeke Ve İletim Hatları İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi(Sazaklar Membaları ile 500m³ DM2 Arası)	Ören Beldesi	*Sazaklar Membaları ile 500m³ DM2 Arası*	Ø63mm HDPE boru	94.89
			Ø100mm DF boru	327.37
			Ø150mm DF boru	2,597.46
			Ø150 Çelik boru	14.47
Kemalpaşa İlçesi Sarılar, Vişneli, Akalan ve Yeşilyurt Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi		*Sarılar, Vişneli, Akalan Yeşilyurt Köyleri*	Ø75mm HDPE 10 ATÜ	26,845.93
			Ø75mm HDPE 16 ATÜ	1,995.93
			Ø160mm HDPE 10 ATÜ	4,847.03
			Ø160mm HDPE 16 ATÜ	2,243.08
			Ø110mm HDPE 10 ATÜ	9,938.19
			Ø250mm çelik boru	16.00
			100m3'lük içmesuyu depo onarımı	2 adet
			150m3'lük içmesuyu depo onarımı	1 adet
			75m3'lük içmesuyu depo onarımı	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**69,487.35**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Kemalpaşa İlçesi Yenmiş-Nazar-Çinili Köyleri ile Çınar Mahallesi Atıksu İnşaatı İşi	Çınar	*Yenmiş-Nazar-Çinili Köyleri*	Ø300mm ECBB	4,645.00
Kemalpaşa İlçesi Sütçüler ve Yenmiş Köylerinin Atıksu Hatlarının Kemalpaşa Kollektörüne Aktarılamsı ve Pompa İstasyonu İnşaatı		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
Kemalpaşa İlçesi Cumalı Köyünün Atıksu Şebekesi Yapılması ve Yeni Yapılacak Olan Fosseptiğe Bağlanması ile Yeşilköy'de Atıksu Şebekesinin Mevcut Fosseptiğe Bağlanması İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**4,645.00**

2012 YILINDA MENDERES İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

Hizmet Binaları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Tel Çit İnşaatı İşi		*Tahtalı Barajı*	betonarme direkli tel çit	4.740
			giriş kapısı	6 adet
			TOPLAM İMALAT:	**4,740.00**

Su Kuyusu Araştırma, Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR
İzmir İli Bayındır İlçesi Hisarlık Köyü H1, Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2, Menderes İlçesi Yeniköy Y2, Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1, Torbalı İlçesi Ayrancılar S1 ve S3, Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı		*Yeniköy Y2*	Su Sondaj Kuyusu	1 adet
İzmir İli Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S8(Ömür) İçmesuyu Kuyusu Enerji Temini ve Karşıyaka İlçesi Cumhuriyet Pompa istasyonu Güç Yükseltilmesi İşi	Gümüldür Beldesi		İçmesuyu Kuyusu Enerji Temini	1 adet
İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi		*Gümüldür Beldesi S3,S4, Pirentepe P1,*	Su Sondaj Kuyusu	3 adet
Bayındır Hasköy Köyü, Menderes Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Torbalı Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi	Yeniköy Bahçecik		İçmesuyu Terfi Merkezine Elektrik Temini	1 adet
Menderes İlçesi Tahtalı Barajı Havzası 2,3 ve 4 nolu Güvenlik Kulübeleri Elektrik Temini		*Tahtalı Barajı Havzası*	Güvenlik Kulübeleri Elektrik Temini	1 adet
İzmir İli Menderes İlçesi Efemçukuru Köyü İçmesuyu Sondaj Kuyusuna Elektrik Temini		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Beldesi İçmesuyu Şebeke (Sayaç 1-2) ve İletim Hattı İnşaatı İşi		*Cumhuriyet caddesi,1238,1236,1191,1234,1232, 1228,1195,1191,1230,1193,8101,kamil eser caddesi,1260,1264,1272,1085, 1087,1218,1226,1222,1189,1220,1226, 8103,1224,1202,1150,1153,1149 29 ekim caddesi,1151,1152,1147, 1145,1134,1157,1148,1128,1142, 1130,1159,1158,1156,1134, 1186,1169,1168,1166,1162 sokaklar*	Ø110mm HDPE	10.799,59
			Ø500mm DF	3.073,52
			Ø400mm DF	3.201,28
			Ø160mm HDPE	1.702,61
Menderes İlçesi Şaşal,Efemçukuru,Küner,Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi	Şaşal Efemçukuru Küner,Ataköy	*Harmanyeri sokak,cumhuriyet caddesi,5602,5607,ılıpınar ,Atatürk sokak,5610,5605,5604,cumhuriyet sokak,4103/1,5612,5606,4106/1,köyyolu sokak,5609,5613,bağ yeri,claros bulvarı, Taşaltı,çapar sokaklar*	Ø75mm HDPE(10 Atü)	27.639,15
			Ø400mm çelik boru ile yatay delgi	40,00
			Ø110mm HDPE(10 Atü)	7.418,84
			Ø110mm HDPE(16 Atü)	793,31
			Ø160mm HDPE(10 Atü)	3.650,98
			Ø225mm HDPE(10 Atü)	817,73
			Ø250mm çelik boru	21,00
Menderes İlçesi Değirmendere Beldesi ve Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi	Yeniköy Bahçecik Mahallesi	*Değirmendere Beldesi*	Ø32mm HDPE	2.819,45
			Ø63mm HDPE 16 ATÜ	2.035,59
			Ø110mm HDPE 10 Atü	15.370,11
			Ø160mm HDPE 10 Atü	124,06
			50m3'lük içmesuyu depo bakım ve onarımı	1 adet
Menderes İlçesi Özdere Beldesi İçmesuyu Şebeke (Sayaç 3-4-5-6) Ana Dağıtım Hatları Yapımı İnşaatı İşi	Özdere Beldesi	*2215,çetin yetiştiren,2249,2288,2270,2209,2272,2205, 2211,2276,2276/1,2280,2217,2219,2221, 2223,2278,2282,2253,2251,2286,288 ateş,2288,290,243,2273,273,2241,292, 294,310,275,312,271 sokaklar*	Ø110mm HDPE-100(10 Atü) boru	37.752,37
			Ø160mm HDPE-100(10 Atü) boru	1.630,87
			Ø300mm DF(idare malı)	2.536,32
Menderes İlçesi Değirmendere Beldesi ve Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu İnşaatı İşi			Ø400mm çelik boru ile yatay delgi	40,00
			TOPLAM İMALAT:	**121.466,78**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Menderes Özdere Orta Mah. 29 Ekim Cad. 8003 ve 8004 Sok. Yağmursuyu İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı	Ataköy Kurudere, Karakuyu Kışla Deresi	*Ataköy Kurudere, Karakuyu Kışla Deresi*	B=3.00m H=1,75m B.A. Menfez	27.00
			B.A Kanat duvarı	12.90
			Yatak düzenlenmesi	123.10
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi	Künerlik		Betonarme Kutu Menfez	25.00
			TOPLAM İMALAT:	**188.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Menderes İlçesi Gölcükler Bölgesi Atıksu Kanalı İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
Menderes İlçesi Efemçukuru Köyü Atıksu Şebeke Hatları İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
Menderes İlçesi Değirmendere Köyü Atıksu Şebeke ve Toplayıcı Hatları İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Yeni Arıtma Tesislerinin İnşaatı

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Menderes İlçesi Özdere Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi			Atıksu Arıtma Tesisi	1 adet
İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Temini İşi			Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Temini	1 adet
Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattı İnşaatı			Karasal deşarj hattı boru döşeme	203.00
Özdere AAT Alanı Enerji Nakil Hattı Tadilatı İşi			Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Nakil Hattı Tadilatı	1 adet
XLPE Kablo Alımı İşi			Özdere Atıksu Arıtma Tesisine Kablo alımı	3,000.00
			TOPLAM İMALAT:	**3,203.00**

2012 YILINDA MENEMEN İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2012

Hizmet Binaları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Karabağlar,Bornova,Menemende Ambar,Arşiv ve İstinat Duvarı Yapımı				
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Rüştü Şardağ Caddesi Yağmursuyu Terfi Merkezi,Elifli İçmesuyu Kuyusu ve Süleymanlı Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini		*Süleymanlı Köyü*	İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini	1 adet
Bornova Eğridere Köyü, Menemen Uğur Mumcu Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Foça Kozbeyli Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi	Uğur Mumcu		İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini	1 adet
Menemen İlçesi Seyrek Su Deposu Elektrik Temini ve Ege-koop Villakent 1000m3 lük Depo Elektrik Temini İşi				
Menemen İlçesi Seyrek Köyü Deposu Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi		*Seyrek Köyü*	Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi	1 adet
İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi		*Alaniçi Köyü A1*	Su Sondaj Kuyusu	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Çıtak, Güzelhisar ve Karakuzu Köyleri (Aliağa İlçesi) - Kozbeyli ve Çakmaklı Köyleri (Foça İlçesi) - Emiralem Beldesi ve Süleymanlı Köyü (Menemen İlçesi) - Barbaros Köyü (Urla İlçesi) İçmesuyu İnşaatı İşi		*Emiralem Beldesi Süleymanlı Köyü*	Ø75mm HDPE (10 Atü)	3,826.61
			Ø110mm HDPE (10 Atü)	471.24
			Ø160mm HDPE (10 Atü)	1,106.11
			Ø100mm DF (idare malı)	454.34
			Ø150mm DF (idare malı)	350.86
			Ø225mm HDPE (10 Atü)	93.61
			100m3'lük içmesuyu depo onarımı	1 adet
Menemen İlçesi Asarlık Beldesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları İnşaatı İşi	Asarlık Beldesi	Adnan menderes caddesi,533,534,532,531,530,516,Burhan Özfatura caddesi,526,503,504,506.507, 508,524,519,520,518,521,522,523, 517,552,555,549,548,1,548,527,528 529,543,545,546,547,550,500 20,13,10,19,15,Turgut Özal Caddesi,9,8, 7,5,1,2,3,4,5,14,18 sokaklar	Ø110mm HDPE	17,475.80
			Ø63mm HDPE	918.27
			Ø160mm HDPE	3,461.26
			Ø225mm HDPE	788.62
			Ø400mm DF	561.76
			Ø300mm DF	570,55
			Ø250mm DF	2,435.29
Menemen İlçesi Maltepe İçmesuyu Şebeke ve Seyrek-Villakent İletim Hattı Yapım İşi	Maltepe Seyrek-Villakent	Kubilay caddesi,45 sokak,46 sokak,50sokak,53 sokak,Mehmet Akif Ersoy caddesi,61 sokak,1 sokak	Ø110 mm HDPE (10 Atü) Boru	2,230.93
			Ø200 mm DF İdare Malı Boru	3,159.38
Menemen İlçesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi		1522,Atatürk caddesi sevgi yolu, Atatürk caddesi lise yolu,6310/1,6302,6309,6310,K.Arslan,6312 Niyazi Kaplangı caddesi, yavuz,İkiçeşme,meydan,1407, 1406,1410, fabrika,kiremitçi,S.karakaplan, Yüksel kavan caddesi, sevrekköy caddesi, İzmir caddesi, Taşhan, Hasan fikri,üç eylül,sabancı,sen,Okkaoğlu,muammer Aksoy cad.,eski sanayi sitesi,	Ø110mm HDPE 100 (10Atü)	34,000.86
			Ø160mm HDPE 100 (10Atü)	2,875.18
			Ø63 HDPE (16 ATÜ)	19.96
			Ø400mm DF	549.71
			Ø500mm DF	245.04
			Ø300mm DF	569.99
			Ø600mm DF	19.96
			Ø225mm HDPE 100 (10Atü)	2,043.55
			Ø600mm çelik boru	12.75
Ege-Koop Villakent Konutları 1000m³'lük İçmesuyu Depo ve Şebeke İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
Menemen K5 Pompa İstasyonu Yapım İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**77,671.08**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Menemen Mermerli, Ahihıdır, Camikebir, Seydinnasrullah Mah. Muh. Sokak Yağmursuyu Dere Islah İnşaatı İşi		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0,00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Menemen İlçesi Asarlık Çayı ve Koyundere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşi		*Asarlık Çayı ve Koyundere*	Ø1000mm PVC	3.012,94
			betonarme u kesit	3.805,51
			taş duvar	4.146,30
			Dere kenarına profil korkuluk yapılması	10.902,00
Gediz Nehri Kıyısında Tahkimat Yapılması İşi		*Gediz Nehri*	istifsiz taş dolgu	8.725 ton
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı		*Türkelli deresi*	B=2.00m H=1.50m Ç.H. Taş duvar ve B.A Taban kaplamalı kanal	255,00
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi		*İğnedere telekler*	Betonarme Kutu Menfez	75,00
			TOPLAM İMALAT:	**22.196,75**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bornova,Menemen Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Atıksu Kanalizasyon İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
Menemen Alaniçi Köyü Kanalizasyon İnşaatı		*Yer Teslimi Yapıldı*		
Menemen Plastik Organize Sanayi Bölgesi Kanalizasyon Deplasman İnşaatı İşi		*Plastik Organize Sanayi Bölgesi*	Ø300mm ECBB	1.681,48
			Ø1000mm ECBB	909,11
			TOPLAM İMALAT:	**2.590,59**

2012 YILINDA SELÇUK İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Selçuk İlçesi Pamucak Turizm Alanı İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi		*Pamucak Turizm Alanı*	idare malı Ø100mm DF	2,208.20
			idare malı Ø300mm DF	2,613.84
			Ø300mm çelik boru	8.70
			TOPLAM İMALAT:	**4,830.74**

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir İli Selçuk İlçesi S1 ve S2, Menderes İlçesi Gümüldür Beldesi S3 ve S4, Menderes İlçesi Pirentepe P1, Karabağlar İlçesi Tırazlı Köyü T1, Menemen İlçesi Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı İşi		*S1 ve S2*	Su Sondaj Kuyusu	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**4,830.74**

2012 YILINDA SEFERİHİSAR İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi S1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı		*Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi*	Su Sondaj Kuyusu	1 adet
			TOPLAM İMALAT:	**0,00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Seferihisar İlçesi Gölcük ve Gödence Köyleri İçmesuyu İletim Hatları İnşaatı İşi		***Kesin Hesaptan Gelen Ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0,00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı	Ulamış Mah.	*Hırsızalmaz deresi*	B=2.00m H=1.00m B.A. Menfez	11,50
			B.A Kanat duvarı	2,18
			Yatak düzenlenmesi	151,32
İzmir Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2.Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı	Payamlı Bengiler	*6222, 6224,6290 Sokaklar*	Dere kenarına profil korkuluk yapılması	3.356,00
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi		*1550/2 Sokak*	Betonarme Kutu Menfez	25,00
			TOPLAM İMALAT:	**3.546,00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Seferihisar İlçesi Muhtelif Sokaklarda Atıksu Şebekesi Yapılması İnşaatı İşi		*90,91/2,92/2,91/8,91/5,93/1,93/2,88/9,88/1,97,89/1,83/6,2172,1025/2,1025/1,1051,1080,1062,1078,1552,1551,1551/4,1551/5,1037,1044/1 Sokaklar*	Ø300mm ECBB	17.892,73
			Ø400mm ECBB	406,27
Ürkmez İlçesi Mersinalan Mahallesi 6048 Sokak ve Çevresine Ait Atıksu Şebeke İnşaatı İşi	Mersinalan	*6048 Sokak*	Ø300mm ECBB	438,00
			TOPLAM İMALAT:	**18.737,00**

Yeni Arıtma Tesislerinin İnşaatı

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi			Atıksu Arıtma Tesisi	1 adet
Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Temini İşi				
			TOPLAM İMALAT:	**0,00**

2012 YILINDA TORBALI İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Bayındır Hasköy Köyü, Menderes Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezleri ile Torbalı Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi		*Dağkızılca Köyü*	İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini	1 adet
İzmir İli Bayındır İlçesi Hisarlık Köyü H1, Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2, Menderes İlçesi Yeniköy Y2, Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1, Torbalı İlçesi Ayrancılar S1 ve S3, Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı		*Ayrancılar S1,S3*	Su Sondaj Kuyusu	2 adet
Torbalı Yazıbaşı Mahallesi, Aliağa Karaköy Köyü, Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyuları ve Kemalpaşa Gökkaya Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Enerji Temini	Yazıbaşı Mahallesi		İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini	1 adet
Yazıbaşı Kısmı Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması		*Yazıbaşı Kısmı*	Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması	1 adet
Karaköy-Belenbaşı-Dağkızılca-Aşık Veysel Kısımları Su Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması		*Dağkızılca köyü*	Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması	1 adet
Su Sondaj Kuyularına Motopomp ve Saç Kabin Temini		*Helvacı köyü,orman köyü*	Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılması	2 adet
İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar İçmesuyu Terfi Merkezi ve Kemalpaşa İlçesi Sarıçalı Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini		***Kesin hesaptan gelen ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0,00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Menderes İlçesi Şaşal,Efemçukuru,Küner,Ataköy-Torbalı İlçesi Yeşilköy-Karabağlar İlçesi Tırazlı-Bornova İlçesi Gökdere-Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi	Yeşilköy	*6424.6424.1.6425.6426,fatih s.mehmet caddesi, eski aydın 7040,5 sokak,6423,sokak,4 sokak,3 sokak,2 sokak,7039 sokak,6422 sokak, 6427 sokak,6427/1 sokak 6427/2 sokak,6427/3, Menderes caddesi ,oğlananası,7041 sokak,7042 sokak, 7043 sokak,7044 sokak,7045 sokak*	Ø75mm HDPE(10 Atü)	11.055,66
			Ø400mm çelik boru ile yatay delgi	16,00
			Ø110mm HDPE(10 Atü)	2.967,54
			Ø110mm HDPE(16 Atü)	317,30
			Ø160mm HDPE(10 Atü)	1.460,39
			Ø225mm HDPE(10 Atü)	327,09
			Ø250mm çelik boru	8,40
Bayındır İlçesi Havuzbaşı Köyü ile Torbalı İlçesi Demirci Köyü İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı İşi		*Demirci Köyü*	Ø110 mm HDPE (10 Atü)	1.066,00
Bayındır İlçesi Hasköy Mahallesi ve Elifli Köyü ile Torbalı İlçesi Aslanlar ve Taşkesik Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi		*Aslanlar Taşkesik Köyleri*	Ø75mm HDPE(10 Atü)	3.009,19
			Ø110mm HDPE(10 Atü)	3.276,02
			Ø110mm HDPE(16 Atü)	1.932,79
			200m3'lük İçmesuyu depo onarımı	1 adet
İzmir İli Torbalı İlçesi Yazıbaşı Beldesi ve Kuşçuburun Mahallesi İçmesuyu Şebeke İkmal İnşaatı İşi	Kuşçuburun Mahallesi	*Namık kemal,9402,Atatürk cad.,cemal gürsel cad.,9411,selin,9422,556,567,Mevlana, Nafiz alp Yörük cad.,zambak,mimoza,leylak,Balkar cad.,şahin,morgül,barış manço,kırkızı,nergiz,abdi ipekçi cad. , Sülün,Marmara,kanarya sokaklar,*	Ø110mm HDPE	6.581,39
			Ø160mm HDPE 10 Atü	330,90
			Ø225mm HDPE 10 Atü	391,11
			Ø300 DF boru	3.530,22
Torbalı İlçesi Subaşı, Kırbaş, Naime ve Tulum Mahalleleri İçmesuyu İletim ve Şebeke Hattı İnşaatı İşi	Subaşı, Kırbaş Naime Tulum	*İzmir caddesi,Osman dirik parkı,162,160,166,164,129,156,141,137, 117,144,8514,8516,8508,134,128,132, 176,307,338,336,332,369,314,371,310, 320,331,324,334,312,316,346,348,317, 305,309,340,352,330 sokaklar*	Ø150mm DF	1.003,27
			Ø200mm DF	185,41
			Ø250mm DF	5.625,48
			Ø300mm DF	3.017,88
			Ø500mm Çelik boru	33,30
			Ø75mm HDPE	271,66
Torbalı İlçesi Atalan, Göllüce ve Bülbüldere Mahalleleri İçmesuyu İletim ve Şebeke Hatları İnşaatı İşi		***Kesin hesaptan gelen ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**46.407,00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Torbalı Tepeköy Mahallesi Atıksu Kollektör İnşaatı İşi	Tepeköy		Ø300mm BB	183,29
			Ø400mm BB	307,3
			Ø800mm BB	18,34
			Ø1200mm BB	522,07
Torbalı İlçesi Torbalı, Alpkent, Ertuğrul, Tepeköy ve Muratbey Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı İşi	Alpkent, Ertuğrul, Tepeköy Muratbey	*3049,3047,3043,3062,3060,3035,4512, 3058,3055,1029,1031,1033,1016,1020, 1022,1037,1016,1039,1006,1018,1043, 3014,5053,5078,5061,5059,5063,5067, 5069,5071,5075,5082,5084,5077,5092, 5088,1024,5058,5040,5197,3010,3101, 3076,3024,3021,3067,3057,3059 sokaklar*	Ø300mm ECBB	59.477,87
			Ø400mm ECBB	5.705,72
			Ø500mm ECBB	1.646,64
			Ø600mm betonarme boru	1.122,22
			Ø800mm betonarme boru	888,86
Torbalı İlçesi Pancar Beldesi ve Yeni Bulgurca Yerleşim Yerlerinin Atıksu Şebeke ve Kollektör Hatlarının Arıtma Tesisine Aktarılması ve Pompa İstasyonu İnşaatı İşi		*Pancar Beldesi ve Yeni Bulgurca Yerleşim Yerleri*	Ø200mm ECBB boru	7.473,74
			Ø300mm ECBB boru	1.907,83
			TOPLAM İMALAT:	**79.253,88**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
			TOPLAM İMALAT:	**0,00**

2012 YILINDA URLA İLÇESİNDE YAPILAN İMALATLAR

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçindeki İçmesuyu Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Urla Zeytinalanı, İçmeler, Torasan Mahalleleri İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi	Zeytinalanı, İçmeler, Torasan	*Özbek caddesi,güzel sokak,619,6111/1,6112,536,pınar dede, 557,534,565,564,598,566,593,kemal Ertan Caddesi 591 551 521 563 538 550,561,548,545,543,540,531,554,1172 Mavice sokak,4215/3,4215/11,3001/1*	Ø110mm HDPE	111.664,82
			Ø160mm HDPE	10.179,72
			Ø225mm HDPE	7.491,75
			Ø250mm DF	2.630,91
			Ø300mm DF	5.113,07
			Ø350mm DF	83,53
Urla Merkez, Çeşmealtı ve İskele Mahalleleri İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı İşi	Merkez, Çeşmealtı İskele	*14 sokak,11 sokak, ,8 sokak, Yalı caddesi 175 169 243/ 2 243/ 1 harbiye caddesi,242/1,243/3,263 Kısmet sokak,gürgen,75.yıl cumhuriyet caddesi,hasan tümerk caddesi, sokak,20 sokak,denizli caddesi,38 sokak,zümrüt,mimoza,altın,çınar,Tümer Goncagül,deniz,16/3,160,200,200/1,179 188,187,186,180,183,172,170,174, 189,198,197,196,195,194/1,190,202 204,212,205,ören caddesi,161 sokaklar*	Ø100mm DF	98.494,37
			Ø150mm DF	10.770,83
			Ø200mm DF	2.789,97
			Ø300mm DF	2.437,49
			Ø400mm DF	200,99
			Ø250mm DF boru	256,35
Çıtak, Güzelhisar ve Karakuzu Köyleri (Aliağa İlçesi) - Kozbeyli ve Çakmaklı Köyleri (Foça İlçesi) - Emiralem Beldesi ve Süleymanlı Köyü (Menemen İlçesi) - Barbaros Köyü (Urla İlçesi) İçmesuyu İnşaatı İşi		*Barbaros Köyü*	Ø75mm HDPE (10 Atü)	3.826,61
			Ø110mm HDPE (10 Atü)	471,24
			Ø160mm HDPE (10 Atü)	1.106,11
			Ø100mm DF (idare malı)	454,34
			Ø150mm DF (idare malı)	350,86
			Ø225mm HDPE (10 Atü)	93,61
Urla İlçesi 2.Kısım İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi		*Mareşal Fevzi çakmak,2036 sokak,2034 sokak*	Ø300mm DF	1.601,05
			Ø500mm DF	1.398,26
			TOPLAM İMALAT:	**261.415,88**

Yağmursuyu ile Kanalizasyon Şebekesinin Ayrılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Urla İlçesi Zeytinalan Mahallesi 5225/1, 5223, 5222/3 ve Kalabak Mahallesi 3289 Sokakları Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi		***Kesin hesaptan gelen ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Dere Yataklarına Su ve Teressubat Bentleri Yapılması

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir Metropol Alan İçindeki Muhtelif Derelerin 1.Etap Dere Islah İnşaatı		*İmalatlar devam ediyor*		
Urla ve Narlıdere İlçelerindeki Tabaklar ve İbrahimağa Derelerinin Islah İnşaatı		*Yer Teslimi Yapıldı*		
İzmir Muhtelif İlçelerde Dere Yol Geçişi Yapılması İnşaatı İşi	Dadaş kent	*Dadaş Kent*	Betonarme Kutu Menfez	50.00
			TOPLAM İMALAT:	**50.00**

İzmir Metropol Alanı Sınırları İçinde Kanalizasyon Yatırımları

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
İzmir İli Urla İlçesi 2.Etap Atıksu Kanalı İnşaatı İşi		***Kesin hesaptan gelen ödeme***		
İzmir İli Urla İlçesi Barbaros Köyü Atıksu Şebeke Hatları İnşaatı İşi		***Kesin hesaptan gelen ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

Yeni Arıtma Tesislerinin İnşaatı

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR (mt)
Urla Atıksu Arıtma Tesisine Ait Deşarj Hattı Üzerinde Bulunan Kaçakların Tamiri İşi		***Kesin hesaptan gelen ödeme***		
			TOPLAM İMALAT:	**0.00**

2012 YILINDA MUHTELİF İÇMESUYU HAT REVİZYONU VE BORU ALIMI

Muhtelif İçmesuyu Hat Revizyonu ve Boru Alımı

İŞİN ADI	MAHALLE	CADDE / SOKAK	CİNS	MİKTAR(mt)
Muhtelif İçmesuyu Hat Revizyonu ve Boru Alımı İşi			Muhtelif çaplarda içmesuyu borusu	515.675
			TOPLAM İMALAT:	**515.675**

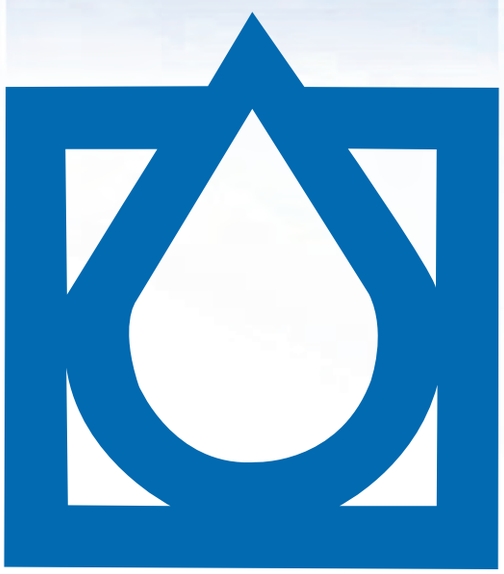

İZSU

ETÜD VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 15.02.2012 tarih ve M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/01 sayılı İZSU Genel Kurul Kararı ile Projeler Dairesi Başkanlığı'nın kurulması sonrasında yeniden yapılanmıştır. Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü, Harita ve Yeraltı Şube Müdürlüğü aynı karar gereği kurulan Etüd ve Planlama Şube Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ile beraber Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı altında teşkilatlanmışlardır.

İZSU Genel Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve M.35.1.İBB.5.01.-050.01.04/08 sayılı kararıyla Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile çalışma, usul ve esaslarını içeren İZSU Teşkilat Yönetmeliğinin 30. maddesinde Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 42.maddesine istinaden hazırlanan Etüd ve Plan Daire Başkanlığı çalışma yönergesi 15.11.2012 tarih ve M.35.0.İBB.05.01.11.04/713 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı iş ve işleyişini idaremizin kuruluş kanunu olan 2560 sayılı yasa, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5018 sayılı Kamu Yönetimi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 2942/4650(D) Kamulaştırma Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile ilgili yönetmelik ve yönergelere dayanarak yürütmektedir.

Daire Başkanlığımız İZSU'nun görev alanı içerisindeki mevcut ya da planlanan içme suyu şebekelerine, kanalizasyon şebekelerine, yağmursuyu ve dere ıslahlarına esas altyapılar ile baraj, arıtma tesisi, depo, pompa vb. tesisler ile hizmet binaları gibi üst yapı tesislerinin yapım ve işletimine yönelik; gereken etüdlerin yapılması, gayrimenkullerin temin edilmesi, ölçü ve harita işlerinin yürütülmesi, çalışmaların arşivlenerek sorgulanmasının sağlanması için İZSU altyapı bilgi sistemine aktarılmasının gerçekleştirilmesini 4 Şube Müdürlüğü ve 39 adet personel ile yürüten bir harcama birimidir.

Buna göre;

Etüd ve Planlama Şube Müdürlüğü

-İdarenin işletiminde bulunan altyapı ve üstyapı tesislerinin mevcut durum tespitini yapmak, gelen talepler doğrultusunda İdarenin kendi imkanları ile yapabileceği mevcut kanalizasyon, mevcut içme suyu şebekelerine bağlanabilecek kısa metrajlı hatların etüdlerinin ve ön projelerini yaparak ilgili birime gönderilmesini sağlamak,

-Yeni açılacak su kuyuları, baraj ve kaynak suyu iletim hatları ile gereken tesislerin ve benzeri gelen taleplerin yersel tüm tetkik ve etüdlerinin yapılmasını sağlamak,

-Dere yataklarına ilişkin gelen taleplerin etüdlerinin yapılarak gereksinimlerin tespit edilmesi ve dere ıslah ya da temizlik konusunda gereğinin yapılması için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

-İlgili birimin talebi üzerine yüzeysel su kaynaklarının Mutlak Koruma Alanı içinde kalan taşınmazları kamulaştırmak,

-İdare birimlerince gereksinim duyulan taşınmazların, kamulaştırmasını, tahsisini, irtifak hakkı tesisi kurulmasını, devrini ve satın alma işlemlerini yapmak, tapu dairelerinde tescil işlemlerini yürütmek,

-İdarenin emlak işlemlerini yürütmek ve İdarenin sahip olduğu taşınmazları kayıt altına almak

Harita ve Yer altı Tesisleri Şube Müdürlüğü

-Harita ve Yer altı tesisleri hizmetlerini yürütmek, projeye esas ve yapımı planlanan tesislerin arazi ve mülkiyet araştırmalarını yapmak, gerekli ölçümlerin alınmasını sağlamak içme suyu, atık su ve yağmursuyu havzalarının planlanması ve işletimine esas harita ve harita bilgilerinin üretilmesini sağlamak,

-İlgili birimlerce kontrollüğü yürütülen projelere ve bu projelere göre yapımı tamamlanmış tesislere ait iş sonu projelerinin harita kontrol faaliyetlerini yürütmek,

-İdarenin orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak ilgili İdare birimleri tarafından istenilen alanların halihazır haritalarının ve kamulaştırma planlarının yapılmasını sağlamak,

-Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerden gelen imar planları yapım ve değişiklilerine altyapı tesisleri ile uyumu yönünden (İdarenin ilgili birimlerinden gelecek görüşlerle birlikte) İZSU görüşü vermek,

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

-İdaremizin planlama, inşaat, işletme ve altyapı görüşü hazırlama çalışmalarında birimlerin ihtiyaçlarına cevap verecek Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarını geliştirme amaçlı çalışmalar yapmak,

-Mevcut İZSU CABS'ni yürütmek, İdarenin gereksinim duyduğu konuma bağlı bilgi sistemlerini planlamak ve İZSU CABS entegrasyonunu sağlamak,

-Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki birim, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu oluşturmak ve sürekliliği sağlamak.

Daire Başkanlığı'na bağlı tüm Müdürlükleri ile de;

- ≠ Konusu ile ilgili İdare tarafından veya İdareye karşı açılan davalara ilişkin gelen bilirkişi raporlarını değerlendirerek savunmaya esas belge temin etmek ve görüş bildirmek,
- ≠ 5018 sayılı yasa kapsamında Daire Başkanlığı bütçesini oluşturmak.

EMLAK VE KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYETİ

BARAJ ALANLARI

GÖRDES BARAJI

Gördes Barajı Mutlak Koruma Alanı içine 7 adet köyün tapulaması girmekte olup kamulaştırmaya esas şahıs arazileri 2.506.938 m^2 dir. İlk etapta Mutlak Koruma Alanı içinde köy yerleşik alanı bulunan Karayakup köyü tapulamasında (1.064.480,56 m^2) kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.

Köy Yerleşim Alanında Tescil Edilen Parseller;

Karayakup Köyü : 9 Adet

Toplam 8.084,00 m2 alan İdaremiz adına tescil edilmiştir.

Karayakup Köyü: 10 Adet (hisseli)

Toplam 8.521,99 m2 alan İdaremiz adına hisseli olarak tescil edilmiştir.

Köy Yerleşim Alanında Tespit ve Tescil Davası Açılan Parseller

Karayakup Köyü : 102 Adet (180 Kişi)

Toplam 82.621,27 m2 alanın tespit ve tescil davası devam etmektedir.

Karayakup Köyü Görüntüleri







Kamulaştırmaya Esas Tespitlerin Görüntüleri





Pazarlık Görüşmeleri Görüntüleri





TAHTALI BARAJI

Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı 1737 Ha.'dır. Bu alan içinde kamu alanları ve şahıs parselleri bulunmaktadır. Kamulaştırmaya esas şahıs parselleri 728 Ha.'dır. Bugüne kadar şahıslara ait 705 Ha. alanın İdaremiz adına Tescili sağlanmıştır.

Kısa Mesafeli Koruma Alanında bulunan köy yerleşim alanı olması sebebiyle Beyköy-Eşen ve Küner-Şaşal köylerinde kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Tescil Edilen Parseller;

Menderes İlçesi Bulgurca Köyü: 13 Adet

Develi Köyü: 2 Adet

Tekeli Köyü: 1 Adet

Beyköy Köyü: 1 Adet

Değirmendere Köyü:3 Adet

Toplam 20 Adet, 277.098.62 m^2 alan İdaremiz adına tescil edilmiştir.

Beyköy Köyü: 1 Adet (hisseli)

Lember Köyü: 4 Adet (hisseli)

Bulgurca Köyü: 1 Adet (hisseli)

Küner Köyü: 11 Adet (hisseli)

Toplam 17 adet, 63.680,09 m2 alan İdaremiz adına hisseli olarak tescil edilmiştir.

Tespit ve Tescil Davası Açılan Parseller

Menderes İlçesi 11 Adet (495 Kişi)

2- ALTYAPI VE ÜSTYAPI TESİSLERİ KAMULAŞTIRMA VE TAHSİS İŞLEMLERİ

Tescil Edilen Parseller;

İlçelere Göre:

Kemalpaşa İlçesi; 14 Adet

Bayındır İlçesi; 12 Adet

Bornova İlçesi; 6 Adet

Güzelbahçe İlçesi; 4 Adet

Foça İlçesi; 8 Adet

Seferihisar İlçesi:3 Adet

Urla İlçesi:1 Adet

Torbalı:2 Adet

Toplam 50 Adet, 189.913,97 m^2 alan İdaremiz adına tescil edilmiştir.

Tespit ve Tescil Davası Açılan Parseller

Bayındır İlçesi; 1 Adet Parsel (1 Kişi)

Güzelbahçe İlçesi; 3 Adet Parsel (4 Kişi)

Kavaklıdere İlçesi; 2 Adet Parsel (4 Kişi)

Foça İlçesi; 3 Adet Parsel (5 Kişi)

Kemalpaşa İlçesi; 2 Adet Parsel (5 Kişi)

Tahsisi Yapılan Parseller;

Bayındır İlçesi; 2 Adet (Daimi Tahsis)

Seferihisar İlçesi; 2 Adet (Daimi Tahsis)

Gaziemir İlçesi; 2 Adet (Daimi Tahsis)

Çiğli: 2 Adet (Daimi Tahsis)

Toplam 8 Adet, 27.783,86 m^2 alanın İdaremiz adına daimi tahsisi gerçekleştirilmiştir.

İrtifak Tesisi Kurulan Parseller;

Kemalpaşa İlçesi; 2 Adet

Güzelbahçe İlçesi; 1 Adet

Urla İlçesi:1 Adet

Toplam 4 Adet, 2.864,09 m^2 alanın İdare adına İrtifak Tesisi kurulmuştur

2012 yılında İdare Adına Tescil olan Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Dağılımı

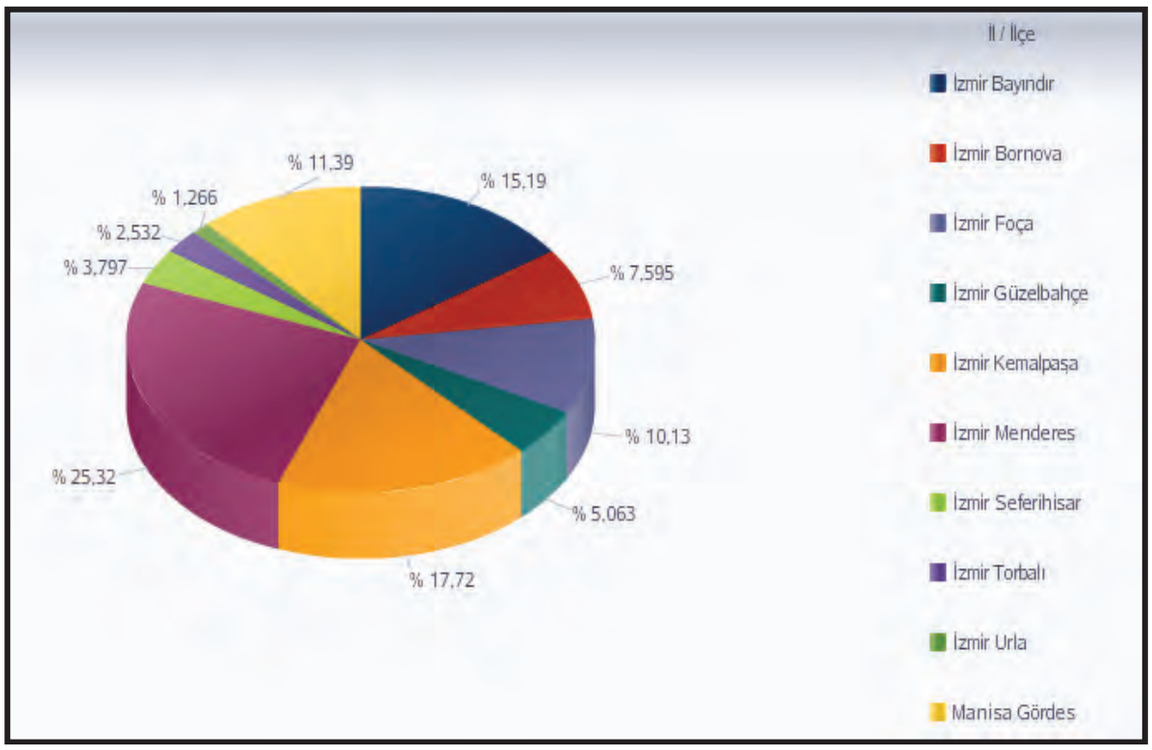

2012 yılında İdare Adına yapılan Sınırlı Ayni Haklar (İrtifak Hakkı Tesisi ve Tahsis) Dağılımı

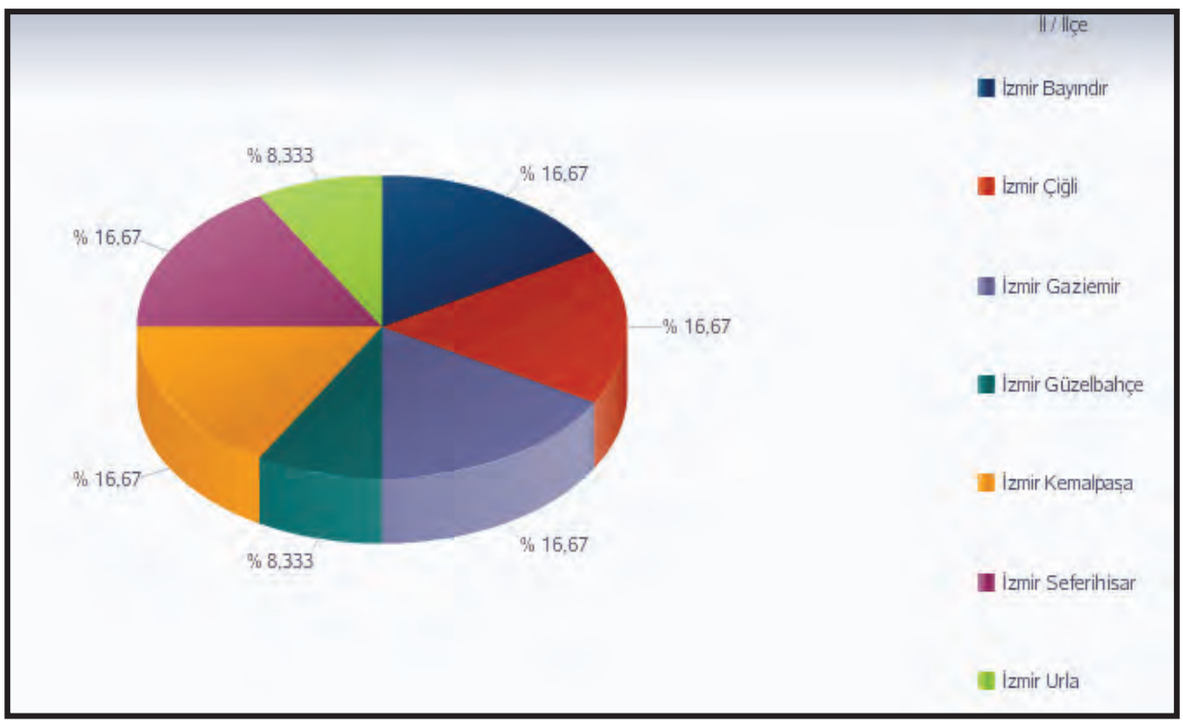

İLÇE BAZINDA PARSEL SAYILARI VE YÜZÖLÇÜMÜ TABLOSU						
İLÇELER	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ (parsel sayısı / adet)	YÜZÖLÇÜMÜ (m2)	SINIRLI AYNİ HAKLAR (Parsel sayısı/adet)	YÜZÖLÇÜMÜ (m2)	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ + SINIRLI AYNİ HAKLAR (Parsel sayısı/adet)	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ + SINIRLI AYNİ HAKLAR (yüzölçümü /m2)
ALİAĞA	15	51.959,96	1	7.349,04	16	59.309,00
BALÇOVA	21	6.874,00	1	106.00	22	6.980,00
BAYINDIR	15	38.711,96	2	2.996,34	17	41.708,3
BAYRAKLI	1	2.080,00	0	0.00	1	2.080,00
BORNOVA	25	74.362,57	6	6.704.18	31	81.066,75
BUCA	8	27.874,51	12	25.428,07	20	53.302,58
ÇİĞLİ	400	12.120.770,50	29	2.282.372,12	429	14.403.142,62
FOÇA	9	11.968,44	0	0.00	9	11.968,44
GAZİEMİR	0	0.00	4	5.206,00	4	5.206,00
GÜZELBAHÇE	7	12.946,02	8	8.641,83	15	21.587,85
KARABAĞLAR	17	2.960,00	10	12.582,58	27	15.542,58
KARŞIYAKA	67	1.094.548,27	8	384.835.00	75	1.479.383,27
KEMALPAŞA	19	72.013,00	3	726,15	22	72.739,15
KONAK	193	460.548,50	12	16.769,50	205	477.318,00

İLÇELER	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ (parsel sayısı / adet)	YÜZÖLÇÜMÜ (m2)	SINIRLI AYNİ HAKLAR (Parsel sayısı/adet)	YÜZÖLÇÜMÜ (m2)	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ + SINIRLI AYNİ HAKLAR (Parsel sayısı/adet)	TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ + SINIRLI AYNİ HAKLAR (yüzölçümü /m2)
MENDERES	725	7.054.350,74	62	423.347,80	787	7.477.698,54
MENEMEN	17	12.482,45	29	26.831,51	46	39.313,96
MURADİYE	2	1.144,00	0	0.00	2	1.144.00
NARLIDERE	7	9.266.00	5	12.440,48	12	21.706,48
SARUHANLI	1	1744.00	0	0.00	1	1.744,00
SEFERİHİSAR	9	82.522,54	3	13.013,50	12	95.536,04
SELÇUK	0	0.00	1	34.560,00	1	34.560,00
TORBALI	3	44.164,01	11	81.849,03	14	126.013.04
URLA	2	18.960,00	3	10.859,35	5	29.819,35
GÖRDES	9	8.084,00	0	0,00	9	8.084,00
TOPLAM	**1572**	**21.210.335.47**	**210**	**3.356.618,48**	**1782**	**24.566.953,95**

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYETLERİ:

İDAREMİZCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA ALTLIK OLMAK ÜZERE ÜRETİLEN FAALİYETLER

TALEP EDEN BİRİM	GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET
İZSU Genel Müdürlüğü'nün İlgili Birimleri	Mevcut İZSU Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemi'nin yürütülmesi, yeni veri girişi ve bu sistemin içindeki verinin iyileştirilmesi. (**Resim1, Resim2**)
	İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'den gelen, imalatı tamamlanan ve gaz verilen sokakların, izsu intranet ortamında "**K:\CBS_Bilgilendirme**" ortak klasöründen tüm İzsu birimlerine paylaşımı ve güncellenmesi.
	İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen, Kentsel Dönüşüm Alanlarının, **K:\CBS_Bilgilendirme** Ortak klasöründen tüm İzsu birimlerine paylaşımı ve güncellenmesi.
	İzmir Büyükşehir Belediyesinden ve İlçe Belediyelerden gelen ismi değişen sokaklar, **K:\CBS_Bilgilendirme** ortak klasöründen tüm İzsu birimlerine paylaşımı ve güncellenmesi.
	Bentley Map PowerView program lisansı ve bu programla ilgili kullanıcı eğitim alınması işi kapsamında eğitim programının yapılması ve Organizasyonun Hazırlanması.
	Bentley Map PowerView ve ProjectWise programlarının kullanıcı eğitimlerinin verilmesi. 9, 10-11, 12-13, 16-17 Temmuz 2012
İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı	Expo 2020 İzmir Alan Master Plan ve Fizibilite Çalışmaları Kapsamında, İnciraltı Alanındaki İdaremize Ait Alt Yapı Bilgilerinin Hazırlanması.
Hukuk Müşavirliği	Menemen Asarlık 541 Ada, 1 parsel üzerindeki isale hattının koordinatlı krokisinin temin edilmesi.
Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı	Resimhane Birimine, Çiğli - Karşıyaka - Bayraklı - Güzelbahçe - Narlıdere - Balçova - Karabağlar ve Konak ilçelerinin içmesuyu altyapı şebeke bilgilerinin temin edilmesi.
	Resimhane Birimindeki Bilgisayarlara Microstation ,Water, Oracle , Bentley Map PowerView , ProjectWise Programlarının Kurulması; Cell ve XML Dosyalarının Güncellenmesi ve gerekli ayarların yapılması.
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğüne Microstation - Bentley Water - Oracle Client - Bentley Map PowerView - ProjectWise Programlarının Kurulması
Projeler Dairesi Başkanlığı	"İzmir (Gördes Barajı) İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım Proje Yapımı" işi Kapsamında İstenilen Tüm Altyapı Verilerinin Hazırlanması
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı	Bostanlı, Bayraklı, Güzelyalı, Alsancak, Pasaport, Göztepe ve Mithatpaşa Bölgeleri Sahil Şeridinin Tüm Altyapı Bilgilerinin Temin Edilmesi.
	Şemikler Yaya Alt Geçidi Yapılması işi kapsamındaki söz konusu alanda Coğrafi Bilgi Altyapı Bilgi Sisteminde mevcut bulunan içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon bilgilerinin hazırlanması.
	Bornova İlçesi Ergene Mahallesi 29 Pafta, 56 Ada, 23 Parselde Yer Alan Paterson Köşkü Çevresindeki Coğrafi Bilgi Altyapı Bilgi Sisteminde mevcut bulunan içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon bilgilerinin hazırlanması.
	Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi 196 Ada, 19K-1B Pafta, 2 Parselde Yapılacak Olan Ören İtfaiye İlçe Merkez Tesisi İşi Kapsamındaki Alanda Coğrafi Bilgi Altyapı Bilgi Sisteminde mevcut bulunan içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon bilgilerinin hazırlanması.
Çiğli Belediye Başkanlığı	Çiğli İlçesi Maltepe Mahallesi 22670 ada 1,5719,5798 ve 5799 parseller üzerinde Coğrafi Bilgi Altyapı Bilgi Sisteminde mevcut bulunan içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon bilgilerinin hazırlanması.
Dilekçe	Karşıyaka İlçesi 25473, 25479 ve 25480 nolu adalar, 1 parseller üzerinde Coğrafi Bilgi Altyapı Bilgi Sisteminde mevcut bulunan içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon bilgilerinin hazırlanması.
	647/19 Sokak No:18 Buca ve Konak 2765 Sokak No:14 Konak Adreslerinde Oturan Vatandaşlara Sokaklarındaki Kanal Şebeke bilgisinin verilmesi.
	Akova Süt ve Gıda Mamulleri , Torbalı Subaşı Akyalı Mevkiinin Arşivimizde Bulunan Kuyuların Koordinatları ile Şebeke Hatlarının Temin edilmesi.

MEVCUT SİSTEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALAR

İhtiyaç analizleri ve kullanım kolaylıkları ile veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik araştırma ve inceleme çalışmaları kesintisiz devam ettirilmektedir.

CABS İçmesuyu

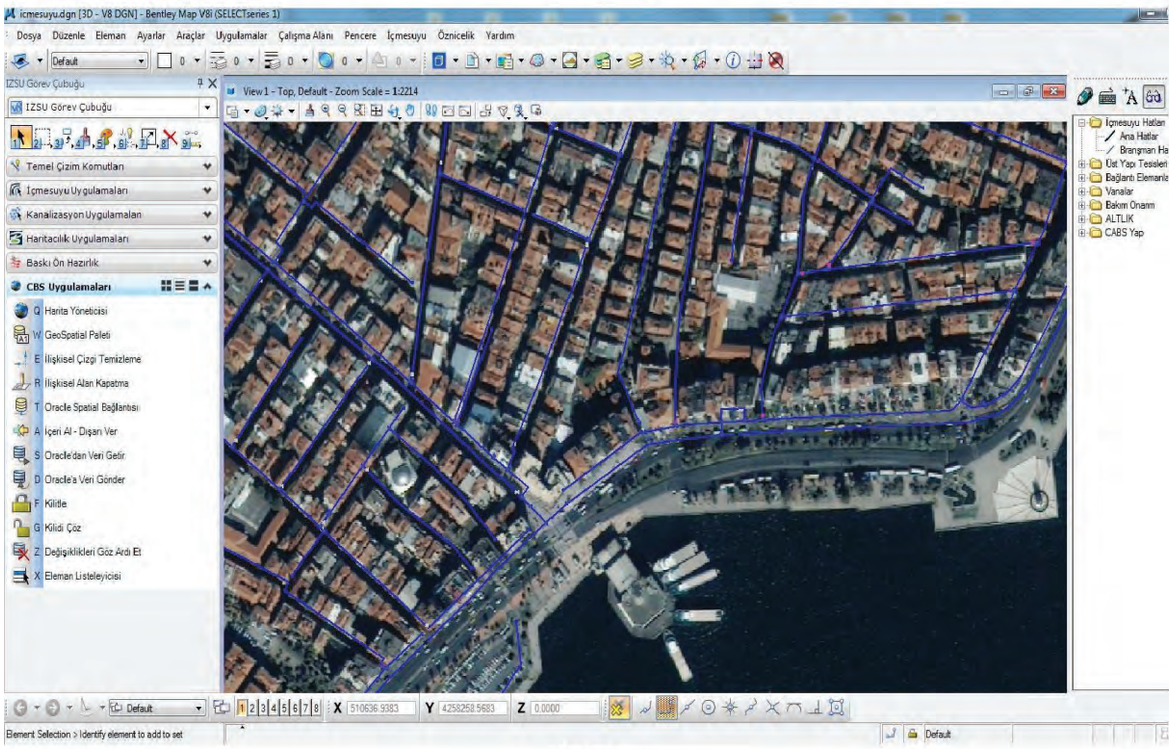

Resim 1

CABS Atıksu

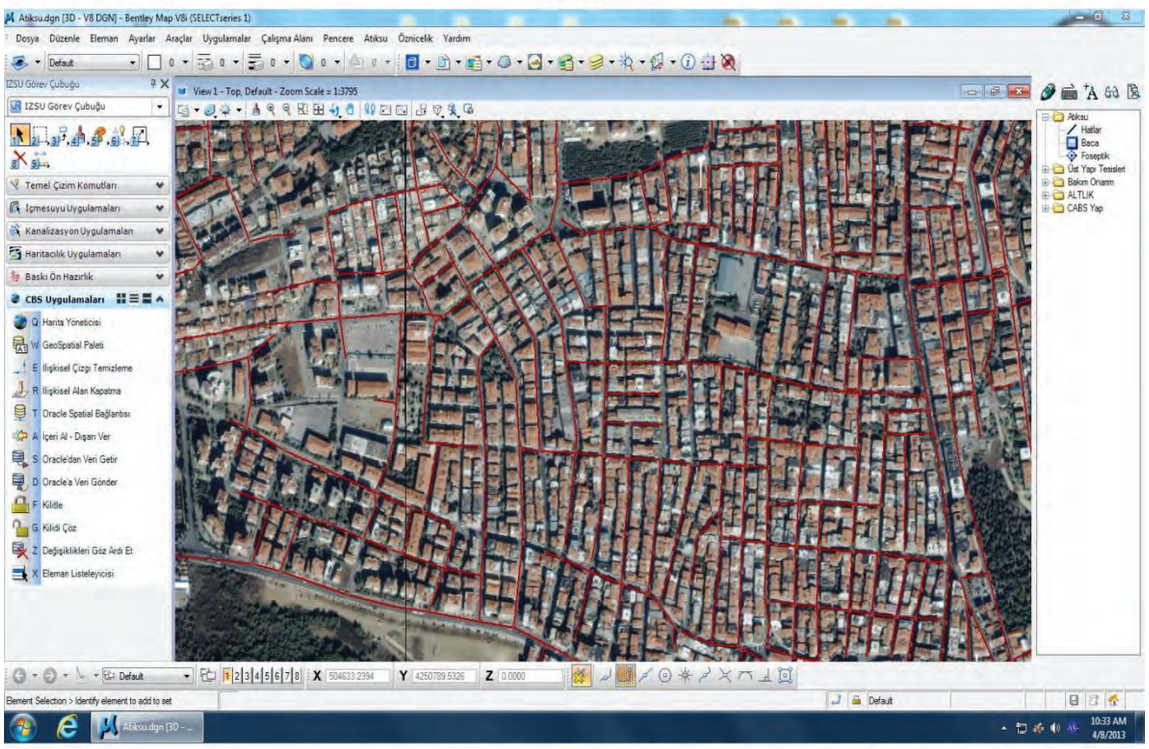

Resim 2

ETÜD VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Kanalizasyon Etüdü



Dere Etüdü



İçmesuyu Etüdü



Yağmursuyu Etüdü



Kanalizasyon Etüdü

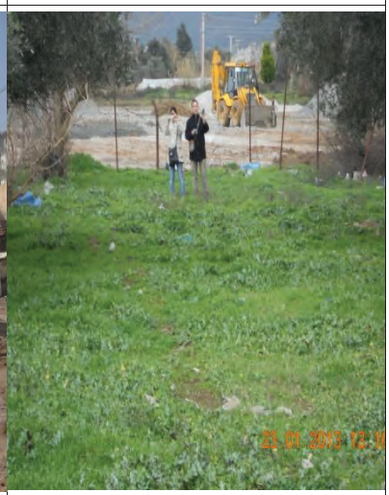

Kuyu Etüdü



Dere Etüdü



Kanalizasyon Etüdü



Yağmursuyu Etüdü

2012 YILI FAALİYETLERİ

- İzmir Büyükşehir sınırları içerisindeki İlçe, Belde, Köy yerleşim alanlarındaki yağmursuyu, atıksu, kuyu yeri, içmesuyu ve dere etüdlerini yapmak kısa mesafeli atısu ve içmesuyu projelerini hazırlayıp yapımı için ilgili Daire Başknlıklarına göndermektir.

- İzmir Büyükşehir sınırları içerisindeki özel tüzel ve kamu kuruluşlarının taleplerini değerlendirmek için talep edilen konu arazide bizzat inceleme ve araştırma sonucu arazide tespit ettiğimiz eksik ve aksaklıkları resimlemek ve raporlamak suretiyle sorunun çözümüne yönelik çalışmaları yapmak.

- Yağmursuyu talepleriyle ilgili olarak öncelikle yeni açılan yollardaki yüzeysel sular ve mevcut sokaklardaki olumsuzluklar olarak iki kısımda etüdü yapıldığı, söz konusu ızgara taleplerinin ve hizmetin hızlı bir şekilde vatandaşa ulaşımının sağlanması İlçe Belediye'lerinin görev alanı kapsamındaki yolların halihazır durumnun imar planına uygunluğu, mülkiyete esas terklerinin yapılıp yapılmdığı, su basman kotlarına esas olacak yol kırmızı kotunun belirlenmesi ve gerekli reglajın yapılmasını sağlatmak ve İlçe Belediyeleriyle işbirliği içerisinde sorunları çözmek.

- Atıksu talepleriyle ilgili olarak yapılan etüdler iki kısımdan oluşmaktadır; Birincisi yol kırmızı kotuna getirilen yol terkleri yapılmış yollara yapılacak tesisin oluşumunu sağlamak kısa mesafe ise projesini hazırlayıp ilgili Daire Başkanlığına göndererek yapımını sağlamaktır. İkincisi ise mevcut şebekenin yenilenmesi doluluk oranlarının tespiti deplasmanlarının mülkiyet içerisindeki tesisin kaldırılması, kollektörlere bağlanan tali hatların ve incelemelerinin yapılması.

- Kuyu etüdleriyle ilgili olarak vatandaşın mülkiyetindeki yerlerde açılacak kuyuların araştırılması yerleşim yerlerindeki su ihtiyacını karşılamak için yeni açılacak kuyuların yer tespitlerinin yapılması mülkiyet araştırmaları ve ihtiyaç tespitinin yapılması.

- İçmesuyu taleplerinde atıksuda olduğu gibi iki kısımda etüd yapılmakta, Birinci kısım yeni açılan yollar ikinci kısımda mevcut yolla yapılan içmesuyu etüdleri, etüdleri yapılan sokakalarda kısa mesafedeki şebekelerin projeleri hazırlanarak ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilerek imalatın yapımı gerçekleştirilmekte olup, uzun mesafeli şebekelerin etüdleri ise projesi yapılmak üzere proje grubuna iletilmektedir.
- Derelerle ilgili talepler ise;
1- Dere yatakları ile ilgili taşkın etüdü yapmak, İdaremize gelen her türlü talebi yerinde etüd ederek taşkının nedenleri ve çözüm yolları tespit etmek,
2-Dere yatakları üzerinde inşası talep edilen (menfez-köprü gibi) hertürlü sanat yapısı talebi ile ilgili ilk etüd çalışması yapmak ve vatandaşlardan, muhtelif kamu kurumları, yerel yönetimler ve valilkten gelen hertürlü talebin yerinde yapmak ve incelemek
3-Dere geçişlerine büz inşa edilmesi ve muhtelif sanat yapılarının uygunluğunun tespitini enerji ve tabii kaynaklar bakanlığının genelgesi doğrultusunda etüdlerin yapılması
4-Dere yataklarına yapılan muhtelif işgal ve müdahalelerin tespiti ve engellemesi çalışmaları
5-Dere yataklarının temizlenmesi taleplerinin değerlendirilmesi, mahkeme ve dava dosyalarına görüş yazısı yazmak, iptal edilen dere yatakları ile ilgili görüş oluşturmak, hidrolik veriler temin etmek

Yukarıda bahsedilen taleplerin değerlendirilmesi ve etüd edilmesinin dışında çözüm konusundaki görüşlerimizin idareye rapor edilmesi.

Aylara Göre Gelen Evrak Sayısı
Nisan: 92 Adet
Mayıs: 154 Adet
Haziran: 191 Adet
Temmuz: 211 Adet
Ağustos: 187 Adet
Eylül: 151 Adet
Ekim: 161 Adet
Kasım: 247 Adet
Aralık: 419 Adet
Evraklara Göre Yapılan Aylık Etüd Faaliyetleri
Nisan: 9 Etüd yapıldı
Mayıs: 34 Etüd yapıldı
Haziran: 21 Etüd yapıldı
Temmuz: 60 Etüd yapıldı
Ağustos: 51 Etüd yapıldı
Eylül: 44 Etüd yapıldı
Ekim: 44 Etüd yapıldı
Kasım: 66 Etüd yapıldı
Aralık: 54 Etüd yapıldı
2012 Yılı Projesi Hazırlanan Yeni Kanalizasyon Şebekesi İmalatı ve Deplasman İşi Miktarı
9.567 m
2012 Yılı Projesi Hazırlanan Yeni Su Şebekesi İmalatı ve Deplasman İşi Miktarı
8.932 m
2012 Yılı Su Sondaj Kuyu Etüdü Çalışması Miktarı
24 Adet









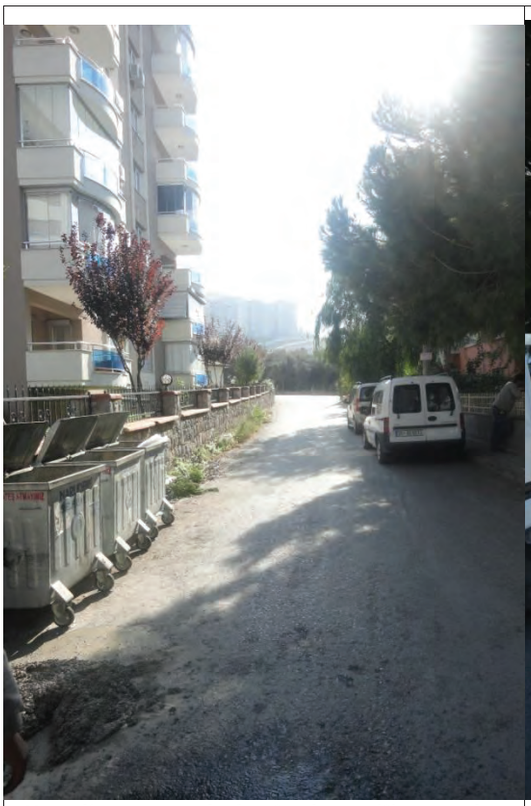

Kanalizasyon şebekesi talep edilen canlar sokak (Kanalizasyon Etüdü)



Ev kolu bağlantısı yapılacak olan taşınmaz.



Pınar Caddesi yağan yağmur sonrası oluşan göllenmeler



Fincancılar Çarşı Yağmursuyu Etüdü

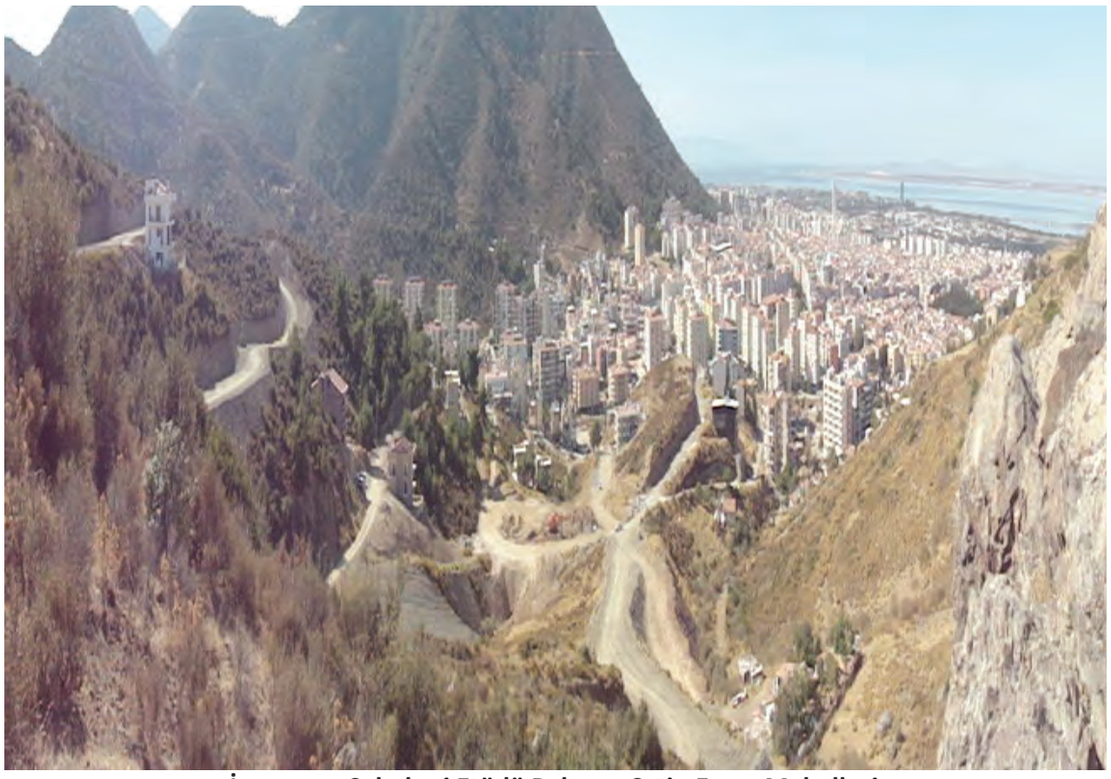

İçmesuyu Şebekesi Etüdü Balçova Çetin Emeç Mahallesi



Su Sondaj Kuyusu Etüdü Menemen Kesikköy



Dere Etüdü Aliağa İlçesi, Karakuzu Köyü Kaplan Deresi



Kemalpaşa İlçesi, Bağyurdu, Yiğitler Deresi



Torbalı İlçesi, Kaplancık yolu, Arapkahve Deresi

HARİTA VE YER ALTI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012 YILI RAPORU (FAALİYET)
İdaremizce Yürütülen Proje ve Yapım İşlerinin Harita Çalışmalarının Kontrollük Faaliyeti

SIRA NO	FAALİYET ADI	İŞİN TANIMI KAPSAMI	İŞİN MİKTARI	(FİZİKİ) GERÇEKLEŞTİRME
1	Karşıyaka İlçesi Cahar Dudayev Bulvarı Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol	2070.61 m.	100%
2	Karşıyaka İlçesi, Cahar Dudayev Bulvarı ve 8291 Sokak Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol	656.72 m.	100%
3	Küçük Çiğli Anadolu Caddesi 8704 - 8714/2 - 8715 - 8716 Sokaklar Yağmursuyu Şebeke İnşaatı	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol	1203.88 m.	100%
4	İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Kanal Proje Kontrol		100%
5	Menderes İlçesi Efemçukuru Köyü Atıksu Şebeke Hatları İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	4121.43 m.	100%
6	Bayındır İlçesi Teknik Amirlik Binası Yeri Kamulaştırması	Kamulaştırma		
7	İBB Sorumluluk Alanına Giren Yerleşimlerin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atıksu Şebeke Projelerin Hazırlanması	Kanal Proje Kontrol	2070.61 m.	100%
8	İzmir İline Bağlı Bulunan Buca, Karabağlar, Gaziemir, Menderes, Torbalı, Bayındır, Selçuk, İlçelerinin Cadde Sokak ve Bulvarlarından Kanal Bakım, Onarım İnşaatı Yapılması	Kanal İnşaat Kontrol	6754.64 m.	100%
9	Zeytinlik Mahallesi Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol	1468.51 m.	100%
10	Bornova Homeros Vadisi Kererli, Çatalpınar, Bedesten, Deli Süleyman, Kocapınar kaynakları İçmesuyu İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	5500.57 m.	100%
11	Aliağa İlçesi Helvacı Beldesi İçmesuyu İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	31904.64 m.	100%
12	Kemalpaşa İlçesi ile Örnekköy Mahallesi ve Yukarıkızılca Beldesi İçmesuyu Şebeke ve İletim Hatları İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	62200.08 m.	100%
13	Aliağa İlçesi İmar Planlı Dere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı	Dere İnşaat Kontrol		100%
14	Torbalı İlçesi Tepeköy Mahallesi Atıksu Kolektör İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol		100%
15	Bayındır (Merkez) İlçesi İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması İşi	Su Proje - Kontrol	4690.41 m.	100%
16	K5 Pompa İstasyonu Yapım İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol		100%
17	İzmir İli Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Foça, Aliağa, Menemen, Bornova, Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır ve Selçuk İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması	Yağmursuyu Proje Kontrol		100%
18	İzmir İli Foça İlçesi Bağarası AAT Havalandırma Havuzu İnşaatı	Arıtma Tesisleri - Kontrol		100%
19	Çamlıbel Köyü Kanalizasyon Şebeke ve Fosseptik İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	2161.48 m.	100%
20	Ana Kuşaklama Hattı Arap Deresi Sifon Geçişine İlave Kanalizasyon İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol		100%
21	Kemalpaşa İlçesi Sütçüler ve Yenmiş Köylerinin Atıksu Hatlarının Kemalpaşa Kollektörüne Aktarılması ve Pompa İstasyonu İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	7787.56 m.	100%

SIRA NO	FAALİYET ADI	İŞİN TANIMI KAPSAMI	İŞİN MİKTARI	(FİZİKİ) GERÇEKLEŞTİRME
22	İzmir İli Urla İlçesi Barbaros Köyü Atıksu Şebeke Hatları İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	10689.79 m.	100%
23	İzmir İli Urla İlçesi Çeşmealtı - İskele - Zeytinalanı Kesiminde Yer Alan Dere Yataklarının Düzenlenme Projelerinin Hazırlanması	Dere Proje Kontrol		100%
24	Özdere Arıtma Tesisi Kamulaştırılması	Kamulaştırma		100%
25	Kemalpaşa İlçesi Yenmiş - Nazar - Çinili Köyleri ile Çınar Mahallesi Atıksu İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol		100%
26	Konak İlçesi Küçükada Mahallesi 1433 - 1139 - 2228 - 2225 - 3558 - 3559 - 3557 Sokaklar Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol	1342.54 m.	100%
27	Buca İlçesi Çamlıpınar Mahallesi 254 Sokak Mevcut Yağmursuyu Izgarası Tamiratı ve Çamlıkule ve Çamlıpınar Mahalleleri Mevcut Kanalların Düzenlenmesi	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol		100%
28	Karşıyaka İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1831/15 Sokak Yağmursuyu İnşaatı	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol	102.63 m.	100%
29	Torbalı İlçesi Subaşı, Kırbaş, Naime ve Tulum Mahalleleri İçmesuyu İletim ve Şebeke Hatları İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	30556.35 m.	100%
30	İzmir İli Aliağa İlçesinde İmar Planlı Alanlardaki Dere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı İşinin Kubaj Hesaplarının Kontrol Edilmesi	Dere İnşaat Kontrol		100%
31	Bornova İlçesi Çimentaş Alanı ile Kemalpaşa, Altındağ Merkez ve Mevlana Mahalleleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	3422.52 m.	100%
32	Bayındır İlçesi Yakapınar - Alankıyı - Kızılcaova - Yeşilova(Çıplakköy) - Karahalilli - Furunlu Köyleri ve Çırpı Beldesi ile Selçuk İlçesi Zeytinköy ve Barutçu Köyleri İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	Su Proje - Kontrol	42386.15 m.	100%
33	Selçuk İlçesi Pamucak Turizm Alanı İçmesuyu Şebeke İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	4874.96 m.	100%
34	Torbalı Atıksu Arıtma Kamulaştırması	Kamulaştırma		100%
35	Karşıyaka Pompa İstasyonu İdari Bina ve Atölye Binası İnşaatı	Kontrollük		100%
36	Özdere Tedaş Trafo Merkezi Yeri Kamulaştırması	Kamulaştırma		100%
37	Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattı Uygulama Projesi	Su Proje - Kontrol		100%
38	Narlıdere İlçesi Gürler Caddesi ve Civarı Atıksu Şebeke İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	4690.79 m.	100%
39	Melez Deltası Taşkın Koruma Duvarı İnşaatı	Kontrollük	404.76 m.	100%
40	Menderes İlçesi Özdere Beldesi İçmesuyu Şebeke (Sayaç 1 - 2) ve İletim Hattı	Su İnşaat - Kontrol	38292.41 m.	100%
41	İzmir İline Bağlı Bulunan Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Bornova, Kemalpaşa, Foça, Aliağa, Menemen İlçelerinin Cadde Sokak ve Bulvarında Kanal Bakım Onarım İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	17917.59 m.	100%
42	Aliağa ve Foça İlçelerinden Geçen Derelerin Islah Projelerinin Hazırlanması	Dere Proje - Kontrol	16300. m.	100%

SIRA NO	FAALİYET ADI	İŞİN TANIMI KAPSAMI	İŞİN MİKTARI	(FİZİKİ) GERÇEKLEŞTİRME
43	Bornova, Karşıyaka, Narlıdere İlçelerinde Homeros Bölgesi, Bostanlı ve Kebap Derelerinde Mevcut Hasarlı Tersip Bentlerinin Onarılması, Yeni Tersip Bendi ve Taş Duvar İmalatı Yapılması İnşaatı	Kontrollük		100%
44	Kızılağaç Köyü Otuzbirler Mahallesi 127 Ada 11 Parsel, 177 Ada 1 Parsel , 171 Ada 1 Parselde Bulunan Fosseptiklere Vidanjörün Girebilmesi İçin Yol Güzergah	Kontrollük		100%
45	Bornova ve Yeşildere İçmesuyu Ana İletim Hatları Yenileme Projelerinin Hazırlanması	Su Proje - Kontrol	11000. m.	100%
46	Ürkmez İlçesi Mersinalan Mahallesi 6048 Sokak ve Çevresine Ait Atıksu Şebeke İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	451.42 m.	100%
47	Egekent Koop Villakent Konutları 1000 m3'lük İçmesuyu Depo ve Şebeke İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol		100%
48	Bayındır İlçesi Havuzbaşı Köyü ile Torbalı İlçesi Demirci Köyü İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	2500.00 m.	100%
49	Gaziemir 2096 Ada 6 Parsel Tahsisi ve 1441 Ada 49 Parsel Güneyindeki Pompa İstasyonu Kamulaştırması	Kamulaştırma		100%
50	İzmir Çiğli Arıtma Tesisi Atölye & Ambar Binası İnşaatı	Arıtma Tesisleri - Kontrol		100%
51	İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Yakaköy Köyü İçmesuyu Kuyusuna Elektrik Temini	Kontrollük		100%
52	Bozyaka T-20 H.Edip Adıvar Caddesi Arası ve Bornova 1594/1 Sokak ile 252 Sokak Arası İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	1926.55 m.	100%
53	Çiğli İlçesi Egekent Mahallesi 8050 - 8836 - 8827 Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	1296.70 m.	100%
54	İzmir İli Torbalı İlçesi Yazıbaşı Beldesi ve Kuşcuburun Mahallesi İçmesuyu Şebeke İkmal İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	12108.02 m.	100%
55	Menemen İlçesi Asarlık Beldesi İçmesuyu Şebeke Ve İletim Hatları İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	42633.02 m.	100%
56	Gaziemir Dökü Sahası Etrafı Betonarme Direkli Kafes Tel İle Himaye Çiti ve Betonarme Duvar İnşaatı	Kontrollük		100%
57	Karşıyaka İlçesi İnönü ve Onur Mahallesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol		100%
58	Foça İlçesi Horozgediği, Bağarası, Yenibağarası, Ilıpınar ve Yeniköy Köyleri ile Aliağa İlçesi Uzunhasanlar, Şehitkemal ve Yukarışehitkemal Köyleri İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	Su Proje - Kontrol		100%
59	Bayraklı İlçesi R.Şevket İnce ve Muhittin Erener Mahallelerinin Muhtelif Sokaklarında Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol	3068.34 m.	100%
60	Gediz Nehri Kıyısında Tahkimat Yapılması	Dere İnşaat - Kontrol		100%
61	Altındağ Merkez Mahallesi 4499 Sokak Devamı Atıksu Kanal İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	537.26 m.	100%
62	Çiğli İlçesi 2. Jet Hava Üssü Yolu Atıksu Deplasman İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	361.10 m.	100%
63	Menemen İlçesi Plastik Organize Sanayi Bölgesi Kanalizasyon Deplasman İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	2640.36 m.	100%

SIRA NO	FAALİYET ADI	İŞİN TANIMI KAPSAMI	İŞİN MİKTARI	(FİZİKİ) GERÇEKLEŞTİRME
64	Karşıyaka İlçesi Atakent Mahallesi Gölet ve Çevresi Yağmursuyu İnşaatı	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol	78.42 m.	100%
65	Güzelbahçe İlçesi Kahramandere Mahallesi 753, 763, 747, 844 Sokaklar Kanalizasyon İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	654.94 m.	100%
66	Narlıdere İlçesi Limanreis Mahallesi Türker ve Limanreis Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol		100%
67	Foça İlçesi Ilıpınar Köyü Atıksu Bertaraf Tesisi Alanının İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması	Kontrollük	5 adet sondaj	100%
68	Menderes İlçesi Çamönü, Çakaltepe, Karakuyu, Kısıkköy, Efemçukuru ve Çileme Köyleri İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	Dere İnşaat - Kontrol	11740.00 m.	100%
69	Mehmet Akif Caddeleri ile Şirinyer İstasyon ve Pazaryeri Çevresi Yağmursuyu İnşaatı	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol	813.22 m.	100%
70	İzmir İli, Güzelyalı Terfi Merkezinin Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması	Kontrollük	2 adet sondaj	100%
71	İzmir İli Gaziemir İlçesi Sarnıç Bölgesi Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması	Yağmursuyu Proje - Kontrol	78.42 m.	100%
72	İzmir İline Bağlı Bulunan Konak İlçesinin 1. Kısım Mahallelerinin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal Bakım, Onarım İnşaatı	Kanal İnşaat - Kontrol	7957.63 m.	100%
73	Torbalı İlçesi Türkmenköy, Özbey, Ahmetli, Yeniköy, Karaot, Korucuk, Ormanköy, Yoğurtçular Köyleri ve Sağlık Mahallesi, Kemalpaşa İlçesi Aşağıkızılca Mahallesi, Bornova İlçesi Eğridere Köyü, Karşıyaka İlçesi Sancaklı Köyü İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	Su Proje - Kontrol		100%
74	Hasköy (Bayındır) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Arıtma Tesisleri - Kontrol	813.22 m.	100%
75	Menderes İlçesi Değirmendere Beldesi ve Yeniköy Bahçecik Mahallesi İçmesuyu İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	38.89 m. Yatay Delgi	100%
76	İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi Terfi Merkezinin İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması	Su Proje - Kontrol	5 adet sondaj	100%
77	Narlıdere Sahilevleri Muhtelif Sokaklar ve Güzelbahçe Siteler 426 Sokak Atıksu Kanalizasyon İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	1119.17 m.	100%
78	Özdere Tedaş Trafo Merkezi Yerinin Tespiti	Kontrollük		100%
79	Torbalı İlçesi Yeniköy - Çaybaşı - Pamukyazı ve Pancar Terfi Merkezinde İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması	Su Proje - Kontrol	4 adet sondaj	100%
80	Narlıdere İlçesi 8 Pafta 1 Parselde Atıksu Arıtma Tesisi İmar Planı Değerlendirme	Kamulaştırma		100%
81	İzmir İli Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisinde Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması	Su Proje - Kontrol	2 adet sondaj	100%
82	Seferihisar İlçesi Turgut, İhsaniye, Çamtepe, Beyler, Gölçük ve Gödence Köyleri ile Urla İlçesi Demircili, Yağcılar ve Özbek Köyleri İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması - Orman İzin Evrakları Hazırlanması	Su Proje - Kontrol		100%

SIRA NO	FAALİYET ADI	İŞİN TANIMI KAPSAMI	İŞİN MİKTARI	(FİZİKİ) GERÇEKLEŞTİRME
83	Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi Toplu Konut I. Bölge Dolgu Alanları Stabilite İnşaatı	Kontrollük		100%
84	İzmir İli Konak, Karabağlar, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve Seferihisar İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması	Yağmursuyu Proje - Kontrol		100%
85	Torbalı İlçesi Karakuyu Beldesi 1689 Parselde Yer Alan Su Kuyusunun Kamulaştırılması	Kamulaştırma	1073.87 m.	100%
86	İzmir İli Merkez Dere Mahallesi 568 Adet Konut,Ticaret Merkezi, Cami, Okul, Sosyal Tesis ve Yemekhane İnşaatı ile Ada İçi Altyapı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı İçmesuyu İşi	Su İnşaat - Kontrol		100%
87	Karşıyaka, Konak, Karabağlar, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir ve Balçova İlçeleri İçmesuyu Şebeke ve Branşman Yenileme İşi	Su İnşaat - Kontrol		100%
88	TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Yeşildere Üzerinde Alsancak - Halkapınar Demiryolu Hattında Bulunan Çelik Demiryolu Köprüsü Yıkımı ve Yapımı	Kontrollük		100%
89	Çiğli Belediyesinin Ataşehir (İstasyonaltı) 8271/10 Sokağın 26K- III - B PAFTA, 21624 Ada, 1 ve 3 No'lu Parsellere Yolun Girmesi ve Altyapı Tesislerin İncelenmesi	Kontrollük		100%
90	Bornova Evka-3 Mahallesi Şeytan Deresi İçi Atıksu Kanalı Deplasmanı ile Ege Üniversitesi Kampüs İçi İtfaiye Grubu Atıksu Kanalı İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	871.70 m.	100%
91	Kırıklar Cezaevi Çevresi Yağmursuyu Kanalı İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol		100%
92	Bayraklı İlçesi Onur Mahallesi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	2112.20 m.	100%
93	Asarlık Çayı ve Koyundere Yataklarının Düzenlenmesi İnşaatı	Dere İnşaat - Kontrol	6527.37 m.	100%
94	Bornova İlçesi Yaka - Çiçekli - Kayadibi - Karaçam - Sarnıç ve Kavaklıdere Köyleri İçmesuyu Şebeke İnşaatı	Su İnşaat - Kontrol	32663.98 m.	100%
95	Karşıyaka Onur-1 Mahallesi Pompa İstasyonu	Su İnşaat - Kontrol		100%
96	Bornova İlçesi Yaka - Çiçekli - Kayadibi - Karaçam - Sarnıç ve Kavaklıdere Köyleri İçmesuyu İnşaatı Su Deposu Yeri	Su İnşaat - Kontrol		100%
97	Buca Atatürk ve Çamlıkule Mahallesi Muhtelif Sokaklar Atıksu ile Konak Vapur İskelesi Atıksu	Kanal İnşaat Kontrol		100%
98	İzmir İli 2.Kısım İlçelerinin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı	Kanal İnşaat Kontrol	23742.42 m.	100%
99	Su İnşaat Çalışmalarının Harita Kontrollüğü	Su İnşaat - Kontrol	20 adet	Kontrollük devam etmekte.
100	Kanal İnşaat Çalışmalarının Harita Kontrollüğü	Kanal İnşaat Kontrol	13 adet	Kontrollük devam etmekte.
101	Dere İnşaat Çalışmalaıının Harita Kontrollüğü	Dere İnşaat - Kontrol	8 adet	Kontrollük devam etmekte.
102	Yağmursuyu İnşaat Çalışmalarının Harita Kontrollüğü	Yağmursuyu İnşaat - Kontrol	7 adet	Kontrollük devam etmekte.
103	Su Proje Çalışmalarının Harita Kontrollüğü	Su Proje - Kontrol	3 adet	Kontrollük devam etmekte.

SIRA NO	FAALİYET ADI	İŞİN TANIMI KAPSAMI	İŞİN MİKTARI	(FİZİKİ) GERÇEKLEŞTİRME
104	Kanal Proje Çalışmalarının Harita Kontrollüğü	Kanal Proje - Kontrol	3 adet	Kontrollük devam etmekte.
105	Dere Proje Çalışmalarının Harita Kontrollüğü	Dere Proje - Kontrol	2 adet	Kontrollük devam etmekte.
106	Yağmursuyu Proje Çalışmalarının Harita Kontrollüğü	Yağmursuyu Proje - Kontrol	2 adet	Kontrollük devam etmekte.
106	Arıtma Tesislerinin İnşaat ve Proje Harita Kontrollüğü	Arıtma Tesisleri - Kontrol	4 adet	Kontrollük devam etmekte.
107	Kamulaştırma Harita Kontrollüğü	Kamulaştırma	7 adet	Kontrollük devam etmekte.
108	Diğer İşlerin Harita Kontrollükleri	Kontrollük	13 adet	Kontrollük devam etmekte.

HARİTA VE YERALTI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILLIK RAPORU (FAALİYET)

İdaremizce Yürütülen Çalışmalara Altlık Olmak Üzere Üretilen Harita Çalışmalarını İçeren Faaliyetler

SIRA NO	TALEP EDEN BİRİM	GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET
1	İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı	Gediz Deltası Koruma Alanları Üzerine Sit Sınırları işlenerek haritaların hazırlanması.
2		Çiğli Organize Sanayi Bölgesi Alanı Eşyükselti haritasının hazırlanması.
3		İzmir İli dereler ve tersip bentleri haritasının hazırlanması.
4	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı	Torbalı İlçesi Aslanlar Köyü 1751 - 1752 parsellerde kalan dere yatağı arazide ölçülerek tespit edilmesi.
5		Balçova İlçesi Ilıca Deresi'nin arazi ölçümlerinin yapılması.
6		Buca Yıldızlar Mahallesi Toplayıcı Kanalizasyon hattının orman sınırları içinde kalan kısmına ait Orman iznine yönelik harita çalışmalarının hazırlanması.
7		Harmandalı Çöp Deposuna Açılacak Olan Yol Hattının Halihazır Alımının Yapılması.
8		Torbalı İlçesi Aslanlar Köyü Deresinin Ölçülmesi.
9		Alternatif Stadyum Yerlerinin Havza İçindeki Konumunun Gösterilmesi
10		Seferihisar İlçesi Orhanlı Mahallesi 942-943 parsellerin kadastral durumlarının tespit edilerek uydu görüntüleri üzerine işlenmesi.
11		Menemen İlçesi 902 ve 903 parsellerin imar ve kadastral durumlarının incelenerek İmar Planı uygulanması halinde oluşacak kamulaştırmaların tespit edilmesi.
12		İZSU Bornova Şubesinde yapılması planlanan arşiv binasının zemin ölçümünün yapılması.
13		Bayındır İlçesinde yapılması planlanan hizmet binası yerinin zemin ölçümünün yapılması.
14		Kemalpaşa İlçesi 162 ada 2 parselin irtifak hattının zemin ölçümünün yapılması.
15		Torbalı İlçesi Bozköy 726 - 738 - 739 - 740 parsellerin mülkiyet araştırmasının yapılması.
16		Torbalı Karakuyu 1689 parselin arazi ölçümünün yapılması.
17		Bornova İlçesi Kızılay Mahallesi 240 ada 3 parselde bulunan su deposu yerinin kadastral durumunun incelenmesi.
18		Bornova İlçesi 3568 ada 3 parselin kadastral durumunun incelenmesi.
19		Torbalı İlçesi Karakuyu Köyündeki pompa istasyonu yerinin kamulaştırması işleminin kadastro kontrolünün sağlanması.
20		Torbalı İlçesi Ayrancılar Köyündeki kamulaştırma yerinin detay alımının yapılması.
21		Menderes İlçesi Şaşal Köyü 604 Parselin aplikasyonunun yapılması.
22		Güzelbahçe 1473 Parsele yapılacak terfi merkezinin plankotesinin yapılması.
23	Projeler Dairesi Başkanlığı	Kavacık Köyünde bulunan kaynaklar ile depo arasındaki iletim hattının orman içinde kalan kısmının Orman iznine yönelik harita çalışmalarının yapılması.
24		Selçuk İlçesi Pamucak Turizm Alanındaki otelleri besleyen İçmesuyu Şebeke Hattının Yenilenmesi İçin Döşenecek Hattın Orman İçinde Kalan Kısmının Orman İznine Yönelik Harita Çalışmalarının Yapılması.

SIRA NO	TALEP EDEN BİRİM	GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET
25	Projeler Dairesi Başkanlığı	Bornova Çamiçi Köyü (Homeros) Kaynaklarının Telçit Yapılması Planlanan Alanın Ölçülmesi.
26		Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı 6. Etap Tel Çit Yapımı İçin Etüt Çalışmalarının Yapılması.
27		Torbalı 270 Ada 5 Parselle, Seferihisar 272 Ada 88 - 91 Parsellerin Mülkiyet Durumlarının Tespit Edilmesi ve Plankotelerinin Hazırlanması.
28		Buca Belenbaşındaki Kuyu ve İçmesuyu Hattı Arasının Ölçülmesi.
29		Gökyaka Köyü'nün Pompa Hattının Orman İçinde Kalan Kısmının Orman İznine Yönelik Harita Çalışmalarının Yapılması.
30		Bornova İlçesi Yaka, Çiçekli ve Karaçam Köyleri Arası İletim Hattının Orman İçinde Kalan Kısmının Orman İznine Yönelik Harita Çalışmalarının Yapılması.
31		Menderes İlçesi Şaşal, Efemçukuru, Küner, Ataköy – Torbalı İlçesi Yeşilköy – Karabağlar İlçesi Tırazlı – Bornova İlçesi Gökdere – Güzelbahçe İlçesi Payamlı Köyleri İçmesuyu Hatlarının Orman Alanı İçinde Kalan Kısımlarının Orman İznine Yönelik Harita Çalışmalarının Hazırlanması.
32		Foça İlçesi Fevzipaşa Mahallesi İtfaiye Alanı Planlarının Hazırlanması.
33		Torbalı İlçesi Özbey, Ormanköy, Yoğurtçular, Kemalpaşa İlçesi Aşağıkızılca ve Karşıyaka İlçesi Sancaklı Köyleri İçmesuyu Hatlarının Orman İçinde Kalan Kısımlarının Orman İznine Yönelik Harita Çalışmalarının Yapılması.
34		Narlıdere İlçesi Ali Onbaşı Barajı Sondaj Kuyularının Orman İznine Yönelik Harita Çalışmalarının Yapılması.
35		Karşıyaka İlçesi Örnekköy Mahallesi 37793 Ada 11 Parsel Sınırları İçinde Kalan Yağmursuyu Kanalının Ölçülmesi.
36		Konak İlçesi 1507 Ada 97 Parsel Sınırları İçinde Kalan Yağmursuyu Kanalının Ölçülmesi.
37		Harmandalı Mürteci Kampı için yapılması planlanan hattın güzergah ölçümünün yapılması.
38		Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi Alanını içeren parselin sayısal hale getirilerek Kadastro Mutabakatının Sağlanması.
39		Buca İlçesi Yıldız Mahallesi Kanal Projesi İşi İçin Detay Alımının Yapılması.
40		Menemen İlçesi Emiralem - Koca köprü Deresinde Bulunan Duvarın Ölçülmesi.
41		Güzelbahçe Yelki Köyünde bulunan Derenin Ölçülmesi.
42		Çiğli İlçesi Ata Sanayi İçinde Yeni Döşenen Boru Hattının Ölçülmesi.
43		Torbalı İlçesi Ayrancılar Karayolları Sınırının ve Proje Bacalarının Aplikasyonunun Yapılması.
44		Güzelbahçe 1473 Parsel Pompa İstasyonu Plankotesinin Yapılması.
45	Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı	Foça İlçesi Ilıpınar Arıtma Tesisi Yapılması Planlanan Alanın Ölçülmesi.
46		Özdere Arıtma Tesisinin Arazi Çalışmalarının Yapılması.
47		Torbalı Arıtma Tesisinin Yan Parseli Olan 270 Ada 5 Parselinin Plankotesinin Yapılması.
48		Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi Detay Alımının Yapılması.
49		Güzelbahçe İlçesi Arıtma Tesisleri İçindeki Sondaj Yerlerinin Ölçülmesi.
50		Kemalpaşa atıksu arıtma tesisi kollektör hattı kamulaştırma planı dahilinde yapılacak değerlemeye esas harita çalışmalarının hazırlanması.
51		Ürkmez Arıtma Tesisine Kot Verilmesi

SIRA NO	TALEP EDEN BİRİM	GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET
52	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Kızılağaç Köyü Otuzbirler Mahallesi 127 Ada 11 Parsel, 177 Ada 1 Parsel, 171 Ada 1 Parselde Bulunan Fosseptiklere Vidanjörün Girebilmesi İçin Yol Güzergahının Tespit Edilmesi İçin Gerekli Harita Çalışmalarının Yapılması.
53		İzmir Körfezi Kanal Çalışmalarına Yönelik Harita Çalışmalarının Yapılması.
54		Bornova Mevlana Mahallesi Yağmursuyu Izgaralarının Detay Alımının Yapılması.
55		İzmir Körfezinde 4 Noktaya (Karaburun - Foça - Güzelbahçe - Pasaport) Meteroloji İstasyonu ve Akıntı Ölçer Kurulumuna Yönelik Harita Çalışmalarının Yapılması.
56		Sirkülasyon Kanalı İşi Kapsamında Ragıp Paşa Dalyanında GPS ile Derinlik Ölçülmesi.
57		Pompa İstasyonu İşi Kapsamında Gaziemir Kipa Yanında Arazi Ölçümü Yapılması.
58		Körfez Kanal Güzergahında Yapılan Ölçüm Noktalarının İşlenmesi.
59		Melez Deresinde Arazi Ölçümü Yapılması.
60		Bornova İlçesi Şeytan Deresinin Dere Yatağının Yeni Güzergahının Aplikasyonu Ve Detay Alımının Yapılması.
61		Menderes İlçesi Küner Köyü (Pomza Export'un olduğu bölge) Dere Dolgusunun Detay Alımının Yapılması.
62		Buca İlçesi Ali Kuşçu İ.Ö.O. Etrafında Kanal Bacalarının Ölçülmesi.
63		Körfez tarama sonrası olusturulacak "İzsu Doğa Adası" nın belirlenmesine yönelik harita çalışmalarının yapılması.
64		Gaziemir İlçesi Pompa İstasyonu Yerinin Köşe Noktalarının Aplikasyonunun Yapılması.
65		Menemen İlçesi Yahşelli Pompa İstasyonu Yerinin Detay Alımının Yapılması.
66		Konak İlçesi Hilal Mahallesi Köprü Ayaklarının Büyük Kanal Projesi İşi İçin Kanalizasyon Baca Kapaklarının Ölçülmesi.
67		Özdere TM1 Ve TM3 Terfi Merkezlerinin Arazi Ölçümlerinin Yapılması.
68		Konak İlçesi Muhtelif Kanal Ölçümünün Yapılması.
69		Karşıyaka Alaybey ve Carrefour Yanı Kanal Bacalarının Ölçülmesi.
70		Buca İlçesi Yıldızlar Mahallesinde Dereye Yapılan Müdahalenin Tespitine Yönelik Arazi Ölçümlerinin Yapılması.
71		Torbalı Oğlananası Köyü Otoban Yanı Dolgu Ölçümünün Yapılması.
72		Menderes İlçesi Çakallar Mevkiinde Derenin Ölçülmesi.
73		Gaziemir İlçesi Alke İnşaatın Ölçtüğü 2200'lük Hatta Arıza Yapılan Yerin Ölçülmesi.
74		Menderes Kısık Köyün 270 ve 271 Parsellerin Yanındaki Derenin Ölçülmesi
75	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Çiğli İlçesi KİPA Yanı 600 lük CPT Boru Hattından 2 Adet Noktanın Aplikasyonunun yapılması.
76		Menemen İlçesi Süleymanlı Piknik Alanın Olduğu Yerden Geçen İsale Hattının Aplikasyonunun Yapılması.
77		Kadifekale Selvili Pompa İstasyonu İçmesuyu Hattı İçin Arazi Ölçümünün Yapılması.
78		Manisa - Karayakup Köyü (Gördes Barajı) Bina Detay Alımlarının Yapılması.
79		Menemen İlçesi Maltepe Köyünde Değişen Güzergahın Ölçülmesi.
80		Çiğli İlçesi Ata Sanayi İçinde Yeni Döşenen Boru Hattının Ölçülmesi

SIRA NO	TALEP EDEN BİRİM	GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET
81	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Seferihisar İlçesi Ürkmez ve Payamlı Beldeleri Terfi Merkezi ile Depo Arası İletim Hattının Orman İçinde Kalan Kısımlarının Orman İznine Yönelik Harita Çalışmalarının Yapılması.
82		Bayındır İlçesi Söğütören Köyünün Depo ile Kuyu Arası Hattın Ölçülmesi.
83		Menderes İlçesi Ataköy Depo ile Kuyu Arası Hattın Ölçülmesi.
84		Tahtalı Barajı Su Alma Yapısındaki Genleşme Farkının Saptanmasına Yönelik Deformasyon Ölçülerinin Yapılması.
85		Torbalı İlçesi Karakuyu Köyündeki Kuyu Yerinin Aplikasyonunun Yapılması.
86		Menderes İlçesi Dereköy Pirentepe Mevkii ile Menderes İçmesuyu Şebekesi Arası Hattın Ölçülmesi.
87		Menderes İlçesi Çamönü Köyü İçmesuyu İletim Hattının Ormanda Kalan Kısmının Orman İznine Yönelik Harita Çalışmalarının Yapılması.
88		Torbalı İlçesi Helvacı Köyü Enerji Nakil ve İletim Hattının Ormanda Kalan Kısmının Orman İznine Yönelik Harita Çalışmalarının Yapılması.
89		Kemalpaşa İlçesi Vişneli Köyü Kaynak Suyu Yerinin Ölçülmesi.
90		Tahtalı Barajı Su Alma Yapısına Kot Verilmesi.
91		Gaziemir İlçesi ile Karabağlar İlçesi Arası İsale Hattının Ölçülmesi.
92	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Tahtalı Baraj Havzasında Kalan 9 adet kaçak yapının ölçülmesi.
93	İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı	Menderes İlçesi Özdere Kanalizasyon Tatbikat Projesi Kapsamında TM1, TM2 Ve TM3 Tahsisi İçin Onaylı İmar Planlarının Ve Kadastral Durumunun İncelenerek Koordinatlarının Temin Edilmesi.
94	KURUMSAL YAZIŞMALAR	İlgili Kamu Kurumlarınca talep edilen İmar Planı görüşlerine yönelik harita çalışmalarının yapılması. (105 adet)
95	DİLEKÇELER	Baraj Havzaları Konum Tespitine Yönelik Vatandaş Dilekçelerinin Yanıtlanması (306 adet)

PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

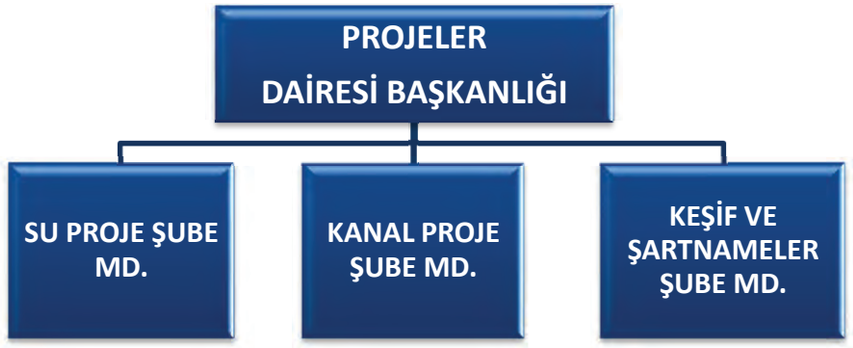

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Projeler Dairesi Başkanlığı, İZSU Genel Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/01 sayılı kararı ile kurulmuştur. İZSU teşkilat yapısına göre Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yer alan Projeler Dairesi Başkanlığı; bir Daire Başkanı ile Su Proje Şube Müdürlüğü, Kanal Proje Şube Müdürlüğü ve Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü olmak üzere 3 (üç) adet müdürlükten oluşmaktadır.

Projeler Dairesi Başkanlığının görev yetki ve sorumlulukları 18.05.2012 tarih ve M.35.1.İBB.5.01-050.01.04/08 sayılı İZSU Genel Kurulu (Meclis) kararı ile yapılan teşkilat yönetmeliğe eklenen Ek 1. maddede tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 42. Maddesine istinaden hazırlanan Projeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönergesi İZSU Yönetim Kurulunun 15.11.2012 tarih ve M.3501.İBB.5.01-11.01.04/712 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Projeler Dairesi Başkanlığı; yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, "**su temini-dağıtımı ve kentin atıksu kirliliğini önleme amaçlı planlama çalışmaları ve projeleri**" (barajların planlama raporu ve uygulama projeleri, hizmet tesisleri - içmesuyu arıtma tesisi, paket arıtma tesisi, pompa istasyonu, su deposu ambar, lojman, atıksu arıtma tesisleri, paket atıksu arıtma tesisleri, fosseptik ve terfi merkezi projeleri vb. yapıların projeleri - ile restorasyon, restitüsyon ve rölöve projeleri), "**altyapı projeleri**" (içme suyu şebekeleri, içme suyu kuyuları, atıksu şebekeleri, yağmursuyu şebekeleri, dere ıslahları) ile **enerji temini** yapılması ve yaptırılması çalışmalarını bünyesinde yeralan 3 Şube Müdürlüğü ve 55 personel ile yürüten harcama birimidir.

Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde teşkilatlanan Su Proje Şube Müdürlüğü, Kanal Proje Şube Müdürlüğü ve Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüklerince yürütülen yetki ve görevler aşağıda özetlenmiştir:

Su Proje Şube Müdürlüğü:

- İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde kurum içi ve kurum dışından gelen içme ve kullanma suyu taleplerini değerlendirerek Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yatırım programına alınan her türlü tesis ve şebekelere ilişkin plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatılmasını sağlamak,
- Proje müelliflerinin yapmış oldukları "**su temini ve dağıtımı amaçlı planlama raporu ve projeleri**" (barajların planlama raporu ve uygulama projeleri; hizmet tesisleri - içmesuyu arıtma tesisi, paket arıtma tesisi, pompa istasyonu, su deposu ambar, lojman gibi yapıların projeleri - ile restorasyon, restitüsyon ve rölöve projeleri),

"**altyapı projeleri**" (içme suyu şebekeleri, içme suyu kuyuları) ile **enerji temini** (su kuyularına ve yeni açılan kuyulara) hazırlamak veya hazırlatılmasını sağlamak,

- Yeni su kaynaklarının planlamasında ilgili Daire Başkanlıklarıyla ortaklaşa çalışmaların yapılmasını sağlamak,
- İçme suyu ve enerji temini konularında güncel gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
- 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği; kurum içi ve kurum dışından gelen imar planı çalışmalarını inceleyerek mevcut ve çalışmaları yürütülen su kaynağı, şebekesi ve tesislerine yönelik değerlendirmenin yapılmasını ve görüşün verilmesini sağlamak,

Kanal Proje Şube Müdürlüğü:

- İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde kurum içi ve kurum dışından gelen atıksu, yağmursuyu ve dere ıslah taleplerini değerlendirerek Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yatırım programına alınan her türlü tesis ve şebekelere (kanalizasyon, yağmursuyu toplama, dere ıslahı, terfi merkezi ve arıtma tesisleri) ilişkin plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatılmasını sağlamak,
- Proje müeliflerinin yapmış oldukları **kentin atıksu kirliliğini önleme amaçlı planlama çalışmaları ve projeleri**" (atıksu arıtma tesisleri, paket atıksu arıtma tesisleri, fosseptik ve terfi merkezi projeleri vb yapılar ile atıksu şebekelerinin projeleri), "**sel baskını ve taşkınlara karşı altyapı projeleri**" (yağmursuyu şebekeleri ile dere ıslahları) ile **enerji temini** (atıksu arıtma tesisi ve terfi merkezi için enerji temini) projelerini hazırlamak veya hazırlatılmasını sağlamak,
- Atıksu, dere ıslahı ve yağmursuyu yönetimi konularında güncel gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
- 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği; kurum içi ve kurum dışından gelen imar planı çalışmaları incelenerek mevcut ve yapılacak dere ıslahları ile kanalizasyon şebeke ve tesislerine yönelik değerlendirmenin yapılmasını ve görüşün verilmesini sağlamak,

Keşif ve Şartnameler Şube Müdürlüğü:

- Projeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Proje Şube Müdürlüğü ile Kanal Proje Şube Müdürlüğü'nce hazırlattırılan ve yapım ihalesine çıkılmak üzere Şube Müdürlüğü'ne gönderilen tüm projelere ait özel ve teknik şartname dosyalarının ve yapım ihalesine esas teşkil edecek yaklaşık maliyet ve şartname dosyalarını hazırlamak,
- Şube Müdürlüğüne gönderilen her türlü yapım işine ait onaylı projeler ile mahal listelerinin birbiri ile uyumunu kontrol etmek ve gerektiğinde işlerin yapılacağı yerlere gidilerek ilave tetkik ve incelemeleri yapmak,
- Onaylı projeler üzerinden metraj ve keşif cetvellerini hazırlamak ve birim fiyat ve analizlerini yapmak,
- Belirlenen birim fiyat cetvellerine uygun birim fiyat tariflerini ve tanımlarını yapmaktır.

KANAL PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI PROJELERİ

İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması		
1	Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisine ait proses hesapları ile statik hesapların ve zemin iyileştirme, inşaat, mimari, elektrik, mekanik uygulama projelerinin tetkik ve onayı yapılmıştır.
2	İzmir İli, Urla İlçesi Özbek Köyünde Yapılması Planlanan Atıksu Bertaraf Tesisi Alanının İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması	40 m zemin sondajı yapılarak alınan örneklerle lab deneyleri ve jeof.çalışmalar yapıldı.Alanın 1/1000 ölçekli jeol. haritası ve jeol. kesitleri alınarak İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlandı.
3	İzmir İli Foça İlçesi Ilıpınar KöyüAtıksu Bertaraf Tesisi Alanının İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması İşi	75 m zemin sondajı yapılarak alınan örneklerle lab deneyleri ve jeof.çalışmalar yapıldı.Alanın 1/5000 ölçekli jeol. haritası ve jeol. kesitleri alınarak İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlandı.
4	İzmir İli Güzelyalı Terfi Merkezinin Jeoteknik Etüd Rapaorunun Hazırlanması	30,6 m zemin sondajı yapılarak alınan örneklerle lab deneyleri ve jeof.çalışmalar yapıldı.Alınan örneklerden yas kimyasal analizi yapılarak, jeoteknik etüt raporu hazırlandı
5	İzmir İli Urla İlçesi Gülbahçe Mahallesi Terfi Merkezinin İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması	68,9 m zemin sondajı yapılarak alınan örneklerle lab deneyleri ve jeof.çalışmalar yapıldı.Alanın 1/1000 ölçekli jeol. haritası ve jeol. kesitleri alınarak İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlandı.
6	İzmir İli, Bayındır İlçesi Terfi Merkezinde İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması	40 m zemin sondajı yapılarak alınan örneklerle lab deneyleri ve jeof.çalışmalar yapıldı.Alanın 1/1000 ölçekli jeol. haritası ve jeol. kesitleri alınarak İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve Jeoteknik etüt raporu hazırlandı.
7	İzmir İli, Torbalı İlçesi Yeniköy, Çaybaşı, Pamukyazı ve Pancar Terfi Merkezinde İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporunun Hazırlanması	60 m zemin sondajı yapılarak alınan örneklerle lab deneyleri ve jeof.çalışmalar yapıldı.Alanın 1/1000 ölçekli jeol. haritası ve jeol. kesitleri alınarak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlandı.
8	İzmir İli Buca İlçesi Kaynaklar Mah ve Zafer Mah de Yeralan İkiş Adet Terfi Merkezine Ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporunun Hazılanması	30 m zemin sondajı yapılarak alınan örneklerle lab deneyleri yapıldı.Alanın 1/5000 ölçekli jeol. haritası ve jeol. kesitleri alınarak imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlandı.
9	Özdere Deniz Deşarjı Projesi	İleri Biyolojik Arıtma Projesine sahip Özdere Atıksu Arıtma Tesisi sonrasında nihai ortam olan denizin yüzme amaçlı kullanılması sebebiyle arıtılmış suların deniz içinde 500 m lik bir hat ile koruma bandı dışına çıkartılmasına olanak tanıyacak karada 517 m ve deniz içinde 527 m olmak üzere toplam 1044 m uzunluğunda Deniz Deşarjı projesi hazırlatılmıştır.

İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projelerinin Hazırlanması		
10	Foça Deniz Deşarjı Batimetrik, Oşinografik ve Geoteknik Araştırma Projesi	Deniz içinde arıtılmış suları koruma bandı dışına çıkartacak deşarj hattı projesi yapımı için gerekli olan "Batimetrik, Oşinografik ve Geoteknik Araştırma Projesi" tamamlanmıştır.
11	Doğanbey Derin Deniz Deşarjı Batimetrik, Oşinografik ve Geoteknik Araştırma Projesi	Deniz içinde arıtılmış suları koruma bandı dışına çıkartacak deşarj hattı projesi yapımı için gerekli olan "Batimetrik, Oşinografik ve Geoteknik Araştırma Projesi" tamamlanmıştır.
12	Seferihisar Derin Deniz Deşarjı Batimetrik, Oşinografik ve Geoteknik Araştırma Projesi	Deniz içinde arıtılmış suları koruma bandı dışına çıkartacak deşarj hattı projesi yapımı için gerekli olan "Batimetrik, Oşinografik ve Geoteknik Araştırma Projesi" tamamlanmıştır.
İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Dere Islah Projelerinin Hazırlanması		
1	İzmir İli Türkelli-Helvacı-Hatundere Atıksu İletim Hattı ve Hatun Deresi Islah Uygulama Projelerinin Hazırlanması	4 km. atıksu şebeke , 1 km. dere ıslah, 4 adet terfi merkezi projesi hazırlandı.
2	İzmir İli Aliağa ve Foça İlçelerinden Geçen Derelerin Islah Projelerinin Hazırlanması	16 km dere ıslah projesi hazırlandı.
3	İzmir Büyükşehir Sorumluluk Alanına Giren Yerleşimlerde 1. Etap Muhtelif Dere Islah Projesi Hazırlanması	25 km. dere ıslah projesi hazırlandı.
4	İzmir İli Seferihisar İlçesi Ürkmez ve Akarca Derelerinin Islah.Proj.Haz	12 km dere ıslah projesi hazırlandı.
5	İzmir İli Urla İlçesi Hamza Deresinin Islah Proj.Haz	4,2 km dere ıslah, 1,3 km atıksu şebeke projesi hazırlandı.
İzmir Metropol Alanı İçerisindeki Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması		
1	İzmir İli Aliağa , Foça, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa, Bayındır, Torbalı, Selçuk İlçelerinde Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması İşi	50 km yağmursuyu, 10 km atıksu şebeke ve 1 adet terfi merkezi projesi hazırlandı.
2	İzmir İli, Buca İlçesinde Atıksu ve Yağmursuyu Ayrıştırma Projelerinin Hazırlanması	1 km dere ıslahı,15 km atıksu şebeke, 25 km yağmursuyu projesi hazırlandı.
3	İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sarnıç Bölgesi Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması	20 km yağmursuyu projesi hazırlandı.
4	İzmir İli, Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, Menderes İlçelerinde Yağmursuyu Projelerinin Hazırlanması	5 km atıksu şebeke , 30 km yağmursuyu , 2 adet terfi merkezi projesi hazırlandı.
5	İzmir İli Konak İlçesi Kemeraltı Bölgesi Atıksu ve Yağmursuyu Toplayıcı ve Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması	12 km atıksu-yağmursuyu , 1 km atıksu şebeke , 1 km yağmursuyu projesi hazırlandı.

KANAL PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI PROJELERİ

YER	PROJENİN ADI	AÇIKLAMASI
PLANLAMA ÇALIŞMALARI		
MENDERES İLÇESİ	Gümüldür-Özdere Atıksu İletim Hattı Uygulama Projeleri" kapsamında bulunan terfi merkezinin yapılacağı alanların teknik altyapı alanı olarak belirlenmesine ilişkin imar planı çalışmalarının yapılması	Proje kapsamında 3 adet atıksu terfi merkezinin imar planına işlenmesi çalışmalarına devam edildi.
BUCA İLÇESİ	İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Beldesi ve Zafer Mahallesi atıksu kanalı uygulama projelerinin hazırlanması işi kapsamında bulunan terfi merkezi yerlerinin imar planı paftalarına işlenmesi	Proje kapsamında 2 adet atıksu terfi merkezinin imar planına işlenmesi çalışmalarına devam edildi.
SELÇUK İLÇESİ	İzmir İli, Selçuk İlçesinde Tarımsal Sanayi Alanı Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projeleri kapsamında bulunan terfi merkezi ve dere yatağının imar planı paftalarına işlenmesi	Proje kapsamında 1 adet terfi merkezinin ve dere yatağının imar planına işlenmesi çalışmalarına devam edildi.
URLA İLÇESİ	İzmir İli, Urla İlçesi Gülbahçe Mahallesi, Atıksu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Uygulama Projesi kapsamındaki imar planı çalışmalarının yapılması	Proje kapsamında 6 adet atıksu terfi merkezinin imar planına işlenmesi çalışmalarına devam edildi.
TORBALI İLÇESİ	İzmir İli Torbalı Çaybaşı Subaşı Beldeleri Özbey Yeniköy Göllüce Bülbüldere Köyleri İle Eğerci Şehitler-Pamukyazı-Atalanı- Kırbaş-Naime Mahalleleri Atıksu Kollektör ve Şebeke Projelerinin hazırlanması işi kapsamında terfi merkezinin imar planı çalışmalarının yapılması	Proje kapsamında 4 adet atıksu terfi merkezinin imar planına işlenmesi çalışmalarına devam edildi.
FOÇA İLÇESİ	İzmir İli Yenifoça Kanalizasyon Uygulama Projeleri kapsamında terfi merkezlerinin imar planı değişikliği çalışmalarının yapılması	Proje kapsamında 5 adet atıksu terfi merkezinin imar planına işlenmesi çalışmalarına devam edildi.

BAYINDIR İLÇESİ	İzmir İli Bayındır İlçesi Canlı, Karaveliler, Yakapınar, Eski Çıplakköy, Elifli, Yenimahalle, Karahalili, Fırınlı, Yeni Çıplakköy (Yeşilova)Yerleşimleri Kanalizasyon Şebeke Toplayıcı Hatları ve Pompa İstasyonları İle Fosseptik Projelerinin Hazırlanması işi kapsamında imar planı çalışmalarının yapılması	Proje kapsamında 7 adet atıksu terfi merkezinin imar planına işlenmesi çalışmalarına devam edildi.
MENEMEN İLÇESİ	İzmir İli, Menemen İlçesi, İğneredere, Görece, Süleymanlı, Emiralem, Haykıran, Hasanlar, Yahşelli Köylerinin Atıksularının Menemen Şebekesine aktarmak İçin toplayıcı hattın projelendirilmesi işi	Proje kapsamında 6 adet atıksu terfi merkezinin imar planına işlenmesi çalışmalarına devam edildi.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ'NDE ÇAMUR ÇÜRÜTME VE KURUTMA TESİSİ İNŞAATI

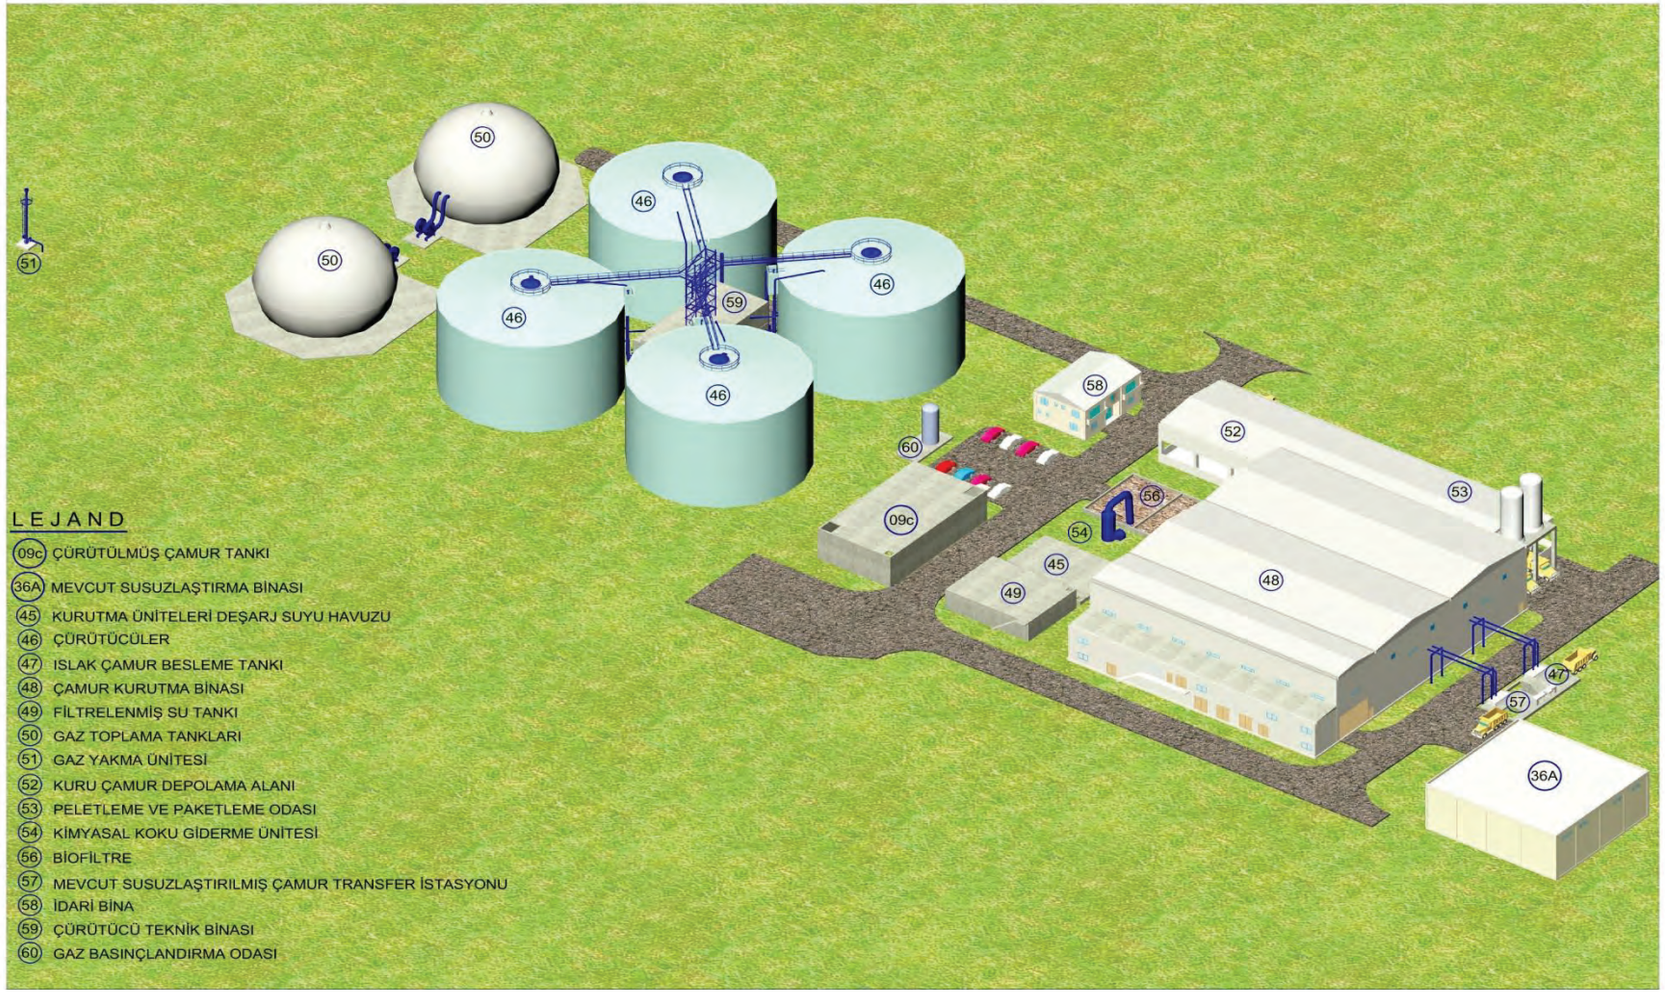

SU PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI PROJELERİ

NO	YER	PROJENİN ADI	AÇIKLAMASI
		İçmesuyu Şebeke ve İsale Hatları	
1	Bornova ve Konak	Bornova ve Yeşildere İçmesuyu Ana İletim Hatları Yenileme Projelerinin Hazırlanması İşi	Mevcut betonerme borunun sık sık arıza yapması nedeniyle DF boru olarak yenilenmesi amaçlanmıştır.17,1 km. Iletim hattı projelendirilmesi ve 210 mt. Jeoteknik etüd çalışmaları yapılmıştır
2	Selçuk İlçesi	Selçuk İlçesi İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	30 km iletim hattı,110 km şebeke hattı proje ihalesi yapılmıştır.
3	Menderes İlçesi	Menderes İlçesi İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	35 km iletim hattı,160 km şebeke hattının projesi tamamlanmıştır.
4	Bayındır İlçesi Yakapınar, Alankıyı, Kızılcaova, Yeşilova(Çıplakköy), Karahalilli, Furunlu Köyleri ve **Çırpı Beldesi** ile **Selçuk İlçesi** Zeytinköy ve Barutçu Köyleri	Bayındır İlçesi Yakapınar, Alankıyı, Kızılcaova, Yeşilova(Çıplakköy), Karahalilli, Furunlu Köyleri ve Çırpı Beldesi ile Selçuk İlçesi Zeytinköy ve Barutçu Köyleri İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	21,5 km iletim hattı ve 143 km şebeke hattının projesi tamamlanmıştır.
5	Menderes İlçesi Çamönü, Çakaltepe, Karakuyu, Kısıkköy, Efemçukuru ve Çileme Köyleri	Menderes İlçesi Çamönü, Çakaltepe, Karakuyu, Kısıkköy, Efemçukuru ve Çileme Köyleri İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	21 km iletim hattı ve 83 km şebeke hattının projesi tamamlanmıştır.
6	Torbalı İlçesi Türkmenköy, Özbey, Ahmetli, Yeniköy, Karaot, Korucuk, Ormanköy, Yoğurtçular Köyleri ve Sağlık Mahallesi, Kemalpaşa İlçesi Aşağıkızılca Mahallesi, Bornova İlçesi Eğridere Köyü, Karşıyaka İlçesi Sancaklı Köyü	Torbalı İlçesi Türkmenköy, Özbey, Ahmetli, Yeniköy, Karaot, Korucuk, Ormanköy, Yoğurtçular Köyleri ve Sağlık Mahallesi, Kemalpaşa İlçesi Aşağıkızılca Mahallesi, Bornova İlçesi Eğridere Köyü, Karşıyaka İlçesi Sancaklı Köyü İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	32 km iletim hattı ve 88 km şebeke hattının projelendirme çalışmalarına devam edilmiştir.
7	Foça İlçesi Horozgediği, Bağarası, Yenibağarası, Ilıpınar ve Yeniköy Köyleri ile **Aliağa İlçesi** Uzunhasanlar, Şehitkemal ve Yukarışehitkemal Köyleri	Foça İlçesi Horozgediği, Bağarası, Yenibağarası, Ilıpınar ve Yeniköy Köyleri ile Aliağa İlçesi Uzunhasanlar, Şehitkemal ve Yukarışehitkemal Köyleri İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	17 km iletim hattı ve 121 km şebeke hattı projelendirme çalışmalarına devam edilmiştir.
8	Seferihisar İlçesi Turgut, İhsaniye, Çamtepe, Beyler, Gölcük ve Gödence Köyleri ile **Urla İlçesi** Demircili, Yağcılar ve Özbek Köyleri	Seferihisar İlçesi Turgut, İhsaniye, Çamtepe, Beyler, Gölcük ve Gödence Köyleri ile Urla İlçesi Demircili, Yağcılar ve Özbek Köyleri İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	17 km iletim hattı ve 93 km şebeke hattı içmesuyu hattı projelendirme çalışmalarına devam edilmiştir.
9	Menemen İlçesi Turgutlar, Görece, Bozalan, Telekler, Buruncuk, Çaltı, Çukurköy, Günerli, Süzbeyli, Çavuş, Musabey, Alaniçi, Ayvacık, Bağcılar, Kesik, İğnedere ve Göktepe Köyleri	Menemen İlçesi Turgutlar, Görece, Bozalan, Telekler, Buruncuk, Çaltı, Çukurköy, Günerli, Süzbeyli, Çavuş, Musabey, Alaniçi, Ayvacık, Bağcılar, Kesik, İğnedere ve Göktepe Köyleri İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması	34 km iletim hattı ve 77 km şebeke hattı, km içmesuyu hattı projelendirme çalışmalarına devam edilmiştir.

Su Kuyusu Sondaj ve Enerji Temini			
1	Menemen İlçesi Uğur Mumcu Mahallesi İçmesuyu Terfi Merkezi Aliağa İlçesi TM-2 İçmesuyu Terfi merkezi (Güç Yükseltimi) Aliağa İlçesi TM-3 İçmesuyu Terfi merkezi (Güç Yükseltimi) Bayındır İlçesi Hasköy Ayaklı Depo Altı Terfi Merkezi Menderes İlçesi Bahçecik Depo İçmesuyu Terfi Merkezi Torbalı İlçesi Dağkızılca Köyü Terfi Merkezi Bornova İlçesi Eğridere Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Menderes İlçesi Kısık Köy İçmesuyu Kuyusu	İçmesuyu Terfi Merkezleri (Uğur Mumcu Mah., Aliağa İlçesi TM-2,TM-3, Hasköy Köyü, Bahçecik Köyü, Dağkızılca Köyü, Eğridere Köyü) ve Kısıkköy İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini Uygulama Projeleri Hazırlanması işi.	Uğur Mumcu Mahallesi İçm. Terfi Merkezi 5 kW güç ihtiyacı için AG ENH **Aliağa İlçesi TM-2 İçm Terfi merkezi mevcut 100 kVA trafo ilave güç ihtiyacı için 160 kVA trafolu güç yükseltimi **Aliağa İlçesi TM-3 İçm Terfi merkezinde mevcut 11 kW motor 22 kW a yükseltilmesi nedeniyle mevcut pano şalter ve kabloları yenileme **Mevcut Bayındır İlçesi Hasköy Ayaklı Depo Altı Terfi Merkezinde ilave 11 kW güç ihtiyacı için 6003000 no'lu elektrik aboneliği sözleşme gücü değişikliği için iç tesisat ve güç yükseltimi **Menderes İlçesi Bahçecik Depo İçmesuyu Terfi Merkezi 5kW güç ihtiyacı için AG ENH**Torbalı İlçesi Dağkızılca Köyü Terfi Merkezi 5 kW güç ihtiyacı için AG ENH **Bornova İlçesi Eğridere Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi 8 kW güç ihtiyacı için AG ENH **Menderes İlçesi Kısık Köy İçmesuyu Kuyusu 20 kW güç ihtiyacı için A-2 ile A-25 arasındaki şebeke tadilatı ve elektrik temin projeleri hazırlanmıştır.
2	Torbalı İlçesi Helvacı Köyü İçmesuyu Kuyusu ve Demir Mangan Paket Arıtma Tesisi ve Ormanköy Köyü İçmesuyu Kuyusu Bayındır İlçesi Söğütören Köyü İçmesuyu Kuyusu Arıtma Tesisi Bayındır İlçesi Yakapınar Köyü İçmesuyu Kuyusu Kemalpaşa İlçesi Yenmiş Köyü İçmesuyu Kuyusu Malta Güvenlik Kulübesi	İçmesuyu Kuyuları (Torbalı Helvacı - Ormanköy, Bayındır Söğütören –Yakapınar, Kemalpaşa Yenmiş), Torbalı Helvacı Demir Mangan Arıtma Tesisi ve Menderes Malta Güvenlik Kulübesi Elektrik Temini Uygulama Projeleri Hazırlanması”	**Torbalı İlçesi Helvacı Köyü İçmesuyu Kuyusu ve Demir Mangan Paket Arıtma Tesisi ve Ormanköy Köyü İçmesuyu Kuyusu için toplam 50 kW güç ihtiyacı için 100kVA trafo , **Bayındır İlçesi Söğütören Köyü İçmesuyu Kuyusu Arıtma Tesisi için oplam 20 kW güç ihtiyacı için AG ENH projelendirilmiştir. **Bayındır İlçesi Yakapınar Köyü İçmesuyu Kuyusu 20 kW güç ihtiyacı için **Kemalpaşa İlçesi Yenmiş Köyü İçmesuyu Kuyusu 20 kW güç ihtiyacı için **Malta Güvenlik Kulübesi 20 kW güç ihtiyacı için AG ENH projeleri yaptırılmıştır.
3	Aliağa İlçesi Karaköy Köyü İçmesuyu Kuyusu Buca İlçesi Belenbaşı Köyü İçmesuyu Kuyusu Bornova İlçesi Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyusu Torbalı İlçesi Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Torbalı İlçesi Yazıbaşı Mahallesi İçmesuyu Kuyusu Torbalı İlçesi Gökyaka Köyü İçmesuyu Pompa İstasyonu Menemen İlçesi Asarlık İçmesuyu Pompa İstasyonu	İçmesuyu Kuyuları (Torbalı Dağkızılca ve Yazıbaşı, Aliağa Karaköy, Buca Belenbaşı, Bornova Aşık Veysel Parkı) ve Pompa İstasyonları (Kemalpaşa Gökyaka Köyü, Menemen Asarlık Mah)Elektrik Temini Elektrik Temini Uygulama Projeleri hazırlanması işi.	Aliağa İlçesi Karaköy Köyü İçmesuyu Kuyusu 15 kW güç ihtiyacı için Buca İlçesi Belenbaşı Köyü İçmesuyu Kuyusu 25kW güç ihtiyacı için Bornova İlçesi Aşık Veysel Parkı İçmesuyu 15 kW güç ihtiyacı için Torbalı İlçesi Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu 22 kW güç ihtiyacı için Torbalı İlçesi Yazıbaşı Mahallesi İçmesuyu Kuyusu20 kW güç ihtiyacı için Torbalı İlçesi Gökyaka Köyü İçmesuyu Pompa İstasyonu 5 kW güç ihtiyacı için Menemen İlçesi Asarlık İçmesuyu Pompa İstasyonu 110 kW güç ihtiyacı için elektrik iç tesisat, elektrik temin projeleri yaptırılmıştır.

Su Kuyusu Sondaj ve Enerji Temini			
4	Aliağa İlçesi Karaköy Köyü İçmesuyu Kuyusu Buca İlçesi Belenbaşı Köyü İçmesuyu Kuyusu Bornova İlçesi Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyusu Torbalı İlçesi Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Torbalı İlçesi Yazıbaşı Mahallesi İçmesuyu Kuyusu Torbalı İlçesi Gökyaka Köyü İçmesuyu Pompa İstasyonu Menemen İlçesi Asarlık İçmesuyu Pompa İstasyonu	İçmesuyu Kuyuları (Torbalı Dağkızılca ve Yazıbaşı, Aliağa Karaköy, Buca Belenbaşı, Bornova Aşık Veysel Parkı) ve Pompa İstasyonları (Kemalpaşa Gökyaka Köyü, Menemen Asarlık Mah)Elektrik Temini Elektrik Temini Uygulama Projeleri hazırlanması işi.	Elektrik temini proje işi tamamlandı
5	Bayındır-Menderes-Torbalı-Kemalpaşa	İzmir İli Bayındır İlçesi Hisarlık köyü H1, Bayındır İlçesi Yeşilova Köyü Y2, Menderes İlçesi Yeniköy Y2, Menderes İlçesi Çamönü Köyü Ç1, Torbalı ilçesi Ayrancılar S1 ve S3, Kemalpaşa İlçesi Çambel Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu İnşaatı	Toplam 7 adet su sondaj kuyusu açılmasına ait teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.
6	Selçuk,Gümüldür,Menderes,Menemen	İzmir İli Selçuk ilçesi S1 ve S2 ,Gümüldür Beldesi S3 ve S4 Menderes İlçesi Pirentepe P1,Karabağlar Tırazlı Köyü T1, Menemen Alaniçi Köyü A1 Su Sondaj Kuyuları İnşaatı	Toplam 7 adet su sondaj kuyusu açılmasına ait teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.
7	Aliağa, Buca, Torbalı, Bornova	İzmir ili Aliağa İlçesi Karaköy, Buca İlçesi Belenbaşı köyü , Torbalı İlçesi Helvacı Köyü ve Ormanköyü Dağkızılca Köyü ile Yazıbaşı Mahallesi, , Bornova İlçesi Aşık Veysel Parkı Su Sondaj Kuyularına Motopomp Temini ve Montajı Saç Kabin Yapılması	Toplam 7 adet su sondaj kuyusuna motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılmasına ait teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.
8	Bayındır, Bornova,Kemalpaşa	İzmir İli Bayındır İlçesi Söğütören köyü S1, Bayındır İlçesi Yakapınar Köyü Y2, Bayındır İlçesi Kızılcaova K2, Bornova ilçesi Beşyol köyü B2 , Kemalpaşa İlçesi Yenmiş Köyü Y1 Su Sondaj Kuyularına Motopomp Temini ve Montajı İle Sac Kabin Yapılması	Toplam 5 adet su sondaj kuyusuna motopomp temini ve montajı ile saç kabin yapılmasına ait teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır.
Yeni Yüzeysel Su Kaynakları			
1	Narlıdere	Alionbaşı Barajı Revize Planlama Raporu Hazırlanması	Taşkın koruma ve içmesuyu elde etmek amacıyla planlanan vbarajdan yıllık yaklaşık 2,4 hm3 içme ve kullanma suyu elde edilecektir.Revize planlama raporu çalışmalarına devam edilmiştir.
2	Bornova İlçesi Kavaklıdere Köyü	İzmir İçmesuyu (Gördes ve Çağlayan) Uygulama Projesi	İzmir İçmesuyu (Gördes Çağlayan) Uygulama Projesi Yapımı İşi 24.09.2007 Tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokole istinaden yapılmıştır.Bu iş kapsamında 100 km Gördes- İzmir arası isale hattı ile hamsuyu arıtacak 360.000 m3/gün kapasiteli Kavaklıdere İçmesuyu Projesi tamamlanmıştır.

Yeni Yüzeysel Su Kaynakları			
3	Karşıyaka	Bostanlı Barajı Revize Planlama Raporu ve Uygulama Projeleri Yapımı Mühendislik Hizmetleri işi	Taşkın koruma ve İçmesuyu elde etmek amacıyla planlanan ve yaklaşık 40.000 kişilik bir nufusun ihtiyacını karşılayacak Barajdan yıllık 2,4 hm3 içme ve kullanma suyu elde edilecektir. Proje çalışmaları
4	Menemen	Değirmendere Barajı Revize Planlama Raporu ve Uygulama Projeleri Yapımı Mühendislik Hizmetleri işi	Taşkın koruma ve İçmesuyu elde etmek amacıyla planlanan ve yaklaşık 80.000 kişilik bir nufusun ihtiyacını karşılayacak Barajdan yıllık 4 hm3 içme ve kullanma suyu elde edilecektir. Proje çalışmaları devam etmektedir.
5	Güzelbahçe	İzmir İçmesuyu Projesi Çamlı Barajı Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri İşi	İçmesuyu elde etmek amacıyla planlanan barajdan yıllık yaklaşık 13 hm3 içme ve kullanma suyu elde edilecektir.Revize planlama raporu tamamlanmıştır.
Hizmet Binası ve Tesis Projeleri			
1	Seferihisar, Urla, Torbalı, Gaziemir	Seferihisar, Urla, Torbalı Tip Hizmet Binaları Uygulama ve Çevre Düzenleme Projeleri İle Gaziemir (P5) Pompa istasyonu Projelerinin Hazırlanması	İş kapsamında Urla ve Torbalı, Seferihisar İlçelerinde 4 adet teknik amirlik,hizmet binaları ile Gaziemir P5 pompa istasyonu uygulama projeleri tamamlandı.
2	Halkapınar	Halkapınar Yerleşkesi Genel Müdürlük, Sosyal Tesis, Atölye Binaları ve Çevre Tanzimi Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Dağınık ve yetersiz binalarda çalışmakta olan tüm hizmet birimlerimizin tek bir binada toplanması ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi amacıyla Genel Müdürlük Hizmet Binası yapılmasına yönelik proje çalışmalarına proje çalışmalarına devam
3	Çiğli	Çiğli Atık Su Pompa İstasyonu Onarım ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması	Binada meydana gelen deformasyonların incelenip, araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Yapılacak olan tüm bu araştırmalar neticesinde binanın güçlendirilmesine yönelik proje çalışmalarına devam edilmiştir.
4	Manisa	Nuriye, Görece ve Çullutepe' de Yapılacak Lojman ve Hizmet Binaları İçin Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi	İş kapsamında Sarıkız içmesuyu Arıtma Tesisi personeli için lojman, Menderes Görecede Ambar Binası ve Muradiye Çullutepede arsenik arıtma tesislerinde atölye, ambar depo, projeleri yaptırılması işi tamamlanmıştır.
5	Konak/Halkapınar	Halkapınar Tarihi Pompa Binasının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi	Halkapınarda mevcut tarihi pompa istasyonu , labaratuvar ve mescit binalrının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. 1No.lu Kült. ve Tab. Varl. Kor. Kurl.ndan gerekliizin ve onay için başvuruda bulunulmuştur.Restore edilmesinden sonra bina müze ve sosyal etkinlikler için kullanılacaktır.

Hizmet Binası ve Tesis Projeleri			
6	Konak/Halkapınar - Aliağa	Halkapınar ve Aliağa Pompa İstasyonlarının Mimari, İnşaat, Elektrik, Mekanik ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi	Halkapınar ve Aliağa pompa istasyonlarının mimari, inşaat, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanması tamamlanmıştır.
7	Buca	Buca Şube Müdürlüğü, Teknik Amirlik ve Ambar Binaları Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi	İzmir İli Buca İlçesinde Şube Müdürlüğü Binası, Teknik Amirlik Binası ile Ambar Binası uygulama projele tamamlanmıştır.
8	Bornova, Homeros	Homeros Vadisi Kocapınar, Çatalpınar, Kererli, Bedesten, Deli Süleyman Kaptaj Odaları ve Toplama Deposu Tadilat İşi	Bornova Homeros Vadisi kaptaj odaları ve çevresinde gerekli tadilatların yapılması amacıyla; Kocapınar, Kererli, Çatalpınar, Bedesten ve Deli Süleyman Kaptaj Odaları ile Toplama Deposu Onarım Projesi, Kocapınar ve Çatalpınar Kaptaj Odaları Etrafı Beton Direkli Kafes Tel ile Himaye Çiti Projesi hazırlanmıştır.
9	Bornova, Gaziemir	Bornova Arşiv Binası, Gaziemir Su Teknik Amirliği Hizmet ve Ambar Binası Yapılması ve P25 Pompa Binası Etrafına İstinat Duvarı Yapılması Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Bornova İnönü Mahallesinde Arşiv Binası yapılması, Gaziemir'de Su Teknik Amirliği Hizmet ve Ambar Binası yapılması ve Bornova Atatürk Mahallesi P25 Pompa Binası etrafına istinat duvarı yapılması ile ilgili proje hazırlanmasına yönelik ihale hazırlığı yapıldı.
İçme suyu Paket Arıtma Tesisleri			
1	Bornova ilçesi Yaka köyü	Bornova İlçesi Yaka Köyü Yeni Kuyu Çıkışına Paket Arıtma Tesisi Temini ve Montajı	8 lt/sn kapasiteli paket arsenik arıtma tesisi için proje,teknik şartname ve ihale dosyası hazırlandı. .
2	Menemen ilçesi Seyrek köyü	Menemen İlçesi Seyrek Köyü Deposu Arsenik Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini ve Montajı	10 lt/sn kapasiteli paket arsenik arıtma tesisi için proje, teknik şartname ve ihale dosyası hazırlandı.
3	Seferihisar ilçesi Eski Orhanlı köyü	Seferihisar İlçesi Eski Orhanlı Köyü Kuyusuna Demir-Mangan Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini ve Montajı	8 lt/sn kapasiteli paket demir-mangan arıtma sitemi için proje, teknik şartname ve ihale dosyası hazırlandı.
4	Bayındır ilçesi Dernekli köyü	Bayındır İlçesi Dernekli Köyü Mevcut Paket Demir-Mangan Arıtma Sisteminin Revizyonu ve Antimon-Arsenik Giderimi İçin 2. Kademe Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini ve Montajı	3 lt/sn kapasiteli paket demir, mangan, arsenik ve antimon arıtma sitemi için proje, teknik şartname ve ihale dosyası hazırlandı.
5	Bayındır ilçesi Çamlıbel köyü	Bayındır İlçesi Çamlıbel Köyü Kuyusuna Demir-Mangan Giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini Ve Montajı	3 lt/sn kapasiteli paket demir-mangan arıtma sitemi için proje, teknik şartname ve ihale dosyası hazırlandı.

İçme suyu Paket Arıtma Tesisleri			
6	Torbalı ilçesi Helvacı, Ormanköy ve Düverlik köyleri	Torbalı İlçesi Helvacı Köyü Demir-Mangan giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini ve Montajı	Torbalı İlçesi Helvacı Köyünde açılan 2 sondaj kuyusundan elde edilen sulardaki standart üstü olan demir-mangan parametrelerinin giderilerek Helvacı, Ormanköy ve Düverlik köylerinin içme suyu ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla Helvacı köyünde 8 lt/sn kapasiteli paket demir-mangan arıtma sistemi kurulması için ihale dosyası hazırlanmıştır.
7	Bayındır ilçesi Söğütören köyü	Bayındır İlçesi Söğütören Köyü Demir-Mangan giderimi İçin Paket Arıtma Sistemi Ekipmanı Temini ve Montajı	Bayındır İlçesi Söğütören Köyünde açılan sondaj kuyusu suyundaki standart üstü olan demir-mangan parametrelerinin giderilerek Söğütören köyünün içme suyu ihtiyacının sağlanması amacıyla 3 lt/sn kapasiteli paket demir-mangan arıtma sistemi kurulması için ihale dosyası hazırlanmıştır.
8	Foça Gerenköy Mevkii	Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Foça, Yeni Foça ve Musabey kuyularından alınan suların Foça Gerenköy mevkiinde yapılacak yaklaşık 300 lt/sn kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisinde arıtılarak (havalandırma, durultucu, filtrasyon vb.) öncelikle Foça ve Yeni Foça ilçelerine daha sonrasında Maltepe, Seyrek Beldelerine içmesuyu sağlanacaktır. Arıtma tesisi uygulama projelerinin hazırlatılması için ihale hazırlıkları sürdürülmüştür.
9	Menemen	Menemen K5 Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Menemen K5 kuyularından sağlanan suların Terfi istasyonu yanında yapılacak yaklaşık 150 lt/sn kapasiteli arıtma tesisi uygulama projelerinin hazırlatılması için ihale hazırlıkları sürdürülmüştür.
10	Halkapınar	Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Kapasite arttırılması için yapılacak 500 lt/sn kapasiteli ilave arıtma tesisi uygulama projelerinin hazırlatılması için ihale hazırlıkları sürdürülmüştür.
11	Bornova	Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi İmalat ve Montajı	Bornova Yamanlardaki Bedesten ve Deli Süleyman kaynak sularının ambalajlanarak satılmasına yönelik dolum tesisi kurulması için teknik şartname hazırlıkları tamamlanmıştır. İmar plan çalışmaları devam etmektedir.

Planlama Çalışmaları			
1	Gaziemir İlçesi	Tahtalı Barajı isale hattından emiş yapan ve 18M-IIc paftada, 1441 ada, 49 parselin güneyinde yer alan P5 istasyonu alanının "İZSU Pompa İstasyon Alanı"olarak işlenmesine yönelik imar planı değişikliği önerisi.	İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülerek onanmıştır.
		2096 ada 6 parselde "Belediye Hizmet Alanı (İZSU) alanının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği önerisi.	
2	Menemen İlçesi	Asarlık Mahallesi 541 ada 1 parsel içerisinde "İZSU Pompa İstasyonu" alanının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği önerisi.	İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülerek onanmıştır.
3		Asarlık Mahallesi 541 ada 1 parsel içerisinde "Trafo Binası" alanının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği önerisi.	İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülerek onanmıştır.
4	Torbalı İlçesi	Yapılan protokol ileYazıbaşı Belediyesi Başkanlığıtarafından işletimi İdaremize devredilen Yazıbaşı İlçesi su deposu alanının "BHA alanı"olarak işlenmesine yönelik imar planı değişikliği önerisi.	İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2012 gün 05.796 sayılı kararı ile uygun görülerek onanmıştır.
5		Ayrancılar Mahallesi, tapuda 4 pafta, 1574 numaralı parsel içerisinde hâlihazırda bulunan su pompa istasyonunun korunması için "Belediye Hizmet Alanı (İZSU Pompa İstasyon Alanı)" olarak işlenmesine yönelik imar planı değişikliği önerisi.	İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülerek onanmıştır.
6		Ayrancılar Mahallesi, Deliincir mevkii 397 parselde yeralan içmesuyu kaynağının koruma alan/larının belirlenmesi.	Çalışmaları sürdürülmüştür.
7	Seferihisar İlçesi	Turabiye Mahallesi 168 ada 30 ve 110 parseller, Camikebir Mahallesi 106 ada 1 parsel; Sığacık Mahallesi 97 ada 12 ve 13 parseller, Hıdırlık Mahallesi, 283 ada 89 parsel ve Tepecik Mahallesi 398 ada 82 ve 83 parsellerde yeralan su depoları ile terfi merkezi alanlarının "Belediye Hizmet Alanı" olarak işlenmesine yönelik imar planı değişikliği önerisi.	Mevcut depoların özel mülkiyet alanlarında kalması nedeniyle kamulaştırmaya esas imar planı çalışmaları sürdürülmüştür.
8	Güzelbahçe İlçesi	1473 parselde "İZSU Pompa İstasyonu" alanının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği önerisi.	Mevcut pazaryerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle içinde yeralan pompa istasyonunun kaldırılması Belediyesince talep edilmiştir.
9		1576 ve 5486 nolu parseller ile 1573 nolu parselin bir kısmını kapsayan BHZ alanı kullanım kararının "Belediye Hizmet Alanı (İZSU) olarak işlenmesine yönelik imar planı değişikliği önerisi.	Mevcut depo ve pompa istasyonu alanının büyütülmesine ilişkin çalışmaları kapsamaktadır. Çalışmalar sürdürülmüştür.
10	İzmir Büyükşehir Belediye Alanı	*1/25000 ölçekli Nazım Plan Değişikliği* 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyon çalışmaları * ÇED görüşü vb.	3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği; kurum içi ve kurum dışından gelen birçok imar planı çalışması (imar planı değişikliği, revizyonu veya plan değişikliği önerisi) incelenerek mevcut-planlanan su kaynağı, şebeke ve tesislerine yönelik 69 (altmış dokuz) görüş bildirilmiştir.

BAYINDIR İLÇESİ DERNEKLİ KÖY KUYUSU
PAKET DEMİR-MANGAN, ANTİMON VE ARSENİK ARITMA SİSTEMİ AKIŞ ŞEMASI

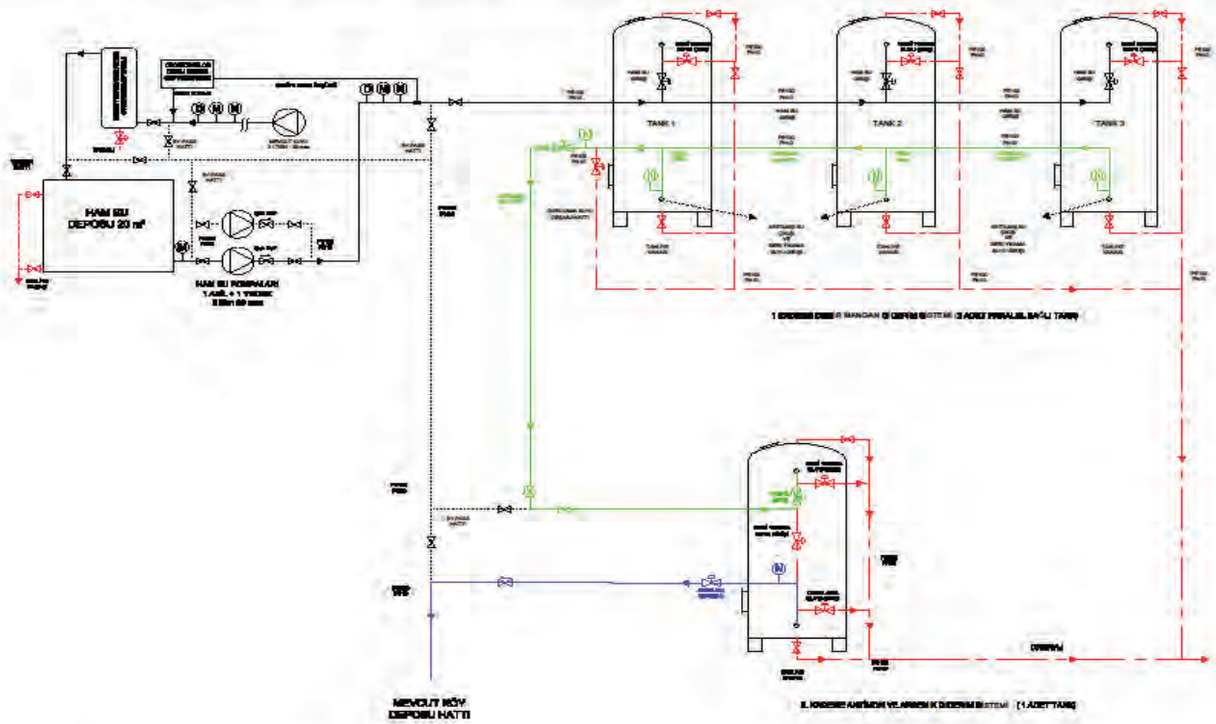

M : MANOMETRE
N : NUMUNE ALMA MUSLUĞU
D : DEBİMETRE (DİJİTAL)
: ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA
: FİKSİ PARLAMAZ KLİPSLİ KELEBEK VANA

Çizimde gösterilmeyen ancak sistem için gerekli tüm aldırmanların (vana, şalovar vb) temini ve montajı yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

TC
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON DAİRESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İ Z S U

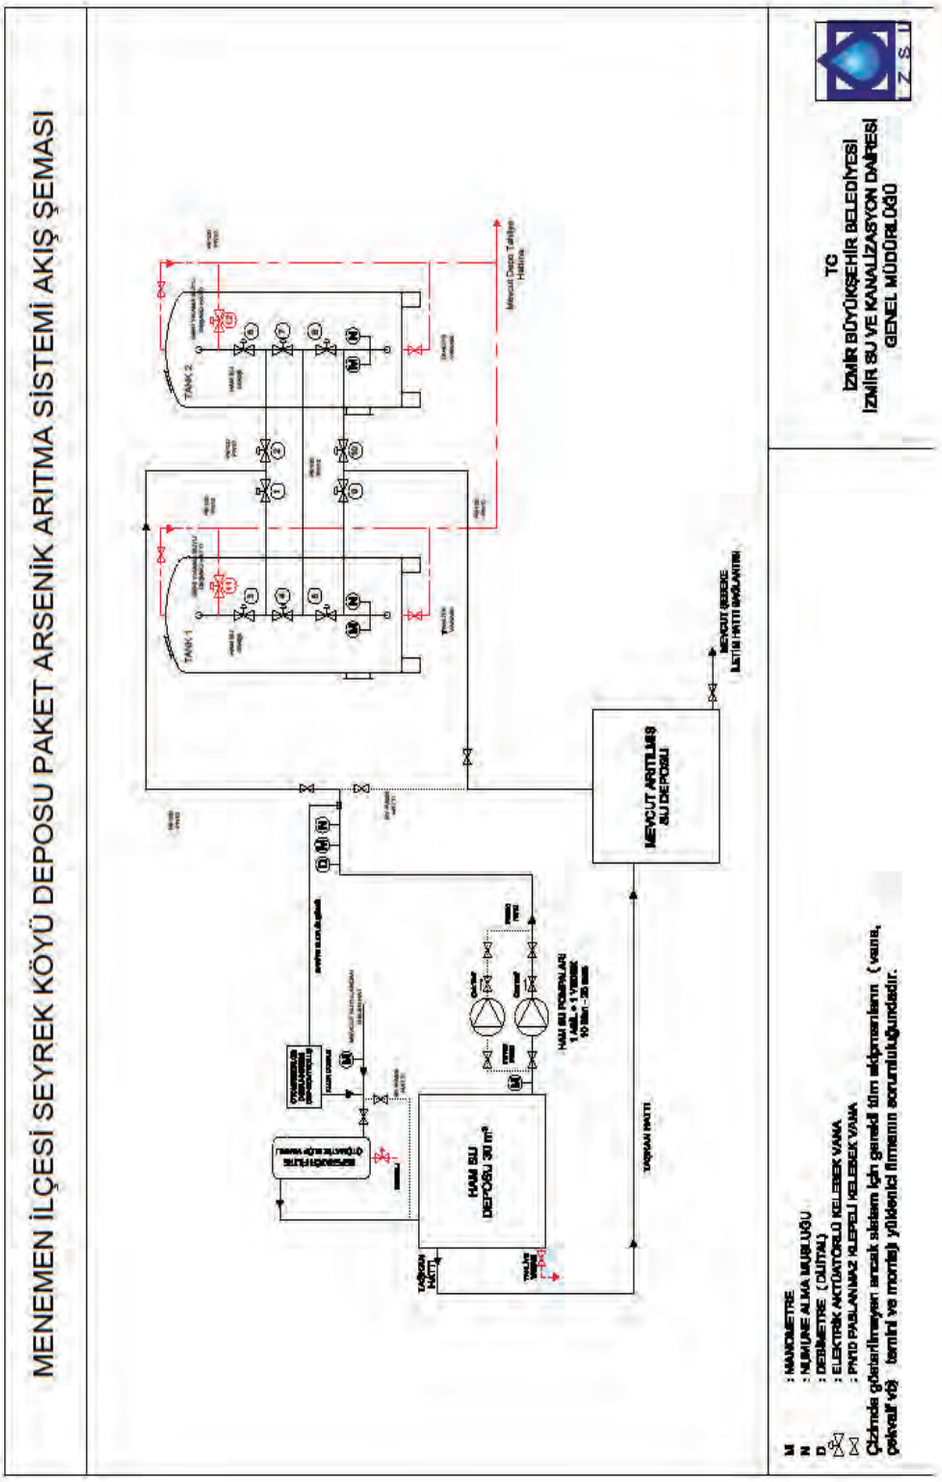
MENEMEN İLÇESİ SEYREK KÖYÜ DEPOSU PAKET ARSENİK ARITMA SİSTEMİ AKIŞ ŞEMASI
TANK 1
TANK 2
MEVCUT ARITILMIŞ SU DEPOSU
HAM SU DEPOSU 30 m³
TAŞKAN HATTI
TC
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR SU VE KANALİZASYON DAİRESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
M : MANOMETRE
N : NUMUNE ALMA MUSLUĞU
D : DEBİMETRE (DÜİTAL)
: ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA
: PN10 PASLANMAZ KLEPELİ KELEBEK VANA
Çizimde gösterilmeyen ancak sistem için gerekli tüm ekipmanların (vana, çekvalf vb) temini ve montajı yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

YENİ GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI







TARİHİ LABORATUVAR RESTORASYONU



TARİHİ MESCİT RESTORASYONU



TARİHİ POMPA BİNASI RESTORASYONU



ÖZDERE-ÇUKURALTI Ç4D PAKET DEMİR MANGAN ARITMA TESİSİ ALİ ONBAŞI BARAJI JEOTEKNİK ETÜD ÇALIŞMALARI



ALİ ONBAŞI BARAJI JEOTEKNİK ETÜD ÇALIŞMALARI





ALİ ONBAŞI BARAJI JEOTEKNİK ETÜD ÇALIŞMALARI



BOSTANLI BARAJI JEOTEKNİK ETÜD ÇALIŞMALARI



BOSTANLI BARAJI JEOTEKNİK ETÜD ÇALIŞMALARI



DEĞİRMENDERE BARAJI JEOTEKNİK ETÜD ÇALIŞMALARI



KEŞİF VE ŞARTNAMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2012 YILI FAALİYET RAPORU

NO	İŞİN ADI	KONUSU	İMALAT
1	Karabağlar Eskiizmir Caddesi Mevcut Prekast Kapaklı Yağmursuyu Kanalı Tadilatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı.	Ø600 mm HDPE boru = **146 m.** Mevcut ızgara onarımı = **40 m.**
2	Çiğli İstasyonaltı Mah. Ve Sasalı Merkez Mah. Muh. Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnaşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı.	Ø200, Ø400, Ø600 HDPE Koruge Boru temini ve döşenmesi. **L=229 m.** B=0,40 m. H=Değişken Delikli Saç Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı Yapılması. **L=487 m.** B=0,60 m. H=Değişken Delikli Saç Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı Yapılması. **L=167 m.**
3	Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi ile Bornova Gürpınar ve Kemalpaşa Mahalleleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı.	Ø300, Ø400, Ø500 mm HDPE Koruge Boru=**3008 m.** Ø800, Ø1000 mm E.C.Betonarme Boru =**387 m.** B=40cm ,B=60cm ,B=80cm ,B=100cm Delikli Saç Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı Yapılması. **L=1519m.** 1,00x1,00m., 1,50x1,00m., 1,00x0,80m. BA menfez **L=4287m.**
4	Buca İlçesi Kırıklar Cezaevi Çevresi Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı.	**L=265m.** Ø400 HDPE Koruge Boru temini ve döşenmesi. **L=249m**. Ø1000 E.C.B. Boru temini ve döşenmesi. **L=30m**. B=0,40m. H=Değişken Delikli Saç Izgaralı B.Arme Y.suyu Kanalı Yapılması. **L=365m.** B=0,50m. Trpez Kesitli Y.suyu Kanalı Yapılması.
5	Narlıdere Sahilevleri Muh. Sokaklar ve Güzelbahçe Siteler 426 Sk. Atıksu Kanalizasyon İnşaatı İşi.	Atıksu Kanalı.	Ø300 HDPE Boru temini ve döşenmesi. **L= 49 m.** Ø300 ECBB temini ve döşenmesi. **L= 1095 m.** **1 adet** B.A. İtme Odası Yapılması.
6	Bornova İlçesi Altındağ Merkez Mah. 4499 Sk. Devamı Atıksu Kanalizasyon İnşaatı İşi.	Atıksu Kanalı.	**L= 530 m.** Ø300 ECBB temini ve döşenmesi.
7	Bayraklı İlçesi Tepekule ve Çiçek Mah. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı	Ø300, Ø400, Ø800 mm ECB = **1175 mt.** Ø400, Ø500, Ø600 mm HDPE Koruge Boru =**1893 mt.** B=0,40m ve B=1,0m Delikli Saç Izgaralı Y.Suyu Kanalı Yapılması = **592 mt.** 1,5x1 Baks Kesit B.A. Menfez = **517 mt.**
8	Karşıyaka; Yamanlar, Cumhuriyet Mah. Ve Bayraklı Cengizhan Mah. Muhtelif Sk. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı	Ø400mm. , Ø500mm. , Ø600mm. HDPE Koruge Boru Temini ve Döşenmesi. **L=1427m.** B=40cm. , B=60cm. , B=80cm. , B=100cm. Delikli Saç Izgaralı Betonarme Y.suyu Kanalı Yapılması. **L=1507m.** Trapez Kanalı (B:1,0m. H:1,0m.)yapılması. **L=285m.**
9	Çiğli Güzeltepe Mahallesi,Maltepe Deresi ve Yankolu (Peynircioğlu Deresi) Islah ve Atıksu Kanalizasyon İnşaatı İşi.	Dere Islahı ve Atıksu Kanalı.	Ø300mm E.C.B. Boru temini ve döşenmesi **L=278,98m.** (B:8,0m H:2,0m),(B:5,0m H:2,0m) Trapez Kanal yapılması **L=599,20m.** (B:4,0m H:2,0m) Kutu Kesit 2 gözlü yapılması **L=10m.** (B:2,0m H:2,0m) Kutu Kesit yapılması **L=38m.** (B:4,0m H:2,5m),(B:2,0 H:2,0m) U Kanal yapılması **L=441,29m.** (B:değ. H:2,5m)(yan kol) U Kanal yapılması **L=15m.** (B:4,0m-2,0m H:2,5-2,0m) U Kanal yapılması **L=28,45m.** Korkuluk yapılması **L=1880m.**

NO	İŞİN ADI	KONUSU	İMALAT
10	Karşıyaka Onur-1 Mah. Pompa İstasyonu İnşaatı İşi.	İçmesuyu Pompa İstasyonu	1 adet Pompa İstasyonu Yapımı.
11	Çaltılıdere Köyü (ALİAĞA İLÇESİ)-Foçaköy Evleri (BAĞARASI / FOÇA İLÇESİ) İçmesuyu İnşaatı İşi.	İçmesuyu İnşaatı.	**İLETİM HATLARI:** **Çaltılıdere köyü:**Ø160mm HDPE(16 Atü) L=783m. **Foçaköy Evleri:**Ø150mm DF L=1911m. **Toplam L=2.694mt.** **ŞEBEKE HATLARI:** **Çaltılıdere köyü:**Ø63mm, Ø75mm, Ø110mm ve Ø160mm HDPE(10 atü) L=15244m. **Foçaköy Evleri:**Ø63mm, Ø110mm HDPE(10 Atü), Ø63mm, Ø75mm, Ø110mm HDPE(16 Atü) L=14828m. **Toplam L=30.072mt.** **GENEL TOPLAM L=32.766mt.**
12	Narlıdere İlçesi Ilıca Deresi ile Tabaklar ve İbrahimağa Derelerinin Islah İnşaatı İşi.	Dere Islahı	**Dere Islahı ve Onarımı:** B.A. Trapez kanal = **10844 mt.** B.A. Kutu menfez = **74 mt.** Demir korkuluk = **9255mt.**
13	İzmir İli Muhtelif Derelerde 1. Etap Korkuluk Yapılması İşi.	Dere Korkuluk	**L=2680 m** Korkuluk Yapımı.
14	Bornova ilçesi Atatürk Mah. Muhtelif Cad. Ve Sokaklar Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı	Ø400, Ø500 mm HDPE Korıge Boru = **1817 mt.** Ø600,Ø800, Ø1000 mm ECB Boru = **1452 mt.** 1,00x1,00m BA Kutu menfez = **1456 mt.** B=0,40m Delikli saç ızgaralı BA kanal = **548 mt.**
15	Buca Atatürk ve Çamkule Mah. Muh. Sk. Atıksu ile Konak Vapur İskelesi Atıksu Hattı Bağlantı İnşaatı İşi.	Atıksu İnşaatı	**L=1218m.** Ø300mm E.C.B.B. Temini ve döşenmesi. **L=87m.** Ø200mm PVC Boru temini ve döşenmesi.
16	Gaziemir İlçesi Sarnıç mahallesi atıksu işi.	Atıksu Şebeke İnş.	Ø300, Ø400 E.C.B. Boru = **11060 mt.** Ø110 PE100 boru =**173 mt.** **1 Adet** Terfi Merkezi yapılması.
17	Narlıdere İlçesi Limanreis Mah. Türker ve Limanreis Sokaklarda Y.Suyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı İnşaatı.	**L=107,00m** 1,50x1,00m B.A. Kutu kesitli Yağmursuyu Kanal Yapımı.
18	Bornova Evka-3 Şeytan Deresi İçi Atıksu Kanalı Deplasmanı ile Ege Üniversitesi Kampüs İçi İtfaiye Grubu Atıksu Kanalı İnşaatı İşi.)	Atıksu Kanalı.	**L=522m.** Ø300 ECBB Koruge Boru temini ve döşenmesi. **L=158m.** Ø400 ECBB temini ve döşenmesi. **L=722m.** Ø800 ECBB temini ve döşenmesi. **L=75,52m**. Ø63 HDPE100 PN10 Boru temini ve döşenmesi. **1 Adet** B.A. Baca İçi Terfi Yapılması.
19	İzmir İli Muhtelif Derelerin Kenarlarına 2. Etap Korkuluk Yapılması İnşaatı İşi.	Korkuluk Yapılması	**L=7707,60m.** Dere Kenarı Korkuluk Yapımı.
20	Menemen İlçesi Mermerli, Ahihıdır, Camikebir, Seydinnasrullah Mahalleleri Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu ve Dere Islah İnşaatı İşi.	Dere Islahı ve Yağmursuyu Kanalı	Ø200, 400, 500mm ECBB teminive döşenmesi. **L=765m.** Ø1000mm ECBB temini ve döşenmesi. **L=465m.** Ø200, 400, 500, 600, 800mm HDPE koruge boru temini ve döşenmesi. **L=4990m.** Ø400mm PE100 PN6 boru temini ve döşenmesi. **L=8m.** B=40cm. Betonarme Açık Y.Suyu Kanalı yapılması. **L=11m.** 1x1 – 1,5x1 – 2x1 Baks tipi Y.Suyu Kanalı yapılması. **L=821m.** 4x2,5 – 6x2,5 Kagir taş duvarlı trapez kesit dere ıslahı yapılması. **L=1533,70m.** 2x(3x2) – 4x2 Kutu menfez yapılması. **L=36,33m.** Yatak temizliği ve düzenlemesi. **L=571,68m.** Korkuluk yapılması. **1 Adet** Vana Odası yapılması. **1 Adet** Rögar yapılması.

NO	İŞİN ADI	KONUSU	İMALAT
21	Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Temini İşi.	Elektrik Temini	5345m mesafeye teraltından XLPE kablo, 1 adet betonarme şebeke direği, 19 adet modüler hücre, 1 adet 1600kVA hermetik trafo, 1 adet 1600kVA dizel jeneratörün temini ve montajı, topraklamaların yapılması, tesislerin enerjilendirilmesi.
22	Özdere Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattı İnşaatı İşi.	Arıtma Tesisi Deşarj Hat.	Ø800mm HDPE PN6 Boru temini ve döşenmesi(karasal deşarj hattı) **L=516,97m.** Derin deniz deşarj hattı yapılması. **L=500m.** (Ø800, 630, 315, 200mm HDPE PN6 Boru temini ve su altında döşenmesi. **L=547m.**)
23	Çiğli İstasyonaltı Mah. Ve Sasalı Merkez Mah. Muh. Sokaklar Yağmursuyu Kanalı İnaşaatı İşi. **(2.İHALE)**	Yağmursuyu Kanalı.	Ø200, Ø400, Ø600 HDPE Koruge Boru temini ve döşenmesi. **L=229 m.** B=0,40 m. H=Değişken Delikli Saç Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı Yapılması. **L=487 m.** B=0,60 m. H=Değişken Delikli Saç Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı Yapılması. **L=167 m.**
24	Karabağlar İlçesi Uzundere Deresi Ana Kol ve Yan Kolları Yataklarının Düzenlenmesi ile Atıksu Kanalı İnşaatı İşi.	Dere Yataklarının Düzenlenmesi ve Kanal İnşaatı	**L=1524,70m.** Ø300mm E.C.B.B. Temini ve döşenmesi. **L=435,24m.** Ø400mm E.C.B.B. Temini ve döşenmesi. **L=569,76m.** Ø500mm E.C.B.B. Temini ve döşenmesi. **L=254,14m.** Ø600mm E.C.B.B. Temini ve döşenmesi. **L=4744,80m**. Dere Islahı Yapılması. **L=9330,92m.** Dere Kenarı Korkuluk Yapılması.
25	Menderes İlçesi Özdere Orta Mahallesi 29 Ekim Caddesi, 8003 ve 8004 sk. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı	**L=188m.** Ø1000 E.C.B.B. Temin ve döşenmesi. **L=33m.** Ø200 HDPE Koruge Boru temini ve döşenmesi. **L=102m.** Ø400 HDPE Koruge Boru temini ve döşenmesi. **L=91m.** Ø800 HDPE Koruge Boru temini ve döşenmesi. **1 Adet** Su alma Yapısı Yapılması
26	Güzelbahçe AAT, Karaburun Büyükada, Foça Dereboynu ve Konak Pasaport İskelede Meteoroloji-Akıntı Ölçüm İstasyonu Platformları Yapılması İnşaatı İşi.	Beton Dökümü ve Telçit Yapılması.	**4 adet** Betonarme Platform İnşaat
27	Güzalbahçe Çamlı Köyü Gönen ve Evren Konutları İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi.	İçmesuyu Şebeke İnşaatı	**L=907,00 mt.** Ø110 mm. HDPE boru (10 Atü) **1 Adet** Sayaç Odası yapılması.
28	Bayraklı İlçesi Onur Mahallesi Muhtelif Sokaklara Kanalizasyon İnşaatı İşi.	Atıksu Kanal İnşaatı	**L=1961m.** Ø300 E.C.B.B. Temin ve döşenmesi. **L=196m.** Ø400 E.C.B.B. Temin ve döşenmesi. **L=124m.** Ø400 HDPE Koruge Boru temini ve döşenmesi. **L=124m.** Yatay delgi metodu ile delinerek geçilmesi ve Ø600mm çapında boru sürülmesi. **1 Adet** Betonarme yatay delgi itme odası yapılması.
29	Bornova , Menemen Muh. Cad.ve Sk.da Atıksu Kanal İnşaatı İşi.	Atıksu Kanal İnşaatı	**L=4379,00m.** Ø300mm E.C.B.Boru
30	Özdere AAT Alanı Enerji Nakil Hattı Tadilatı İşi.	Özdere AAT alanı ENH tadilatı	Enerji nakil hattı inşaatı
31	Bornova Eğridere Köyü, Menemen Uğur Mumcu Mah. İçmesuyu Terf. Merk. İle Foça Kozbeyli Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi	Elektrik Temini	Elektrik panosu yapımı ve enerji temini
32	Bayındır Hasköy Köyü, Menderes Yeniköy Bahçecik Mah. İçmesuyu Terfi Merkez. İle Torbalı Dağkızılca Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini İşi.	Elektrik Temini	Elektrik panosu yapımı ve enerji temini Elektrik panosu yapımı ve enerji temini
NO	Tahtalı Barajı 6. Etap Mutlak Sınır Tel Çit Yapım İşi.	Tel Çit Yapılması	Betonarme direkli tel çit yapılması **L=5550mt** Giriş kapısı yapılması **6 adet**
33	Karabağlar Tahsin Yazıcı ve A.Fuat Cebesoy Mah. Muh. Sk. Y.suyu İnşaatı ile Eskiizmir Cad. Y.suyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı	Ø200,400,500,600 mm. HDPE Koruge Boru **L=1322 m.** B=40cm. Delikli Saç Izgaralı Açık B.A. Y.Suyu Kanalı 7 Adet Delikli Saç Izgaralı Tekli Y.suyu Bacası Yapılması. **L=198m.** Mevcut IzgaraTadilatı Yapılması **L=39,90 m.**

NO	İŞİN ADI	KONUSU	İMALAT
34	Güzelbahçe AAT, Karaburun Büyükada, Foça Dereboynu ve Konak Pasaport İskelede Meteoroloji-Akıntı Ölçüm İstasyonu Platformları Yapılması İnşaatı İşi.	Beton Dökümü ve Telçit Yapılması.	**4 adet** Betonarme Platform İnşaat
35	Buca ve Gaziemir İlçeleri Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı Hk.	Ø200,400,500,600 mm. HDPE Koruge Boru temini ve döşenmesi. **L=4078 m.** Ø800,1000 mm. E.C.B.B. Temini ve döşenmesi. **L=1760m.** B=1000cm. Delikli Saç Izgaralı B.A. Y.suyu Kanalı yapılması. **L=693m.** **163 adet** Tekli Izgara yapılması.
36	Buca İlçesi Yeşilbağlar, Göksu, Fırat, Seyhan Mahalleleri Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı	Ø200,300,400,500,600,1000 mm. HDPE Koruge boru temini ve döşenmesi. **L=3985m.** Ø800,1000 mm. E.C.B.B. Temini ve döşenmesi. **L=1333m.** B=40cm. Delikli Saç Izgaralı B.A. Y.Suyu Kanalı yapılması. **L=35m.** B.A. Kutu Kesit (B:1,5m. H:1,0) yapılması. **L=1783m.** Yatay delgi modu ile delinerek geçilmesi ve Ø1200 mm. Çapında çelik boru temini ve sürülmesi. **L=76m.** **143 adet** Tekli Izgara yapılması.
37	Çiğli Balatçık ve Harmandalı Deresi İle Menderes Gölcükler Deresi Islah İnşaatı İşi.	Dere Islahı Yapılması	**L=4354m.** Borulu Y.Suyu imalatı yapılması. **L=145m.** Delikli Saç Izgaralı B.A. Y.Suyu Kanalı yapılması. **L=3032,47m.** Dere Islahı yapılması. **L=2143m.** Korkuluk yapılması.
38	Menderes İlçesi Tahtalı Barajı Havzası 2, 3 ve 4 no'lu Güvenlik Kulubeleri Elektrik Temini İşi.	Elektrik Temini	İşler kapsamında, toplamda 90mt mesafeye havai, 60mt mesafeye yeraltından kablo çekilmesi, 3 adet harici tip pano, 3 adet trafo, 3 adet trafo direğinin temini ve montajı, topraklamaların yapılması, tesislerin enerjilendirilmesi.
39	Kemalpaşa İlçesi Ulucak Mahallesi ve Damlacık Köyü Arası İçmesuyu İletim Hattı İnşaatı İşi.	İçmesuyu İletim Hattı İnş.	Ulucak Mah. 2000 m³'lük mevcut depo ile yeni yapılacak terfi odası arası **CAZİBELİ İLETİM HATTI:** İdari malı Ø100mm DF **L=2637 mt.** Yeni yapılacak terfi odası ile Damlacık Köyü 150 m³'lük mevcut depo arası **TERFİ İLETİM HATTI:** İdari malı Ø100mm DF **L=1521 mt.** **İLETİM HATLARI TOPLAMI: 4158 mt.** Sanat Yapısı 6 adet
40	Torbalı Yazıbaşı Mahallesi, Aliağa Karaköy Köyü, Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. Aşık Veysel Parkı İçmesuyu Kuyuları ve Kemalpaşa Gökyaka Köyü İçmesuyu Terfi Merkezi Enerji Temini İşi.	Elektrik Temini	İşler kapsamında, toplamda 640mt mesafeye AG kablo döşenmesi, 3 adet sayaç, 4 adet harici tip panonun ve pano malzemelerinin temini ve montajı, topraklamaların yapılması, tesislerin enerjilendirilmesi.
41	Menemen İlçesi Alaniçi Köyü Kanalizasyon İnşaatı İşi.	Kanalizasyon İnş.	Ø200 ECBB temini ve döşenmesi. **L=520,54m.** Ø300 ECBB temini ve döşenmesi. **L=3725,98m.** **2 adet** 1000 kişilik betonarme fosseptik yapılması. Fosseptiklerin çevresine telçit yapılması.
42	Bayraklı İlçesi Yamanlar, Emek ve Org. Nafiz Gürman Mahalleleri Muhtelif Sokaklarda Y.Suyu İnşaatı İşi.	Y.Suyu Kanal İnş.	Ø200, 300, 400, 500, 600, 800 HDPE Koruge Boru temini ve döşenmesi. **L=9114mt.** 1x1 , 1,6x0,8 B.A. Kutu Kesit Yapılması. **L=457mt.** B=0,40m. Delikli saç ızgaralı B.A. Enine geçiş yapılması. **L=471mt.** **275 Adet** Tekli Izgara Yapılması. **1 Adet** Su alma Yapısı Yapılması.
43	Bornova Homeros Vadisi Kocapınar, Çatalpınar, Kererli, Bedesten, Deli Süleyman Kaptaj Odaları ve Toplama Deposu Tadilatı İşi.	Homeros Vadisi Kaynakları Tadilatı	Kaptaj odası ve toplama odası onarımı ve çevre koruma çiti yapılması.

NO	İŞİN ADI	KONUSU	İMALAT
44	Buca Belenbaşı Köyü İçmesuyu Kuyusu Elektrik Temini	Elektrik Temini	Havai Hat=20mt. Yer altı Kablo Döş.=900mt BA Direk=2 ad. Direk Tipi Trafo=1 ad.
46	Gaziemir Irmak Mah.36, 713, 711 Sok. Yağmursuyu İnş.	Yağmursuyu Kanal İnş.	1,00mtx1,00mt BA.Menfez=288 mt.
47	Seferihisar Karakoç Deresi Islahı İnşaatı İşi.	Dere Islahı İnş.	**L=320,00m.** B.A. Trapez Kesit (B=35,00 H=2,50) **L=1852,30m.** Duvar Çimento Harçlı Taş Duvar, Taban B.A. Kaplama Dere Islahı yapılması (B=25,00 H=3,25) **L=4343,60m**. Korkuluk Yapılması **L=32,55m.** Açıklıklı 1 adet Uzay Kafes Sistem Yaya Köprüsü Yapılması.
48	Çiğli İlçesi Maltepe Deresi Islah İnşaatı İşi.	Dere Islahı Yapılması	**L=2341,18 m.** Dere ıslah yapılması **L=4717 m.** Korkuluk yapılması
49	Çiğli İlçesi Aydınevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka-2 Mah. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu İnş.	Ø200, 400, 500, 600 mm. HDPE Koruge boru temini ve döşenmesi. **L=2525,00 m.** B=40 cm. Delikli Saç Izg. B.A. Y.Suyu Kan. **L=261,2 m.** Bordür Izgara Yapılması = **44 adet**
50	Konak Kadifekale Bölgesi Selvili Pompa – kale Depoları Arası İçmesuyu İletim Hattının Yenilenmesi İşi.	İçmesuyu İletim Hattı Yenileme İnş.	Ø500, 600 mm DF boru **L=910mt.**
51	İzsu Narlıdere Şube Müdürlüğü Binası Subasman Seviyesi İkmal İnşaatı İşi.	Bina İnş.	1 Adet Hizmet Binası (Subasman Seviyesine kadar)
52	Konak İlçesi Ferahlı, Küçükada, Zeytinlik, Yenidoğan, Mehmet Akif ve Ulubatlı Mah. Muh. Sk. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu İnş.	B=90 cm. Delikli Saç Izg. U kesit B.A. Açık Kan. **L=792,10 m.** 1,00x1,00 , 2,00x1,00 Aralıklı Sfero Dök. Izg. B.A. Baks Tipi Kan. **L=909,00 m.** Ø200, 300, 400, 500, 600, 800 mm. HDPE Koruge Tip-5 boru Temini ve döşenmesi. **L=3290,00m.** Sfero döküm kapaklı tekli yağmursuyu ızgarası yapılması = **67 adet**
53	Menemen AsarlıkMahallesi İçmesuyu Terfi Merkezi Elektrik Temini İşi.	Eletrik Temini	Bu işin kapsmında; **3 adet** betonarme direğin sökümü, **130mt** mesafeye havai hat, **160mt** mesafeye yeraltından kablo döşenmesi, **3 adet** betonarme direk, **1 adet** PB-3 tipi beton trafo köşk, **3 adet** modüler hücre, **1adet** trafonun temini ve montajı, topraklamaların yapılması, tesislerin enerjilendirilmesi.
54	Kemalpaşa İlçesi Sütçüler ve Yenmiş Köyleri İçmesuyu İnşaatı İşi.	İçmesuyu İnş.	**İLETİM HATLARI:** Sütçüler Köyü; Ø200 mm DF ve Ø200 mm Çelik L=1.529 m. Yenmiş Köyü; Ø100, 150 mm DF ve Ø150 mm Çelik L=3.875 m. **ŞEBEKE HATLARI:** Sütçüler Köyü; Ø75, 110, 160, 225 mm HDPE (10 Atü) ve Ø200 mm Çelik L=18.294 m. Yenmiş Köyü; Ø75, 110, 160 HDPE (10 Atü) ve Ø65, 150 mm Çelik L=11.602 m. **İLETİM VE ŞEBEKE HATLARININ TOPLAMI=35.300,00 m.**
55	Bornova İlçesi Çamdibi, Manda Çayı - Fatih Cad.-Kemalpaşa Cad. Ve Çevre Yolu Sınırı Mevcut Dere Yataklarının Düzenlenmesi ile Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon İnşaatı İşi.	Dere Islahı, Yağmursuyu ve Kanal İnşaatı	Ø200, 300, 400, 500, 600, 800mm. HDPE Korige Boru=**30.184,47m.** Çeşitli ölçülerde B.A. Baks Y.Suyu Kanal=**18.548,95m.** Çeşitli ölçülerde Delikli Saç Izgaralı B.A. Açık Kanal=**10.328,67m.** Tekli Izgara Rögarı=**142 Adet.**
56	Konak İlçesi Mithatpaşa Mah. Şehit Nihat Bey Cad. Ve 189 Sk. Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı İnş.	Ø200, 400, 500 mm HDPE Koruge boru temini ve döşenmesi. **L=341,50 m.** B=40 cm. Delikli Saç Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı yapılması. **L=145,50 m.** B=60 cm. Delikli Saç Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı yapılması. **L=49 m.** **6 adet** Tekli Izgara yapılması.

NO	İŞİN ADI	KONUSU	İMALAT
57	Bornova İlçesi Kemalpaşa Mah. 5.Sanayi Sitesi Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi.	Yağmursuyu Kanalı İnş.	Ø200, 400, 500, 600 mm HDPE Koruge boru temini ve döşenmesi. **L=1261,50 m.** B=40 cm. Delikli Saç Izgaralı Betonarme Y.Suyu Kanalı yapılması. **L=21,00 m.** **44 adet** Tekli Izgara yapılması. Basamaklı Savak Yapılması. **L=12,10 m.**
58	Menderes Görece Ambar Binası İnşaatı İşi.	Bina İnş.	Ambar binası yapılması **1 adet**
59	Karabağlar İlçesi Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mah. Yağmursuyu İnşaatı İşi.	Yağmursuyu İnş.	Ø500mm HDPE Koruge boru temini ve döşenmesi.**L=60m.** B=40cm. U-80 Izgaralı Betonarme Y.suyu Kanalı Yapılması. **L=1331m.**
60	Karabağlar İlçesi Basın Sitesi, Çankaya, Araphasan Mah. İle İnönü ve Gazeteci Hasan Tahsin Caddeleri Muh. Sk. Yağmursuyu İnş. İşi.	Yağmursuyu İnş.	Ø200, 400, 500, 600 HDPE Koruge Tip-5 boru temini ve döşenmesi. **L=3867,00 m.** B=40 cm. , B=80 cm. Delikli Saç Izgaralı U kesit B.A. Açık Kanal yapılması. **L=164,00 m.** **65 Adet** sfero döküm kapaklı tekli yağmursuyu ızgarası yapılması. **4 Adet** özel baca yapılması.

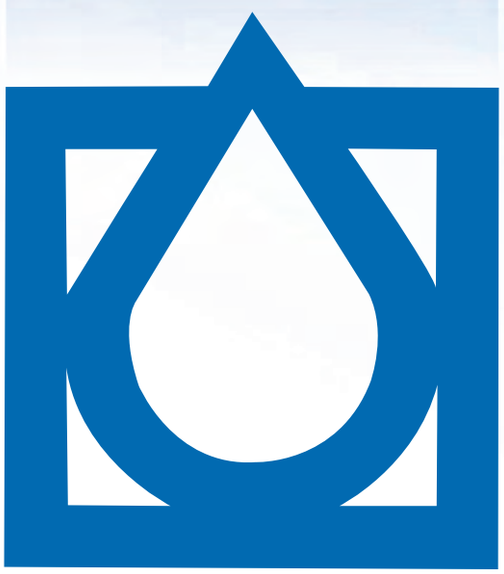

İZSU

TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Norm Kadro standartlarına göre yeni yapılanma gereği İZSU Yönetim Kurulunun 19.04.2007 tarih ve 21/243 sayılı kararı ile Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar ile söz konusu Daire Başkanlığı'na; İhaleler Şube Müdürlüğü, Hakediş ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü ile Satınalma Şube Müdürlüğü bağlanmıştır.

Bu kapsamda Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ana işlevi; Kanunlar, Yönetmelikler, Yönergeler, ilgili mevzuatlar ile İZSU bütçesinde bulunan ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunuyla belirlenmiş, İZSU Genel Müdürlüğü birimlerinden gelen mal ve mala yönelik hizmet alım satım ihtiyaçları ile yatırım programında bulunan hizmet alımları ve yapım işlerinin ihalelerini yürütmek ve sonuçlandırmak, bu kapsam dışındaki işleride İZSU İhale Yönetmeliği veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre sonuçlandırmak,

Hizmet ve yapım işlerinin ara hakediş ve kesin hesaplarının içeriğinde yer alan tüm dokümanlarının sözleşme, şartnameler, genelge hükümlerine ve projesine uygun düzenlenmiş olup olmadığını incelemek, eksiklerini tamamlatmak, hesap hatalarını düzeltmek ve tasdik etmek,

görevlerini yürütmektir.

İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMI

İhaleler Şube Müdürlüğü, idarenin tüm birimlerinin yatırım programında bulunan, Hizmet Alımları, Danışmanlık Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İhale Uygulama Yönetmelikleri hükümlerine, Tebliğlerle yapılan düzenlemelere ve bu kapsam dışındaki işleri İzsu İhale Yönetmeliğine göre yürütür ve sonuçlandırır.

- ≠ İlgili birimlerden gelen ihale taleplerini işin cinsi, niteliği, miktarına göre tasnif edip, ihale yönteminin ihale yetkilisince belirlenmesini sağlamak ve ihale onayı almak,
- ≠ Belirlenen ihale usulüne göre ihale dokümanlarını hazırlamak,

- ≠ İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği ihale sürecinin gerektirdiği tüm işlemleri yaparak ihaleyi gerçekleştirmek,
- ≠ Onaylanan ihalenin sözleşmesinin imzalanmasını sağlamak,
- ≠ İmzalanan sözleşmeyi talebi yapan birime yada ilgili birimlere göndermek-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre önmali kontrol yapılması öngörülen işlerin sözleşme imzalamadan önce ön mali kontrol yapılması amacıyla Strateji Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yapmak.

Ayrıca çalışmalar yürütülürken;

- ≠ İhale kayıt numaraları için Kamu İhale Kurumu ile gerekli yazışmaları yapmak,
- ≠ KİK ilan bedeli ve yerel gazete ilan bedelleri için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yapmak,
- ≠ Yerel Gazete ilanları için de; Basın İlan Kurumu, ile yazışma yapılarak ilanların yayımlanmasını sağlamak,

genel faaliyetlerini oluşturmaktadır.

İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYETLERİ

2012 faaliyet yılında 41 adet açık ihale,29 adet doğrudan temin,7 adet pazarlık usulü, toplam 77 adet hizmet alımı işi; 73 adet açık ihale, 2 adet pazarlık usulü, 24 adet doğrudan temin toplam 99 adet yapım işleri; 6 adet danışmanlık işi tamamlanmış toplam 182 adet iş sözleşmeye bağlanmıştır. Genel toplamda 129 adet işin ihalesi yapılıp sözleşmeye bağlanmıştır. Ayrıca 40 adet yapım işi, 14 adet hizmet işi olmak üzere 55 adet işin ihale işlemleri devam etmektedir. Yıl içinde 23 adet ihale çeşitli sebeplerden iptal edilmiştir.

HAKEDİŞ VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMI

Hakediş ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, İdarenin tüm birimlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, İZSU İhale Yönetmeliği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu göre hizmet ya da yapım olarak ihale edilerek, yükleniciyle sözleşmesi yapılan işlerinin, denetim görevlilerince düzenlenmiş olan ve incelenmesi istenen, Geçici Hakediş ve Kesin Hakediş Raporlarını inceler. Bu incelemede hakedişlerin içeriğinde yer alan ataşman, metraj, yeşil defter, tutanak, icmal cetvelleri, fiyat farkları ve benzeri belgeler ile gerekli görülen diğer dokümanlarının sözleşme, şartnameler, genelge hükümlerine ve projesine uygun düzenlenmiş olup olmadığına bakılır, eksik evrakı varsa tamamlatılır, hesap hataları düzeltilir.

Yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik olarak, farklı düzenlemelerin önüne geçilmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması bakımından, Hakediş Raporları için gerekli tablo ve evrakların tek tip olarak düzenlenmesini sağlar.

İlgili Dairesi ve yüklenici ile gerekli yazışmaları yaparak hakedişleri sonuçlandırır, tasdik edilen hak edişlerin muhasebeleşmesi için Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek görevlerinden sorumludur.

HAKEDİŞ VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYETLERİ

Yapım ve hizmet işlerinden, 2012 faaliyet yılında incelenmesi için gelen ödemeye esas 827 adet Geçiçi Hakediş incelenmiş olup toplam 161.400.212,25 TL'lik tasdik olmuştur. 170 adet Kesin Hakediş Raporu incelenerek 3.961.942,57 TL 'lik tutarında onaylanmıştır.

Ayrıca yapıma ihtiyaç duyulan fiyat analizleri incelenerek ödemeye esas yeni fiyatlar sonuçlandırılmıştır.Tüm birimlerden gelen mal, hizmet ve yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri incelenip kontrol edilerek sözleşmesine uygunluğu sağlanmıştır.

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMI

Satınalma Şube Müdürlüğü, İdarenin ilgili birimlerinin mal ya da mala yönelik hizmet alım, satım ihtiyaçlarını, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, istenilen nitelik ve nicelikte en uygun fiyatlarla karşılamak amacıyla, piyasa araştırması ve ihale işlemleri gerçekleştirme görev ve sorumluluğu ile faaliyetlerini yürütmektedir.

İdare, Harcama birimlerinin ihtiyacı olan büro malzemeleri, bilgisayar ve sarf malzemeleri, araç tamiri ve malzemeleri, inşaat ve şebeke malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, araç ve ekipman, su arıtma kimyasalları ve malzemeleri, atık su arıtma kimyasalları ve malzemeleri, akaryakıt ve ürünleri gibi birçok malzemenin satın alma işlemlerini gerçekleştirmektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunları Uyarınca;

- ≠ İlgili birimlerden gelen taleplerin İhale yönteminin belirlenmesini sağlamak,
- ≠ 4734/22.d maddesine istinaden alımı uygun görülen malzemeler için piyasa araştırması yapmak,
- ≠ Piyasa araştırması neticesinde alımı onaylanan işlerin siparişlerini hazırlamak ve siparişleri ilgili firmalara ulaştırmak,
- ≠ Siparişlerin teslimini sağlamak/sağlatmak,
- ≠ Gereğinde satınalma memurlarınca avans mukabilinde alım gerçekleştirmek,
- ≠ Açık ihale yöntemi ile alımı uygun görülen işler için ihale işlem dosyası hazırlamak,
- ≠ Dosya satış işlemi gerçekleştirmek,
- ≠ İhale komisyonlarınca karara bağlanan ihalelerin ihale yetkilisinden onay alınmasını sağlamak,
- ≠ Onaylanan ihalelerin sözleşmesinin hazırlanarak imzalanmasını gerçekleştirmek,
- ≠ DMO 'nden yapılacak alımların işlemlerini gerçekleştirmek,
- ≠ Sözleşmeleri, kabul işlemlerini gerçekleştirmek üzere talebi yapan ilgili birimlere göndermek,
- ≠ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ön mali kontrol yapılması öngörülen işlerin sözleşme imzalamadan önce ön mali kontrol yapılması amacıyla Strateji Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yapmak

Ayrıca çalışmalar yürütülürken;

- ≠ İhale kayıt numaraları için Kamu İhale Kurumu, ile gerekli yazışmaları yapmak,
- ≠ KİK ilan bedeli ve yerel gazete ilan bedelleri için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yapmak,
- ≠ Yerel Gazete ilanları için de; Basın İlan Kurumu, ile yazışma yapılarak ilanların yayımlanması sağlanmaktadır.

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYETLERİ

2012 faaliyet yılı içinde 116 adet açık ihale usulu ile Mal Alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 33 adedi çeşitli sebeplerden iptal edilmiş 83 adedi sözleşmeye bağlanmıştır. Bu sözleşmelere karşılık 29.715.785,33.- TL karşılığı alım gerçekleştirilmiştir.

Kamu İhale Kanununun 10 adet 3/e maddesine istinaden Devlet Malzeme Ofisinden 15.928.859,07 TL, ilgili firmalardan 1 adet 21/b (pazarlık usulü) maddesine istinaden 3.201.250,00 TL , 6 adet 22/a maddesine istinaden 141.802,63 TL , 268.500 EURO 'lik ihale gerçekleştirilmiş, mal ve ekipman alımı yapılmıştır. 21 adet işin ihale işlemleri devam etmektedir.

Ayrıca aynı kanunun doğrudan temin başlıklı 1276 adet **22/d maddesine** istinaden piyasa araştırması gerçekleştirerek 16.499.259,88 TL'lık alım yapılmıştır. 31 adet iş 3/e maddesine göre sonuçlandırılmıştır.

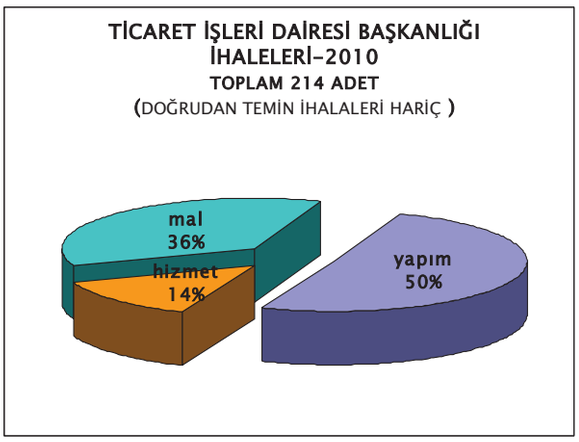

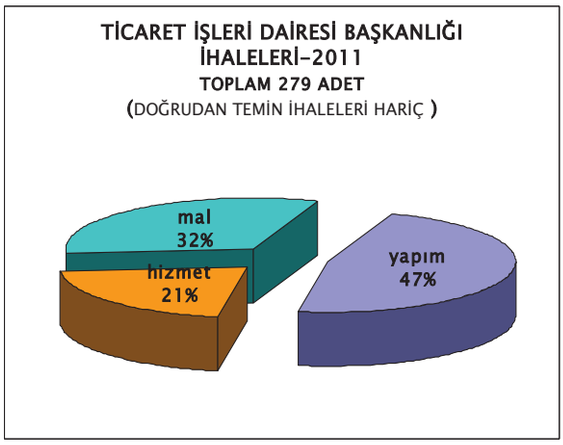

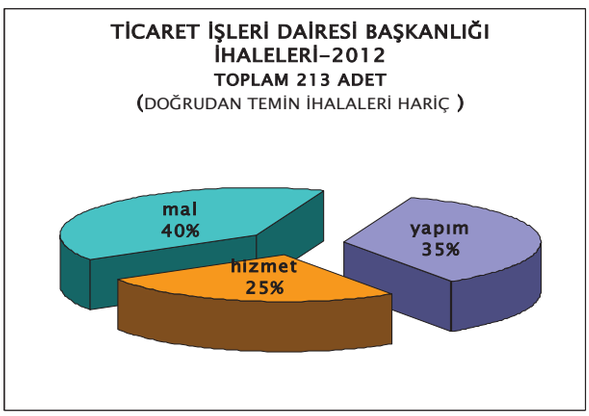

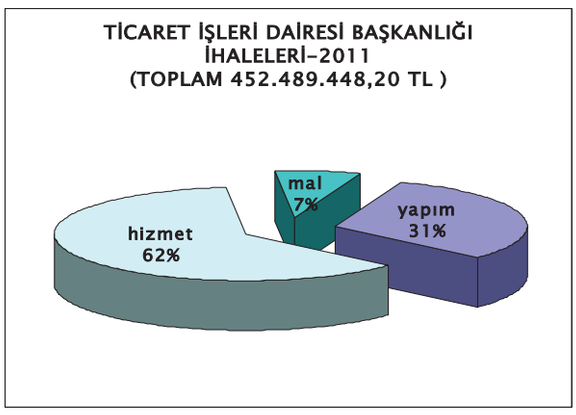

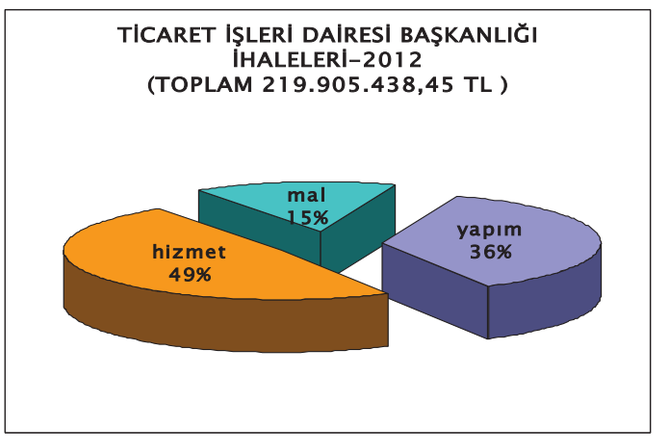

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İZSU kuruluşundan itibaren Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı ismi ile faaliyet gösteren Daire Başkanlığı 19.04.2007 tarih M.35.0.İBB.5.01.21/243 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı adını almıştır. Ayrıca yine aynı Yönetim Kurulu Kararı ile Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü ismi ile faaliyet gösteren Şube Müdürlüğü Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğü adını, İçme Suyu Arıtma Tesisleri İşletme Şube Müdürlüğü ismi ile faaliyet gösteren Şube Müdürlüğü de Yüzey Suyu Üretim Şube Müdürlüğü adını almıştır.

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı 2560/3009 Sayılı Yasa ile kurulan İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2872/5491 Sayılı Çevre Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 5237 Sayılı TCK Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili yönetmelik, yönergelere dayanarak, İzmir Metropol alanında yaşayanlara ihtiyaçları olan suyu zamanında ve kaliteli olarak ulaştırmak, su kaynaklarının son teknolojik gelişmeler çerçevesinde en iyi şekilde kullanılması ve arıtılması, su kaynaklarının korunması, atık suların çevreyi kirletmesini engelleyecek şekilde denetlenmesi vizyonu kapsamında çalışmalarını 236 adet teknik personel ile yürüten bir harcama birimidir.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 3(üç) Şube Müdürlüğünden oluşmuştur.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, bu harcama birimine bağlı olan müdürlükleri aracılığı ile aşağıda tarifli işleri yürütmektedir.

Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğü ile;

≠ 5216 sayılı yasa ile tanımlı İzmir Büyükşehir sınırları içinde endüstriyel atıksu kaynaklarının kanalizasyon öncesi tedbirlerini aldırmak, kontrolünü sürdürmek ve aykırı durumların tespitinde yasal işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara bildirmek;

≠ Su Havzalarının evsel, endüstriyel, tarımsal kirleticilerden korunması için gerekli tedbirleri aldırmak, kirletici kaynakların kontrolünü sürdürmek ve aykırı durumların tespitinde yasal işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara bildirmek;

Laboratuvar Şube Müdürlüğü ile;

≠ Kirletici kaynakların atıksu analizlerini yapmak, içme suyu kimyasal ve bakteriyolojik analizlerini yapmak, içme suyu kaynaklarını ve şebekeyi kalite açısından izlemek, şebeke dezenfeksiyonunu sağlamak, dezenfeksiyon ünitelerinin bakım ve işletimini sağlamak;

Yüzeysuyu Üretim Şube Müdürlüğü ile;

≠ Yüzey suyu kaynaklarına ait içme suyu arıtma tesisi ve pompa istasyonlarını işletmek, bakım ve onarımını yapmak;

Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğü, Laboratuvar Şube Müdürlüğü ve Yüzeysuyu Üretim Şube Müdürlüğü ile;

≠ 5018 sayılı yasa kapsamında bütçesini oluşturarak bütçe stratejik plan hedefleri kapsamında yatırımlarını ve işletme çalışmalarını gerçekleştirmek.

≠ 5018 sayılı yasa kapsamında tüm birimlerinin taşınır mal varlıklarını kayıt altına alarak kontrolünü yapmakla görevli olup 2012 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmaların detayları birimler kapsamında tanımlanmıştır.

RUHSAT DENETİM KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. MERKEZ BİRİMİ 2012 YILI ÇALIŞMALARI

A) Atıksu kirliliğine sebebiyet veren işletmeler kontrol edilmektedir.

Kontrol Altındaki Bireysel İşletme Sayısı

Önemli Kirletici Kaynak	: **53** Adet Aktif – **4** Adet 2012 yılında İnaktif
Önemsiz Kirletici Kaynak	: **2755** Adet Aktif – **215** Adet 2012 yılında İnaktif
Toplam İşletme Sayısı	: **3027** Adet (2808 Aktif – 219 İnaktif)

B) Önemli kirletici kaynak durumunda olan işletmelere arıtma tesisi yaptırılmaktadır. Arıtma Tesisi olan işletmeler, Arıtma Tesisini devreye alma aşamasında olan işletmeler ve 2012 yılında faaliyetini durduran önemli kirleticiler listeler halinde verilmiş olup yeni tesislere ilişkin görüntüler aşağıdadır.

Atıksu Debisi ≥ 50 m^3/gün Önemli Kirletici: **53** Adet

2012 yılında Arıtma Tesisi yapan işletmelerden görüntüler;



Ege Hazır Yiyecek Arıtma Tesisi

Denge Tekstil San.Tic. Arıtma Tesisi



Önemli kirletici kaynak durumunda olup, 2012 yılında arıtma tesisi olan işletme sayısı 53 adet, faaliyetini durduran işletmelerin sayısı ise 4 adettir.

C) Önemsiz kirletici kaynak durumundaki işletmelere kanal öncesi "ızgara – elek – çökeltim havuzu – yağ tutucu – nötralizasyon – çamur kurutma yatağı" gibi önlem tesisleri yaptırılmaktadır.

Atıksu Debisi < 50 m^3/gün Önemsiz Kirletici: **2755** Adet

a) Projeli Önlem Tesisi olan

İşletme Sayısı : 860 Adet + 193 Adet (Devrede Olan + Olmayan) = **1053**

b) Basit Önlem Tesisi olan

İşletme Sayısı : 260 Adet + 19 Adet (Devrede Olan + Olmayan) = **279**

c) Kuru İşletme Sayısı : 736 Adet + 368 Adet + 257 Adet + 62 Adet)

(Kuru + Evsel + Mermerci + D.daim Uyg. İşletme) = **1423**

Toplam Önemsiz Kirletici İşletme Sayısı: = **2755**

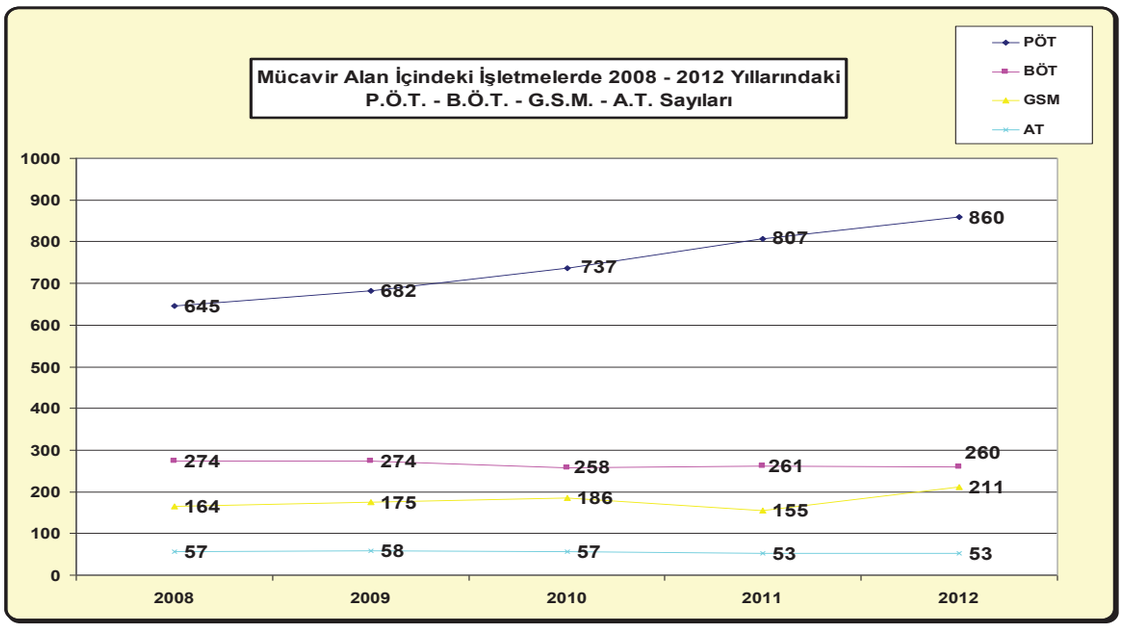

2012 yılında Projeli Önlem Tesisini yapan işletmelerden görüntüler;



Efes Oteli Oto Yıkama



Atakalp Hastanesi Çamaşırhane-Yemekhane



Mikrocerrahi Hastanesi Çamaşırhane-Yemekhane



Mozaik Şarapçılık

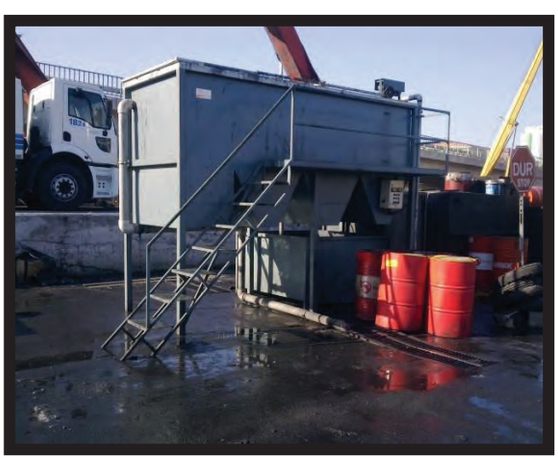

TCDD İzmir Limanı Loko Bakım Atölyesi



Urla Makine Tır Araç Bakım Atölyesi

D) DENETİM VE NUMUNE ALMA SAYISI

Denetim Sayısı : **4694** Adet Atıksu Numune Sayısı: **2151** Adet

E) 2012 YILINDA UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER

Arıtma yada önlem tesisini İZSU standart değerlerine göre uygun çalıştırmayan, atıksu kirliliğine sebebiyet veren işletmelere birimimiz KÖP (Kirlilik Önlem Payı) uygulamaktadır. Arıtma Tesisini devreye almayanların teminatları gelir kaydedilmekte, KÖP tahakkukları ve uyarılara rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen, çevre kirliliğine sebebiyet veren endüstriler ve atıksularını alıcı ortama deşarj edenler Çevre Kanununa göre işlem yapılmak üzere Mülki Amirliklere ve GSM Yönetmeliğine göre işlem yapılmak üzere ise ilgili Belediyesi'ne gönderilmektedir.

a) İZSU Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine göre KÖP tahakkuk yapılan işletme adedi **1586** adet olup, Ocak-Aralık 2012 arası tahakkuk edilen **543.451,00 TL**, tahsil edilen KÖP miktarı ise **251.268,00 TL**'dir. Ödenmeyen tahakkuklar icra yolu ile tahsil edilmektedir.

b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 2012 yılında **1** işletme alıcı ortama deşarj etmesi nedeniyle cezai işlem için gönderilmiştir. Kurum tarafından Çevre Kanunu kapsamında söz konusu işletmeye herhangi bir cezai işlem yapılmamıştır.

c) İlgili Belediyelerine 2012 yılında **95** işletme GSM Yönetmeliğine göre işlem yapılmak için gönderilmiştir. İlgili belediyeleri tarafından **30** adet işletmeye faaliyetten men cezası uygulanmıştır.

MERKEZ KONTROL BİRİMİNİN DİĞER ÇALIŞMALARI

- Gelen Evrak Sayısı : **2553** Adet
- Çıkan Evrak Sayısı : **2331** Adet
- Proje Onay Adedi : **140** Adet
- GSM Ruhsatı Görüşü Sayısı : **211** Adet
- Deşarj Ruhsatı Sayısı : **350** Adet

2. HAVZA BİRİMİ 2012 YILI ÇALIŞMALARI

İZMİR ŞEHRİNE İÇME SUYU TEMİN EDEN BARAJ GÖLLERİ



Tahtalı Barajı

Toplam Yağış alanı ~555 km^2'dir.

2012 yılında üretilen su miktarı 66.336.300 m^3/yıl'dır.

2012 yılında üretilen suyun %34,8'i bu kaynaktan sağlanmıştır.

2012 yılı su kalitesi mevsimsel değişiklikler görülmekte olup Alüminyum, Mangan, BOI5, Oksijen Doygunluğu A3, T.Kaliform, Fekal Kaliform, Amonyum Azotu A2, diğerleri A1 sınıfındadır.


Balçova Barajı

Toplam Yağış Alanı 32.82 km^2

2012 yılında üretilen su miktarı 5.243.395 m^3/yıl'dır.

2012 yılında üretilen suyun %2,8'i bu kaynaktan sağlanmıştır.

2012 yılı su kalitesinde mevsimsel değişimler görülmekte olup BOI5 A2, diğerleri A1 sınıfındadır.


Ürkmez Barajı

Toplam Yağış Alanı 30.81 km^2

2012 yılında üretilen su miktarı 1.705.156 m^3/yıl'dır.

Ürkmez bölgesinin İçmesuyu bu kaynaktan sağlanmaktadır.

2012 yılı su kalitesinde mevsimsel değişmeler görülmekte olup, T.Kaliform ve Çözünmüş Demir A2, diğerleri A1 sınıfındadır.


Gördes Barajı

Toplam Yağış Alanı 1045 km^2

2012 yılında üretilen su miktarı 14.763.248 m^3/yıl'dır.

2012 yılında üretilen suyun %7,7'si bu kaynaktan sağlanmıştır.

2012 yılı su kalitesinde mevsimsel değişmeler görülmekte olup, Alüminyum, BOI5 A3, Toplam Kaliform, Oksijen Doygunluğu, Mangan A2, diğerleri A1 sınıfındadır.

STRATEJİK PLAN YATIRIM PROGRAMINDA BULUNAN ÇAMLI BARAJI


Çamlı Barajı

Toplam Yağış alanı 62,71 km^2'dir.

2012 su kalitesi İletkenlik, Nitrat, Sülfat uygun değil, Nitrat Azotu, Nitrit Azotu A4, Alüminyum, Kurşun, Demir, Mangan, Çözünmüş Oksijen, BOI5, Civa, T.Fosfor, Sülfat A3, Renk, Klorür, Amonyum Azotu, T.Kjeldahl Azotu, Oksijen Doygunluğu A2, diğerleri A1 sınıfındadır.

Stratejik plan yatırım programındadır.

Baraj yapımına ilişkin mevcut planlama raporunun DSİ tarafından kabul edilmemişir. Bu nedenle 2.ci planlama raporu revizyonu sürmektedir.

TAHTALI BARAJI KORUMA ALANINDAKİ 2012 YILI ÇALIŞMALARI

A) ATIKSU KAYNAKLARININ VE YAPILAŞMANIN KONTROLÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre 2012 yılı içinde Tahtalı Baraj havzasının evsel, endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla denetimler sürdürülmüş, işletmelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.

Tahtalı Baraj Havzası	Aktif	İnaktiif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	90	86	**176**
Evsel Atıksuyu Olan İşletme	335	66	**401**
Endüstriyel Atıksuyu Olan İşletme	52	24	**76**
Toplam	**477**	**176**	**653**

Ayrıca; Tahtalı Baraj Havzası içinde 10 adet Arıtma Tesisi olan evsel yada endüstriyel işletme mevcuttur. Söz konusu işletmelerin arıtmalarının kontrolleri de yapılmakta, kanun ve yönetmelik hükümlerindeki standartlar doğrultusunda çalışmalar sağlanmaktadır. Diğer işletmelerin ise atıksuları için sızdırmasız fosseptikleri mevcuttur.

Baraj havzasında yapılaşmanın kontrolü amacıyla **2012** yılı içinde; **62** adet kaçak yapı tespit edilmiştir. Tespit edilen kaçak yapıların durumu aşağıda verilmiştir. Tespit edilen yapılardan orta ve uzun mesafeli koruma alanı içindeki yapılar 3194 sayılı Kanuna ve TCK'ya göre işlem yapılmak üzere ilgili belediyesine gönderilmektedir. Mutlak, Kısa ve Dere Mutlak Koruma alanında kalan yapılar ise İdaremiz Yönetim Kurulu tarafından alınan yıkım kararı sonrasında yıkım programına alınmaktadır. Ayrıca TCK'na göre işlem başlatılmaktadır.

2012 yılında tespit edilen kaçak yapıların koruma alanına göre durumu

	Uzun	Orta	Kısa	Mutlak	Dere Mutlak	Toplam
Tespit Edilen Kaçak Yapı	37	3	7	---	15	62

2012 yılında İdaremiz görev kapsamında yıkımı yapılan yapıların durumu

	2012 yılında tespit edilip yıkılan kaçak yapı sayısı	2012 yılı öncesi tespit edilip 2012 yılında yıkılan kaçak yapı sayısı	Toplam
Kısa mesafe	2	6	8
Mutlak mesafe	---	---	---
Dere mutlak	3	10	13
Toplam	**5**	**16**	**21**

2012 yılı sonu itibarıyla İdaremiz görev kapsamındaki işlemde olan mutlak, kısa, dere mutlaktaki yapıların durumu

Yıkım programına alınacaklar	1
Tebligat süresi 60 günü bekleyenler	1
Tebligat aşamasında olanlar	1
Dava açıp ara karar bekleyenler	1
Basınla Tebliğ	---
İşlemleri devam edenler	14
Toplam	**18**

2012 Yılında Yıkılan Binaların Fotoğrafları

Yıkım Öncesi **Yıkım Sonrası**













2012 Yılında Yıkılan Binaların Fotoğrafları

Yıkım Öncesi **Yıkım Sonrası**






B) 2012 YILINDA TAHTALI BARAJ HAVZASINDA UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER

Yönetmelik hükümlerine aykırı eylemde bulunarak göl alanı ve ağaçlandırma alanına hayvan sokan **1058** kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılması için ilgili Belediyesine gönderilmiş, 2012 yılında **149** kişi hakkında ilgili Belediyesi işlem yapmıştır. Ayrıca, Belediyeler **9** adet işletmeye uzaklaştırılacak işletme olmaları nedeniyle faaliyetten men, **2** adet moloz dökümü içinde Kabahatler Kanununa göre idari işlem yapmıştır.

İZSU Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi gereği **3** adet vidanjör firmasının Yönerge hükümlerini ihlal etmeleri nedeniyle **5** adet vidanjörün **2.645,02 TL** değerindeki teminatları gelir kaydedilmiştir.

C) TAHTALI MUTLAK KORUMA ALANI AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

2012 yılında mutlak koruma alanında **650 hektar** alanın koruması, **402 hektar** alanın bakımı, **120 hektar** alanın ağaçlandırılması yapılmıştır.

2012 yılında 39.000 adet fidan dikilmiş olup, 2012 yılı sonu itibariyle 450 hektar'lık mutlak koruma alanında toplam 540.000 adet fidanın bakımı, koruması ve dikimi yapılmıştır.

2012 Yılı Fidan Dikimi ve Bakım Çalışmaları



Servis ve Emniyet Yolu Bakımı



Servis ve Emniyet Yolu Yapımı



Pullukla Sürüm (Bakım)



Ot Alma Çapalama (Bakım)

2012 Yılı Fidan Dikimi ve Bakım Çalışmaları



Alt Toprak İşlemesi (Bakım)



Üst Toprak İşlemesi (Bakım)



Fidanlıktan Fidan Alımı



Fidan Dikimi

BALÇOVA BARAJI KORUMA ALANINDAKİ 2012 YILI ÇALIŞMALARI

Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre 2012 yılı içinde Balçova Baraj Havzasının evsel, endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla denetimler sürdürülmüştür. Balçova Baraj havzasının tamamı orman alanıdır.

Balçova Baraj Havzasındaki işletmelerin durumu aşağıda verilmiştir.

Balçova Baraj Havzası	Aktif	İnaktiif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	4	4	**8**
Evsel Atıksuyu Olan İşletme	0	0	**0**
Endüstriyel Atıksuyu Olan İşletme	0	0	**0**
Toplam	**4**	**4**	**8**

2012 yılında kaçak yapı tespiti yoktur.

ÜRKMEZ BARAJI KORUMA ALANINIDAKİ 2012 YILI ÇALIŞMALARI

Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre 2012 yılı içinde Ürkmez Baraj Havzasının evsel, endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla denetimler sürdürülmüştür. Tamamı orman alanıdır. Yapılaşma ve ticari faaliyet yoktur.

GÖRDES BARAJI KORUMA ALANINIDAKİ 2012 YILI ÇALIŞMALARI

Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre 2012 yılı içinde Gördes Baraj Havzasının evsel, endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla denetimler başlatılmıştır. Bakanlık Aralık 2012 tarihinde bu havzada Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerektiğini bildirmiştir. 2012 yılında tespit edilen işletmelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.

Gördes Baraj Havzası	Aktif	İnaktiif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	158	1	**159**
Evsel Atıksuyu Olan İşletme	4	0	**4**
Endüstriyel Atıksuyu Olan İşletme	14	0	**14**
Toplam	**176**	**1**	**177**

ÇAMLI BARAJI KORUMA ALANINDAKİ 2012 YILI ÇALIŞMALARI

Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre 2012 yılı içinde Çamlı Baraj Havzasının evsel, endüstriyel, hayvancılık, tarımsal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amacıyla denetimler sürdürülmüştür. Çamlı Baraj Havzasındaki işletmelerin durumu aşağıda verilmiştir.

Çamlı Baraj Havzası	Aktif	İnaktiif	Toplam
Hayvancılık Tesisi	0	3	**3**
Evsel Atıksuyu Olan İşletme	0	11	**11**
Endüstriyel Atıksuyu Olan İşletme	1	0	**1**
Toplam	**1**	**14**	**15**

2012 yılında kaçak yapı tespiti yoktur.

TÜM HAVZALARIN KORUMA KONTROL ÇALIŞMALARINDA;

- **Denetim Sayısı: 1977 Adet**
- **Numune Sayısı: 209 Adet**

HAVZA KONTROL BİRİMİNİN DİĞER ÇALIŞMALARI

- Gelen Evrak Sayısı : 1748 Adet
- Çıkan Evrak Sayısı : 1699 Adet
- Proje Onay Sayısı : 23 Adet
- GSM Görüşü Sayısı : 21 Adet
- Vidanjör Çalışma İzin Belgesi : 95 Adet
- Zirai Elektrik İzin Sayısı : 81 Adet
- Çevre Düzeni Planı ve Su Havzaları Kontrol Yönetmeliği'ne göre İzin Sayısı : 43 Adet
- Yönetim Kurulu Kararı Sayısı : 69 Adet

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TAHTALI BARAJI İÇMESUYU ARITMA TESİSİ 2012 YILI İŞLETME FAALİYETLERİ

TAHTALI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ve TAHTALI POMPA İSTASYONU YILLIK FAALİYET TABLOSU

		2008	2009	2010	2011	2012	2012 YILI SARFİYATLAR
BARAJ DURUMU							
BARAJ KODU	(m)	34,09	47,99	53,94	53,46	53,04	-
BARAJ SU HACMİ	(m^3)	25.225.000	97.807.000	158.198.000	153.118.000	148.673.000	-
BARAJ AKTİF DOLULUK ORANI	(%)	1,96	27,25	48,28	46,51	44,97	-
ELEKTRİK SARFİYATLARI							kWsaat/m3
ARITMA TESİSİ ELEKTRİK	(kWsaat)	1.465.284	1.335.410	1.305.946	1.354.209	1.315.333	0,02
SU ALMA YAPISI ELEKTRİK	(kWsaat)	26.148.100	25.387.860	27.681.420	25.779.780	26.225.520	0,40
KİMYASAL MADDE SARFİYATLARI							g/m3
POTASYUM PERMANGANAT	(kg)	0	113	0	0	0	0,00
SODYUM HİDROKSİT (% 50'lik)	(kg)	1.297.059	1.124.971	1.287.220	1.032.650	685.186	10,33
POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR	(kg)	0	0	0	323.350	2.093.500	31,56
DEMİR III KLORÜR (% 40'lık)	(kg)	2.440.587	2.563.280	2.498.714	1.618.247	0	0,00
ALÜMİNYUM SÜLFAT	(kg)	0	0	0	0	0	0,00
POLİELEKTROLİT	(kg)	662	832	825	1.695	125	0,00
KLOR	(kg)	263.540	201.656	269.522	262.597	267.881	4,04
KİREÇ	(kg)	302.777	328.586	322.581	233.607	294.897	4,45
ÇAMUR ARITIMI							
ÇAMUR ARITIMI *	(kg)	4.974.650	5.636.860	4.698.900	4.018.250	3.240.640	48,85
SU ÜRETİMİ							
SU ÜRETİMİ **	(m^3)	59.410.000	61.478.300	67.635.500	66.248.250	66.336.300	-

*** % 30'dan fazla katı madde içeriği olan arıtılmış çamur, Katı Atık Yönetmeliği'ne istinaden uzaklaştırılmaktadır.**

**** 2012 yılı içinde sulama suyu kullanımına yönelik olarak, DSİ II. Bölge Müdürlüğü tarafından Tahtalı Baraj Gölü'nden 1.829.000 m^3 su tahliye edilmiştir.**

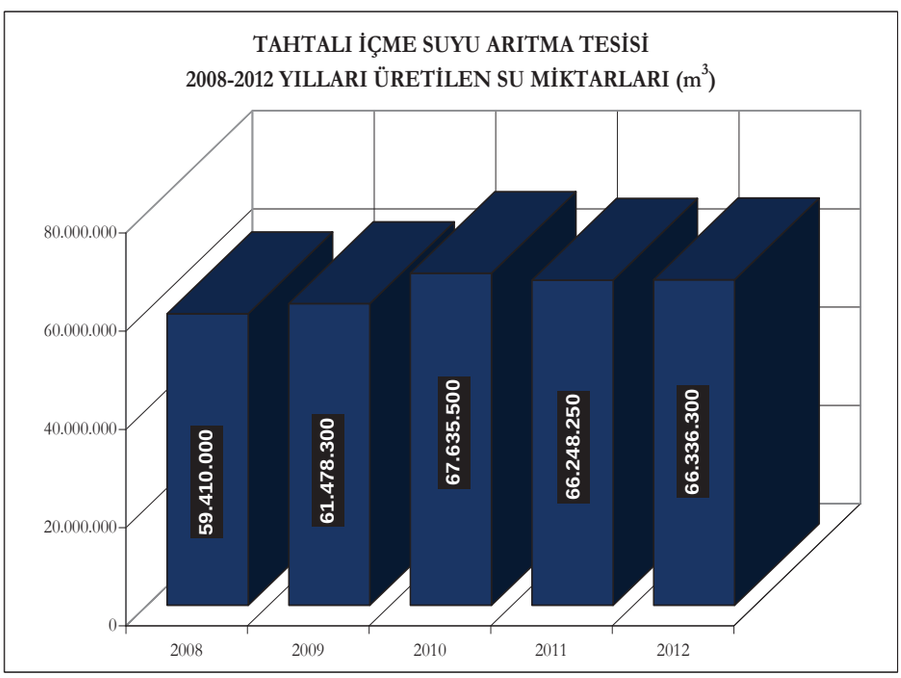

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BALÇOVA BARAJI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YILLIK FAALİYET TABLOSU

		2008	2009	2010	2011	2012	2012 YILI SARFİYATLAR
BARAJ DURUMU							
BARAJ KODU	(m)	111,5	135,68	128,73	119,97	128,16	-
BARAJ SU HACMİ	(m^3)	714.000	4.542.000	2.978.000	1.587.000	2.869.000	-
BARAJ AKTİF DOLULUK ORANI	(%)	7,57	57,79	37,27	19,02	35,84	-
ELEKTRİK SARFİYATLARI							kWsaat/m^3
BALÇOVA ELEKTRİK	(kWsaat)	166.863	194.730	200.400	227.311	211.975	0,04
KİMYASAL MADDE SARFİYATLARI							g/m^3
KLOR	(kg)	9.009	7.324	10.059	11.291	8.687	1,66
SU ÜRETİMİ							
SU ÜRETİMİ *	(m^3)	2.636.667	5.090.826	5.074.897	6.066.176	5.243.395	-

*** 2012 yılı içinde sulama suyu kullanımına yönelik olarak DSİ II. Bölge Müdürlüğü tarafından Balçova Baraj Gölü'nden su tahliye edilmemiştir.**

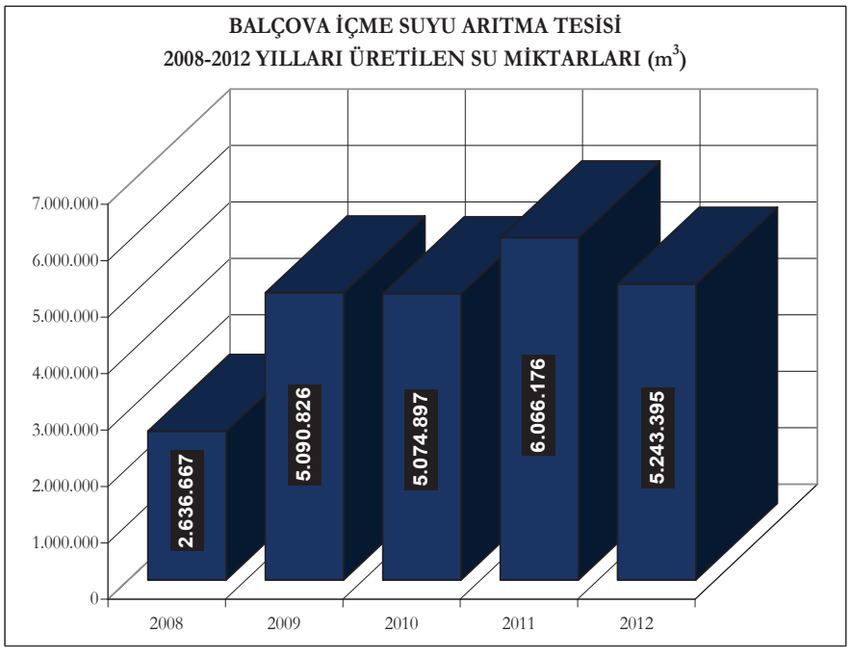

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÜRKMEZ BARAJI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YILLIK FAALİYET TABLOSU

		2008	2009	2010	2011	2012	2012 YILI SARFİYATLAR
BARAJ DURUMU							
BARAJ KODU	(m)	23,47	38,45	40,57	37,59	38,57	-
BARAJ SU HACMİ	(m^3)	434.000	4.241.000	5.171.000	3.886.000	4.292.000	-
BARAJ AKTİF DOLULUK ORANI	(%)	0,52	59,14	63,31	46,35	51,71	-
ELEKTRİK SARFİYATLARI							kWsaat/m^3
ÜRKMEZ ELEKTRİK	(kWsaat)	171.493	537.257	767.767	582.820	553.571	0,32
KİMYASAL MADDE SARFİYATLARI							g/m^3
KLOR	(kg)	1.298	3.765	7.319	6.565	5.414	3,18
ALÜMİNYUM SÜLFAT	(kg)	10.247	40.827	57.383	55.334	52.395	30,73
ÇAMUR ARITIMI							
ÇAMUR ARITIMI *	(kg)	1.500	4.000	6.000	6.300	6.000	3,52
SU ÜRETİMİ							
SU ÜRETİMİ **	(m^3)	272.469	1.146.544	1.742.537	1.813.298	1.705.156	-

*** % 30'dan fazla katı madde içeriği olan arıtılmış çamur Katı Atık Yönetmeliği'ne istinaden uzaklaştırılmaktadır.**

**** 2012 yılı içinde sulama suyu kullanımına yönelik olarak, DSİ II. Bölge Müdürlüğü tarafından Ürkmez Baraj Gölü'nden 1.319.200 m^3 su tahliye edilmiştir.**

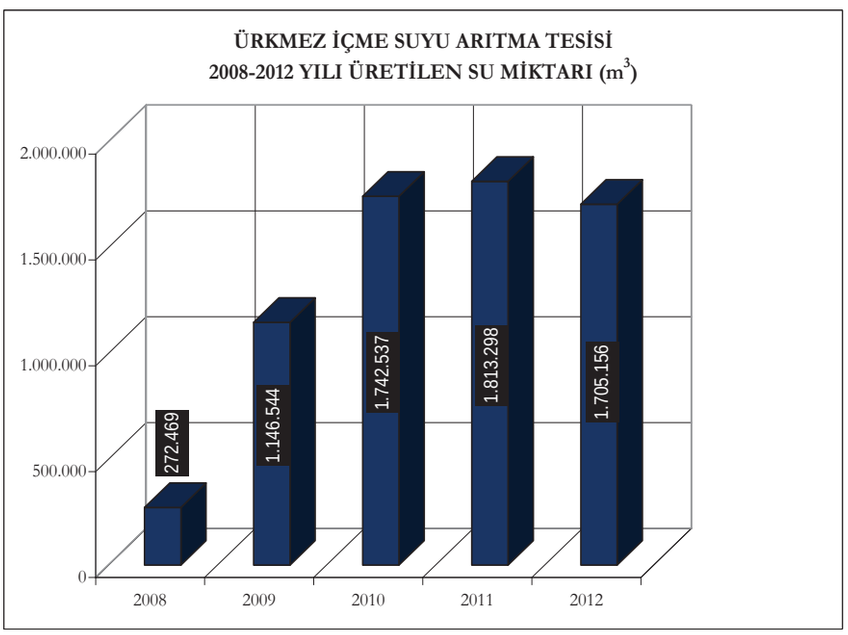

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÜZELHİSAR BARAJI ALİAĞA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YILLIK FAALİYET TABLOSU

		2008	2009	2010	2011	2012	2012 YILI SARFİYATLAR
BARAJ DURUMU							
BARAJ KODU	(m)	88,8	104,16	103,46	103,89	101,51	-
BARAJ SU HACMİ	(m^3)	71.442.000	139.538.000	135.801.000	138.089.000	125.720.000	-
BARAJ AKTİF DOLULUK ORANI	(%)	41,48	88,97	86,37	87,96	79,34	-
ELEKTRİK SARFİYATLARI							kWsaat/m^3
ALİAĞA ELEKTRİK	(kW saat)	66.640	135.336	131.391	157.458	155.971	0,09
KİMYASAL MADDE SARFİYATLARI							g/m^3
KLOR	(kg)	1.347	2.192	3.066	2.718	4.108	2,28
ALÜMİNYUM SÜLFAT	(kg)	6.275	27.196	49.626	51.628	61.603	34,22
ÇAMUR ARITIMI							
ÇAMUR ARITIMI *	(kg)	500	1.500	2.000	2.300	2.400	1,33
SU ÜRETİMİ							
SU ÜRETİMİ **	(m^3)	382.311	1.054.415	1.444.430	1.702.350	1.800.450	-

*** % 30'dan fazla katı madde içeriği olan arıtılmış çamur Katı Atık Yönetmeliği'ne istinaden uzaklaştırılmaktadır.**

**** 2012 yılı içinde sulama suyu kullanımına yönelik olarak, DSİ II. Bölge Müdürlüğü tarafından Güzelhisar Baraj Gölü'nden 2.029.900 m^3 su tahliye edilmiştir.**

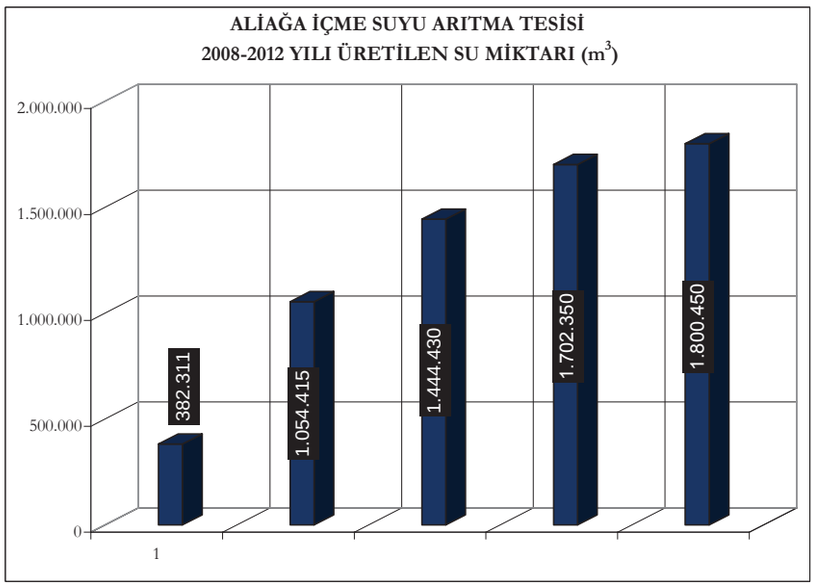

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖRDES BARAJI, SARIKIZ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ 2012 YILI İŞLETME FAALİYETLERİ

		2008	2009	2010	2011	2012	2012 YILI SARFİYATLAR
BARAJ DURUMU							
BARAJ KODU	(m)				208,08	227,13	-
BARAJ SU HACMİ	(m^3)				24.608.000	100.215.000	-
BARAJ AKTİF DOLULUK ORANI	(%)				1,99	18,52	-
ELEKTRİK SARFİYATLARI							$kWsaat/m^3$
ARITMA TESİSİ ELEKTRİK	(kWsaat)				166.268	407.310	0,03
KİMYASAL MADDE SARFİYATLARI							g/m^3
POTASYUM PERMANGANAT	(kg)				0	0	0,00
POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR	(kg)				46.700	512.356	34,70
DEMİR III KLORÜR (% 40'lık)	(kg)				207.128	0	0,00
POLİELEKTROLİT	(kg)				2.180	1.843	0,12
KLOR	(kg)				17.611	37.117	2,51
ÇAMUR ARITIMI							
ÇAMUR ARITIMI *	(kg)				465.910	739.815	50,11
SU ÜRETİMİ							
SU ÜRETİMİ	(m^3)				11.720.757	14.763.248	-

*** % 30'dan fazla katı madde içeriği olan arıtılmış çamur Katı Atık Yönetmeliği'ne istinaden uzaklaştırılmaktadır.**

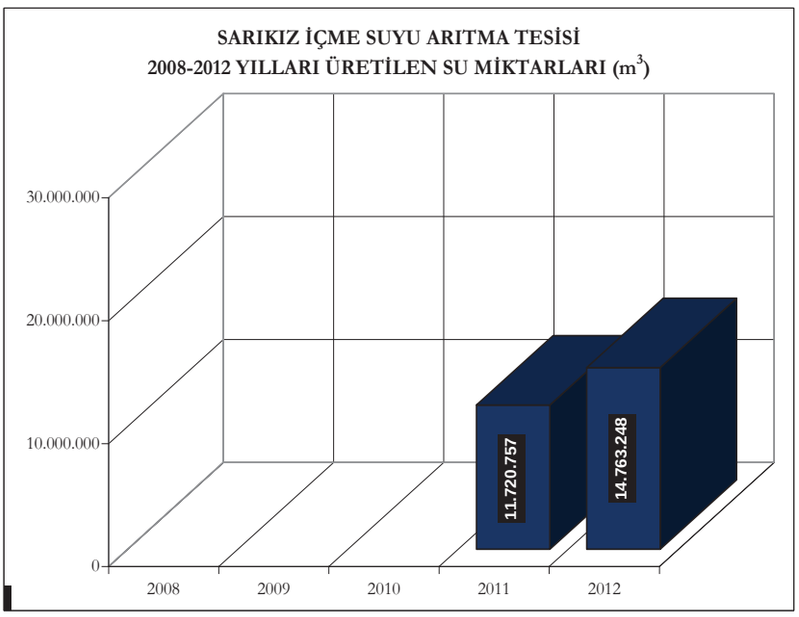

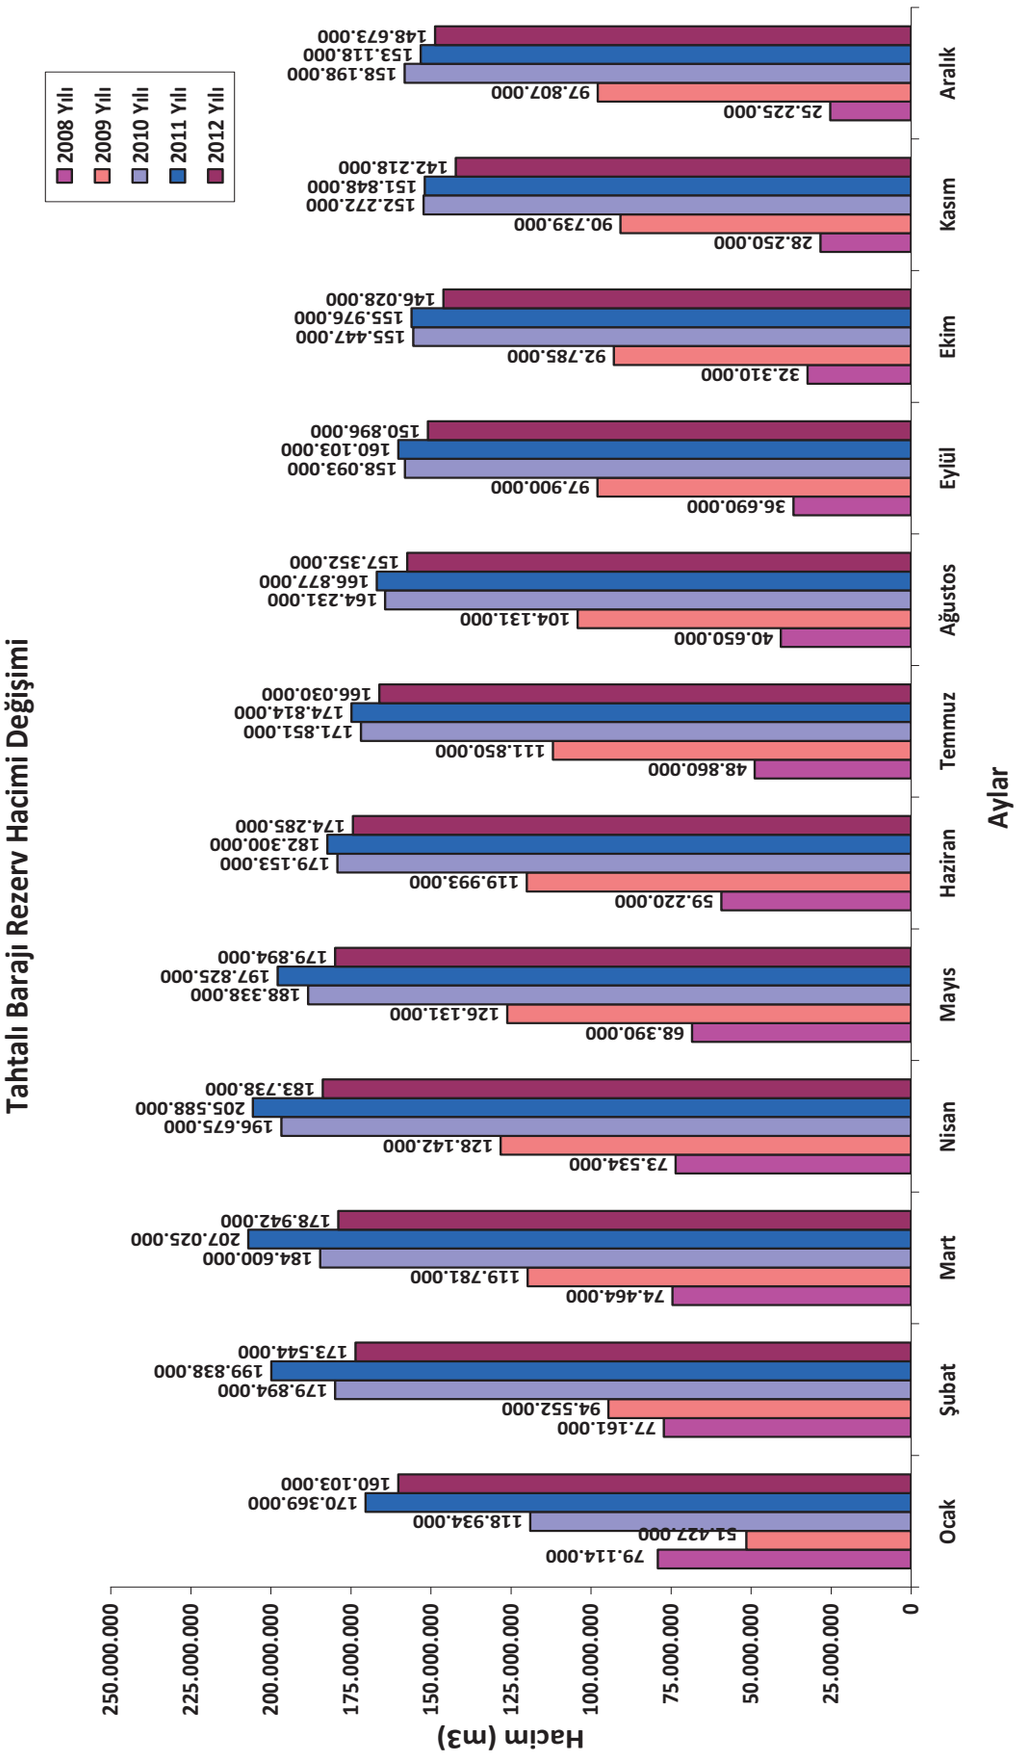
Tahtalı Barajı Rezerv Hacimi Değişimi
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
Hacim (m3)
250.000.000
225.000.000
200.000.000
175.000.000
150.000.000
125.000.000
100.000.000
75.000.000
50.000.000
25.000.000
0
Aylar
Ocak
79.114.000
51.427.000
118.934.000
170.369.000
160.103.000
Şubat
77.161.000
94.552.000
179.894.000
199.838.000
173.544.000
Mart
74.464.000
119.781.000
184.600.000
207.025.000
178.942.000
Nisan
73.534.000
128.142.000
196.675.000
205.588.000
183.738.000
Mayıs
68.390.000
126.131.000
188.338.000
197.825.000
179.894.000
Haziran
59.220.000
119.993.000
179.153.000
182.300.000
174.285.000
Temmuz
48.860.000
111.850.000
171.851.000
174.814.000
166.030.000
Ağustos
40.650.000
104.131.000
164.231.000
166.877.000
157.352.000
Eylül
36.690.000
97.900.000
158.093.000
160.103.000
150.896.000
Ekim
32.310.000
92.785.000
155.447.000
155.976.000
146.028.000
Kasım
28.250.000
90.739.000
152.272.000
151.848.000
142.218.000
Aralık
25.225.000
97.807.000
158.198.000
153.118.000
148.673.000

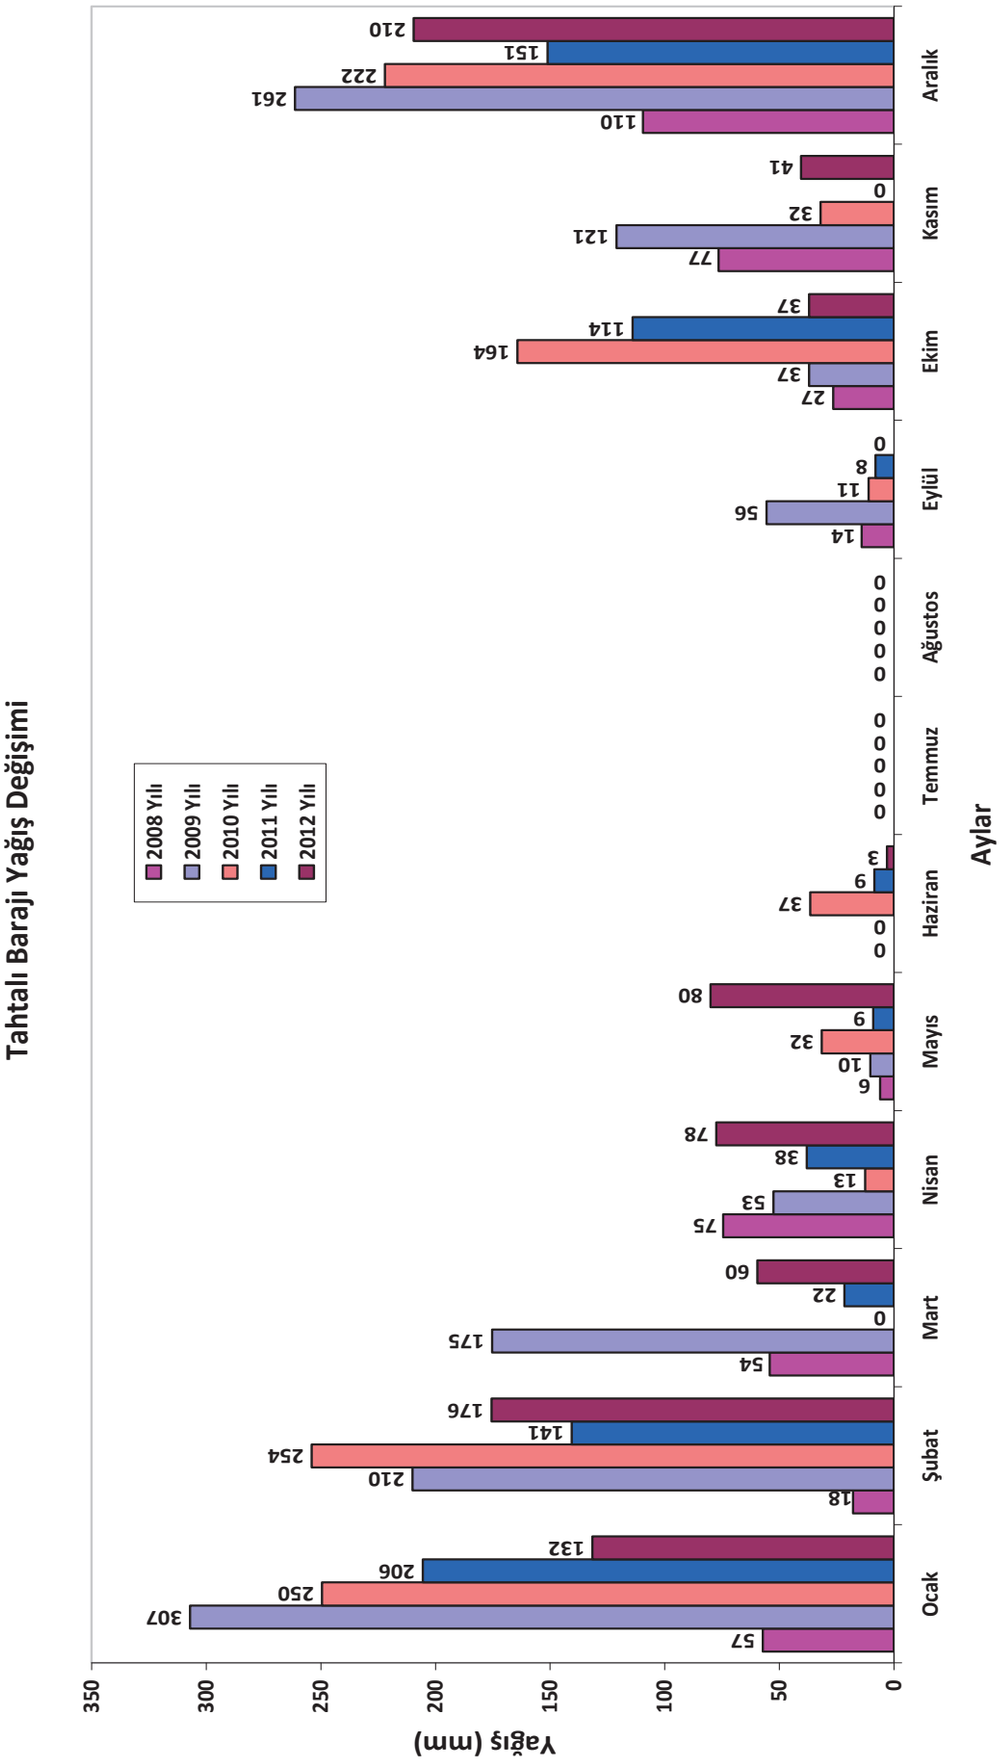
Tahtalı Barajı Yağış Değişimi
Yağış (mm)
Aylar
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

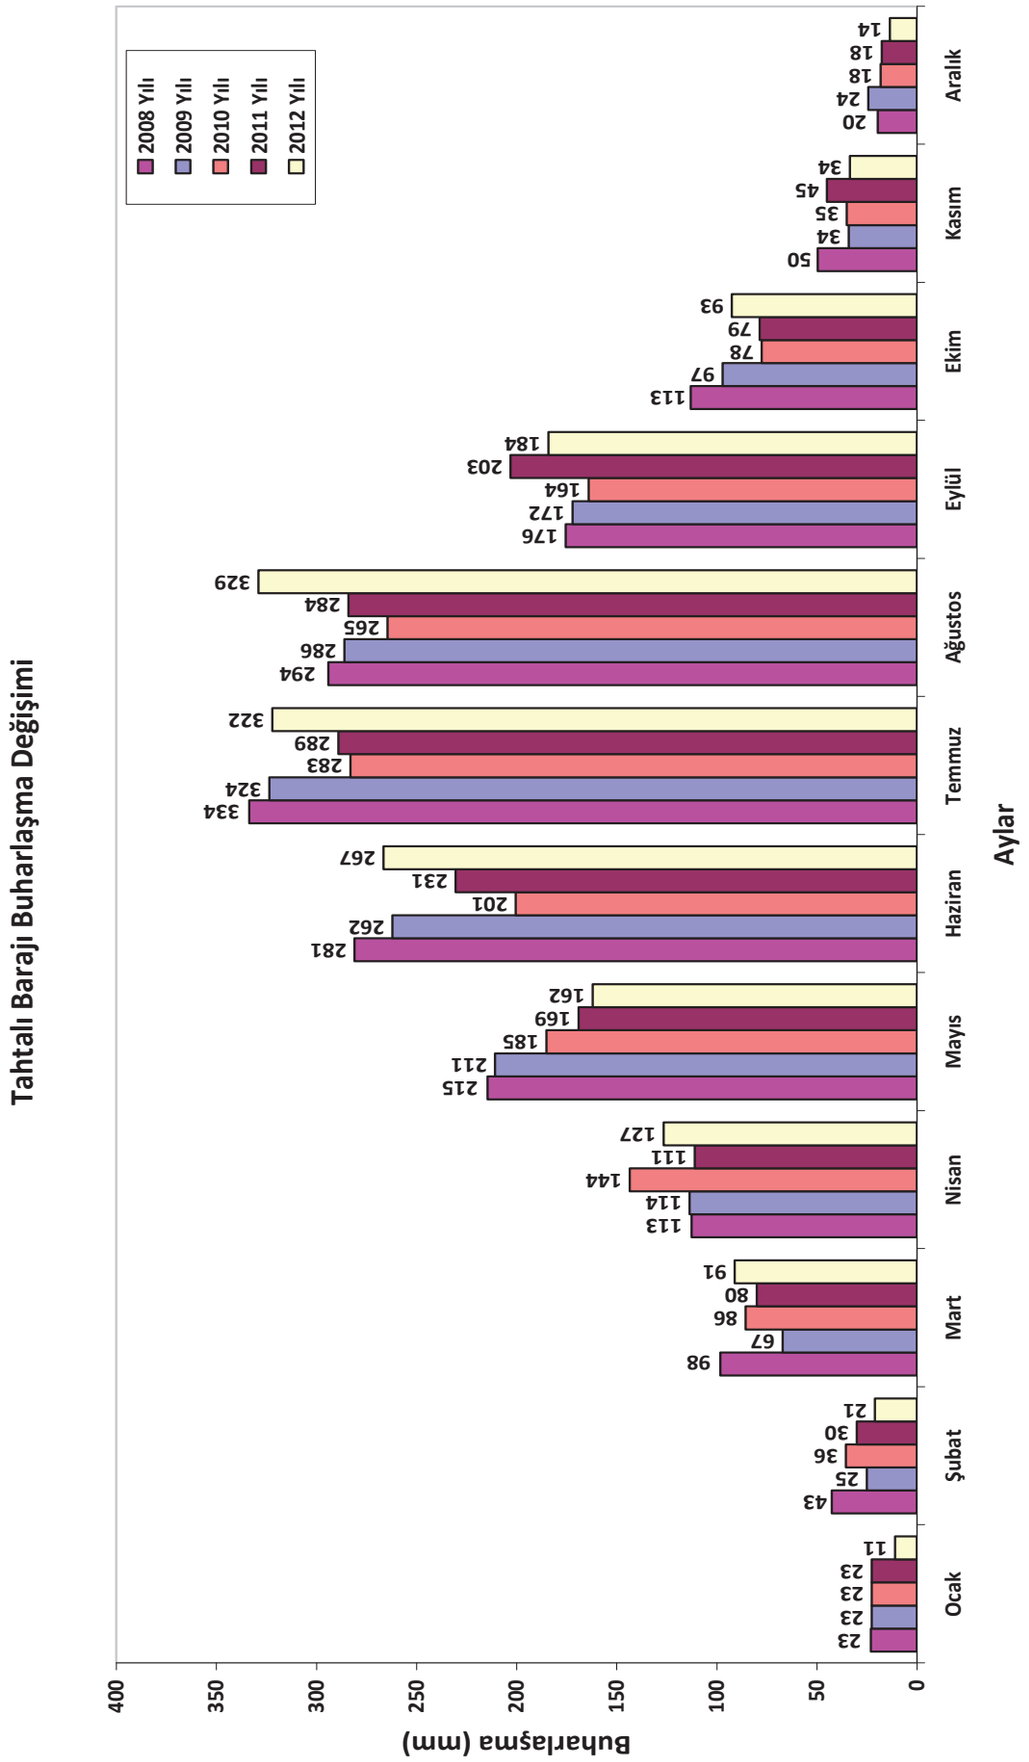
Tahtalı Barajı Buharlaşma Değişimi
Buharlaşma (mm)
Aylar
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

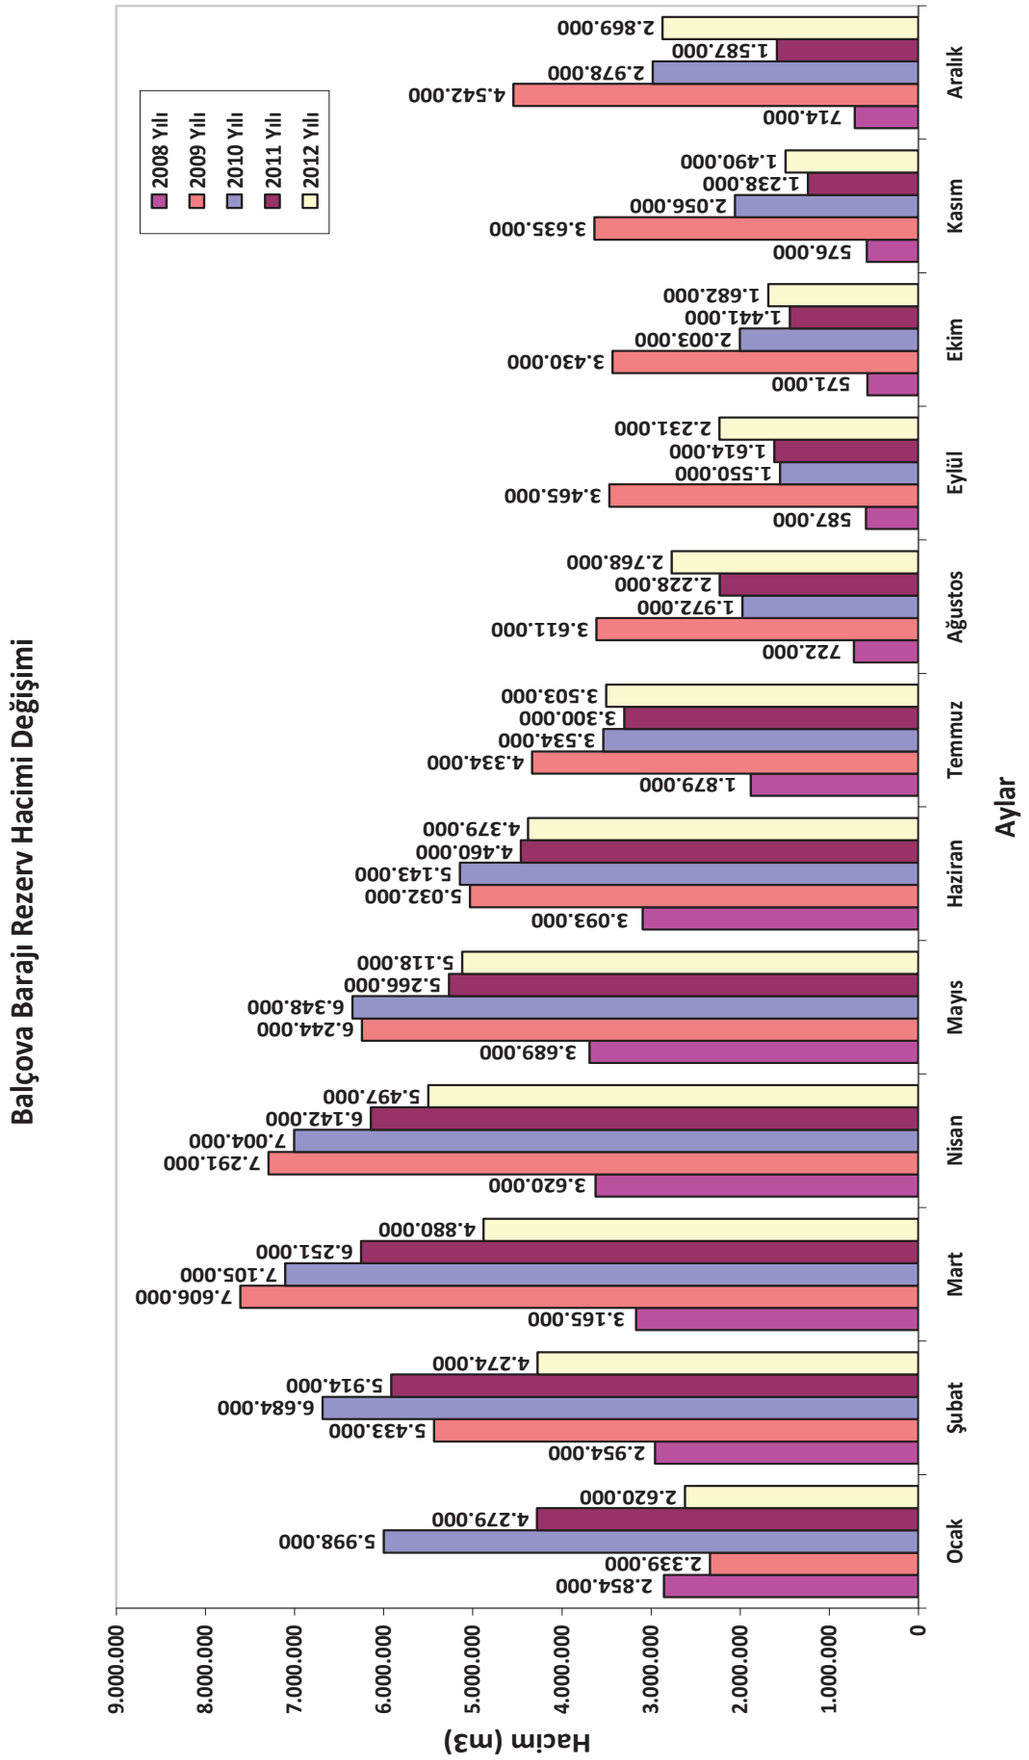
Balçova Barajı Rezerv Hacimi Değişimi
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
Hacim (m3)
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Aylar
Ocak
2.854.000
2.339.000
5.998.000
4.279.000
2.620.000
Şubat
2.954.000
5.433.000
6.684.000
5.914.000
4.274.000
Mart
3.165.000
7.606.000
7.105.000
6.251.000
4.880.000
Nisan
3.620.000
7.291.000
7.004.000
6.142.000
5.497.000
Mayıs
3.689.000
6.244.000
6.348.000
5.266.000
5.118.000
Haziran
3.093.000
5.032.000
5.143.000
4.460.000
4.379.000
Temmuz
1.879.000
4.334.000
3.534.000
3.300.000
3.503.000
Ağustos
722.000
3.611.000
1.972.000
2.228.000
2.768.000
Eylül
587.000
3.465.000
1.550.000
1.614.000
2.231.000
Ekim
571.000
3.430.000
2.003.000
1.441.000
1.682.000
Kasım
576.000
3.635.000
2.056.000
1.238.000
1.490.000
Aralık
714.000
4.542.000
2.978.000
1.587.000
2.869.000

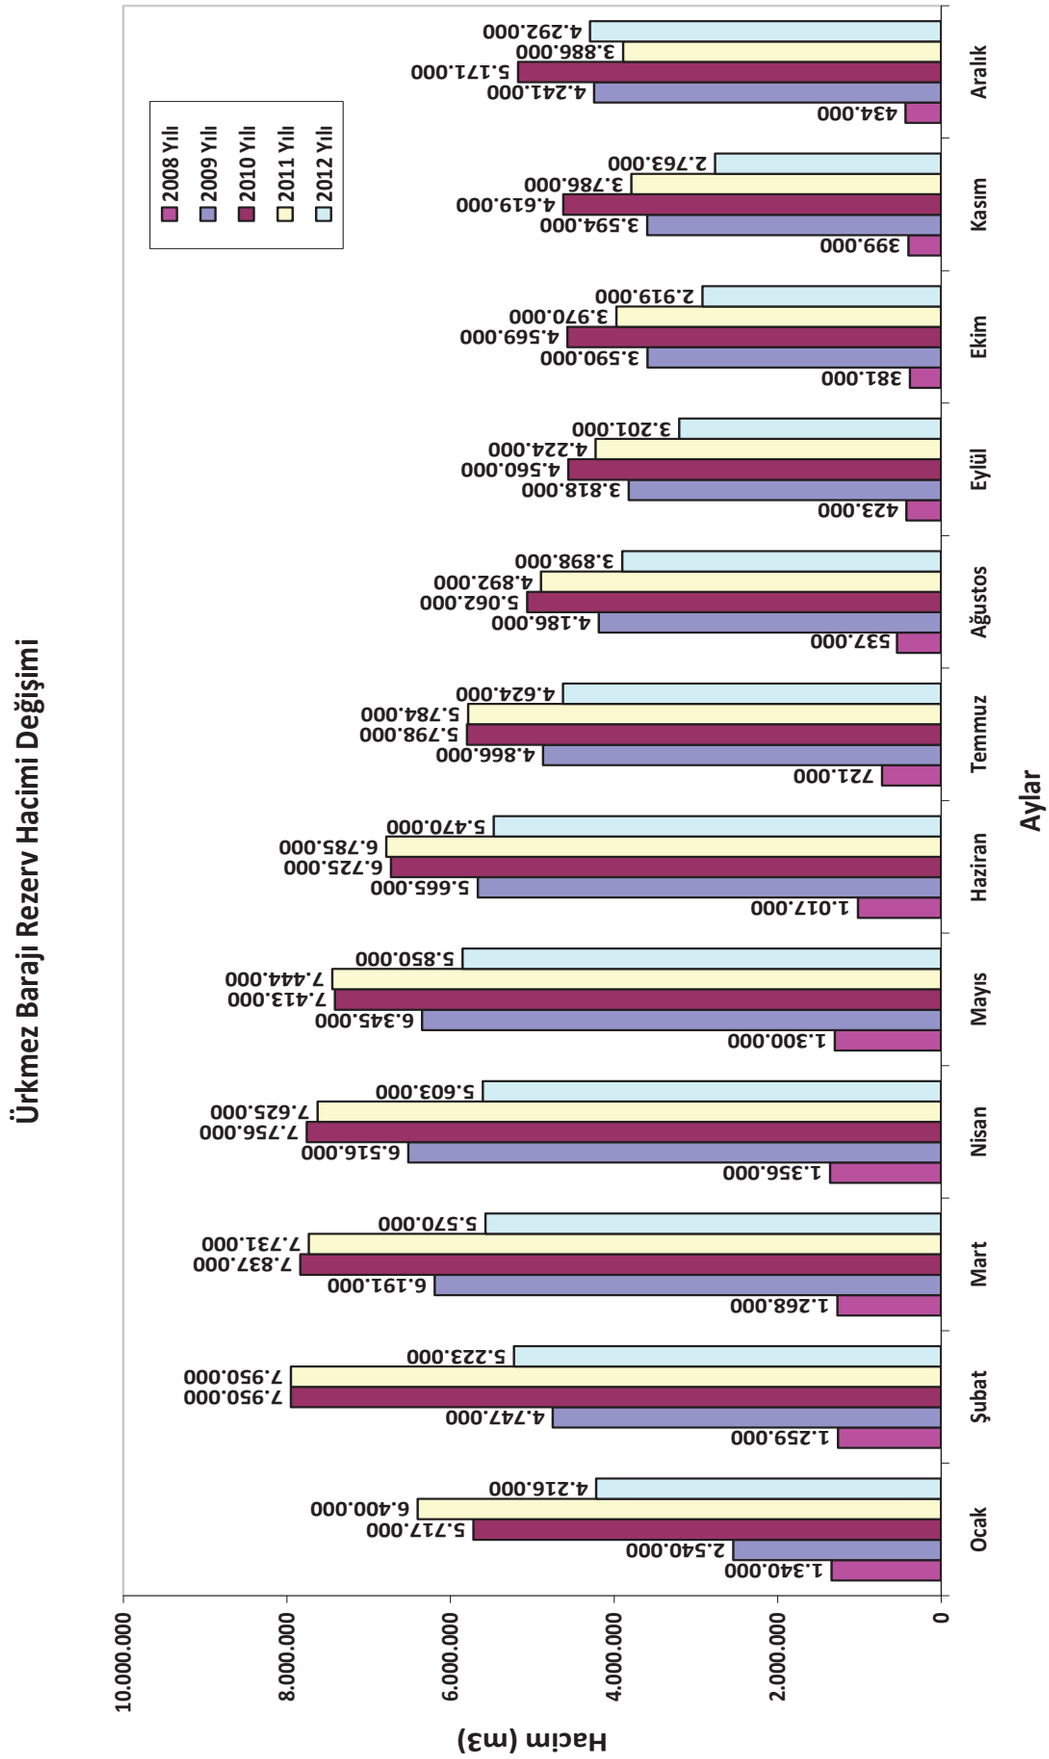
Ürkmez Barajı Rezerv Hacimi Değişimi
Hacim (m3)
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
1.340.000
2.540.000
5.717.000
6.400.000
4.216.000
1.259.000
4.747.000
7.950.000
7.950.000
5.223.000
1.268.000
6.191.000
7.837.000
7.731.000
5.570.000
1.356.000
6.516.000
7.756.000
7.625.000
5.603.000
1.300.000
6.345.000
7.413.000
7.444.000
5.850.000
1.017.000
5.665.000
6.725.000
6.785.000
5.470.000
721.000
4.866.000
5.798.000
5.784.000
4.624.000
537.000
4.186.000
5.062.000
4.892.000
3.898.000
423.000
3.818.000
4.560.000
4.224.000
3.201.000
381.000
3.590.000
4.569.000
3.970.000
2.919.000
399.000
3.594.000
4.619.000
3.786.000
2.763.000
434.000
4.241.000
5.171.000
3.886.000
4.292.000

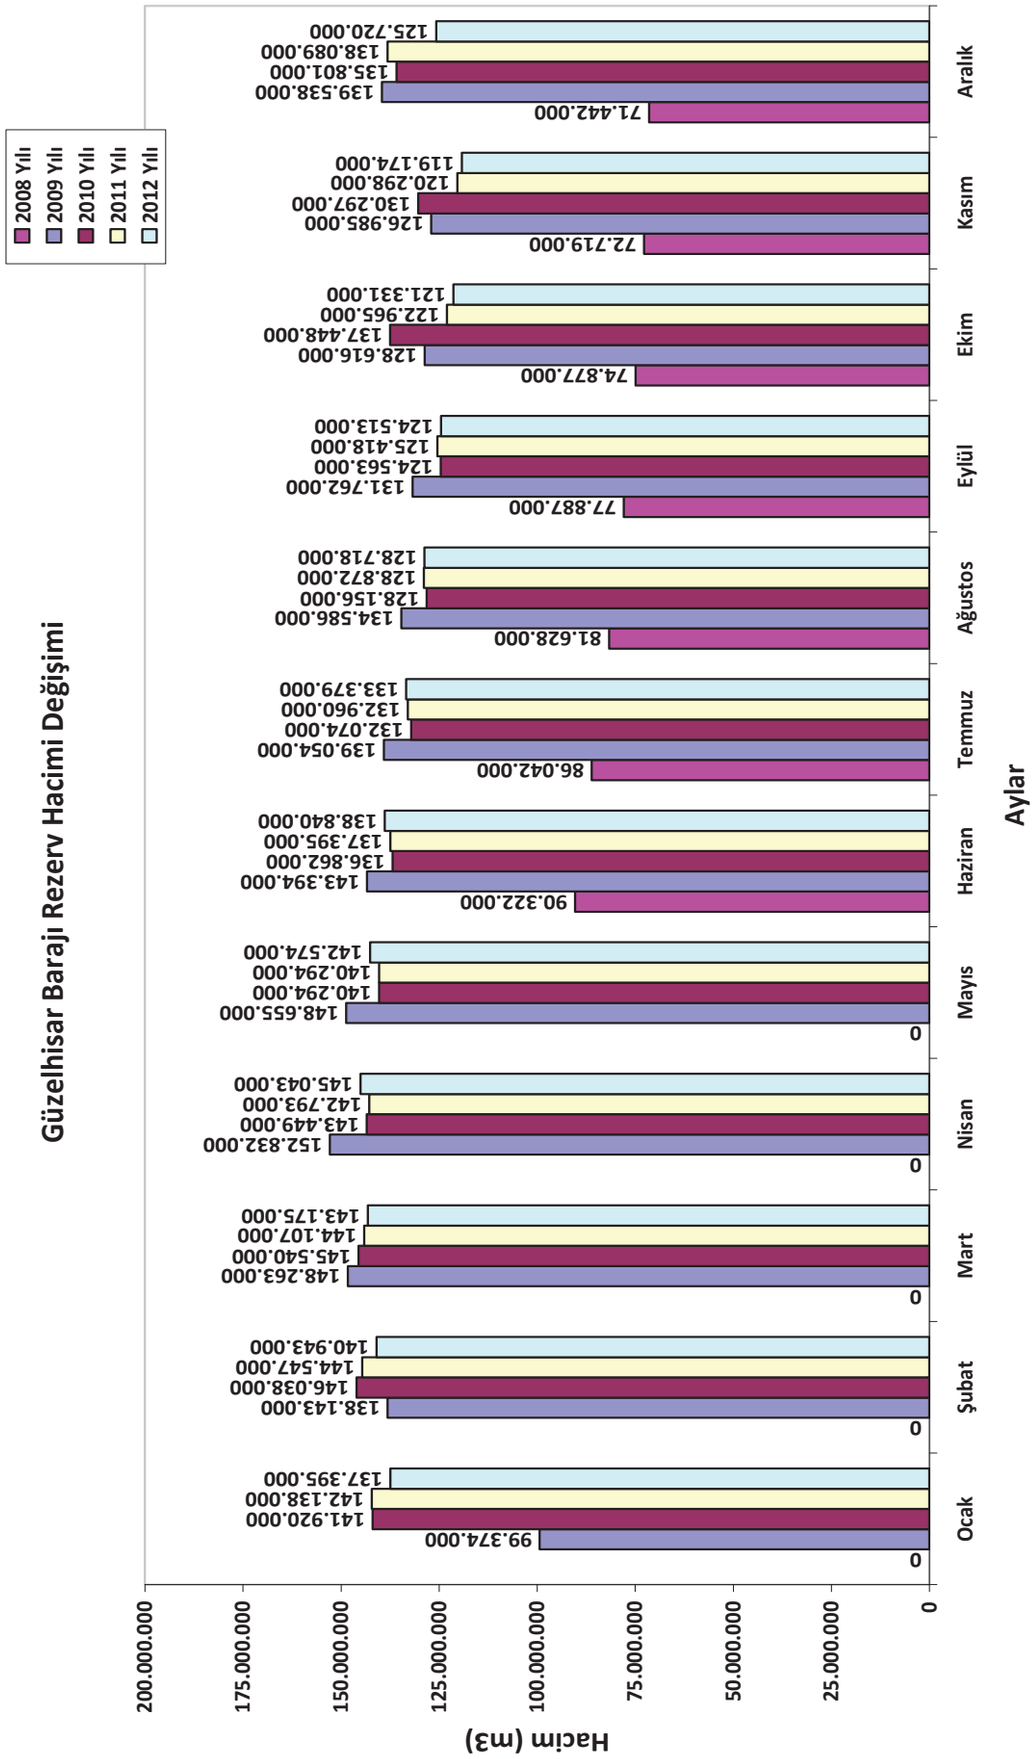
Güzelhisar Baraji Rezerv Hacimi Değişimi
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
Hacim (m3)
200.000.000
175.000.000
150.000.000
125.000.000
100.000.000
75.000.000
50.000.000
25.000.000
0
Aylar
Ocak
0
99.374.000
141.920.000
142.138.000
137.395.000
Şubat
0
138.143.000
146.038.000
144.547.000
140.943.000
Mart
0
148.263.000
145.540.000
144.107.000
143.175.000
Nisan
0
152.832.000
143.449.000
142.793.000
145.043.000
Mayıs
0
148.655.000
140.294.000
140.294.000
142.574.000
Haziran
90.322.000
143.394.000
136.862.000
137.395.000
138.840.000
Temmuz
86.042.000
139.054.000
132.074.000
132.960.000
133.379.000
Ağustos
81.628.000
134.586.000
128.156.000
128.872.000
128.718.000
Eylül
77.887.000
131.762.000
124.563.000
125.418.000
124.513.000
Ekim
74.877.000
128.616.000
137.448.000
122.965.000
121.331.000
Kasım
72.719.000
126.985.000
130.297.000
120.298.000
119.174.000
Aralık
71.442.000
139.538.000
135.801.000
138.089.000
125.720.000

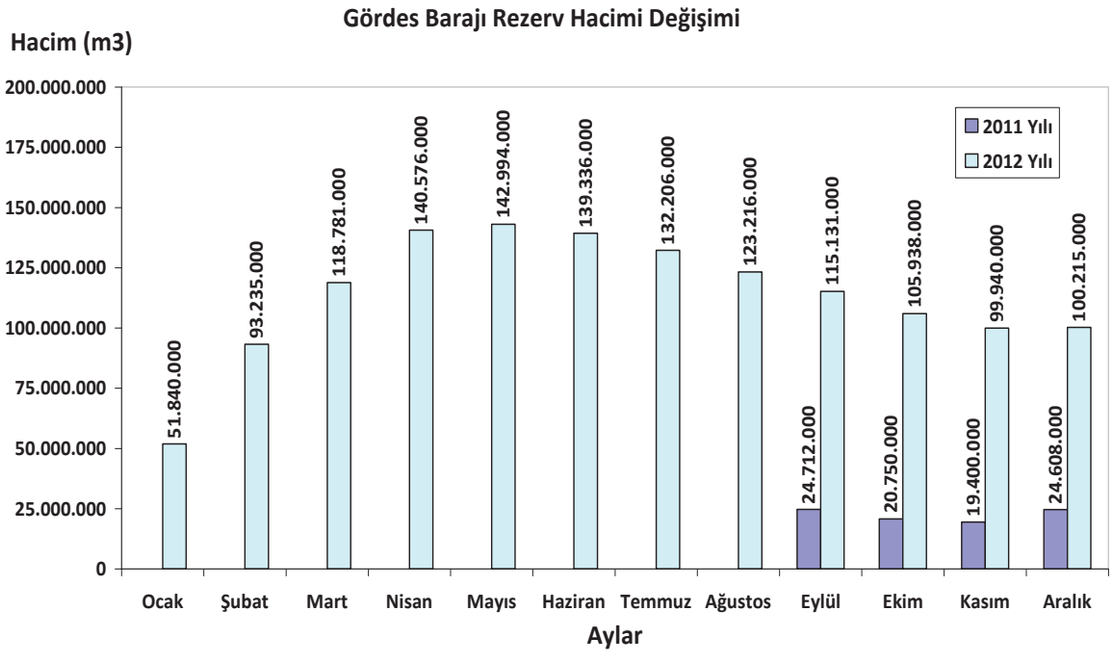

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK&ELEKTRONİK ARIZA,BAKIM-ONARIM EKİBİ 2012 FAALİYET RAPORU							
TAHTALI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ							
KAPSAM	PERİYODİK BAKIM	PERİYODİK KONTROL	ARIZA BAKIM	GENEL	DEMONTAJ	MONTAJ	DIŞ GÖREV
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI SCADA VE SENSÖRLERİ	42	88	14	2	0	0	0
FİLTRELER	5	48	61	4	7	8	0
MAKİNA DAİRESİ	0	48	4	1	0	0	0
DURULTUCULAR	0	48	2	1	0	0	0
KİMYA	0	48	9	0	0	0	0
KLOR	0	89	6	0	0	0	0
FİLTER PRES	0	48	5	1	0	0	0
MİMİK PANO / UPS	3	48	1	0	0	0	0
VİNÇLER	2	2	2	0	0	0	0
DALGIÇ VE DRENAJ POMPALAR (Vana ve debimetre odaları)	0	79	2	0	0	0	0
O.G / AGAT / TRAFOLAR	3	79	3	1	0	0	0
KOMPANZASYON	4	48	1	0	0	0	0
JENERATÖR	2	48	0	1	1	1	0
AYDINLATMALAR	0	0	36	0	0	6	0
MOTOR AKIM KONTROLLERİ	0	48	0	0	0	0	0
YANGIN ALARM SİSTEMİ	0	3	1	0	0	0	0
TELEFON, SANTRAL ve FAKS	1	26	7	0	0	1	0
KLİMALAR	4	1	2	0	0	0	0
ATÖLYEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR	0	8	11	7	0	3	0
GENEL YAPILAN ÇALIŞMALAR	5	23	5	56	0	0	25
TOPLAM İŞ ADEDİ	71	830	172	74	8	19	25

TAHTALI POMPA İSTASYONU							
KAPSAM	PERİYODİK BAKIM	PERİYODİK KONTROL	ARIZA BAKIM	GENEL	DEMONTAJ	MONTAJ	DIŞ GÖREV
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI SCADA VE SENSÖRLERİ	25	48	13	0	3	3	0
1 NOLU KASKAT MOTOR	1	1	1	0	0	0	0
2 NOLU MOTOR	1	1	0	0	0	0	0
3 NOLU MOTOR	3	1	0	0	1	1	0
4 NOLU KASKAT MOTOR	2	0	0	0	0	0	0
5 NOLU MOTOR	1	1	0	0	0	0	0
6 NOLU MOTOR	15	1	2	0	1	1	0
O.G / TRAFOLAR	3	48	1	0	0	0	0
6,3 kV KOMPANZASYON	3	48	0	0	0	0	0
A.G KOMPANZASYON	3	48	1	0	0	0	0
MİMİK PANO / UPS	3	48	1	0	0	0	0
VANALAR	0	48	1	0	0	0	0
YANGIN ALARM SİSTEMİ	0	2	0	0	0	0	0
TELEFON, SANTRAL ve FAKS	1	48	2	0	0	0	0
AYDINLATMALAR	0	0	14	0	1	1	0
DALGIÇ VE DRENAJ POMPALAR	0	48	1	0	0	0	0
VİNÇ	2	2	0	0	0	0	0
JENERATÖR	2	58	1	5	0	0	0
ASANSÖR	12	0	0	0	0	0	0
ELEKTRİK SİSTEM KONTROLLERİ	0	365	0	0	0	0	0
GENEL YAPILAN İŞLER	4	5	10	6	2	2	0
TOPLAM İŞ ADEDİ	81	821	48	11	8	8	0

BALÇOVA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ							
KAPSAM	PERİYODİK BAKIM	PERİYODİK KONTROL	ARIZA BAKIM	GENEL	DEMONTAJ	MONTAJ	DIŞ GÖREV
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI SCADA VE SENSÖRLERİ	1	8	1	0	1	1	0
KLOR	0	0	0	0	0	0	0
MAKİNA DAİRESİ	0	0	0	0	0	0	0
FİLTRELER	0	0	3	0	0	0	0
BARAJ KAPAKLARI	0	0	0	0	0	0	0
SOSYAL TESİS	0	0	0	0	0	0	0
AYDINLATMALAR	0	0	8	0	0	0	0
TELEFON&FAKS	0	0	1	0	0	0	0
JENERATÖR	0	1	2	1	0	0	0
GENEL YAPILAN İŞLER	0	0	3	0	0	0	0
TOPLAM İŞ ADEDİ	1	9	18	1	1	1	0

ÜRKMEZ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ							
KAPSAM	PERİYODİK BAKIM	PERİYODİK KONTROL	ARIZA BAKIM	GENEL	DEMONTAJ	MONTAJ	DIŞ GÖREV
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI	1	8	4	0	0	0	0
FİLTRELER	0	0	3	0	0	1	0
MAKİNA DAİRESİ	0	0	1	0	1	1	0
DURULTUCULAR	0	0	1	0	0	0	0
KİMYA	0	0	0	0	0	0	0
KLOR	0	0	1	0	0	0	0
AKEP PANOSU & UPS	3	8	1	0	0	0	0
VİNÇLER	2	8	1	0	0	0	0
O.G / AGAT / TRAFO	2	5	1	0	0	0	0
JENERATÖR	0	0	2	0	1	0	0
KOMPANZASYON	0	3	0	0	0	0	0
AYDINLATMALAR	0	0	6	0	0	0	0
TELEFON, SANTRAL ve FAKS	0	1	3	0	0	0	0
GENEL YAPILAN ÇALIŞMALAR	0	0	3	0	1	1	0
TOPLAM İŞ ADEDİ	8	33	27	0	3	3	0

ALİAĞA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ							
KAPSAM	PERİYODİK BAKIM	PERİYODİK KONTROL	ARIZA BAKIM	GENEL	DEMONTAJ	MONTAJ	DIŞ GÖREV
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI	1	8	1	0	0	0	0
FİLTRELER	0	0	2	0	1	1	0
MAKİNA DAİRESİ ve HİDRAFOR	0	3	1	0	0	1	0
DURULTUCULAR	0	0	4	0	0	1	0
KİMYA	0	0	0	0	0	0	0
KLOR	8	17	2	0	0	0	0
O.G / AGAT / TRAFO	3	25	0	0	0	0	0
JENERATÖR	3	1	1	0	2	0	0
KOMPANZASYON	0	25	0	0	0	0	0
AYDINLATMALAR	0	0	25	0	0	1	0
TELEFON ve FAKS	0	0	2	0	1	1	0
GENEL YAPILAN ÇALIŞMALAR	0	0	13	0	0	6	0
TOPLAM İŞ ADEDİ	15	79	51	0	4	11	0

SARIKIZ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ							
KAPSAM	PERİYODİK BAKIM	PERİYODİK KONTROL	ARIZA BAKIM	GENEL	DEMONTAJ	MONTAJ	DIŞ GÖREV
SU ANALİZ VE ÖLÇÜM CİHAZLARI	0	29	0	1	0	0	0
FİLTRELER	2	51	23	4	2	0	0
MAKİNA DAİRESİ ve HİDRAFOR	7	51	6	6	1	2	0
DURULTUCULAR	17	43	4	10	1	0	0
KİMYA	2	51	12	12	0	2	0
KLOR	0	59	10	6	1	1	0
DEKANTÖR	5	59	7	4	0	3	0
MİMİK PANO / UPS	0	17	0	0	0	0	0
VİNÇ	0	46	0	1	0	0	0
DALGIÇ VE DRENAJ POMPALAR	2	20	0	3	1	0	0
O.G / AGAT / TRAFOLAR	2	9	6	2	0	0	0
JENERATÖR	2	13	1	1	0	0	0
KOMPANZASYON	0	16	0	3	0	0	0
AYDINLATMALAR	1	0	0	2	0	0	0
MOTOR AKIM KONTROLLERİ	0	19	0	0	0	0	0
YANGIN ALARM SİSTEMİ	1	11	1	0	0	0	0
TELEFON ve FAKS	0	4	1	0	0	3	0
KLİMALAR	1	1	0	0	0	0	0
ATÖLYEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR	1	0	5	8	7	2	0
GENEL YAPILAN ÇALIŞMALAR	4	2	10	65	3	1	0
TOPLAM İŞ ADEDİ	47	501	86	128	16	14	0

GENEL İŞ ADEDİ TOPLAMLARI	223	2273	402	214	40	56	25

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MEKANİK BAKIM ONARIM EKİBİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KAPSAM	periyodik bakım iş	arıza bakım iş	genel iş	imalat iş	demontaj iş	yeni montaj iş	dış görev iş	periyodik kontrol iş	TOPLAM İŞ
TAHTALI İÇMESUYU ARITMA TESİSİ									
DURULTUCULAR	16	28	1	11	3	2	0	163	224
FİLTER PRES	14	38	27	28	2	2	0	386	497
KİMYA BİNASI	41	34	27	11	0	0	0	404	517
GALERİ	0	1	1	0	0	0	0	0	2
HAVALANDIRMA	2	0	0	0	0	0	0	32	34
KLOR BİNASI	4	23	9	5	2	3	0	137	183
FİLTRELER	22	41	1	14	0	0	0	23	101
MAKİNE ODASI	23	0	0	0	0	0	0	404	427
G.Y.S.T.T	3	3	0	3	1	2	0	32	44
SOSYAL TESİS	0	4	0	6	0	1	0	0	11
A.T. ÇIKIŞ	2	3	0	0	0	1	0	0	6
ISI MERKEZİ	4	7	0	0	0	1	0	1	13
İDARİ BİNA	0	11	10	9	0	1	0	0	31
GÜV. BİNASI + ÖN KAPI + ARKA KAPI	0	5	0	4	0	0	0	0	9
TESİS GENELİ	15	81	155	107	4	9	10	143	524
TRAKTÖR	0	0	0	0	0	0	0	16	16
FOKLİFT	1	1	0	0	0	0	0	16	18
JENARATÖR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM İŞ	147	280	231	198	12	22	10	1.757	2.657
BALÇOVA BARAJI İÇMESUYU ARITMA TESİSİ									
TESİS GENELİ	5	24	1	3	0	2	0	1.380	1.415
ÜRKMEZ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ									
TESİS GENELİ	8	12	95	7	4	7	0	407	540
ALİAĞA İÇMESUYU ARITMA TESİSİ									
TESİS GENELİ	6	11	10	8	0	2	0	360	397
SARIKIZ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ									
TESİS GENELİ	25	74	101	10	3	47	3	337	600

GENEL İŞ TOPLAMI	191	401	438	226	19	80	13	4241	5609

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MEKANİK BAKIM ONARIM EKİBİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

TAHTALI POMPA İSTASYONU

KAPSAM	periyodik bakım	arıza bakım	genel	imalat	demontaj	yeni montaj	dış görev	periyodik kontrol	TOPLAM İŞ
	iş	iş	iş	iş	iş	iş	iş	iş	
POMPA-ŞAFT-MOTOR SİSTEMLERİ	48	6	3	0	12	1	0	129	199
VANALAR	1	3	31	0	2	1	0	0	38
KOMPRESÖRLER	3	1	0	0	0	1	0	106	111
JENERATÖR	1	0	0	0	0	0	0	52	53
DALGIÇ POMPALAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMME VE BASMA HATLARI + DENGE BACASI	168	4	0	0	0	0	0	0	172
VİNÇ	0	0	0	0	0	0	0	53	53
DENGELEME TANKLARI	0	2	2	0	0	0	0	213	217
HAVALANDIRMA SİSTEMİ	1	1	0	0	0	0	0	104	106
HİDROFOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İDARİ BİNA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
EKİPMAN TEMİZLİĞİ	0	0	61	0	0	0	0	0	61
S. A. Y. BİNASI, YEDEK MOTOR DEPOSU, TRAFO, GÜVENLİK BİNASI	0	1	12	0	0	0	0	0	13
TOPLAM İŞ	222	18	110	0	14	3	0	657	1024

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNŞAAT-BOYA BAKIM-ONARIM EKİBİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KAPSAM	ARIZA-BAKIM, ALÇI, TAMİRAT İŞLERİ	İMALAT, MONTAJ, BOYA-BETON İŞLERİ	TEMİZLİK, NAKLİYE, TESVİYE, TASFİYE İŞLERİ
TAHTALI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ			
DURULTUCULAR	17	27	3
FİLTER PRESS	1	8	2
KİMYA BİNASI	7	1	3
İDARİ BİNA	9	6	3
KLOR BİNASI	4	8	0
TEKNİK GALERİ	0	0	0
MAKİNE ODASI	0	0	0
KANAL, KAPAK, YOL, BAHÇE	4	14	0
TESİS GENELİ	5	14	25
HIZLI KARIŞTIRICILAR	0	0	0
FİLTRELER	24	72	12
MEKANİK, ELEKTRİK ATÖLYE ve AMBAR	4	16	1
TESİS GİRİŞ YOLU	0	0	0
HAVALANDIRMA YAPISI	0	0	0
G.Y.S.T.T	0	0	0
TRAFO BİNASI	3	3	0
GÜVENLİK	1	2	0
MEKANİK EKİPLE ÇALIŞMA	0	6	0
LOJMAN	0	0	0
HAMSU GİRİŞ VANA ODASI	0	3	1
ISI MERKEZİ	2	0	0
SOSYAL TESİS	5	0	1
TAHTALI POMPA İSTASYONU			
POMPA İSTASYONU	10	2	3
SU BASMA HATTI	0	0	0
GENEL	1	0	0
BALÇOVA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ			
GENEL	1	3	0
ÜRKMEZ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ			
GENEL	0	2	0
ALİAĞA İÇME SUYU ARITMA TESİSİ			
GENEL	0	2	0
SARIKIZ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ			
GENEL	0	0	3
GENEL TOPLAM	**98**	**189**	**57**

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI LABORATUVAR FAALİYETLERİ

01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında Yüzey Suyu Üretim Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tahtalı, Aliağa, Sarıkız ve Ürkmez İçme Suyu Arıtma Tesisi laboratuvarlarında saatlik, günlük ve haftalık periyotlarda alınan hamsu, durultucu çıkış suyu, filtre çıkış suyu, arıtma tesisi çıkış suyu, Tahtalı ve Balçova Baraj gölü suları ve Arıtma Tesisi çamur numunelerinde analizleri yapılan parametreler ve miktarları; ayrıca çapraz kontrol için diğer kamu kuruluşlarının (Hıfzıssıhha Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, vb.) laboratuvarına ve İZSU merkez laboratuvarına gönderilen numune miktarları aşağıda verildiği gibidir.

A) İçme Suyu Arıtma Tesisi Laboratuvarları'nda yapılanlar:

PARAMETRE	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)
Demir	865
Askıda Katı Madde	3.000
NO_2-N ve NO_2	890
NO_3-N ve NO_3	890
NH_4-N ve NH_4	890
Siyanür	560
Permanganat İndeksi	800
Toplam Sertlik	330
Kalsiyum	330
Magnezyum	330
Klorür	700
Alüminyum	3.000
Mangan	3.000
Sülfat	770
Bulanıklık	15.000
YAPILAN DİĞER TESTLER	
Jar Testi	160
Kırılma Noktası Klorlama Testi	16
PAK yoğunluk,alüminyum ve bazisite miktarları ölçümü (Her Sevkiyatta)	84
KALİBRASYONLAR	
pH metre, Çözünmüş Oksijen ölçer, iletkenlik ölçer ve türbidimetre gibi laboratuvar ölçüm cihazlarının periyodik kalibrasyonları	25
ALG SAYIMI	685

PARAMETRE	Yapılan Analiz Sayısı (Adet)
Redoks Potansiyeli	2.500
Toplam Çözünmüş Katı Madde	1.200
Askıda Katı Madde (Çamur)	2.050
% Katı Madde (Çamur)	1.080
Serbest Bakiye Klor	5.000
Alkalinite	340
pH	7.000
Renk	6.650
İletkenlik	5.500
Çözünmüş Oksijen	2.200
Sıcaklık	6.400
Oksijen Doygunluğu	870
E.Coli	430
E.Faecalis	240
Klorofil-a Tayini	647
Toplam Organik Karbon Analizi	725
UV_{254} Analizi	640

B) Laboratuvarlara Gönderilen Numuneler :

Merkez Laboratuvara Gönderilen Numune Adedi	500
Hıfzısıhha Enstitüsüne Gönderilen Numune Adedi	140
Diğer Laboratuvarlara Gönderilen Numune Adedi	4

YÜZEY SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

Tahtalı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonu Boru Hatlarının ve Ekipmanlarının Kumlama Boyama İşi :

• Tahtalı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Pompa İstasyonunda bulunan pompalar, boru hatları, makine ekipmanları ve çelik taşıyıcıların korozyona karşı korunması amacıyla kumlama ve boyaması yaptırılmıştır.

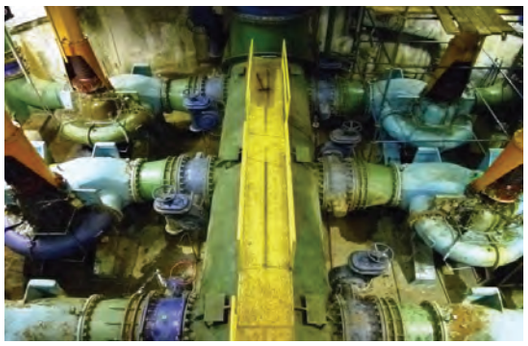
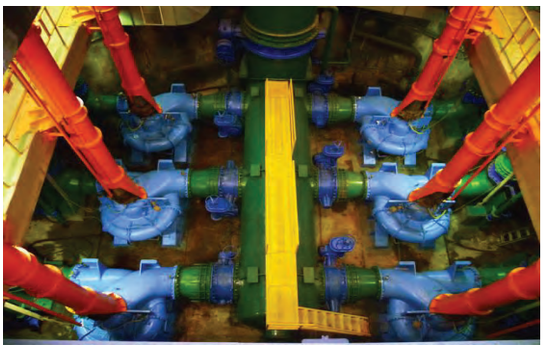



Jeneratör Alımı İşi :

• Tahtalı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisine 1 adet PRIME 630 kVA jeneratör, Ürkmez İçmesuyu Arıtma Tesisine 1 adet PRIME 250 kVA jeneratör alınmış ve Tahtalı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisinde bulunan 110 kVA jeneratör sökülerek Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisine montajı yapılmıştır. Bu sayede tüm anılan tesislerin kesintisiz çalışması sağlanmıştır.








Tahtalı İçmesuyu Arıtma Tesisi Karo Mozaik Döşenmesi İşi :

• Tahtalı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi filtre binasındaki bozuk zeminlerin iyileştirilmesi ve korunması amacıyla karo mozaik döşenmesi işi yapılmıştır.

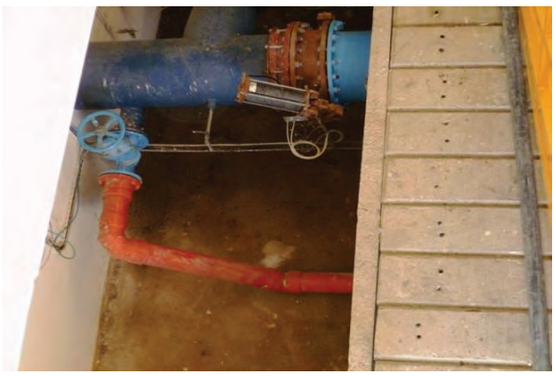




Tahtalı İçmesuyu Arıtma Tesisi Filtre ve Durultucu Ünitesi Çelik Savak Alımı ve Montajı İşi :

• Tahtalı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi filtre ve durultucu ünitelerine çelik savakların montajı yapılarak ünitelerin performansı arttırılmıştır.






LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE 2012'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz **03.10.2005 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesini, 13.03.2008 yılındada yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesini** almış ve çalışmalarını bu kapsamda sürdürmektedir. Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesinin süresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 yılında yaptığı denetim sonrasında **10.05.2015** tarihine kadar yenilenmiştir.

Laboratuvar Şube Müdürlüğümüz **03.10.2006 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu** tarafından verilen **TS EN ISO/IEC 17025:2005** Standartına göre Akredite olup bu belgeyi alarak kalitesini belgelemiştir. Türkak Akreditasyon Kurumunun 2011 yılında yaptığı denetim ile Akreditasyon süresi **22.09.2014** tarihine kadar yenilenmiştir.



ICP-MS Cihazı



İyon Kromotografi Cihazı

2012 yılında yapılan çalışmalar ve TÜRKAK tarafından yapılan ara denetimde ICP-MS cihazı ile analizlenen Kalay ve Gümüş paramatrelerinden kapsam genişletilmiştir.

AB-0056-T dosya numaralı TÜRKAK Akreditasyon Sertifikamız kapsamında 42 adet olan akredite parametre sayısı 5 Kasım 2012 tarihi itibari ile 56'ya yükseltilmiştir.

2012 yılında yapılan çalışmalar ve TÜRKAK tarafından yapılan ara denetimde İyon Kromotografi cihazı ile analiz edilmeye başlanan Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat, Bromat, Sodyum, Potasyum, Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum parametrelerinden kapsam genişletilmiştir.

Y-35/133/2011 belge nolu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamında 13 adet olan yeterlik almış parametre sayısı 19 Eylül 2012 tarihi itibari ile 36'ya yükseltilmiştir.

Akredite parametrelerimiz;

İçme ve Atık Suda ; İletkenlik, Bulanıklık, Kalsiyum, Magnezyum, Nitrit, Nitrat, Toplam Sertlik, Sülfat Arsenik, Cıva, Toplam Krom, Çinko, Nikel, Kurşun, Kadmiyum, Bakır, Demir, Kalay, pH, Klorür, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Yağ Gres, Serbest Klor, Askıda Katı Madde, Sülfür, Bor, Sodyum, Alüminyum, Selenyum, Baryum, Antimon, Cobalt, Mangan, Gümüş, Florür, Fosfat, Bromat, Amonyum, Potasyum.

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DEZENFEKSİYON NOKTALARI VE KLOR SARFİYATLARI		
Dezenfeksiyon Cinsi	**Dezenfeksiyon Noktaları**	**Sarfiyatı (Kg)**
Gaz Klor	1.Halkapınar	154.395
	2.Menemen Acil	
	3.Yahşelli Pompa (İhtiyaç halinde kullanılıyor)	
	4.Cumhuriyet Depo	
	5.Viyadük Altı	
	6.55 binlik Depo (İhtiyaç halinde kullanılıyor)	
	7.Pınarbaşı Kuyuları	
	8.Balçova Barajı	
	9.P-23 Pompa	
	10.Gediz Klorlama	
	11.Karabağlar Klorlama	
	12.Çevre İlçe, Köy ve Beldeler (17 Adet) *	
Sıvı Klor	1.T-17 Depo	252.770
	2.T-18 Pompa	
	3.Buca Teknik Kısım	
	4.Yıldızlar Mah.	
	5.Adatepe Pompa	
	6.Pınarbaşı Çamiçi**	
	7.Çevre İlçe, Köy ve Beldeler (303 Adet) ***	
Tablet Klor	Çevre İlçe, Köy ve Beldeler (2 Adet) ***	45

* 2012 yılında Gerenköy, Eskifoça hattından beslenmeye başlandığı için gaz klorlama iptal edilmiştir.

** 2012 yılında Buca Fen İşleri Pompadan yapılan sıvı klorlama Buca hattından gelen suyun klor miktarının yeterli olması sebebiyle iptal edilmiş, Pınarbaşı Çamiçi Pompadan su alınmaya başlandığından sıvı klorlama sistemi kurulmuştur.

*** 2012 yılında 11 adet yeni sıvı klorlama sistemi montajı yapılmış, 3 noktada da (Kalabak, Maydonoz, Gümüldür Eskiköy) tablet klorlamadan sıvı klorlamaya geçilmiştir.

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÇEVRE İLÇE, KÖY VE BELDELERDEKİ DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI			
BÖLGELER	**GAZ KLOR**	**SIVI KLOR**	**TABLET KLOR**
Merkez	1	30	
Kemalpaşa	2	46	1
Foça	3	6	
Aliağa	2	19	
Menemen	1	29	1
Seferihisar	1	20	
Urla	2	21	
Torbalı	1	52	
Bayındır	1	31	
Selçuk	1	5	
Menderes	2	44	
TOPLAM	**17**	**303**	**2**





2012 yılında DMO'dan 1 adet 4x4 Çift Kabin Kamyonet ekip aracı olarak kullanılmak üzere satın alınmıştır.

İÇME SUYU TEMİN EDİLEN KUYULARIN 2012 YILI ANALİZLERİNE GÖRE SU KALİTESİ							
ANALİZ EDİLEN PARAMETRELER	BİRİM	Pınarbaşı Çınaraltı Kuyuları Toplama Noktası	Halkapınar Toplama Noktası	Menemen-Çavuşköy Toplama Noktası	Göksu Kuyuları Toplama Noktası	Sarıkız Kuyuları Toplama Noktası	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
		06.12.2012	06.12.2012	06.12.2012	06.12.2012	19.06.2012**	
E.coli	Sayı/100 ml	5	0	0	0	0	0-0
Enterokok	Sayı/100 ml	50	0	1	0	0	0-0
Koliform Bakteri	Sayı/100 ml	15	0	0	0	28	0-0
Koloni Sayımı 22°C	Sayı/1 ml	92	0	0	0	0	ANORMAL DEĞİŞİM YOK
*Antimon (Sb)	µg/L	0,268	1,569	0,358	0,351	1,189	0-5
*Arsenik (As)	µg/L	0,869	17,846	13,613	63,449	36,292	0-10
*Bromat (BrO3)	µg/L	<5	<5	<5	<5	-***	0-10
*Bor (B)	mg/L	0,02260	0,04912	0,25678	0,16083	0,22465	0-1
*Kadmiyum (Cd)	µg/L	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,082	0-5
*Krom (Cr)	µg/L	0,234	0,895	1,459	0,483	5,958	0-50
*Bakır (Cu)	mg/L	0,00182	0,00027	0,00059	<0,00022	0,00013	0-2
Siyanür (CN-)	µg/L	0	0	0	0	0	0-50
*Florür (F-)	mg/L	<0,03	0,138	0,075	0,090	0,56	0-1,5
*Kurşun (Pb)	µg/L	0,765	0,511	0,559	0,558	<0,121	0-25
*Civa (Hg)	µg/L	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,071	0-1
*Nikel (Ni)	µg/L	1,785	0,737	0,869	0,596	0,253	0-20
*Nitrat (NO3)	mg/L	12,013	22,456	9,783	3,436	12	0-50
*Nitrit (NO2)	mg/L	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,03	0-0,5
*Selenyum (Se)	µg/L	0,272	0,552	0,570	0,326	0,650	0-10
*Alüminyum (Al)	µg/L	6,697	2,451	1,815	6,844	3,290	0-200
*Amonyum (NH4)	mg/L	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35	0	0-0,5
*Klorür (Cl-)	mg/L	18,872	19,860	59,313	10,179	20	0-250
Renk		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	TKEDY
*İletkenlik	µS/cm	549 (25 °C)	576 (25 °C)	805 (25 °C)	630 (25 °C)	674 (25 °C)	0-2500
*pH		7,7 (25 °C)	7,5 (25 °C)	7,6 (25 °C)	7,5 (25 °C)	7,4 (25 °C)	6,5-9,5
*Demir (Fe)	µg/L	7,894	5,159	23,034	7,751	4,198	0-200
*Mangan (Mn)	µg/L	0,223	<0,2	5,939	0,378	0,267	0-50
Oksitlenebilirlik	mg/L O2	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0-5
*Sülfat (SO4)	mg/L	15,959	10,542	66,920	14,672	40	0-250
*Sodyum (Na)	mg/L	8,836	10,638	52,020	14,545	22,968	0-200
*Bulanıklık		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	TKEDY
Fosfatlar(P2O5)	mg/L	0	0	0	0	0	---
Çözünmüş Oksijen	mg/L	7,2	6,8	6,0	6,9	7,1	---
*Askıda Katı Madde (AKM)	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	---
Tuzluluk	%0	0	0	0,2	0,1	0,1	---
Oksijen Doygunluğu	mg/L O2	84	79	70	74	85	---

* Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen paramertelerdir.

** Gördes Barajından su alımının gerçekleşmesi nedeniyle Sarıkız İçmesuyu Arıtma Tesisinin ürettiği suyun hizmete verilmesi nedeniyle Sarıkız Kuyuları 23.06.2012 tarihinde devre dışı bırakılmıştır.

*** Bromat parametresinin analizi 2012 Eylül ayından sonra bakılmaya başlanmıştır.

İÇME SUYU TEMİN EDİLEN YÜZEYSEL SULARIN 2012 YILI ANALİZLERİNE GÖRE SU KALİTESİ							
ANALİZ EDİLEN PARAMETRELER	BİRİM	Cengiz Saran Barajı Balçova İçme Suyu Arıtma Tesisi Çıkışı	Ürkmez Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi Çıkışı	Güzelhisar Barajı Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi Depo Çıkışı	Tahtalı Barajı Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi Çıkışı	Gördes Barajı Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi Çıkışı	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
		07.11.2012	19.12.2012	04.12.2012	17.12.2012	12.11.2012	
E.coli	Sayı/100 ml	0	0	0	0	0	0
Enterokok	Sayı/100 ml	0	0	0	0	0	0
Koliform Bakteri	Sayı/100 ml	0	0	0	0	0	0
Koloni Sayımı 22°C	Sayı/1 ml	0	0	0	0	0	ANORMAL DEĞİŞİM YOK
C.perfringens	Sayı/100 ml	0	0	0	0	0	0
*Antimon (Sb)	µg/L	0,411	0,258	<0,2	0,299	0,395	5
*Arsenik (As)	µg/L	1,317	1,020	9,130	2,104	2,652	10
*Bromat (BrO3)	µg/L	<5	<5	<5	<5	<5	10
*Bor (B)	mg/L	0,01721	0,05182	0,04959	0,05445	0,02165	1
*Kadmiyum (Cd)	µg/L	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	5
*Krom (Cr)	µg/L	0,321	<0,188	0,650	<0,188	0,191	50
*Bakır (Cu)	mg/L	0,00053	0,00068	<0,00022	0,00041	0,00084	2
Siyanür (CN-)	µg/L	0	0	0	0	0	50
Florür (F-)	mg/L	0,092	0,082	0,146	0,040	0,128	1,5
*Kurşun (Pb)	µg/L	0,469	0,530	0,557	0,470	0,517	25
*Civa (Hg)	µg/L	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	1
*Nikel (Ni)	µg/L	0,422	1,230	0,284	1,491	1,931	20
*Nitrat (NO3)	mg/L	0,583	0,542	15,140	0,391	5,006	50
*Nitrit (NO2)	mg/L	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4	0,5
*Selenyum (Se)	µg/L	0,313	<0,25	2,667	<0,25	0,273	10
*Alüminyum (Al)	µg/L	12,593	61,461	2,015	97,244	169,272	200
Amonyum (NH4)	mg/L	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35	0,5
*Klorür (Cl-)	mg/L	16,485	23,587	33,521	27,591	13,620	250
Renk		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	TKEDY
*İletkenlik	µS/cm	422 (25 °C)	382 (25 °C)	563 (25 °C)	368 (25 °C)	341 (25 °C)	2500
*pH		8,1 (25 °C)	7,9 (25 °C)	7,4 (25 °C)	8,1 (25 °C)	7,7 (25 °C)	6,5-9,5
*Demir (Fe)	µg/L	16,127	7,257	<2	8,945	19,241	200
*Mangan (Mn)	µg/L	3,632	4,652	0,632	2,008	2,835	50
*Bulanıklık	NTU	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	1
Oksitlenebilirlik	mg/L O2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	5
Sülfat (SO4)	mg/L	26,713	34,159	39,845	23,393	31,259	250
*Sodyum (Na)	mg/L	10,331	14,356	25,098	17,602	8,810	200

* Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen paramertelerdir.

İZMİR MERKEZ 11 İLÇEYE VERİLEN İÇME VE KULLANMA SUYUNUN 11.12.2012 TARİHLİ DEPO ÇIKIŞLARINDAKİ SU KALİTESİ **									
ANALİZ EDİLEN PARAMETRELER	BİRİM	55000'lik Depo Çıkışı	Halkapınar Depo Çıkışı	Cumhuriyet Depo Çıkışı	Gaziemir Depo Çıkışı	Çınar altı Pınarbaşı Depo Çıkışı	Güzelbahçe Depo Çıkışı	Menemen Acil Depo Çıkışı	İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
E.coli	Sayı/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterokok	Sayı/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliform Bakteri	Sayı/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Koloni Sayımı 22'C	Sayı/1 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
C.perfringens	Sayı/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
*Antimon (Sb)	µg/L	0.612	1.441	0.319	0.286	0.226	1.064	0.287	5
*Arsenik (As)	µg/L	4.744	6.174	4.232	2.272	0.957	4.875	4.396	10
*Bromat (BrO3)	µg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	10
*Bor (B)	mg/L	0.13241	0.05586	0.19553	0.05303	0.02093	0.08300	0.29324	1
*Kadmiyum (Cd)	µg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	5
*Krom (Cr)	µg/L	0.860	1.106	0.949	<0.188	0.240	0.992	1.485	50
*Bakır (Cu)	mg/L	0.00146	0.00269	0.01020	0.00128	0.00192	0.00315	0.00138	2
Siyanür (CN-)	µg/L	0	0	0	0	0	0	0	50
*Florür (F-)	mg/L	0.292	0.236	0.233	0.040	0.403	0.078	0.087	1,5
*Kurşun (Pb)	µg/L	0.737	0.655	0.970	0.621	0.581	0.674	0.542	25
*Civa (Hg)	µg/L	<0.2	0.289	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	1
*Nikel (Ni)	µg/L	1.648	1.534	1.857	1.294	0.378	1.072	1.071	20
*Nitrat (NO3)	mg/L	6.023	10.217	4.494	<0.3	11.819	8.247	11.683	50
*Nitrit (NO2)	mg/L	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0,5
*Selenyum (Se)	µg/L	0.286	0.374	0.286	<0.25	<0.25	0.290	0.556	10
*Alüminyum (Al)	µg/L	15.519	1.480	9.349	119.868	6.758	18.528	1.288	200
*Amonyum (NH4)	mg/L	<0.35	<0.35	<0.35	<0.35	<0.35	<0.35	<0.35	0,5
*Klorür (Cl-)	mg/L	22.275	21.323	21.733	26.496	21.044	21.010	66.204	250
Renk		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	TKEDY
*İletkenlik	µS/cm	616	565	655	360	535	580	927	2500
*pH		7.6	7.5	7.6	7.9	7.6	7.6	7.6	6,5-9,5
*Demir (Fe)	µg/L	56.947	123.887	32.341	13.690	13.677	72.954	145.624	200
*Mangan (Mn)	µg/L	0.486	0.435	0.215	2.269	<0.2	0.412	1.433	50
Oksitlenebilirlik	mg/L O2	0.4	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.4	5
*Sülfat (SO4)	mg/L	22.397	21.252	22.597	23.263	16.041	21.415	95.328	250
*Sodyum (Na)	mg/L	16.842	11.355	22.681	16.414	10.385	13.288	59.879	200
*Bulanıklık		UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	UYGUN	TKEDY

* Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen paramertelerdir.
** Merkez 11 ilçeye içme ve kullanma suyu 7 adet depodan dağıtılmaktadır.

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET TABLOSU

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

AYLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
Merkez Şebeke'de Alınan Numune Sayısı	1067	1704	624	663	759	747	853	871	723	711	892	1074	10688
Çevre Belediye İçme Suyu Alınan Numune Sayısı	240	356	258	267	360	316	271	184	230	164	378	312	3336
Memba Suyu Numune Sayısı	110	389	138	75	81	68	98	100	187	417	84	86	1833
Özel İçme Suyu Numune Sayısı	61	146	20	34	24	58	23	8	13	9	4	2	402
Özel Atıksu Numune Sayısı	12	8	92	42	144	95	99	85	98	92	122	90	979
Arızadan Alınan Numune Sayısı	57	38	133	93	131	128	152	120	148	117	126	107	1350
Atıksu Numune Sayısı	176	197	214	209	228	189	193	183	194	161	188	159	2291
TOPLAM GELEN ÖRNEK SAYISI													20879
Merkez Şebeke'de Analizlenen Parametre Sayısı	7238	10445	5159	5132	6849	5480	5523	8454	5696	5257	6821	6136	78190
Çevre Belediye İçme Suyu Analizlenen Parametre Sayısı	2956	3818	4134	2766	4283	4080	2744	1339	3951	2040	8958	5906	46975
Memba Suyu Analizlenen Parametre Sayısı	1281	4975	1499	1155	642	769	1583	930	1757	4694	972	774	21031
Özel İçme Suyu Analizlenen Parametre Sayısı	270	521	165	223	192	240	130	56	203	155	93	36	2284
Özel Atıksu Analizlenen Parametre Sayısı	19	15	949	451	483	445	458	318	551	385	685	368	5127
Arızadan Alınan Numune'de Analizlenen Parametre Sayısı	224	198	264	195	245	177	250	231	262	216	221	181	2664
Atıksu Numunelerinde Analizlenen Parametre Sayısı	946	1007	1048	1041	1115	967	954	998	1058	856	981	812	11783
TOPLAM ANALİZLENEN PARAMETRE SAYISI													168054

EKİP ÇALIŞMALARI

AYLAR	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
Merkez Şebeke'de Dezenfeksiyon Uç Nokta Klor Kontrolü Parametre Sayısı	3551	2658	2760	2418	2817	2467	2662	2060	1698	2057	2454	3294	30896
Çevre Belediye Dezenfeksiyon Uç Nokta Klor Kontrolü Parametre Sayısı	4110	3595	4276	2416	3955	3451	2914	3983	3706	3803	3712	3427	43348

LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 YILLARI ARASI FAALİYET ÇİZELGESİ					
YILLAR	2008	2009	2010	2011	2012
Dezenfeksiyon Uç Nokta Klor Kontrolü Parametre Sayısı	33639	43739	39782	29657	30896
Çevre Belediye Uç Nokta Klor Kontrolü Kontrol Sayısı	28240	52623	52897	30427	39921
Merkez Şebeke'de Kontrol Numune Sayısı	8141	12443	9535	9075	10688
Merkez Şebeke'de Kontrol Parametre Sayısı	96472	82580	64730	65354	78190
Çevre Belediye İçme Suyu Numune Sayısı	1283	1269	2006	1470	3336
Çevre Belediye İçme Suyu Bakılan Parametre Sayısı	28287	18771	27785	21997	46975
Memba Suyu Numune Sayısı	389	610	423	1448	1833
Memba Suyu Parametre Sayısı	3312	5013	2741	9774	21031
Özel Su Numune Sayısı	533	641	479	1165	402
Özel Su Parametre Sayısı	5657	5355	2458	3577	2284
Arızadan Alınan Numune Sayısı	1279	1398	990	856	1350
Arızadan Alınan Parametre Sayısı	5493	4393	3227	3187	2664
Merkez Şebeke'de Bakteriyolojik Kontrol Numune Sayısı	4687	5701	5627	3471	- *
Merkez Şebeke'de Bakteriyolojik Kontrol Parametre Sayısı	25601	28595	18588	12438	- *
Çevre Belediye Bakteriyolojik Numune Sayısı	880	492	669	1161	- *
Çevre Belediye Bakteriyolojik Bakılan Parametre Sayısı	2640	1469	2427	4046	- *
Atıksu Numune Sayısı	2385	2438	2110	1906	2291
Atıksu Parametre Sayısı	16840	17075	12277	10460	11783

* 2012 yılı itibariyle analiz raporları fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri toplu tek rapor olacak şekilde düzenlenmeye başlanmıştır.

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 08.12.2006 tarihinde 494 Karar Nolu Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyüksehir Belediyesi sınırları içinde oluşan evsel ve kentsel atık suların arıtılması amacıyla inşa edilmiş olan atıksu arıtma tesislerinin, derin deniz deşarj yapılarının, Foça atıksu pompa istasyonlarının ve Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanının 2872 sayılı Çevre Kanunu'na bağlı olarak düzenlenmiş mevzuat ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen esaslara göre işletilmesini, işlettirilmesini, bakımını, tevsisini, revizyonunu ve mevcut tesislerin yeni ünitelerle geliştirilmesini ve bu amaçlar doğrultusunda kendisine bağlı tüm birimlerin verimli, ekonomik ve mevzuata uygun bir tarzda çalışmalarını sağlar. Bu hizmetler, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 2 adet Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Mevcut durumda;

≠ **Kuzey Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü;** Çiğli, Menemen, Foça (ve Foça Atıksu Pompa İstasyonları), Aliağa, Kemalpaşa, Halilbeyli Köyü, Kozbeyli Köyü, Hacıömerli Köyü, Bağarası Atıksu Arıtma Tesisleri ile Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı'nın işletilmesinden sorumludur.

≠ **Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü;** Güneybatı, Havza, Torbalı, Urla, Seferihisar, Bayındır, Ayrancılar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gümüldür, Selçuk, Ürkmez, Balıklıova Köyü, Gödence Köyü, Çakırbeyli Köyü ve Korucuk Köyü Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesinden sorumludur.

Bu kapsamda Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından aşağıda tanımlanan;

≠ Daire Başkanlığına bağlı atıksu arıtma tesislerinin, derin deniz deşarj yapılarının, Foça atıksu pompa istasyonlarının ve Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanının ilgili mevzuatlara uygun şekilde verimli ve düzenli olarak isletilmesini sağlamak; bu amaçla Başkanlığa bağlı bütün Müdürlükler arasında gerekli koordinasyonu yürütmek,

≠ Tesislerin planlanan normlarda işletilmesi için gereken düzenlemeleri yaparak denetimini sağlamak,

≠ Kuzey Bölgesi ve Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlükleri'ne bağlı ilçe, belde ve köy atıksu arıtma tesisleri, derin deniz deşarj yapıları, Foça atıksu pompa istasyonları ve Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı ile ilgili tevsii, projelendirme yatırım programlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

≠ Kuzey Bölgesi ve Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlükleri'ne bağlı atıksu arıtma tesislerinde atıksu, arıtılmış su ve arıtma çamurlarının analizlerini yapmak, yaptırmak, tesislerin işletilmesi için gerekli yasal prosedürleri sağlamak ve gerekli izinleri almak,

≠ Arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurlarının bertarafı amacıyla tesis kurmak, arıtılmış suların ve arıtma çamurlarının kullanımı için çalışma yapmak,

- ≠ Daire Başkanlığında görev yapan tüm personelin mesleki ve bilgi, becerilerini geliştirmek için eğitim planlamalarını yaparak, bunların kendisine bağlı Müdürlükler vasıtasıyla yürütülmesini sağlamak, arıtma teknolojilerinin güncel durumlarına göre gerekli hallerde Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen hizmetlerde kullanılacak yeni teknolojiler konusunda kapsamlı inceleme, araştırma değerlendirmeler yaparak Üst Makamlara konuyla ilgili öneriler ve raporları sunmak,
- ≠ Daire Başkanlığına gelen ve giden bütün evrakın usulüne uygun bir tarzda cevaplandırılmasını ve bu konuda gerekli tüm gizlilik kurallarına riayet edilmesini sağlamak,
- ≠ Daire Başkanlığına bağlı tüm personelin özlük işlerine ilişkin, bu konuda ilgili dairelerle yazışmaları yürütmek ve Üst Makamlara öneriler sunmak,
- ≠ Başkanlık bünyesinde sunulan hizmetlerin durumuna bağlı olarak, Daire Başkanlığına bağlı tüm personelin akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil vb. gibi dönemlerde hizmetlerin devamını sağlayacak tarzda görevlendirilmesini sağlamak,
- ≠ Daire Başkanlığı personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak,
- ≠ Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin çalışmalarıyla ilgili yıllık iş planları ve faaliyet raporları hazırlayıp Üst Makamlara sunmak ve Üst Makamlar tarafından mevzuatlar dahilinde verilen diğer görevleri yerine getirmek

görevlerini gerçekleştirmektedir.

KUZEY BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kuzey Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü; bünyesinde bulunan atıksu arıtma tesisleri, deniz deşarj yapısı, atıksu pompa istasyonları ve Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanını; 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanunu İle İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu İle Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak işletilmesini sağlamakla görevlidir.

GÜNEY BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü; bünyesinde bulunan atıksu arıtma tesisleri, deniz deşarj yapısı, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanunu İle İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak işletilmesini sağlamakla görevlidir.

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İŞLETİLEN TESİSLER

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak; Çiğli, Güneybatı, Urla, Havza, Menemen, Torbalı, Aliağa, Kemalpaşa, Seferihisar, Foça (ve Foça Atıksu Pompa İstasyonları), Bayındır ve Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere 12 adet ileri biyolojik arıtma, İYTE, Halilbeyli Köyü, Hacıömerli Köyü,

Gümüldür, Bağarası, Kozbeyli Köyü ve Gödence Köyü Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere 7 adet biyolojik arıtma, Selçuk, Ürkmez, Balıklıova Köyü, Çakırbeyli Köyü ve Korucuk Köyü Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere 5 adet doğal atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu 24 tesisin toplam kurulu kapasitesi 803.197m^3/gün olup, 2012 yılında toplam olarak arıtılan atıksu miktarı 270.485.036 m^3 (741.055 m^3/gün), çamur keki miktarı da 200.321 ton'dur (549 ton/gün). Oluşan toplam çamur miktarının 167.791 tonu (460 ton/gün) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde, 32.530 (89 ton/gün) ton'u da diğer tesislerde oluşan ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde depolanan çamur keki miktarıdır. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı'nın işletilmesinden de sorumludur. 2012 yılı içinde Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında 1.407.012 ton evsel, evsel nitelikli endüstriyel, tıbbi, imha atığı ve arıtma çamuru depolanmıştır.

Daire Başkanlığına bağlı 24 adet atıksu arıtma tesisinde, hizmet verilen yaklaşık 3.300.000 vatandaşımızın evsel nitelikli atıksuları arıtılmaktadır. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında ise yaklaşık 3.250.000 vatandaşımıza hizmet verilmektedir.

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanına ilişkin 2012 yılı içinde; koku, güvenlik ve konutlara yakınlık konularında 90 tane şikayet yazısı gelmiştir. Bu şikayetlere karşılık gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Kuzey Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğüne Bağlı Atıksu Arıtma Tesisleri

ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

İzmir Büyük Kanal Projesi'nin son noktası olan arıtma tesisi, 30 hektarlık bir alan üzerine kurulmuş olup, 25 Ocak 2000 tarihinde işletmeye alınmıştır. 605.000m³/gün kapasiteli tesisine gelen atıksular, ileri biyolojik yöntemlerle arıtıldıktan sonra 2,5 km'lik deşarj hattı ile orta körfeze verilmektedir. Artan nüfusla birlikte arıtma kapasitesinin gelecekte yetersiz kalmaması amacıyla, Çiğli'deki mevcut kapasiteyi 7 m^3/sn'den 9.5 m^3/sn'ye yükseltecek olan 4.Faz İnşaatı İşinin Projesi tamamlanmıştır. İleri biyolojik prosese sahip tesisde 2012 yılında 220.141.458 m^3 su arıtılmıştır.

Arıtma işlemleri sonucu, tesiste toplam 167.791 ton (ortalama 460 ton/gün) çamur oluşumu gerçekleşmiştir.



FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ

İleri biyolojik prosese sahip tesiste, Foça ve çevre köylerden gelen atıksular arıtılmakta olup, kapasitesi 9.763 m^3 /gün'dür. Arıtılan atıksular UV dezenfeksiyonu sonrası, 3.410m.uzunluğunda bir derin deniz deşarjı hattı ile deniz altında 59 m. derinliğe deşarj edilmektedir. 2012 yılında 1.720.253 m^3 atıksu arıtılmıştır.



MENEMEN ATIKSU ARITMA TESİSİ

Menemen ilçe merkezi ile Asarlık, Koyundere, Seyrek ve Günerli yerleşim alanlarının atıksularını arıtmak amacıyla kurulmuştur. Tesis, 21.600 m^3 kapasitelidir. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular UV ile dezenfeksiyon işleminden sonra Eski Gediz yatağına deşarj edilmektedir. 2012 yılında 8.611.505 m^3 atıksu arıtılmıştır.



ALİAĞA ATIKSU ARITMA TESİSİ

İleri biyolojik arıtma prosesine sahip tesis, Aliağa ilçe merkezinin atık sularını arıtmaktadır. Tesisin kapasitesi 21.600 m^3/gün olup, arıtılan atıksular UV dezenfeksiyon sonrası, Güzelhisar Çayına deşarj edilmektedir. 2012 yılında 4.552.327 m^3 atıksu arıtılmıştır.



KEMALPAŞA ATIKSU ARITMA TESİSİ

İleri biyolojik arıtma prosesine sahip tesis, Kemalpaşa ilçe merkezi, Bağyurdu, Armutlu, Ören, Yukarı ve Aşağı Kızılca, Yiğitler, Örnekköy ve Çınarköy mahallelerinin atıksularını arıtmaktadır. Tesisinin kapasitesi 12.960 m^3/gün olup, arıtılılan atıksular UV dezenfeksiyon sonrası Nif Çayına deşarj edilmektedir. 2012 yılında 2.626.395 m^3 atıksu arıtılmıştır.



HALİLBEYLİ KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Arıtma tesisi 500 m^3/gün kapasitelidir. Tesis de aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. 2012 yılında 161.609 m^3 atıksu arıtılmıştır.



KOZBEYLİ KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Arıtma tesisi 500 m^3/gün kapasitelidir Tesisde aktif çamur prosesi uygulanmaktadır. 2012 yılında 160.200 m^3 atıksu arıtılmıştır.



HACIÖMERLİ KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Arıtma tesisi 250 m^3/gün kapasitelidir. Tesisde biodisk prosesi uygulanmaktadır. 2012 yılında 91.250m^3 atıksu arıtılmıştır.



BAĞARASI ATIKSU ARITMA TESİSİ

Klasik aktif çamur prosesine sahip olan tesis 2.100 m^3/gün kapasitelidir. 2012 yılında 112.477 m^3 atıksu arıtılmıştır.



HARMANDALI DÜZENLİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANI

1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından projelendirilerek 1992 yılında işletmeye alınan Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı, ülkemizin ilk düzenli depolama alanıdır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinden toplanan evsel, evsel nitelikli endüstriyel ve tıbbi atıklar Harmandalı Katı Atık Depolama Alanında düzenli olarak depolanmaktadır. Tesis, 900.000 m^2 alana sahiptir. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımız 2005 yılından itibaren Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı'nın işletilmesinden sorumludur.

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı'nda 2012 yılında günlük ortalama olarak 3.834 ton/gün atık depolanmıştır. Tesiste 1992–2011 yılları arası 14.170.933 ton ve 2012 yılı içinde 1.399.350 ton olmak üzere evsel, evsel nitelikli endüstriyel ve tıbbi atık depolanmıştır. Depolama alanında oluşan sızıntı suları toplama şebekesi ile toplanarak arıtılmak üzere Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilmektedir.

Tıbbi ve evsel nitelikli endüstriyel atık lotlarının tabanı ve yan yüzeyleri jeotekstil ve jeomembran malzeme ile kaplanarak sızdırmazlık özelliği güçlendirilmiştir. Aktif olarak depolama 170.000 m^2 'lik alanda 95 adet gaz tahliye bacası bulunmaktadır.

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanının daha etkin bir şekilde işletilebilmesi için, yapımı 2011 yılında başlayıp 2012 yılında tamamlanan, 308 m uzunluğunda bir sedde, 5040 m uzunluğunda ulaşım yolu, 6.778 m uzunluğunda sızıntı suyu toplama sistemi ve 2.450 m uzunluğunda yağmur suyu toplama sistemi, 26.905 m^3 hacminde tıbbi atık, 152.883 m^3 hacminde evsel nitelikli endüstriyel atık, 193.117 m^3 hacminde arıtma çamuru ve 3.214.775 m^3 hacminde evsel atık depolama lotları oluşturulmuştur. Tamamlanan imalatlarla, sızıntı suyu sistemi toplam 9.718 m'ye, yağmur suyu sistemi toplam 4.302 m'ye yol uzunluğu toplam 6.760 m'ye ulaşmıştır.

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı'ndaki üstü kapatılmış olan çöp depolama alanlarında, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu kılavuzlar ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştır. Rehabilitasyon Projesi kapsamında yeni metan gazı tahliye bacalarının yapılması, metan gazı yakma sistemi kurulması, ekonomik olması halinde metan gazından elektrik üretimi, yol yapımı ve peyzaj düzenlemeleri bulunmaktadır. Ayrıca, yeni yağmur suyu kuşaklama kanalı ve sızıntı suyu toplama kanalları yapılarak mevcut sistem geliştirilecektir. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması işi tamamlanmıştır.



Güney Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğüne Bağlı Atıksu Arıtma Tesisleri

GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA TESİSİ

Tesis 21.600m³/gün kapasitelidir. İleri biyolojik yöntemlerle arıtılmış atıksular 600 m uzunluğundaki derin deşarj hattı ile 25 m derinlikte denize deşarj edilmektedir. Tesiste 2012 yılında 8.114.864 m^3 atıksu arıtılmıştır.



HAVZA ATIKSU ARITMA TESİSİ

Tahtalı barajını korumak amacıyla yapılmış olan bu tesiste, Menderes ilçesi ve Tahtalı havzasında yer alan köy yerleşimlerin atıksuları arıtılmaktadır. İleri biyolojik arıtma prosesinin uygulandığı tesisin kapasitesi 21.600 m^3/gün'dür. Tesisin arıtılmış atıksuları UV dezenfeksiyon sonrası, DSİ drenaj kanalı ile Küçük Menderes Nehri'ne deşarj edilmektedir. 2012 yılında 4.065.827 m^3 atıksu arıtılmıştır.



TORBALI ATIKSU ARITMA TESİSİ

İleri biyolojik arıtma prosesine sahip tesisinin kapasitesi 21.600 m^3/gün'dür. Tesis, Torbalı ilçe merkezi, Subaşı, Çaybaşı, Pamukyazı, Yeniköy, Özbey, Arslanlar, Şehitler ve yakın yerleşim alanlarının atıksularını arıtmaktadır. Arıtılmış atıksular UV ile dezenfeksiyon işleminden sonra Fetrek deresine deşarj edilmektedir. 2012 yılında 3.911.203 m^3 atıksu arıtılmıştır.



URLA ATIKSU ARITMA TESİSİ

İleri biyolojik arıtma prosesine sahip tesisinin kapasitesi 21.600 m^3/gün'dür. Tesis, Urla Merkez, İskele, Çeşmealtı, Kalabak ve Zeytinalanı bölgelerinin atıksularını arıtmaktadır. Arıtılan atıksular 770 m uzunluğundaki derin deniz deşarj hattı ve -20 m' de bulunan difüzör sistemiyle denize deşarj edilmektedir. 2012 yılında 5.714.612 m^3 atıksu arıtılmıştır.



SEFERİHİSAR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Tesis, Seferihisar ilçe merkezi, Sığacık ve Akarca mahallelerinin atıksularını arıtmaktadır. Tesisin kapasitesi, 10.800 m^3/gün olup, arıtılmış atıksular ileri biyolojik yöntemlerle arıtıldıktan sonra atıksular UV ile dezenfeksiyon işleminden sonra Kocaçay deresine deşarj edilmektedir. 2012 yılında 2.733.735 m^3 atıksu arıtılmıştır.



AYRANCILAR-YAZIBAŞI ATIKSU ARITMA TESİSİ

Küçük Menderes Havzasının kirletilmesinin önlenmesi amacıyla kurulan tesis, Torbalı ilçesinin atıksularını arıtmaktadır. İleri biyolojik arıtma prosesine sahip tesisinin kapasitesi 6.912 m^3/gün'dür. 2012 yılında 3.303.918 m^3 atıksu arıtılmıştır.



BAYINDIR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Küçük Menderes Havzasının kirletilmesinin önlenmesi amacıyla kurulan tesis, ileri biyolojik arıtma prosesine sahip tesisinin kapasitesi 6.912 m^3/gün'dür. 2012 yılında 1.050.568 m^3 atıksu arıtılmıştır.



İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden bir protokolle devir alınan tesis, proje revizyonu yapılarak 2008 yılında işletmeye alınmıştır. Tesis kapasitesi 2.250 m^3/gün olup aktif çamur prosesine sahiptir. Atıksular arıtıldıktan sonra Tatar Deresi'ne deşarj edilmektedir. 2012 yılında 265.463 m^3atıksu arıtılmıştır.



GÜMÜLDÜR ATIKSU ARITMA TESİSİ

Aktif çamur prosesine sahip tesisinin kapasitesi 1.800 m^3/gün'dür. 2012 yılında 636.772 m^3 atıksu arıtılmıştır.



SELÇUK ATIKSU ARITMA TESİSİ

Stabilizasyon havuzu olarak adlandırılan doğal arıtma prosesine sahip tesisinin kapasitesi 10.200 m^3/gün 'dür. 2012 yılında 2.035.000 m^3 atıksu arıtılmıştır.



ÜRKMEZ DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ

Doğal filtreli arıtma prosesine sahip tesisinin kapasitesi 2.000 m^3/gün 'dür. 2012 yılında 297.000 m^3 atıksu arıtılmıştır.



BALIKLIOVA KÖYÜ DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ

Doğal filtreli arıtma prosesine sahip tesisinin kapasitesi 1.000 m^3/gün 'dür.



GÖDENCE KÖYÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Ardışık kesikli aktif çamur prosesine sahip tesisinin kapasitesi 250 m^3/gün 'dür. 2012 Yılında 21.600 m^3 atıksu arıtılmıştır.



ÇAKIRBEYLİ KÖYÜ DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ

Doğal filtreli arıtma prosesine sahip tesisinin kapasitesi 200 m^3/gün 'dür. 2012 Yılında 69.800 m^3 atıksu arıtılmıştır.



KORUCUK KÖYÜ DOĞAL ATIKSU ARITMA TESİSİ

Doğal filtreli arıtma prosesine sahip tesisinin kapasitesi 200 m^3/gün 'dür 2012 Yılında 87.200 m^3 atıksu arıtılmıştır.



ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYETLERİ

1. Çiğli AAT 4. Faz Projesi

Körfez'deki iyileşmeyi sürdürmek için "Yüzülebilir Körfez" hedefiyle "Büyük Körfez Projesi" kapsamında; Büyük Kanal Projesi ile 2000 yılında hizmete giren Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde halen işletmedeki 3 faz arıtma ünitelerine ek olarak saniyede 2.5 metreküp atıksu arıtma kapasiteli 4. faz inşa edilecektir. Bu proje ile mevcut arıtma tesisine eklenecek yeni bir hatla, halen günde 604 bin 800 metreküp olan arıtma kapasitesi, günde 216 bin metreküp artırılarak 820 bin 800 metreküpe ulaşacaktır. Proje sonuçlandırıldığında günde 24 saat kesintisiz olarak çalışan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde; kentin büyümesine bağlı olarak arıtılan atıksu miktarını güvenli ve yüksek kalitede arıtabilmek, gerekli bakım ve yenilemelerini daha iyi yapılabilmek ve yağışlı havalarda daha yüksek debilerde atıksu arıtabilmek için 4.faz üniteleri inşa edilecektir.4.Faz İnşaatı İşinin Projesi tamamlanmıştır.



2. Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı

Arıtılmış atıksuyun tarımsal, endüstriyel ve proses suyu amaçlı olarak yeniden kullanımı için geri kazanım tesisi inşaatı planlanmaktadır. Söz konusu tesisin kurulacağı alanın zemin etüd raporu hazırlanmıştır.

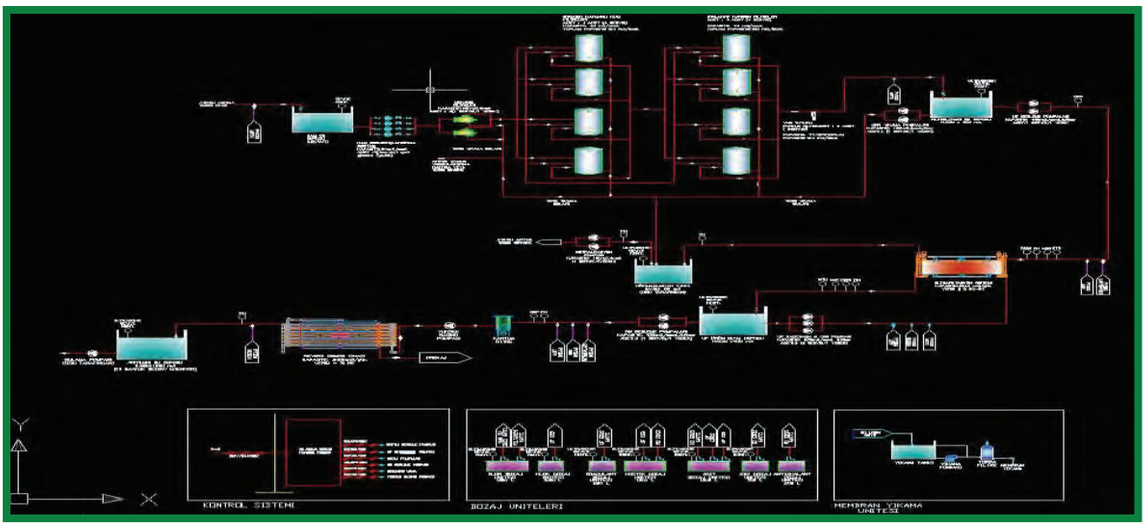

3. Merkezi Scada Sistemi Kurulması

Bu proje ile atıksu debisi, enerji tüketimi, oksijen seviyeleri gibi ana parametrelerin ve blower, pompa gibi ana ekipmanların merkezi izleme ve işletmesini kapsayan bir sistemin oluşturulması hedeflenmiştir. Merkezi Scada Sistemi Yapım İşinin ihalesi yapılmıştır.



4. Çamur Yönetimi için Master Plan

İZSU tarafından işletilmekte olan kullanımdaki atıksu arıtma tesislerinin ve yapımı planlanan tüm atıksu arıtma tesislerinin arıtma çamurları için bir master plan hazırlanacaktır. Teknik şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediye sınırlarının genişlemesi dolayısıyla, İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 19.04.2007 tarih ve 21/243 sayılı kararı ile Genel Müdürlük Makamı'nın 25.07.2007 tarih ve 2007/18 sayılı genelgesine istinaden "Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı" oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan Merkez Bölge, Gediz Bölgesi, Nif Bölgesi, Menderes Bölgesi, Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlükleri, Su Kaçak ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında toplanmıştır. Daire Başkanlığına bağlı Malzeme Temin ve Ambar Birimi, 15.02.2012 Tarih ve 50.01.04/01 Sayılı İZSU Genel Kurulu Kararında yer alan 9 adet Şube Müdürlüğü Kadrosu İhdası Kararına dayanılarak Şube Müdürlüğü yapılmış, Malzeme Temin ve Paket Arıtma Şube Müdürlüğü adını almıştır.

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, bağlı Müdürlükler aracılığı ile;

≠ Merkez Bölge Teknik Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasına giren alanda; imalatı tamamlanmış ya da tamamlanacak isale hatları ve merkezi kontrol sistemi (SCADA) ile işletilen pompa ve depolar hariç olmak üzere her çaptaki içmesuyu şebekesini işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak, içmesuyu şebeke borularının sık arıza yaptığı yerlerde kısmi şebeke yenilemeleri yapmak ve merkez ilçelere bağlı köylerin içmesuyu şebekeleri, pompa ve depoları ile köylerde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda işletilen dezenfeksiyon tesislerinin işletilmesi,

≠ Gediz, Nif, Menderes, Yarımada Bölge Teknik Şube Müdürlüklerin sorumluluk sahasına giren alanlarda; imalatı tamamlanmış ya da tamamlanacak isale hatları ve merkezi kontrol sistemi (SCADA) ile işletilen pompa ve depolar hariç olmak üzere her çaptaki içmesuyu şebekesi ve bunların üzerinde kurulmuş olan her türlü içmesuyu tesisini işletmek, pompa ve depolardaki elektrik tüketimlerinin kontrollerini (aktif, reaktif oranlarını) yapmak, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca kurulan ve koordinasyonunda işletilen dezenfeksiyon tesislerini mevcut yasa ve yönetmelikler kapsamında işletilmesi,

≠ Sorumluluk alanında bulunan her türlü içmesuyu depo, terfi istasyonu, trafo gibi tesislerin bakım, onarım ve yenilemelerini yapmak

≠ Daire Başkanlığı'na, aboneler tarafından çeşitli yollarla (HİM, dilekçe, telefon v.b.) iletilen menşei belli olmayan sularla ilgili şikayetleri değerlendirmek, içme suyundan kaynaklanan problemleri, dinleme yöntemi ile tespit ederek arızaları gidermek,

≠ Abonelerin problemsiz su almalarını sağlamak amacıyla işletme imkanları ile yapılabilecek şebeke yenileme ve/veya kısa mesafeli su şebekesi inşaatı yapmak,

≠ Sorumluluk alanında yeni su taleplerinin keşfini ve yeni su bağlanması çalışmalarını yürütmek,

≠ AYKOME teknik kurulundan altyapı çalışma izni almış kurum, kuruluş ve şahıslara İdaremize ait içme suyu tesislerine zarar verilmeden çalışmalarını sürdürmeleri için gözlemci görevlendirmek,

≠Üretilen su miktarı ile tahakkuk ettirilen (faturalanan) su miktarı arasındaki fark olarak ifade edilen su kayıplarını en aza indirmek amacıyla önleme ve giderme çalışmalarını yapmaktır. Bu kapsamda; matematiksel modelleme yoluyla izole sayaç bölgesi planlanması yapmak, izole bölge girişlerine sayaç rogarı inşa ederek filtre, sayaç/debimetre ve gerekiyorsa basınç kontrol vanası montajı yapılması, sayaç montajı yapılan izole sayaç bölgesinin, şebeke borusu bağlantısı, boru sonlanması, gerekiyorsa kısa mesafeli şebeke borusu döşenmesi, mevcut izole bölge sayaçlarının su tüketimleri ve basınç değerlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ile su kaçağı olduğu tahmin edilen bölgelerin tespiti, su kaçağına neden olan arızaların tespiti ve giderilmesi çalışmalarını yürütmek,

≠Daire Başkanlığının Müdürlükleri ile gerçekleştirilen görevi kapsamında hizmetlerin aksamadan ve kesintisiz yürütülmesi için gerekli malzemelerin asgari stokunu oluşturmak, Taşınır Mal Yönetmeliğine göre tüm malzemeleri ve demirbaşları takip edilmesini sağlamak, her türlü malzemenin minimum stok seviyelerinin korunması için asgari 4 (dört) aylık ihtiyacı karşılayacak şekilde satın alınmasını sağlamak, satın alma işlerine ait sözleşmeleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

≠5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belirlenen sorumluluk alanımızda bulunan yerleşim birimlerine TS 266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Standardına uygun içme ve kullanma suyu temin etmek için İdaremiz tarafından yaptırılan mevcut İçme suyu Paket Tipi Arıtma Tesislerini işletmek, teknik şartnameleri Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan paket tipi arıtma tesislerini ihale yoluyla yaptırmak

≠5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Gerçekleştirme Görevlileri ile birlikte Harcama Yetkilisi olarak stratejik plan, performans programı, analitik bütçe ve iç kontrol mekanizmasını yürütmek, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş ve işçi güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak ve kontrol etmek,

≠Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılan hizmet ve iş araçlarının verimli, ekonomik ve hatasız kullanımını temin etmek için kontrol yapmak,

faaliyetlerini sürdürmektedir.

MERKEZ BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Merkez Bölge Teknik Şube Müdürlüğü'nün görev alanı; Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ilçeleri ile bağlı belde ve köyleridir.

≠Merkez Bölge Teknik Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasına giren alanda; imalatı tamamlanmış ya da tamamlanacak isale hatları ve merkezi kontrol sistemi (SCADA) ile işletilen pompa ve depolar hariç olmak üzere her çaptaki içmesuyu şebekesini işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak, içmesuyu şebeke borularının sık arıza yaptığı yerlerde kısmi şebeke yenilemeleri yapmak ve merkez ilçelere bağlı köylerin içmesuyu şebekeleri, pompa ve depoları ile köylerde, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda işletilen dezenfeksiyon tesislerinin işletilmesi,

≠Sorumluluk alanında bulunan her türlü içmesuyu depo, terfi istasyonu, trafo gibi tesislerin bakım, onarım ve yenilemelerini yapmak,

≠Daire Başkanlığı'na, aboneler tarafından çeşitli yollarla (HİM, dilekçe, telefon v.b.) iletilen menşei belli olmayan sularla ilgili şikayetleri değerlendirmek, içme suyundan kaynaklanan problemleri, dinleme yöntemi ile tespit ederek arızaları gidermek,

≠Abonelerin problemsiz su almalarını sağlamak amacıyla işletme imkanları ile yapılabilecek şebeke yenileme ve/veya kısa mesafeli su şebekesi inşaatı yapmak,

≠Sorumluluk alanında yeni su taleplerinin keşfini ve yeni su bağlanması çalışmalarını yürütmek,

≠AYKOME teknik kurulundan altyapı çalışma izni almış kurum, kuruluş ve şahıslara İdaremize ait içmesuyu tesislerine zarar verilmeden çalışmalarını sürdürmeleri için gözlemci görevlendirmek,

faaliyetlerini sürdürmektedir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

≠İçme suyu şebekelerinde 3.100 adet Büyük Arıza (Boru Patlak arızası), 45.012 adet Küçük Arıza (Branşman, Sayaç Yanı, Yangın Musluğu ve Vana Arızaları) olmak üzere toplam 48.112 adet arızayı tamir edilmiştir. (GRAFİK 1)

≠Aşağıda çapları ve uzunlukları verilen borular ile toplam 6.116 mt boru döşenmiştir.

≠720 mt Ø63 HDPE

≠2.909 mt Ø100 Düktil Font Boru

≠2.022 mt Ø110 HDPE

≠465 mt muhtelif çaplarda HDPE ve düktil boru

≠Sorumluluk alanında toplam 12.225 adet yeni su bağlantısı çalışması yapılmıştır.(GRAFİK 2)

≠Kurum, kuruluş ve şahıslar tarafından içmesuyu şebekelerine verilen zararın tespiti kapsamında 331 adet tutanak düzenlenmiştir.

≠Kurum, kuruluş ve şahısların yaptığı çalışmalarda içmesuyu tesislerine zarar verilmemesi, kurumumuz tarafından yapılan çalışmalarda da üçüncü şahıslara zarar verilmemesi amacıyla toplam 2.404 adet çalışma için gözlemci görevlendirilmiştir.

≠Su şebekelerinde arıza giderilmesi çalışması sırasında toplam 29 abonenin ev veya işyerini su basmış olup verilen hasarlarla ilgili tutanak tutulmuştur.

≠Karşıyaka, Konak, Karabağlar, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Balçova İlçeleri İdare Malı Malzemelerle İçmesuyu Yeni Su Bağlama ve Branşman Yenileme İşi kapsamında ihale yoluyla 37.557 m. branşman hattı yenilenmiş, 3.757 adet sayaç bağlanmıştır.

≠Karşıyaka, Konak, Karabağlar, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Balçova İlçeleri Muhtelif Sokaklar İçmesuyu Şebeke ve Branşman Yenileme İşi kapsamında ihale yoluyla 35.500 m. İçmesuyu şebeke hattı döşenmiştir.

≠Konak, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Karabağlar İlçelerinde İçmesuyu Yeni Su Bağlantısı ve Branşman Yenileme İnşaatı İşi kapsamında ihale yoluyla 11.769 m. branşman hattı yenilenmiştir.

≠Karşıyaka, Çiğli, Bornova ve Bayraklı İlçelerinde İçmesuyu Yeni Su Bağlantısı ve Branşman Yenileme İnşaatı İşi kapsamında ihale yoluyla 7.943 m. branşman hattı yenilenmiştir.

≠Karşıyaka, Konak, Karabağlar, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Balçova İlçeleri İçmesuyu Şebeke ve Branşman Yenileme İşi kapsamında ihale yoluyla 24.844 m. İçmesuyu şebeke hattı döşenmiş, 111 m. branşman hattı yenilenmiştir

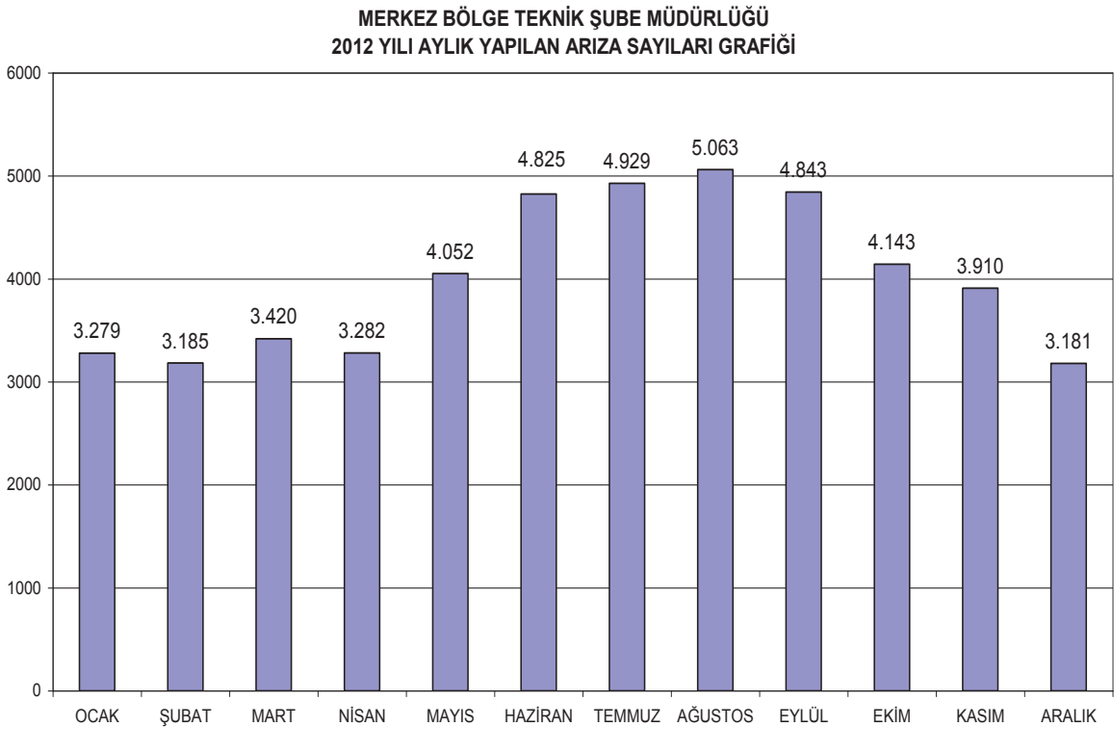

GRAFİK 1: Merkez Bölge Teknik Şube Müdürlüğü'nün 2011 yılında yaptığı arızaların aylık dağılımı

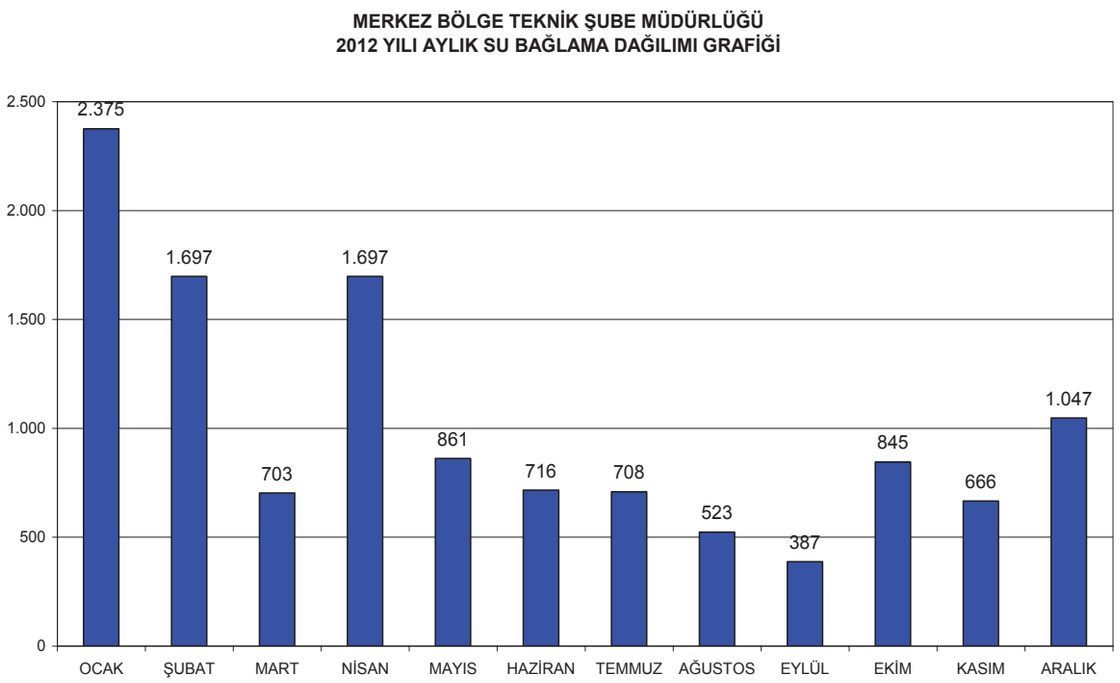

GRAFİK 2: Merkez Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü'nün 2012 yılında yaptığı su bağlama çalışmaları

BÖLGE TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

5216 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediye sorumluluk sınırları içerisine girdiği için oluşturulan Gediz Bölgesi, Nif Bölgesi, Menderes Bölgesi, Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüklerinin görev tanımları aşağıdaki gibidir.

≠ Gediz, Nif, Menderes, Yarımada Bölge Teknik Şube Müdürlüklerin sorumluluk sahasına giren alanlarda; imalatı tamamlanmış ya da tamamlanacak isale hatları ve merkezi kontrol sistemi (SCADA) ile işletilen pompa ve depolar hariç olmak üzere her çaptaki içmesuyu şebekesi ve bunların üzerinde kurulmuş olan her türlü içmesuyu tesisini işletmek, pompa ve depolardaki elektrik tüketimlerinin kontrollerini (aktif, reaktif oranlarını) yapmak, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca kurulan ve koordinasyonunda işletilen dezenfeksiyon tesislerini mevcut yasa ve yönetmelikler kapsamında işletilmesi,

≠ Sorumluluk alanımızda bulunan her türlü içmesuyu depo, terfi istasyonu, trafo gibi tesislerin bakım, onarım ve yenilemelerini yapmak

≠ Daire Başkanlığı'na, aboneler tarafından çeşitli yollarla (HİM, dilekçe, telefon v.b.) iletilen menşei belli olmayan sularla ilgili şikayetleri değerlendirmek, içmesuyundan kaynaklanan problemleri, dinleme yöntemi ile tespit ederek arızaları gidermek,

≠ Abonelerin problemsiz su almalarını sağlamak amacıyla işletme imkanları ile yapılabilecek şebeke yenileme ve/veya kısa mesafeli su şebekesi inşaatı yapmak,

≠ Sorumluluk alanında yeni su taleplerinin keşfini ve yeni su bağlanması çalışmalarını yürütmek,

≠ AYKOME teknik kurulundan altyapı çalışma izni almış kurum, kuruluş ve şahıslara İdaremize ait içmesuyu tesislerine zarar verilmeden çalışmalarını sürdürmeleri için gözlemci görevlendirmektir.

GEDİZ BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ALANI

Gediz Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanı, Menemen, Aliağa, Foça İlçeleri ile bağlı mahalle ve köylerdir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

Müdürlük 2012 yılı faaliyetleri kapsamında;

≠ İçme suyu şebekelerinde 1.923 adet Büyük Arıza (Boru Patlak arızası), 9.031 adet Küçük Arıza (Branşman, Sayaç Yanı, Yangın Musluğu ve Vana Arızaları) olmak üzere toplam 10.954 adet arızayı tamir etmiştir. (GRAFİK 1)

≠ Aşağıda belirtilen çeşit ve çaplarda 11.084 mt temiz su şebeke borusu döşenmiştir.

≠ 1.087 mt Ø25 HDPE

≠ 3.463 mt Ø32 HDPE

≠ 487 mt Ø50 HDPE

≠ 1.729 mt Ø63 HDPE

≠ 2.853 mt Ø110 HDPE

≠ 1.465 mt Muhtelif çeşit ve çaplarda boru

≠ 1.999 adet yeni su bağlantısı yapılmıştır. (GRAFİK 2)

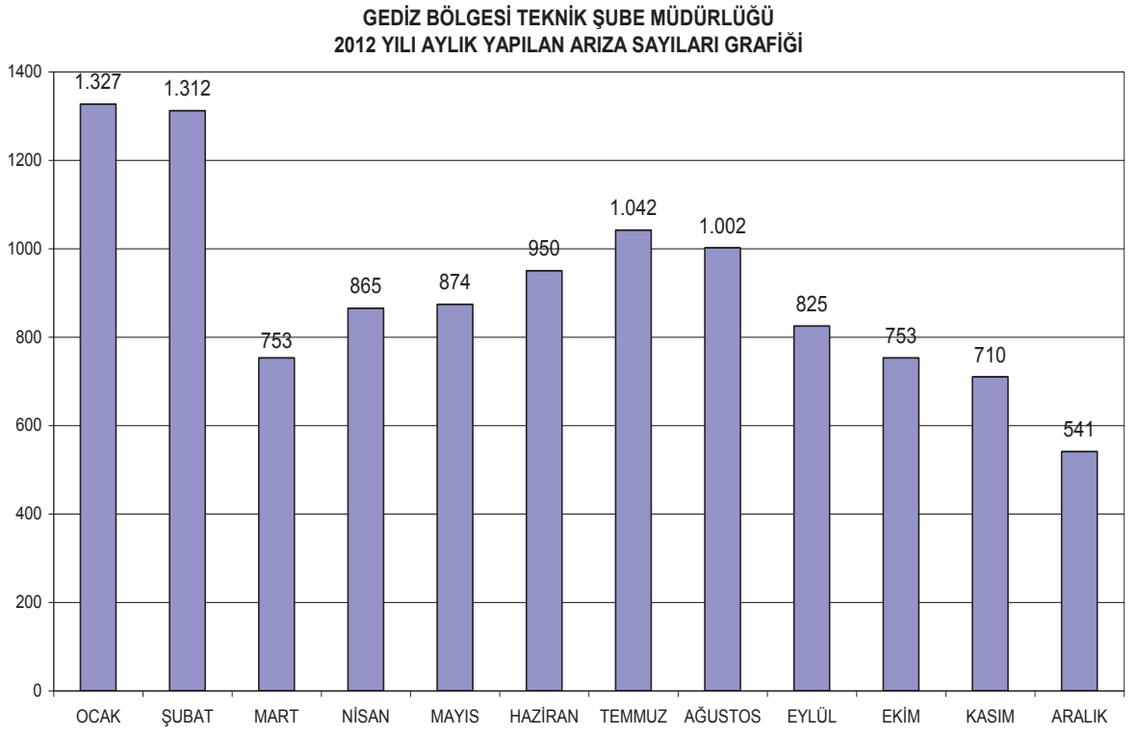

GRAFİK 1: Gediz Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü 2012 yılı aylara göre yapılan arıza sayıları grafiği

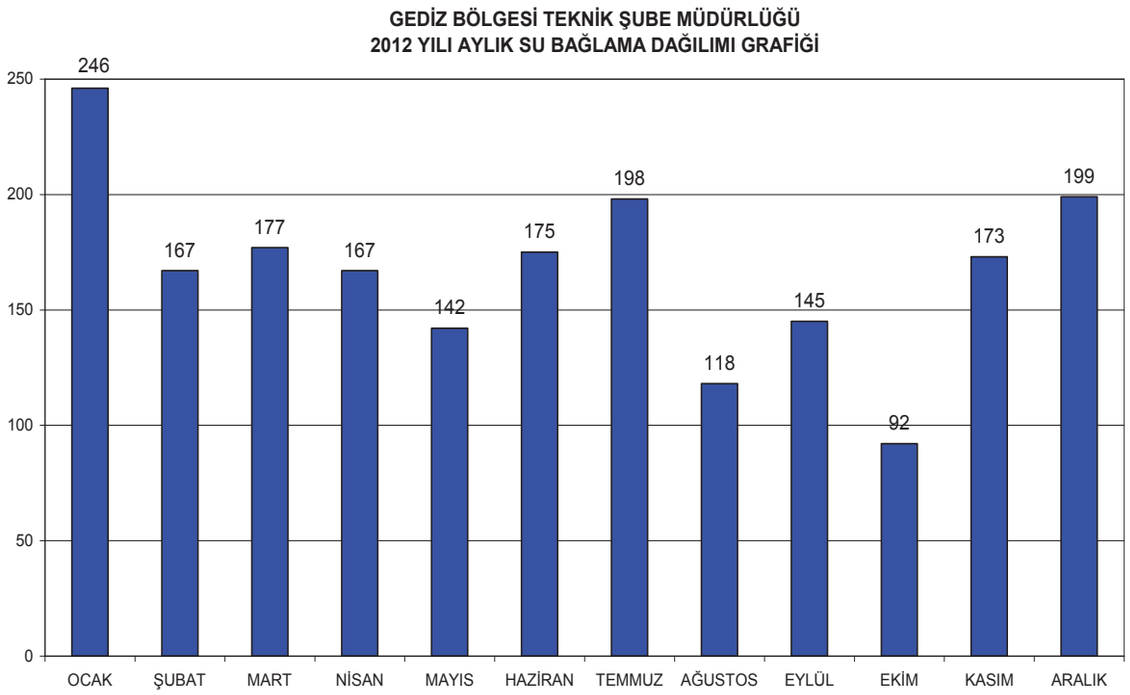

GRAFİK 2: Gediz Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü'nün 2012 yılında yaptığı su bağlantısı çalışmaları

NİF BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ALANI

Nif Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanı, Kemalpaşa ilçesi ile bağlı Armutlu, Bağyurdu, Ören, Ulucak ve Y.Kızılca mahalleleri ve köyleridir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

Müdürlük 2012 yılı faaliyetleri kapsamında:

İçme suyu şebekelerinde 825 adet büyük arıza, 4.127 adet küçük arıza giderilmiştir. (GRAFİK 1)

≠Aşağıda çeşit ve çapları belirtilen 20.120 metre İçme suyu şebeke borusu döşenmiştir.

≠3.010 mt Ø25 HDPE

≠3.945 mt Ø32 HDPE

≠1.170 mt Ø50 HDPE

≠5.760 mt Ø63 HDPE

≠3.085 mt Ø110 HDPE

≠1000 mt Ø100 Düktil Font

≠850 mt Ø150 Düktil Font

≠1.300 mt Muhtelif çaplarda

≠982 adet su bağlantısı yapılmıştır. (GRAFİK 2)

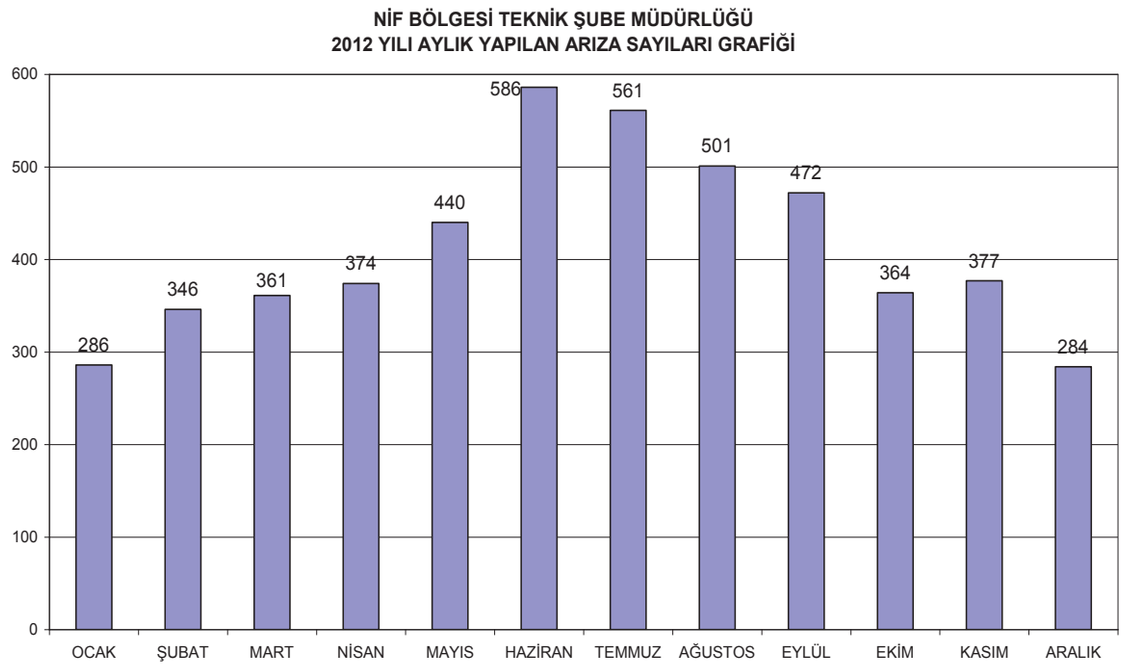

GRAFİK 1: Nif Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü 2012 yılı aylara göre yapılan arıza sayıları grafiği

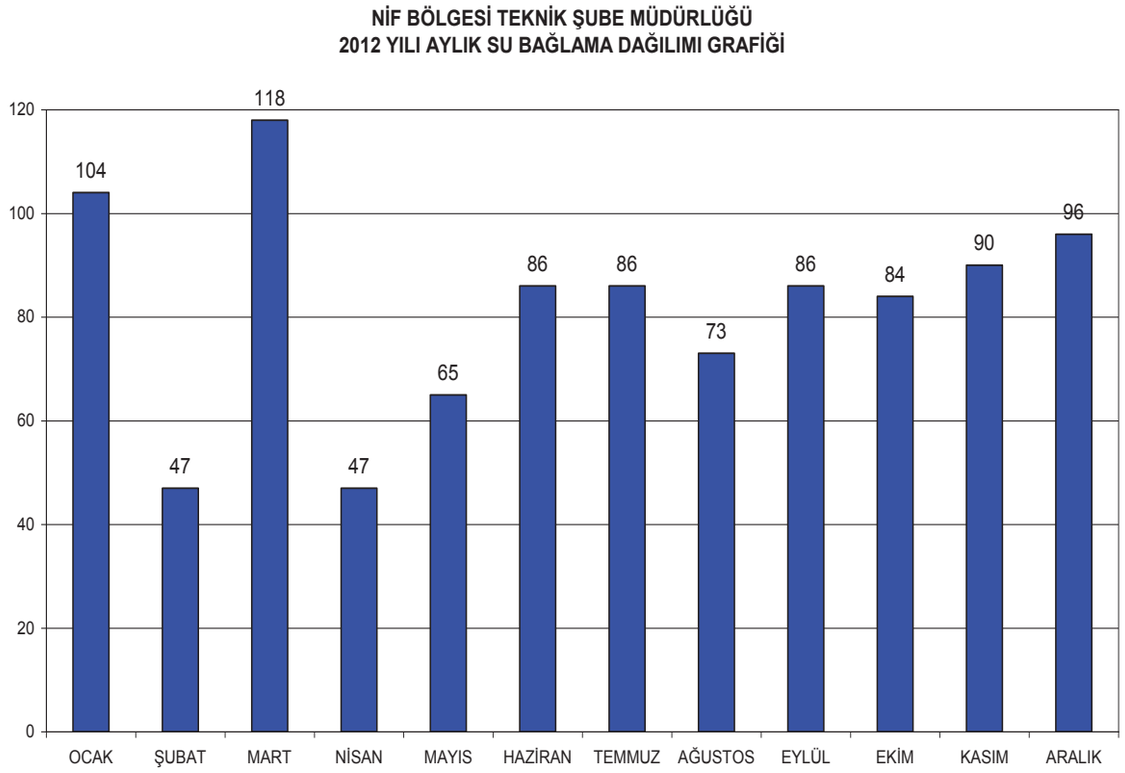

GRAFİK 2: Nif Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü'nün 2012 yılında yaptığı su bağlama çalışmaları

MENDERES BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ALANI

Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanı, Torbalı, Menderes, Bayındır ve Selçuk İlçeleri ile bağlı mahalle ve köylerdir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

Müdürlük 2012 yılı faaliyetleri kapsamında;

≠ İçme suyu şebekelerinde 3.305 adet büyük arıza, 7.384 adet küçük arıza olmak üzere, toplam 10.689 adet arıza giderilmiştir. (GRAFİK 1)

≠ Bayındır Teknik Amirliği Sorumluluk Alanındaki İZSU İçme Suyu Depolarının Bakım ve Onarımı İşi kapsamında 19 adet deponun yenilenmesi çalışmaları yapılmıştır.

≠ Aşağıda belirtilen çeşit ve çaplarda 13.733 mt. temiz su şebeke borusu döşenmiştir.

≠ 2.345 mt Ø63 HDPE

≠ 2.621 mt Ø110 PVC

≠ 6.597 mt Ø110 HDPE

≠ 2.170 mt Muhtelif çaplarda PVC boru

≠ 2.232 adet su bağlantısı yapılmıştır. (GRAFİK 2)

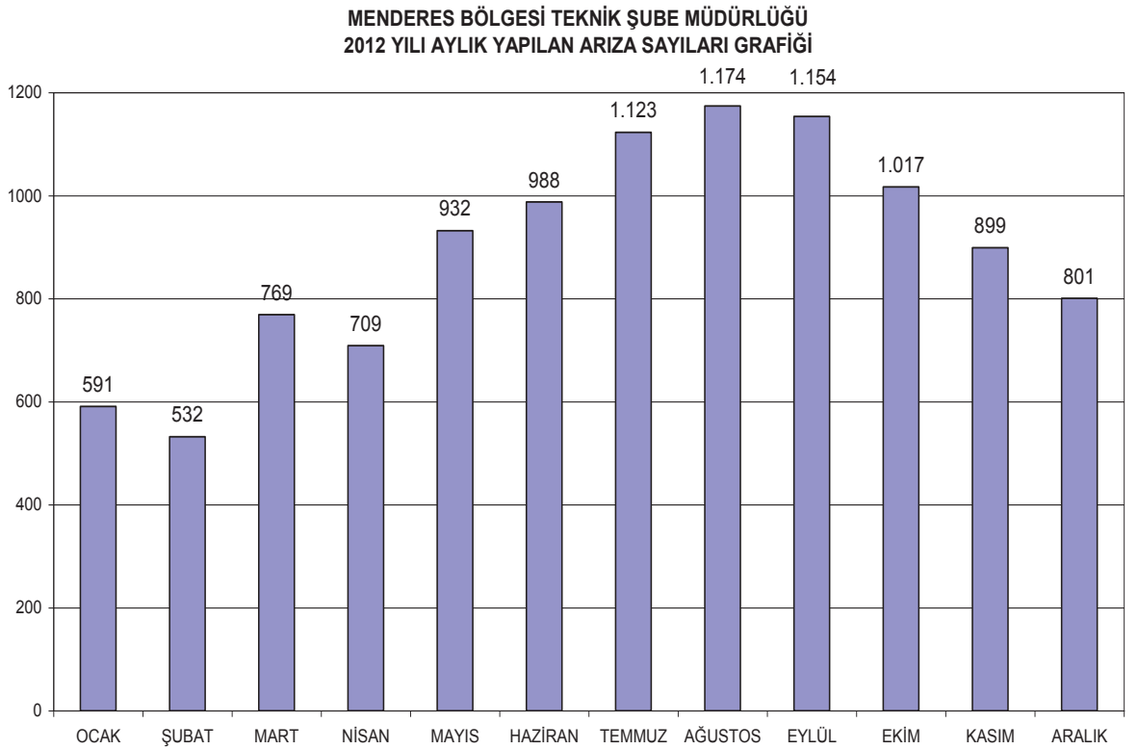

GRAFİK 1: Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü 2012 yılı aylara göre yapılan arıza sayıları grafiği

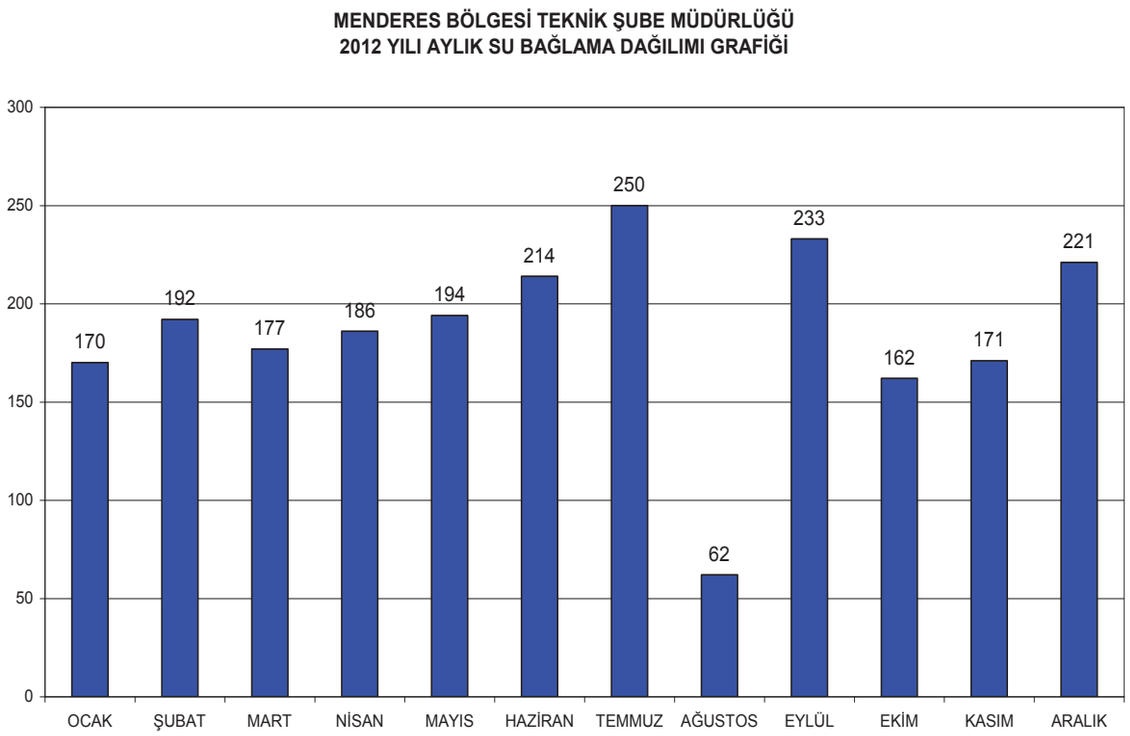

GRAFİK 2: Menderes Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü'nün 2012 yılında yaptığı su bağlantısı ve çalışmaları



Bayındır Alankıyı Köyü Deposu Eski Hali



Bayındır Alankıyı Köyü Deposu Yeni Hali



Bayındır Balcılar Köyü Deposu Eski Hali



Bayındır Balcılar Köyü Deposu Yeni Hali



Bayındır Karahalilli Köyü Deposu Eski Hali



Bayındır Karahalilli Köyü Deposu Yeni Hali

YARIMADA BÖLGESİ TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ALANI

Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanı, Urla, Seferihisar İlçeleri ile bağlı mahalleler ve köyler ile Menderes ilçesi Gümüldür ve Ürkmez beldeleridir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

Müdürlük 2012 yılı faaliyetleri kapsamında;

1.740 adet büyük arıza, 9.518 adet küçük arıza, olmak üzere toplam 11.258 adet arıza giderilmiştir. (GRAFİK 1)

İzsu Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanındaki Mevcut Su Depolarının Bakım ve Onarım İnşaatı işi kapsamında 30 adet depo, pompa , terfi merkezi ve trafo gibi tesisin revizyon çalışması yapılmıştır.

Aşağıda belirtilen çeşit ve çaplarda 5.238 mt. İçmesuyu şebeke borusu döşenmiştir.

≠380 mt Ø63 HDPE

≠3.880 mt Ø110 HDPE

≠522 mt Ø150 Düktil Font

≠456 mt Muhtelif çaplarda PVC, DF ve HDPE Boru

≠Toplam 1.747 adet yeni su bağlantısı gerçekleştirilmiştir.(GRAFİK 2)

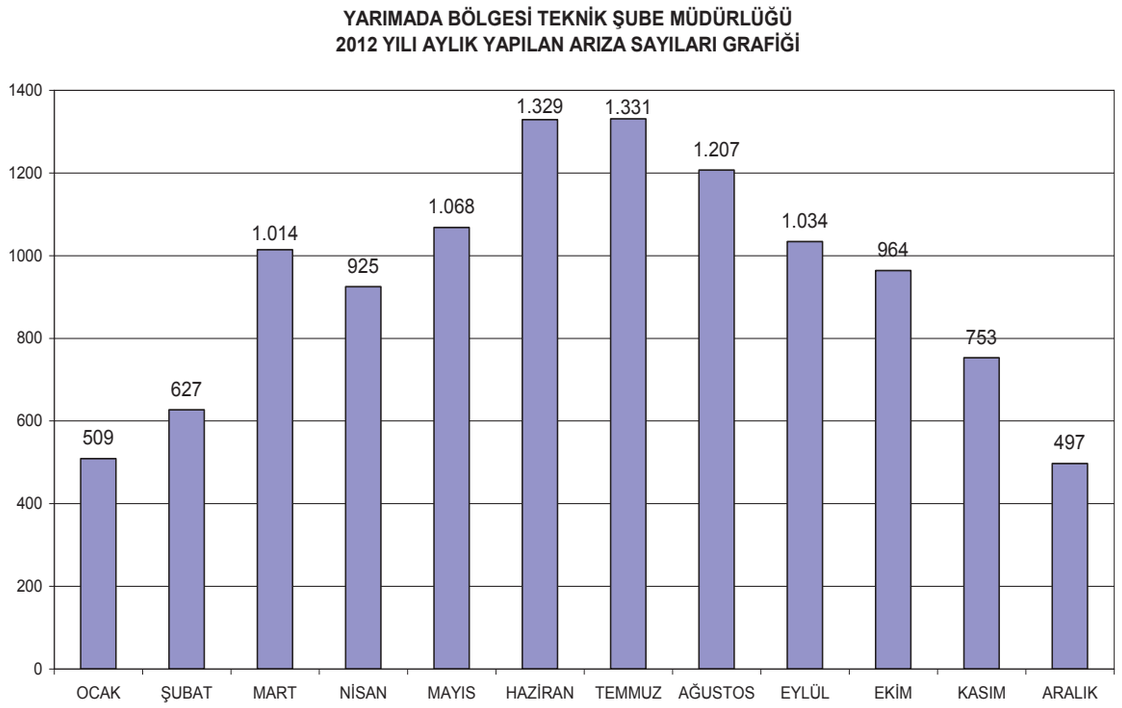

GRAFİK 1: Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü 2012 yılı aylara göre yapılan arıza sayıları grafiği

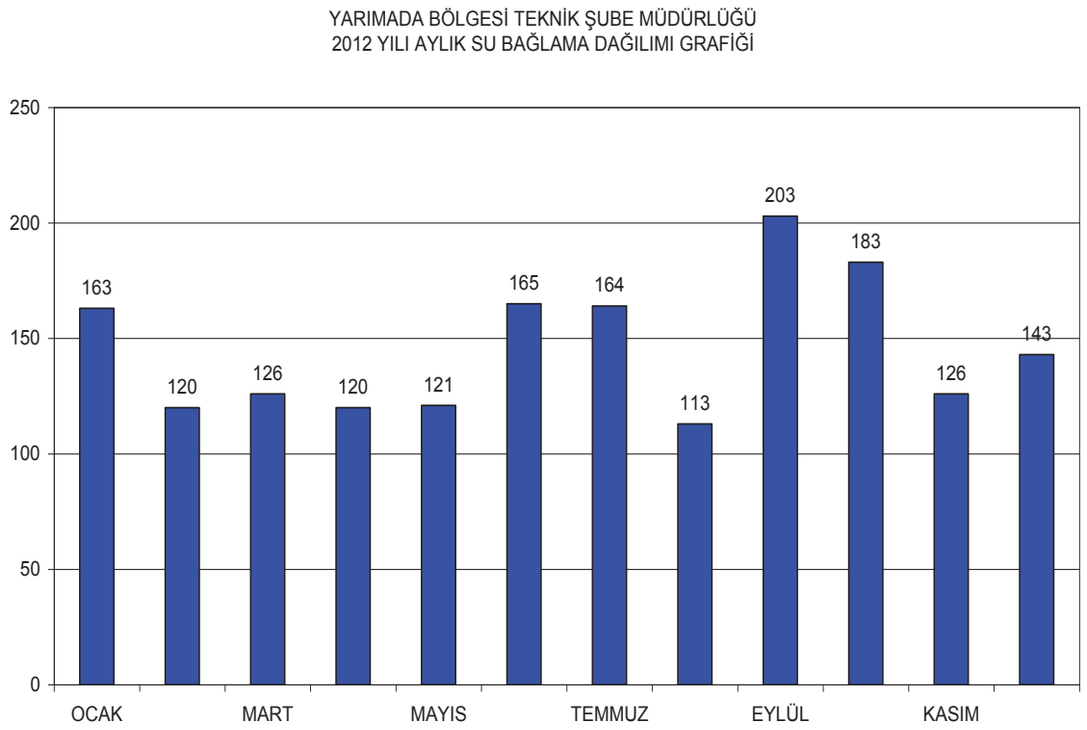

GRAFİK 2: Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü'nün 2012 yılında yaptığı su bağlama çalışmaları



Yarımada Bölgesinde bakım onarımı yapılan deponun ilk ve son halleri




Yarımada Bölgesinde bakım onarımı yapılan deponun ilk ve son halleri




Yarımada Bölgesinde bakım onarımı yapılan deponun ilk ve son halleri

SU KAÇAK VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kentin su ihtiyacının her geçen gün artması, nüfusun hızla çoğalması, küresel ısınmanın etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mevsimlerin kurak geçmesi, su kaynaklarının sınırlı olması suyun ekonomik kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Üretilen su miktarı ile tahakkuk ettirilen (faturalanan) su miktarı arasındaki fark olarak ifade edilen su kayıplarını en aza indirmek amacıyla kurulan söz konusu müdürlük;

İzole bölgeler oluşturarak, bölge sayaçlarının su tüketimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi sonucu alınacak önlemler ve kaçak azaltma çalışmaları ile su kaçağı oranını minimum düzeye indirmek için;

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde,

1. Matematiksel modelleme yolu ile izole sayaç bölgesi planlanması,

2. İzole bölge girişlerine sayaç rögarı inşa ederek filtre, sayaç/debimetre ve gerekiyorsa basınç kontrol vanası montajı yapılması,

3. Sayaç montajı yapılan izole sayaç bölgesinin, şebeke borusu bağlantısı, boru sonlanması, gerekiyorsa kısa mesafeli şebeke borusu döşenmesi,

4. Oluşturulan bölgelerin teyidinin yapılması, bölge sayacından su alan abonelerin Abone Bilgi Yönetim Sistemi(ABYS)'de söz konusu bölge için tanımlanan vana koduna atanması,

5. Mevcut izole bölge sayaçlarının SMS yoluyla uzaktan okuma sisteminden su tüketimleri ve basınç değerlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ile su kaçağı olduğu tahmin edilen bölgelerin tespiti,

6. Su kaçağı tahmini yapılan izole sayaç bölgelerinde görünmeyen arızaların tespiti için dinleme çalışması yaptırılması,

7. Faaliyetler sürdürülürken ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve sistem ihtiyacı ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanarak temininin sağlanması,

faaliyetleri yürütmektedir.

2012 YILI FAALİYETLERİ

1. 2012 yılında devrede olan 391 izole sayaç bölgesinde izleme-değerlendirme ve kaçak azaltma çalışmaları sürdürülmüştür.

2. Mevcut izole bölgelerin sayaç ve basınç kontrol vanalarının rutin bakım-onarım çalışmaları sürdürülmektedir.

3. Özellikle büyük çaplı su arızaların giderilmesi sırasında veya başka sebeplerle şebeke borusu içine giren yabancı maddeler izole bölge sayaç rogarı içine monte edilen filtreler tarafından tutulmaktadır. Bu yabancı maddeler filtrelerde tıkanmalara yol açarak bölge sayaçlarından düşük basınçta yetersiz su geçmesine neden olmaktadır. Bu nedenle izole bölge sayacı filtrelerinin temizlenmesi çalışmaları yapılmıştır.

4. Oluşturulan dinleme ekipleri tarafından izole sayaç bölgelerinde, yeni teknoloji ürünü korelasyon cihazı, dinleme cihazı ve bölgesel kaçak belirleme cihazları kullanılarak su kaçağı tespit çalışmaları yapılmıştır.

5. Mevcut izole sayaç bölgelerinin tüketimleri rutin olarak izlenmiş ve kaçak tahmini yapılmıştır. İzole bölge sayaçlarının basınç ve debi değerleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerde su kaçağı olduğu tahmin edilen sayaç bölgeleri tespit edilmiş, bu bağlamda dinleme teknisyenlerinden oluşturulan dinleme ekipleri ikili vardiya olarak çalışmışlardır.

6. 2011 yılı sonu itibari ile rutin olarak okumaları devam eden bölge sayısı 387 iken, 2012 yılında yapılan çalışmalar sonunda izlenen bölge sayısı 391'e çıkarılmıştır.

7. Oluşturulup, devreye alınan mevcut izole sayaç bölgelerinde rutin bakım-onarım çalışmaları sürdürülmüştür.

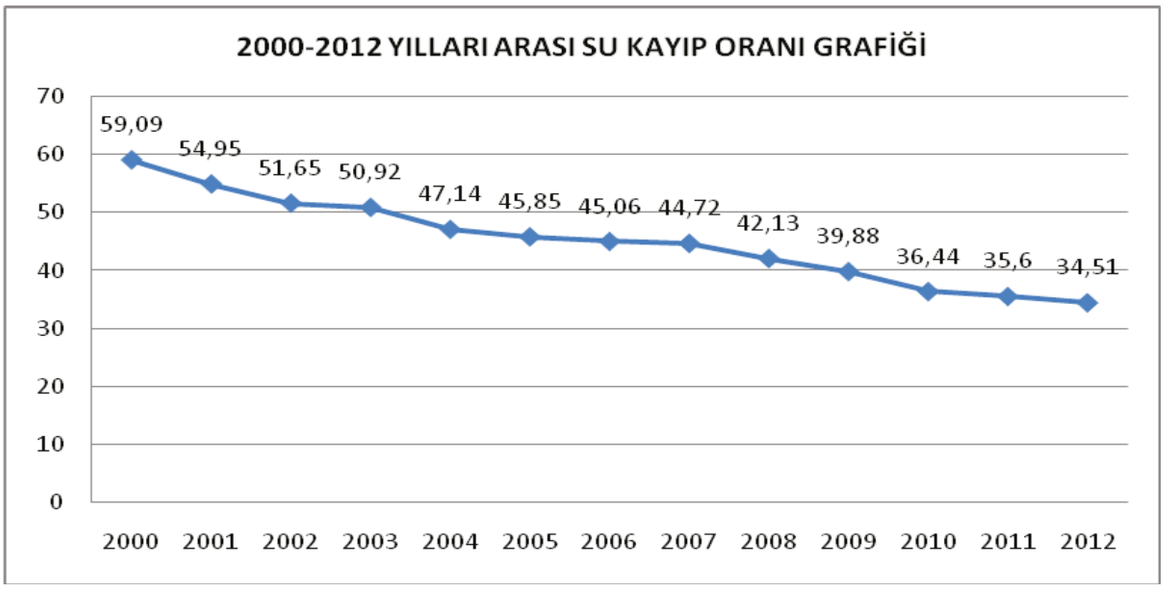

Yıllara Göre Üretilen ve Satılan Su Miktarları (m^3) İle Kayıp Oranları (%)			
YILLAR	SU ÜRETİMİ (m^3)	SATILAN SU (m^3)	KAYIP ORANI (%)
2000	237.313.867	97.081.596	59,09
2001	216.256.726	97.423.293	54,95
2002	198.866.669	96.160.778	51,65
2003	206.938.909	101.570.099	50,92
2004	204.160.704	107.918.651	47,14
2005	209.241.845	113.297.805	45,85
2006	215.228.378	118.241.770	45,06
2007	201.357.705	111.317.772	44,72
2008	192.138.414	111.182.740	42,13
2009	184.481.003	110.904.184	39,88
2010	183.171.383	116.418.426	36,44
2011	183.330.975	118.073.343	35,6
2012	183.970.893	119.949.857	34,51

** Bu tablodaki su kaçak oranları Metropol alan için geçerlidir. Ayrıca Su tanker tüketim miktarı 301.773m^3, arıza nedeni ile tahliye edilen su miktarı 20.276,5m^3, İzsu Tüketim miktarı 201.695m^3olmak üzere denetim dışı kullanımlar dahil edildiğinde kayıp oranı %34,51 olmaktadır*

MALZEME TEMİN VE PAKET ARITMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Malzeme Temin ve Ambar Birimi olarak anılan birim, 15.02.2012 Tarih ve 50.01.04/01 Sayılı İzsu Genel Kurulu Kararında yer alan 9 adet Şube Müdürlüğü Kadrosu İhdası Kararına dayanılarak Şube Müdürlüğü yapılarak, Malzeme Temin ve Paket Arıtma Şube Müdürlüğü adını almıştır.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

≠ Daire Başkanlığının Müdürlükleri ile gerçekleştirilen görevi kapsamında hizmetlerin aksamadan ve kesintisiz yürütülmesi için gerekli malzemelerin asgari stoğunu oluşturmak,

≠ Taşınır Mal Yönetmeliğine göre tüm malzemeleri ve demirbaşları takip etmek,

≠ Her türlü malzemenin minimum stok seviyelerinin korunması için asgari 4 (dört) aylık ihtiyacı karşılayacak şekilde satın alınmasını sağlamak,

≠ Araç, iş makinesi ve ekipman alımını yapmak,

≠ İçmesuyu paket tipi arıtma tesislerini işletmek, kontrol, bakım ve onarımlarını yapmak, sürekli çalışır durumda tutmak

faaliyetlerini sürdürmektedir.

Malzeme Temin ve Paket Arıtma Şube Müdürlüğü, iki alt birimden oluşmaktadır. Bu alt birimlerin isim ve görevleri aşağıdaki gibidir.

1. Malzeme Temin ve Ambar Birimi

≠Daire Başkanlığına bağlı altı müdürlüğün ihtiyacı olan mali malzeme ve hizmetleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak temin etmek,

≠ Daire Başkanlığının ihtiyacı olan araç, iş makinası ve ekipman temini yapmak,

≠Temin edilecek malzeme, araç, iş makinası ve ekipmanların ihale işlemleri ile temin edildikten sonra muayene kabul işlemlerini ilgili kanunlara uygun bir şekilde yürütmek, yürütülmesini sağlamak,

≠Temin edilen malzemelerin kullanım uygulamalarına dönük eğitimlerini planlamak, organize etmek,

≠Ekipmanların periyodik bakım ve kalibrasyonunu yaptırmak,

≠Bağlı Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda Daire Başkanlığının bütçesini oluşturmak, kontrol ve takibini yapmak,

≠Daire Başkanlığı'nın tüm taşınırlarının TMY'ye göre kayıtlarını tutmak, taşınır hareketlerini kontrol etmek,

≠Daire Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin faaliyetleri ile ilgili istatistiki çalışmaların koordinasyonunu yapmak, istenen periyotlarda raporlamalar sunmak.

Bu görevler kapsamında;

Daire Başkanlığı'nın ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet teminini yapmak için ihale düzeyinde alımda 29, doğrudan alımda ise 65 adet talep oluşturulmuştur. Bu alımların ihtiyaç miktarlarının belirlenmesi, alımı yapılacak en uygun malzeme ve hizmetleri tarif eden teknik şartnamelerin oluşturulması, yaklaşık maliyetlerin belirlenmesi için piyasa araştırmalarının yapılması, alımlar için taleplerin oluşturulması, İhale Komisyonlarının oluşturulması, alımı yapılan malzemelerin Muayene ve Kabul Komisyonlarının kurulması, malzeme dağıtım planlarının yapılması, dağıtımı yapılan

malzemeler ile ilgili olarak birimlerden geri dönüşlerin alınarak malzeme özelliklerinin sürekli düzeltilmesi için araştırmalar yapılması bu birimimiz tarafından yapılmıştır.

Daire Başkanlığımızdaki birimlerin araç, iş makinesi ve ekipman temini kapsamında,

≠ 2011 yılında alımı yapılan 10 Adet Çıplak Şasili Kamyona, hidrolik üst ekipman temin ve montaj işi yaptırılarak su arıza ekip aracı oluşturulmuştur.

Devlet Malzeme Ofisinden, küçük arıza ekipleri tarafından kullanılmak üzere 5 Adet Ford Transit 4x2 330S Kombi araç alınmıştır.

≠ Devlet Malzeme Ofisinden 19 Adet Iveco Daily Çift Kabin Çıplak Şaseli Kamyon, su arıza ekip aracı yaptırılmak amacıyla alınmıştır. Hidrolik üst ekipman yaptırılması işi tamamlanarak 2013 yılında kullanıma sunulacaktır.

≠ Devlet Malzeme Ofisinden 4 Adet Kırıcılı Mini Bekoloder iş makinesi alınmıştır.

Alımı yapılan araçlardan teslim edilenler ile ilgili personele eğitimler verilmiştir.





2012 yılında yaptırılan Hidrolik Üst Ekipmanlı Ekip Araçları





Küçük Arıza Ekipleri tarafından kullanılmak üzere alımı yapılan Kombi Van Tipi araçlar





2012 yılında alımı yapılan Kırıcılı Mini Bekoloder iş makineleri

Teknik kısım amirliklerinde bulunan 15 adet akaryakıt pompasının her üç ayda bir düzenli olarak kalibrasyonları yaptırılmış, arızalı akaryakıt pompalarının tamir ve bakım işlemleri yürütülmüştür.

Teknik Şube Müdürlüklerinde, HDPE boru tamir ve döşeme işlerinde kullanılan elektrofüzyon kaynak makinelerinin yıllık kalibrasyonları yapılmış, böylece bu makinelerin düzgün çalışır durumda kalmaları sağlanmıştır.






Teknik Şube Müdürlüklerimize bağlı ekipler tarafından, HDPE boru tamir ve döşeme işlerinde kullanılan elektrofüzyon kaynak yönteminin daha etkin ve hatasız yapılabilmesini sağlamak amacıyla, sahada eğitimler düzenlenmiştir.

2. Paket Arıtma İşletme Birimi

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sorumluluk alanımıza dahil edilen yerleşim birimlerine, TS266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen standartlarda içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla kurulan paket tipi içmesuyu arıtma tesisleri kullanımı ve bakımı kolay şekilde imal edilen arıtma sistemleridir. Taşınabilir boyutlarda ve tam otomatik sistem olması, kimyasal madde ilavesi ve periyodik bakım işlemleri dışında personel ihtiyacı olmaması paket arıtma tesislerini avantajlı kılmaktadır.

Kent merkezine içmesuyu veren Göksu, Sarıkız, Menemen, Çavuşköy ve Halkapınar kuyularındaki Arsenik sorununu; yaptığı arıtmalarla çözen İZSU bazı köy kuyularında yersel olarak ortaya çıkan arsenik, demir-mangan problemini de çözmektedir. İlçe ve köylerde kuyu açma sırasında yapılan su analizlerinde arsenik için litrede 10 mikrogram, antimon için litrede 5 mikrogram, mangan için litrede 50 mikrogram ve demir için litrede 200 mikrogram üst sınırın aşılması halinde İZSU bu kuyuların suyunu arıtacak paket arıtma tesislerini kurmaktadır.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla arsenik/antimon ve demir/mangan arıtma tesisleri kurularak köylerimize dünya kalite standartlarına uygun içme suyu verilmesi sağlanmıştır. Alınan su

örneklerinde içme suyunun kalitesini belirlemede "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" te verilen sınır değerleri baz alınmaktadır.



Paket Arıtma Tesisleri Proses Tanımı:

Kuyu pompaları tarafından beslenen hamsu ORP kontrollü klor dozaj sistemiyle klorlanarak seperatör filtreye girmektedir. Seperatör filtre ile yoğunluğu sudan ağır olan kum & mil gibi partiküller ve askıda katı maddeler tutulmaktadır. Klorlama ile sudaki dezenfeksiyon sağlanmaktadır. Kurulan hamsu depolarından hamsu terfi pompalar ile arıtma sistemine yeterli debi ve basınçla paralel ya da seri olarak kurulan multimedya filtre içeren filtre tankları beslenmektedir. Filtre tankları ST 37-2 karbon çelikten imal edilmektedir. Mevcut debiye göre tank sayısı arttırılmaktadır. Multimedya filtre kum, çakıl ve giderim mineralinden oluşmakta olup bulanık sularda ve hassas filtrasyon istenen proseslerde uygulanmaktadır. Sistemden çıkan su, ürün suyu deposuna aktarılır ve mevcut iletim hattı tesisatı ile köy halkına standartlara uygun içmesuyu temin edilir.

İdaremiz tarafından yaptırılan paket tipi arıtma tesisleri birim tarafından işletilmektedir. 2013 yılından itibaren, Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan ve teknik şartnamesi hazırlanan paket tipi arıtma tesisleri müdürlük tarafından yaptırılacaktır.

Paket Tipi Arıtma Tesislerinin İşletilmesi:

Paket tipi arıtma tesislerinin filtre tanklarına konulan giderim minerallerin ömrü Arsenik arıtma tesislerinde 1 yıl, demir/mangan arıtma tesislerinde ise 5 yıl olmaktadır. Birimimiz tarafından her 15 günde bir arıtma tesislerinden numune alınmaktadır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde içme kullanma suyunda denetim ve izlemeye esas yetkili personellerce alınan numunelerin analiz raporları sonuçlarına göre değerlendirilmeler yapılmakta ve

Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri aşan paket arıtma tesisleri takip altına alınarak medya değişimi yapılmaktadır.

Demir/mangan mineralleri uzun ömürlü olması nedeniyle kısa vadede değişim gerektirmemektedir. Arsenik giderim mineralleri ise arsenik tutma kapasitesinin doymasıyla değiştirilme zorunluluğu getirmektedir.

2012 yılı içerisinde toplam 12.450 litre arsenik giderimi için medya malzemesi alımı yapılmıştır.

Mevcut tesislere ilişkin bilgi Çizelge 1'de verilmektedir.

Çizelge 1: Devrede olan paket tipi arıtma tesisleri

No	Yerleşim Yeri	Tipi	Debi (lt/s)	Tesis Durum	Yapım Yılı
1	Torbalı - Helvacı	Demir/Mangan	3	Tesis devrede. Standartları sağlıyor.	2007
2	Bayındır - Çınardibi	Demir/Mangan	8	Tesis devrede. Standartları sağlıyor.	2009
3	Bornova - Yaka	Arsenik	4	Tesis devrede. Standartları sağlıyor.	2009
4	Foça- Ilıpınar	Arsenik	8	Tesis devrede. Standartları sağlıyor.	2009
No	**Yerleşim Yeri**	**Tipi**	**Debi (lt/s)**	**Tesis Durum**	**Yapım Yılı**
5	Menemen- Bozalan	Arsenik	3	Tesis devrede. Standardı sağlıyor.	2009
6	Aliağa- Yukarı Şehit Kemal	Arsenik	3,5	Tesis devrede. Standartları sağlıyor.	2009
7	Aliağa- Bozköy	Arsenik	7	Tesis devrede. Standartları sağlıyor.	2009
8	Aliağa- Samurlu	Arsenik	3,5	Tesis devrede standartları sağlıyor.	2009
9	Özdere- Çukuraltı Deposu	Demir/Mangan		Gümüldür'den standartlara uygun içme suyu veriliyor. Tesis ihtiyaç halinde devreye alınmaktadır.	2009
10	Özdere-Ç3P	Demir/Mangan	15		2011
11	Özdere-Ç4D	Demir/Mangan			2011
12	Seferihisar Eski Orhanlı Kuyusu	Demir/Mangan	8	Tesis devrede. Standartları sağlıyor.	2012

2012 yılında ihalesi yapılarak yüklenici ile sözleşmesi imzalanmış ve 2013 yılında imalatı tamamlanarak devreye alınması planlanan Bayındır İlçesi Dernekli Köyünde demir- mangan – antimon arıtma ve Çamlıbel Köyünde demir-mangan arıtma, Bornova İlçesi Yakaköy' de, Çiçekli ve Karaçam köylerine su vermek üzere arsenik arıtma, Menemen ilçesi Seyrek Köyünde, Seyrek, Tuzçullu ve Günerli köylerine su vermek için toplam 4 adet paket tipi arıtma tesisi yapım aşamasında olup 2013 yılında devreye alınacaktır.

Mevcut arıtma tesislerinden birkaçının fotoğrafı aşağıda verilmiştir.





Paket Tipi Arıtma Tesisi Sac Kabin





Paket Tipi Arıtma Tesisi Filtre Tankları ve Tesisatı



Paket Tipi Arıtma Tesisi Separatör Filtre ve Klor Tankı





Paket Tipi Arıtma Tesisi Kumanda Panosu



Paket Tipi Arıtma Tesisi Pompası



Ham su ve ürün suyu depoları

SU İSALE VE DAĞITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2560 sayılı yasa ile kurulan İZSU Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenen teşkilat yapısı doğrultusunda kurulmuştur.

Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı faaliyetleri, 19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenmiştir.

Birim 19.04.2007 tarihinde kurulmuş olduğundan bu tarih öncesinde birim görev kapsamındaki faaliyetler Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekteydi. 19.04.2007 tarihinden itibaren birim faaliyetlerini sürdürmektedir.

SU DAĞITIM VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Su Tesisleri Daire Başkanlığının görev tanımı ve bağlı birimleri değiştirilerek yeniden organize edilmiş ve Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı birim olarak görev yapmakta olan Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğü (aynı adla) Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.

Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğü, 19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen görevleri doğrultusunda hizmet yürütmektedir. Yürütülen hizmetler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

- İçmesuyu üretim kaynaklarını planlayarak İzmir'e yeterli ve düzenli olarak içmesuyunun dağıtımını yapmak ve su trafiğini sürekli kontrol altında tutmak.
- Scada sistemini işletmek ve bakımını yapmak.
- İçmesuyu dağıtımını planlamak.
- Scada sistemi ile pompa ve depoların işletimini yapmak.
- Dağıtım hatlarının kontrolü ile ana isale hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesini yapmak.
- Su dağıtım sistemine ilişkin veri kayıtlarını tutmak ve istatistiksel bilgileri değerlendirmek.
- Mevcut altyapı bilgilerinin, bilgisayar ortamı ile paftalara işlenmesini sağlamak ve tutulan kayıtları güncellemek.
- Telsiz haberleşme sistemini izlemek, bakımını yapmak ve kontrolünü yapmak.
- Birim içi faaliyetlerin sürdürülmesinde yardımcı olan mal, hizmet ve yapım işlerini ihale etmek ve gerçekleştirmek.
- Halkapınar içmesuyu üretim kaynaklarını (Halkapınar derinkuyuları ile P-12 ile P-10 pompa istasyonlarını) işletmek.

≠ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Harcama Yetkilisi ile birlikte Gerçekleştirme Görevlileri olarak stratejik plan, performans programı, analitik bütçe ve iç kontrol mekanizmasını yürütmek,

≠ Taşınır Mal Yönetmeliğine göre tüm malzemeleri ve demirbaşları takip etmek, Müdürlük faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ihtiyacını belirlemek, bu malzemelerin asgari stokunu oluşturmak ve bu amaçla malzeme ve ekipmanın teknik şartnamelerini hazırlayarak satın alınmasını sağlamak,

≠ İsale hatları ile depoların bakım ve onarımı ile ilgili teknik şartname ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak,

≠ İhale Komisyonlarında görev almak, ihaleli sözleşmeleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

≠ 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında İş ve İş güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak, kontrol etmek ve uygulanmasını sağlamak,

≠ Müdürlük bünyesinde kullanılan hizmet amaçlı, araç ve iş makinelerinin verimli, ekonomik ve hatasız kullanımını sağlamak, akaryakıt kontrollerini takip etmek, her türlü bakım ve onarımını yaptırmak ve çalışır durumda tutmak,

≠ Bu görevler kapsamı içinde gerekli, birimler arası koordinasyonu sağlamak.

≠ Bağlı bulunduğu Daire Başkanının ve üst Makamların vereceği diğer işleri yapmak.

2012 YILI FAALİYETLERİ:

Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde SCADA Sistemi Tesis Etmek

Yeni ilçe ve beldelerdeki su dağıtım şebekeleri üzerinde SCADA sistemi tesis ederek, izleme, kontrol ve kumanda yoluyla hakimiyet sağlamak, personel tasarrufu yapmak ve yerleşim bölgelerine sürekli ve düzenli su verilmesini gerçekleştirmek ve ve eski metropol de bulunan 11 ilçenin kontrol ve kumanda edildiği varolan scada sisteminin yenilenmesidir.

Proje çalışmaları, önceleri 5216 sayılı yasa ile Büyükşehir kapsamına dahil edilen 30 adet, ilçe belde ve belediyelere SCADA sistemi kurulması olarak devam ederken 2012 yılında, eski metropol de bulunan 11 ilçenin kontrol ve kumanda edildiği halen işletilmekte olan mevcut scada sisteminin yenilenmesi işi de bu projeye dahil edilmiştir. 25.06.2012 tarihinde ihaleye çıkılmıştır.

İzmir İçmesuyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi

İçmesuyu isale hatlarının ve bağlı elemanlarının düzenli ve sağlıklı çalışır durumda tutulması amacıyla gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması ve beton isale hatlarında oluşacak arızaların giderimi amacı ile; İsale hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesi projesi her yıl yenilenerek yürütülmekte olup bu proje kapsamında;

≠ Özellikle kent dışı (Kuzey kaynakları bölgesindeki toplama ve Tahtalı) isale hatlarının periyodik kontrolü ve bakımı,

≠ Beton boru arızalarının giderilmesi (belli sayıda)

≠ Rögarların bakım, temizlik ve boyanması,

≠ İsale hatları üzerindeki kontrol elemanlarının bakımı ve işlerlik kontrolü,

≠ Belli sayıda vantuz, vana değişiklikleri,

≠ Rögar imali ve tamiri gibi çalışmalar

ihale yoluyla yaptırılmaktadır.

2012 yılında 9 kere hat bakımı, dirsek betonu güçlendirmesi, taban betonu ve güvenlik duvarı yapılmış, bu işler esnasında 96 m³ beton, 2,5 ton demir, 175 m³ dolgu yapılmış veya kullanılmıştır.

Proje Faaliyetlere İlişkin Yapılan Çalışmalar

1.İzmir içmesuyu üretim kaynaklarının izlenmesi ve kaynak planlaması faaliyetleri

Su üretim kaynakları izlenip kontrol edilmekte ve kaynak planlaması yapılmaktadır. İsale hattı olarak tanımlanan tüm hatların işletimi sağlanmıştır. İzmir su dağıtım sistemi üzerindeki tüm pompa istasyonları Scada kapsamında işletilmektedir.

Genel yapı olarak pompa istasyonlarının çıkış şebekesinde depo varsa, pompalanan su, öncelikle abonelere dağıtılmakta suyun yetersizliği durumunda depodan takviye yapılmaktadır. Talebin düştüğü zaman dilimlerinde ise fazlalık su depolanmaktadır. Bu şekilde, depoların büyük çoğunluğu denge deposu olarak çalışmaktadır.

Kapsam içindeki tüm depolar Scada yolu ile işletilmektedir.

Su isale ve dağıtım sistemi üzerinde kontrol elemanı olarak çok sayıda ve farklı çaplarda kullanılan vanalar ile suyun hareketine yön verilmekte ve suyun istenen şekilde akışı sağlanarak su trafiği yönlendirilmektedir. (Aç-kapa vanalar, elektronik aktüatörlü vanalar, elektrikli vanalar, iğne vanalar, basınç düzenleyici vanalar vb.) Özellikle isale hatları üzerindeki vana uygulamaları, dikkatli ve açılma/kapanma süreleri ile ilişkili olarak gerçekleştirilmektedir. Kimi vanalar Scada kapsamında uzaktan kumanda yoluyla işletilmekte olup kontrolsüz tüm hat vanalarında manevra yapılmaktadır.

Arıza veya bakım nedenleriyle hatların boşaltılması ve doldurulması işlemleri; vantuzların hava atma ve hava alma kapasitelerine bağlı olarak dikkatli ve özenli bir çalışma ile sürdürülmektedir.

İzlenen Yeraltı İçmesuyu Kaynakları Kapsamı

İzmir'in yer altı su kaynakları derinkuyulardır. Muhtelif bölgelerde tesis edilmiş olan bu kaynaklardan sağlıklı, temiz ve kaliteli içmesuyu temin edilmektedir.

Sarıkız derinkuyuları: Manisa il sınırları içerisindeki Saruhanlı yakınlarında 35 adet aktif derinkuyunun sağladığı su, Çullutepe deposunda Göksu'dan gelen klorlanmış su ile karışarak ve Yahşelli pompa istasyonunda pompalanarak, 1850 ve 2200 mm. çaplı 98 kilometre uzunluğundaki isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.

Göksu derinkuyuları: Manisa il sınırları içerisindeki Göksu bölgesinde mevcut toplam 22 adet derinkuyunun sağladığı su, Göksu pompa istasyonunda klorlanıp pompalanarak ve Çullutepe depoda Sarıkız kaynaklarının ürettiği su ile birleşerek 70 kilometre uzunluğundaki isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.

Menemen derinkuyuları: Menemen ilçe sınırları içerisindeki toplam 20 adet aktif derinkuyulardan üretilen su, Menemen Acil pompa istasyonunda pompalanarak ve belli noktalarda klorlanarak 35 kilometre uzunluğundaki 1000 mm. çaplı isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.

Çavuşköy derinkuyuları: Menemen derinkuyularına yakın bir bölgede bulunan 12 adet aktif derinkuyunun sağladığı su, Menemen Acil pompa istasyonunda Menemen derinkuyularının ürettiği su ile birleşmektedir.

Halkapınar derinkuyuları:Kent içinde eski bir göl alanı içinde bulunan 19 adet aktif derinkuyunun ürettiği su Halkapınar arsenik arıtma tesisinden geçirilip, klorlanarak yine bu havza içindeki pompa istasyonlarında İzmir şehir şebekesine pompalanmaktadır. 6 adet yeni açılan kuyu yedek amaçlı bekletilmektedir.

Pınarbaşı derinkuyuları: Kentin doğu bölgesindeki bu 2 adet aktif derin kuyudan üretilen su, lokal klorlama yapılarak yakın çevrenin beslemesinde kullanılmaktadır.

Buca bölgesinde ise, 3 adet derin kuyu ihtiyaca bağlı olarak çalıştırılmakta, lokal olarak klorlama yapılarak çevre yerleşim bölgelerinin beslemesinde kullanılmaktadır.

İzlenen Yerüstü Kaynakları Kapsamı

İzmir'e içmesuyu temin eden yerüstü kaynakları Tahtalı ve Balçova barajlarıdır.

Tahtalı barajı: İzmir'in en büyük yerüstü kaynağı olan bu barajda 1996 yılı Kasım ayında su tutulmaya başlanmış olup 1997 yılı Aralık ayından bu yana kente su verilmektedir. Temelden yüksekliği 57,5 metre olan Tahtalı barajının rezervi 306.650.000 m³'tür. 35 metre yüksekliğinde inşa edilen Su Alma Yapısındaki 6 adet pompa vasıtasıyla baraj gölünden emilerek modern arıtma tesislerinde arıtılan su, 32,3 kilometre uzunluğundaki 2200 mm. çaplı borular ile kente ulaştırılmaktadır.

Balçova (Cengiz Saran) barajı: İzmir'in Balçova semti yakınlarında bulunan bu baraj 7.759.000 m³ kapasiteli olup içmesuyu dağıtımında tampon olarak kullanılmaktadır. Günlük su ihtiyacına uygun olarak takviye amaçlı kullanılmaktadır.

≠ **İsale hatlarının işletilmesi**

Toplama, İsale ve Ana Dağıtım Hatları Kapsamı

Kuzey Kaynakları diye adlandırılan İzmir metropol alan dışında Manisa ili ile Aliağa ve Menemen ilçeleri civarındaki su tedarik kaynakları Sarıkız, Göksu, Menemen ve Çavuşköy pınarlarıdır.

Sarıkız pınarlarında kurulu derinkuyu pompaları ile yeraltından çekilen su toplama hatları ile kendi bölgesindeki depolarda toplanıp 1850 mm. çaplı bir isale hattı ile Çullutepe deposuna cazibe ile aktarılmaktadır.

Göksu pınarlarında yeraltından çekilen su da toplama hatları ile toplanmakta ve Göksu'da kurulu pompa istasyonu yardımıyla 1850 mm. çaplı bir isale hattı ile Çullutepe deposuna pompalanmaktadır.

Çullutepe deposunda birleşen bu iki kaynak suyu, 2200 mm. çaplı isale hattı ile Menemen'deki Yahşelli pompa istasyonuna cazibe ile aktarılmaktadır. Bu pompa istasyonunda aktarılan su, 2200 mm. çaplı borular ile Karşıyaka bölgesindeki Cumhuriyet deposuna ulaştırılmakta, depo seviyesine uygun olarak ya depoda biriktirilmekte ya da ihtiyaç halinde Halkapınar'daki 55,000 m³ kapasiteli depoya aktarılmaktadır.

Menemen ve Çavuşköy derinkuyularından üretilen su, toplama hatları ile Menemen Acil Pompa istasyonuna gelmektedir. Menemen Acil pompa istasyonunun bastığı su, Sarıkız-Göksu hattına paralel çalışan 1000 mm. çaplı bir isale hattı ile Cumhuriyet depoya ve/veya Alsancak bölgesine aktarılmaktadır.

Tahtalı Barajı Su Alma Yapısındaki pompalar, baraj gölü suyunu, birbirine paralel iki hat yardımıyla Görece'de kurulu modern arıtma tesislerine iletmektedir. Burada arıtılarak klorlanan su, 2200 mm. çaplı isale hattı ile Buca, Gaziemir, Hatay, Yeşilyurt, Kadifekale bölgelerinin beslemesinde kullanılmaktadır.

Balçova barajı; Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova bölgelerine su temini yanında genel su temininde aksaklıkların oluşması durumunda veya kaynakların periyodik bakımlarının yapılması ve dinlendirilmeleri esnasında faydalanılan bir su kaynağıdır. Baraj gölünden alınan su dinlendirilip dezenfekte edilerek 900 mm. çaplı hat ile çevre bölgelere dağıtılmaktadır.

İzmir kent içindeki Halkapınar ve Pınarbaşı derinkuyularından içmesuyu temin edilmektedir. Bu kaynaklardan üretilen su, direkt olarak su dağıtım sistemine verilmektedir.

İzmir kent içinde; Halkapınar 55.000 m³ depodan başlayan ve kenti sahil kesiminden Güzelbahçeye kadar kuşatan isale hattı bulunmaktadır. (Mithatpaşa hattı) Tahtalı suyunun son dağıtım noktası Karabağlar pompa istasyonu ile Mithatpaşa hattını birbirine bağlayan Yeşildere hattı, Karabağlar bölgesinden Hatay bölgesine su aktaran Üçyol-Üçkuyular hattı, Buca bölgesinin su beslemesini sağlayan Gediz hattı, Bornova bölgesinin su beslemesini sağlayan Bornova hattı, Halkapınar bölgesinden Pınarbaşı'ya kadar su aktarımını sağlayan Kamil Tunca hattı, ve bu hatlarla bağlantılı değişik çaplardaki taşıyıcı hatlar başlıca isale hatları olarak sayılabilir.

Çevre ilçe, belde ve köylerde ise; su temin kaynakları ile bu kaynakların bağlandığı depolar arasındaki hatlar isale hattı olarak değerlendirilmektedir ve faaliyet kapsamındadır.

≠ **Pompa İstasyonlarının İşletimi**

Su dağıtım sistemi üzerinde; çok farklı yapılarda ancak temel işlev olarak suyu daha üst kesimlere aktaran terfi pompa istasyonları bulunmaktadır.

İŞLETİLEN POMPA İSTASYONU	MOTOPOMP SAYISI
Göksu kuyular	izleme
Halkapınar kuyular	19
Menemen Acil kuyular	izleme
Sarıkız kuyular	izleme
Çamlık kuyusu	1
Sarnıç kuyular	4
Göksu pompaj	İzleme
Menemen Acil pompaj	izleme
P-20 pompaj	6
P-21 pompaj	6
P-29 pompaj	3
P-30 pompaj	3
Turgut Özal pompaj	3
Güzeltepe Alt pompaj	2
Güzeltepe Üst pompaj	2
P-1 pompaj	6
P-47 pompaj	3
P-2 pompaj	5
Örnekköy pompaj	4
Doğançay pompaj	2
Onur pompaj	2

İŞLETİLEN POMPA İSTASYONU	MOTOPOMP SAYISI
Bayraklı Alt pompaj	3
Bayraklı Üst pompaj	2
Bayraklı 5000 m³ depo içi pompaj	2
P-16 pompaj	4
P-25 pompaj	5
P-26 pompaj	4
P-27 pompaj	2
P-3 pompaj	7
Evka-3 pompaj	3
Üniversite içi pompaj	3
Çınaraltı pompaj	2
Işıkkent pompaj	2
Yeşilçam pompaj	2
Abdi İpekçi pompaj	2
Altındağ pompaj	3
P-37 pompaj	2
Manifaturacılar pompaj	2
P-10 pompaj	5
P-12 pompaj	4
Mersinpınar pompaj	3
Çobançeşme pompaj	4
Çamlık pompaj	2
Samantepe pompaj	4
Yıkıkkemer pompaj	1
Kale pompaj	1
P-6 pompaj	3
Halil Rıfat pompaj	2

İŞLETİLEN POMPA İSTASYONU	MOTOPOMP SAYISI
Susuzdede pompaj	3
Oyak pompaj	3
P 11 pompaj	14
Yeşilyurt pompaj	4
P-23 pompaj	4
P-38 pompaj	5
P-39 pompaj	5
P-24 pompaj	4
P-8 pompaj	5
P-31 pompaj	4
Adatepe pompaj	3
P-5 pompaj	2
Sosyal Konutlar pompaj	2
Evka-7 pompaj	2
Tahtalı Su Alma Yapısı	izleme
Yamaç pompaj	2
İnönü pompaj	2
Narlı pompaj	2
Pazaryeri pompaj	2
Belediye önü pompaj	2
Narkent Alt pompaj	3
Narkent Üst pompaj	3
Arıkent pompaj	3
T-4 depo içi pompaj	2

İŞLETİLEN POMPA İSTASYONU	MOTOPOMP SAYISI
T-54 depo içi pompaj	2
Yahşelli pompaj	izleme
Et entegre pompaj	2
Görece Alt pompaj	2
Görece Üst pompaj	2
Selvili pompaj	8
Harrman pompaj	2

≠ **Depoların İşletimi**

İzmir su dağıtım sistemi üzerinde bulunan ve Scada sistemi ile işletilen depolar aşağıdadır.

DEPOLAR	DEPO SAYISI
Çullutepe depo	izleme
Menemen Acil Toplama depo	izleme
T-2 depo	1
T-50 depo	1
T-51 depo	1
T-74 depo	1
Bayraklı 5000 m³ depo	1
T-41 depo	1
T-46 depo	1
T-48 depo	1
T-77 depo	1
T-7 depo	1
Altındağ depo	1
Çobançeşme depo	1
Kale depolar	3

DEPOLAR	DEPO SAYISI
Çamlık depo	1
Altındağ 200 m³ depo	1
T-17 depo	1
T-18 depo	1
P-31 pompaj içi depo	1
T-49 depo	1
Belediye önü pompaj içi depo	1
T-3 depo	1
T-1 depo	1
T-4 depo	1
T-45 depo	1
T-47 depo	1
T-76 depo	1
T-78 depo	1
Halkapınar 55000 m³ depo	1
Atçalar depo	1
Poligon depo	1
Karabağlar depo	1
Bozyaka depo	1
T-54 depo	1
Tahtalı arıtma tesisi depoları	izleme
T-56 depo	1
Görece Üst pompaj içi depo	1
Sarnıç depo	1

≠ **Boru, vana, vantuz, hidrant vb. ekipmanın işletimi**

İzmir kent ve metropol alan üzerindeki toplama, isale, taşıyıcı, dağıtım hatları;

≠ ön gerilmeli, çelik gömlekli beton,

≠ duktil font,

≠ çelik,

≠ cam elyaflı CTP gibi malzemeden değişik çaplarda mamul borulardan oluşmaktadır.

Yaklaşık 341.000 metre isale hattı bulunmaktadır.

Vantuzlar; değişik yollarla boru içerisine giren havanın dışarı atılmasını (hattın doldurulması), tersine olarak yeterli miktar havanın içeri alınmasını (hattın boşaltılması) sağlayan elemanlardır. Bu sayede boruyu, iç/dış basınç farkından kaynaklanabilecek patlama, büzülme gibi olumsuz sonuçlardan korur ve aynı zamanda boru içerisindeki suyun hareketini kolaylaştırırlar. Genel olarak isale hatları üzerinde ve boru hatlarının yüksek kodlu noktalarında bu görevleri icra etmektedirler.

Hidrantlar ise yangın esnasında itfaiye araçlarına yeterli debide su sağlayan cihazlardır.

2. İçme suyunun İzmir kentine dağıtımı

≠ Su dağıtım planlaması yapılmaktadır.

Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı, İzmir kentinin ihtiyacı olan suyu, üretim kaynaklarından abonelere ulaştırmak amacıyla; ilişkili birimler (Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Su Tesisleri dairesi Başkanlığı, Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, vb.) ile koordineli olarak; kısa vadeli

i) Su üretim kaynaklarının çalışmalarını izleyerek,

ii) Depo ve pompaların durumlarını izleyerek,

iii) Su dağıtım hatları üzerinde oluşan arızaları, yapılan tadilat ve bakım çalışmalarını ve bölgelerin mevcut beslemelerini dikkate alarak,

günlük yada daha kısa süreli "su dağıtım planlaması" yapmaktadır. Bu amaçla pompa çalıştırma/durdurma, vana uygulama gibi gerekli önlemleri almaktadır.

Uzun Vadeli olarak:

i) Genel su dağıtım planına uygun olarak,

ii) Planlanmış tadilat, bakım vs. çalışmalarını öngörerek,

iii) Genel kaynak kullanım politikası doğrultusunda

"su dağıtım programı" hazırlayıp yürürlüğe sokmaktadır.

Gün Bazında ise:

i) Su dağıtım programı çerçevesinde su dağıtım planını uygulamaktadır.

ii) Alınan önlemleri izleyip su dağıtımının devamlılığını kontrol etmektedir.

iii) Su dağıtımı ile ilgili durum değişikliklerini kayıt altına almaktadır.

Aykırı durumlarda veya ani gelişen durum değişikliklerinde su dağıtım planlamasında gerekli değişiklik kararları alınarak uygulamaya konulmaktadır.

≠ Su dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

Su dağıtım planlamasının amacı, İzmir kentine suyun yeterli ve düzenli olarak ulaştırılmasını sağlamak, su trafiğini kontrol etmek ve kentin büyümesine paralel olarak dağıtım hatlarının uygun hale getirilmesi yönünde kararlar almak, bu kararları uygulamak veya uygulanmasını sağlamaktır.

Bu plan çerçevesinde su dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Sürekli ve düzenli bilgi akışı sağlanarak diğer birimler tarafından yapılan/yapılacak ve su dağıtımını etkileyecek çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Aynı şekilde kendi biriminin çalışmaları nedeniyle etkilenecek diğer birimlere bilgi aktarılmaktadır.

Depo taşmaları ile deponun boşalması gibi aykırı durumların önüne geçilmesi amacıyla tedbirler alınmakta veya tedbir alınması sağlanmaktadır. Su dağıtımında yaşanan veya yaşanacak aksaklıkların, basın yoluyla halka duyurulması sağlanmaktadır.

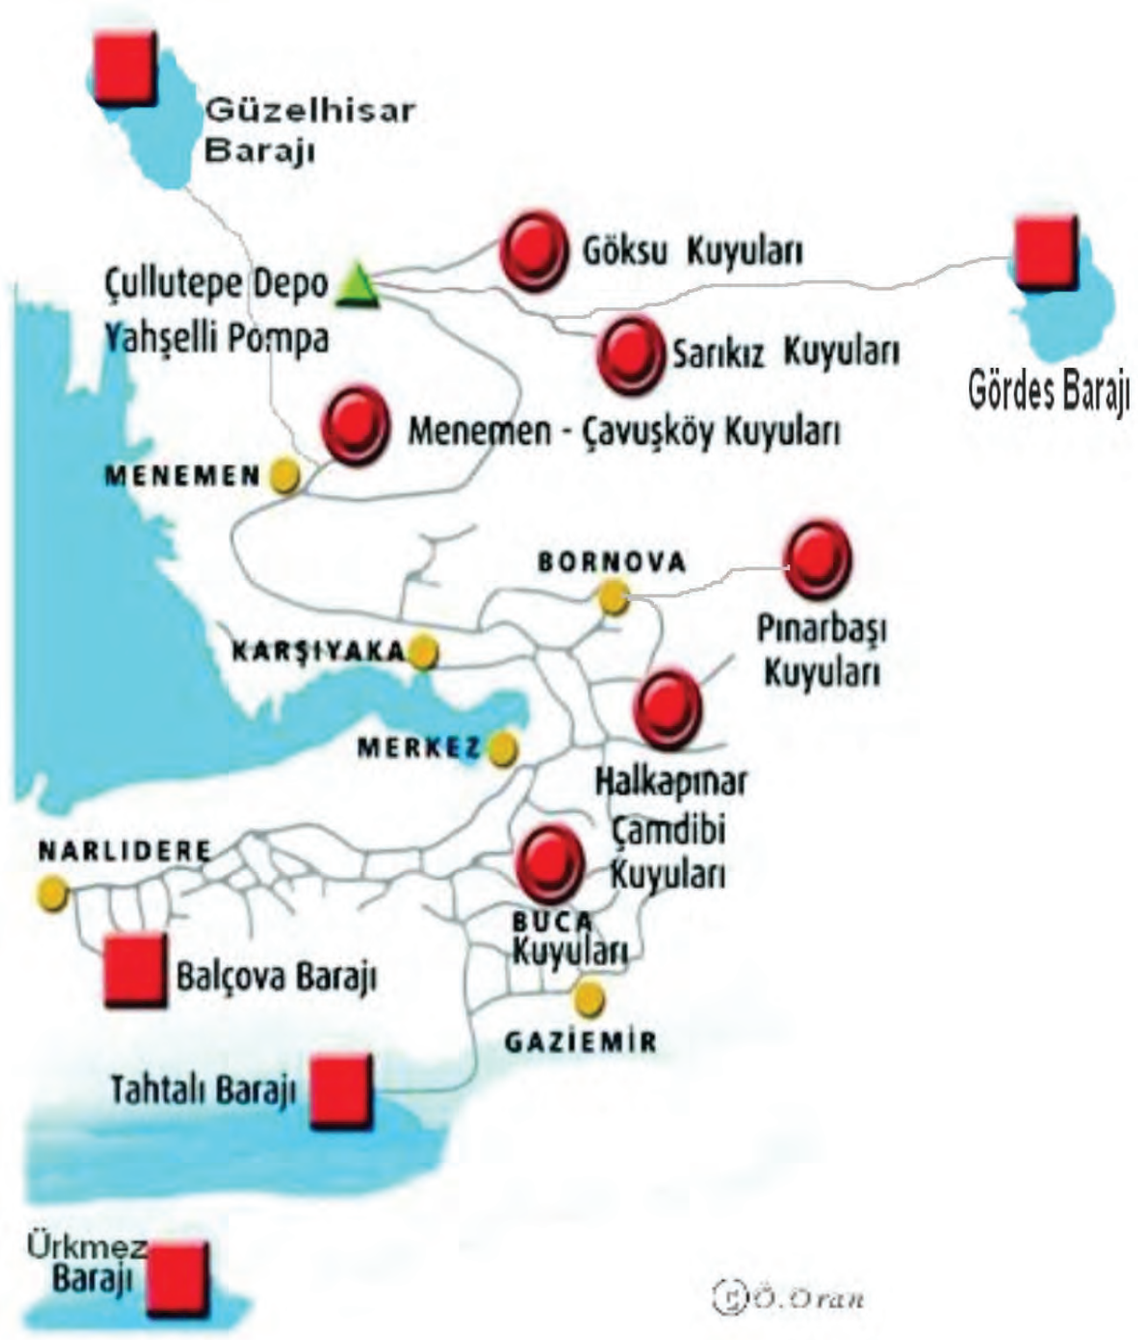

Üretilen suyun kaynaklara dağılımı (2012)

YER ALTI KAYNAKLARI:

Sarıkız derinkuyuları	: % 5,81	11,068,408 m³ / yıl
Göksu derinkuyuları	: % 22,33	42,559,582 m³ / yıl
Menemen derinkuyuları	: % 8,97	17,103,272 m³ / yıl
Halkapınar derinkuyuları	: % 16,33	31,128,709 m³ / yıl
Pınarbaşı derinkuyuları	: % 0,74	1,408,740 m³ / yıl
Buca derinkuyuları	: % 0,52	990,943 m³ / yıl

YER ÜSTÜ KAYNAKLARI:

Tahtalı barajı	: % 34,80	66.336,300 m³ / yıl
Balçova barajı	: % 2,75	5.243,395 m³ / yıl
Gördes Barajı	: % 7,75	14.763,248 m³ / yıl

YERALTI KAYNAKLARI TOPLAMI : % 54,70 104.259,654 m³ /yıl

YERÜSTÜ KAYNAKLARI TOPLAMI : % 45,30 86.342,943 m³ /yıl

Toplam su üretimi : 190.602.597 m³/yıl

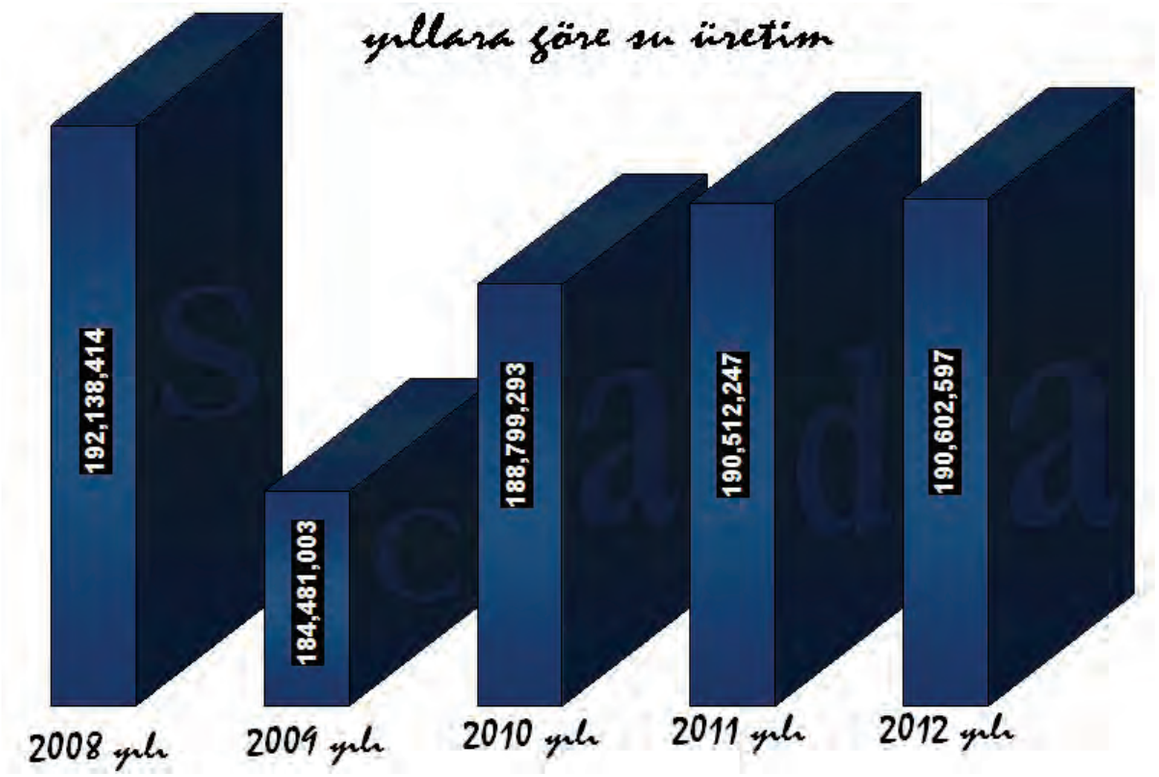

NOT: Su üretimi; İzmir eski metropol alan üzerindeki 11 ilçe (Konak, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe) ile kısmen Menemen ve Urla ilçelerine verilen su miktarını kapsamaktadır.

YIL	SU ÜRETİMİ
2008	192.138.414 m³ / yıl
2009	184.481.003 m³ / yıl
2010	188.799.293 m³ / yıl
2011	190.512.247 m³ / yıl
2012	190.602.597 m³ / yıl

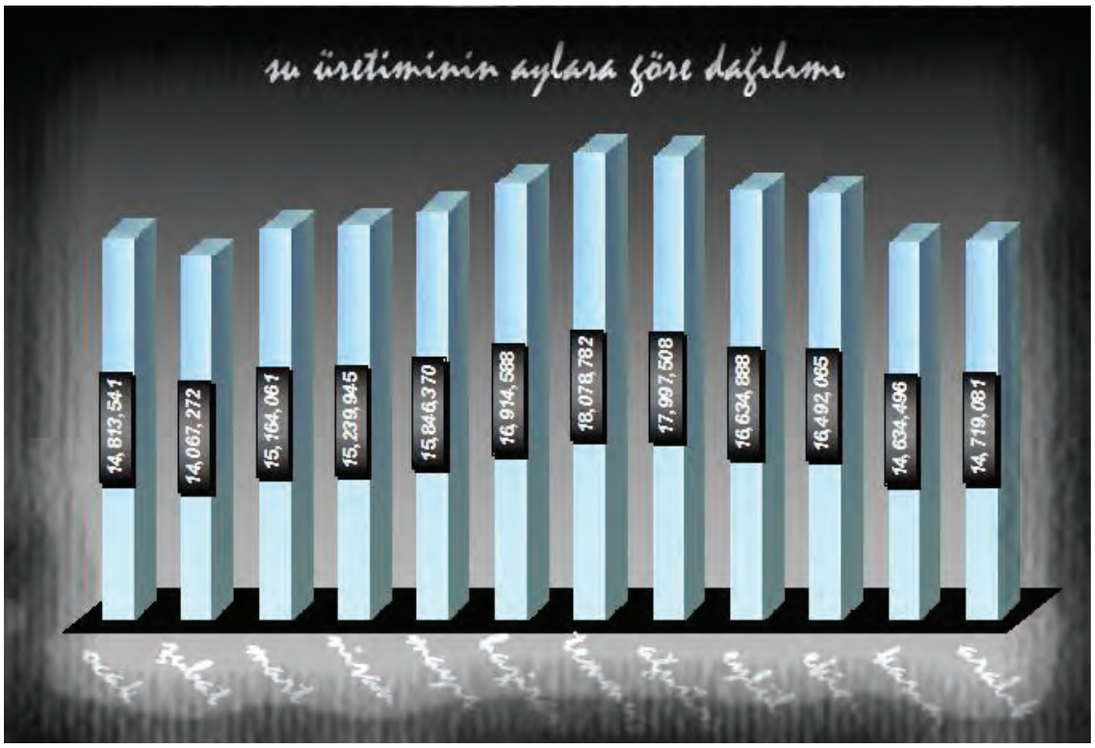
su üretiminin aylara göre dağılımı
14,813,541
14,067,272
15,164,061
15,239,945
15,846,370
16,914,588
18,078,782
17,997,508
16,634,888
16,492,065
14,634,496
14,719,081

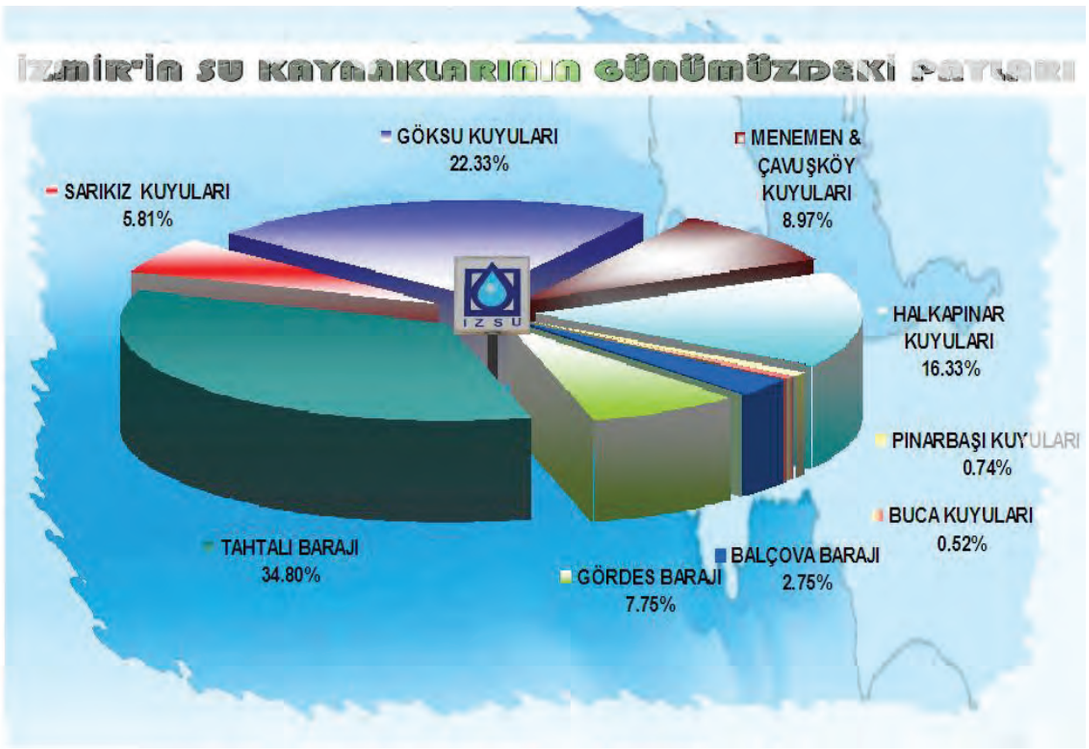
İZMİR'İN SU KAYNAKLARININ GÜNÜMÜZDEKİ DAĞILIMI
GÖKSU KUYULARI
22.33%
MENEMEN & ÇAVUŞKÖY KUYULARI
8.97%
SARIKIZ KUYULARI
5.81%
HALKAPINAR KUYULARI
16.33%
PINARBAŞI KUYULARI
0.74%
BUCA KUYULARI
0.52%
TAHTALI BARAJI
34.80%
BALÇOVA BARAJI
2.75%
GÖRDES BARAJI
7.75%
İZSU

üretimin yeraltı ve yerüstü kaynaklara göre dağılımı



üretimin mevsimlik dağılımı

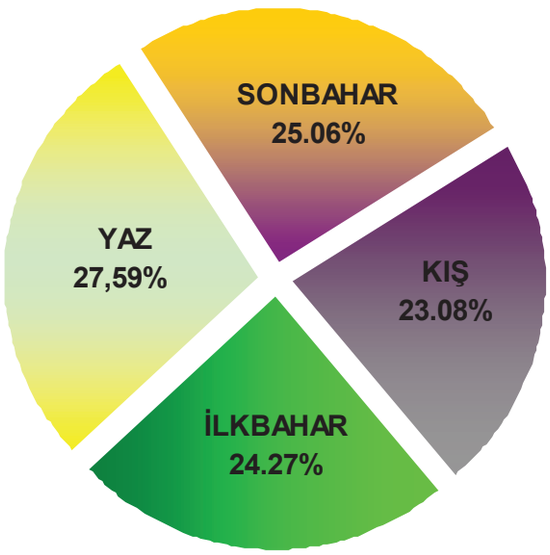

3.İzmir su dağıtım sisteminin izleme, kontrol ve uzaktan kumandası (SCADA)

≠ Scada sistemi ve tarihçesi

SCADA, İngilizce "Supervisory Control And Data Acquisition" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup "Uzaktan Kontrol ve Kumanda" olarak Türkçeleştirilebilir. Bu ifade, geniş bir alan üzerinde kurulu herhangi bir sistemin denetim altına alınmasını ve otomasyonunu içermektedir.

1995-96 yıllarında altyapısı hazırlanarak 1997 yılında ihalesine çıkılan ve 03.04.1998 tarihinde, ELİOP-S.A. (İspanya) / ELIOP Otomatik Kontrol Sistemleri Limited Şirketi (Türkiye) konsorsiyumuna anahtar teslimi olarak ihale edilen SCADA Projesi, İzmir kent alanının ve uzak üretim noktalarının tamamı üzerinde kontrol, izleme ve kumanda yapılacak şekilde dizayn edilerek uygulanmıştır.

Scada sisteminin temel amacı, kurulu sistem üzeri "izlemek" ve "kontrol etmek" olmakla birlikte; yerel ya da genel otomasyon uygulamalarıyla işletim kolaylığı ve geçmişe yönelik bilgi birikiminin değerlendirilerek ileriye yönelik alınacak kararlar için uygun altlıkların oluşturulması da hedeflenmektedir.

≠ **İZSU Scada sistemi kapsamı**

Güzelbahçe'den Bornova'ya, Manisa-Nuriye kasabasından Tahtalı barajına uzanan çok geniş bir alan üzerindeki üretim kaynakları, isale hatları, terfi pompa istasyonları ve depolar; SCADA sistemi kapsamına alınmıştır. İhtiyaçlara uygun olarak Scada sistemi kapsamın ilave ve çıkarımlar yapılmış ve yapılmaktadır. Son durumda:

104 adet derinkuyu,

2 adet baraj,

73 adet pompa istasyonu,

43 adet depo, havuz, rasat kuyusu, ve

17 adet hat vanası denetim altındadır.

≠ **Scada sistemi bileşenleri**

Scada sistemi temel olarak dört ana bileşenden oluşmaktadır: (Kontrol Merkezi, RTU'lar, Enstrümantasyon ve İletişim ortamı)

Scada Merkezi, bilgisayarlar ve çevre donanımı ile donatılmış olup su dağıtım sistemi üzerinde hakimiyet sağlanması amacıyla görsel araçlara da sahiptir. (Projeksiyon sistemi, görsel ekranlar) Bu birim, sahadan bilgi akışının merkezi olmasının yanı sıra ekipler yada birimler arası bağlantının da sağlandığı 24 saat kesintisiz olarak personel bulunan bir ünitedir.

RTU cihazları sahada toplanan bilgileri derleyip Scada Merkezine iletimini sağlayan ünitelerdir. Bu amaçla sahada 190 adet RTU cihazı çalışmaktadır. RTU cihazları akıllı tip olup kendi başına karar verme ve kumanda yapma özelliğine sahiptirler.

Enstrümantasyon adı altında tanımlanan cihazlar; ölçüm yapan, konum bilgisi üreten ve sonuçları derleyerek bağlı bulundukları RTU cihazlarına gönderen genelde mikroişlemci tabanlı sensör ve çevirici ünitelerdir.

İletişim ortamı, saha ile Scada Merkezi arasında ve sahadaki üniteler arasında bilgi aktarımının sağlandığı telsiz haberleşmesi ortamıdır. İdaremize ait mevcut telsiz altyapısının, ses iletişimi yanında bu amaçla da kullanılması tercih edilmiştir. Kısmen kablo haberleşmesi de kullanılmaktadır.

Scada sistem dizaynını sağlayıp sistemi yöneten yeterli ve yetkili personel, sisteminin işletiminden sorumlu olan operatörler, donanım ve ekipmanın bakımından sorumlu olan personel, vb. kişiler; Scada sisteminin dinamik olarak ayakta kalmasını, verimli kullanılmasını ve sistemin sürekliliğini sağlayarak Scada sisteminin canlı bileşenlerini oluşturmaktadırlar.

≠ **Scada sisteminin işletimi**

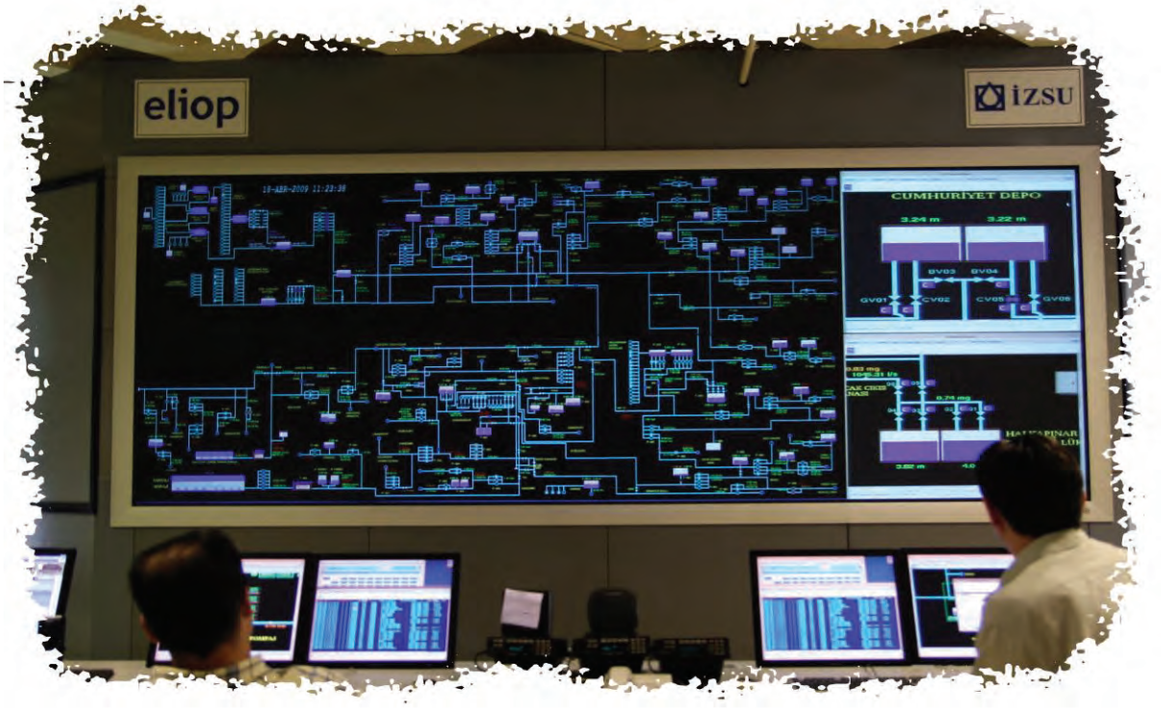

İşletmenin temel bir parçası "izleme"dir. Scada merkezine gelen bilgiler operatör ekranlarına yansıtılarak önceden tanımlanmış aykırı durumlar dikkat çekici şekilde gösterilir. 24 saat kesintisiz yapılan bu izleme ile saha üzerinde tam hakimiyet sağlamaktadır.

İzlemenin sürekliliği yolu ile ani debi/basınç değişimlerinden izlenen hatlarda olası patlakların tespiti de mümkün olmaktadır.

"İzleme" işleminin ayrılmaz bir parçası ise "kontrol"dür. İzlenen tüm parametreler operatör veya yönetici süzgecinden geçirildikten sonra anlamlı hale gelir. İzlenen parametrelerden sonuçlar üretilmesi, gerekirse testler yapılarak durumun irdelenmesi, sonuçlar üzerinden karar alınması veya karar için altlıkların oluşturulması bu kapsamda sürdürülen faaliyetlerdir.

"İzleme" ve "kontrol" işlemlerinin sonuçları ise "kumanda"dır. Durumun gerektirdiği manevraların Scada Merkezi veya RTU cihazları tarafından yapılarak su dağıtımının sürekli ve düzenliliği sağlanmaktadır.

"İzleme", "kontrol" ve "kumanda" sayesinde, aykırı durumlarda oluşabilecek olumsuz sonuçların, zamanında ve hızlı olarak önüne geçilmesi mümkün olmaktadır. (Depo taşması, bulanıklığın artması, klor alarmı, yetkisiz kişilerin tesislere girişi gibi)

Merkezi işletim

Scada Merkezindeki işletmenler (operatörler); su dağıtım programına bağlı olarak ve su dağıtım sistemindeki anlık veya periyodik pozisyon değişikliklerine (aykırılıklar, alarmlar) göre durum değerlendirmesi yaparak aldıkları kararları sahaya uygulamaktadırlar. Kritik durumlarda, yetkililere bilgi aktarmakta veya bilgisine başvurmaktadırlar.

Yerel işletim

Sahadaki akıllı RTU cihazları; üzerlerindeki programlar vasıtasıyla ve bir mantık çerçevesinde kararlar alarak uygulamakta ve Scada Merkezine sonuç bilgilerini göndermektedirler. Bu işletim modelinde Scada Merkezi izleyici, denetleyici ve müdahaleci rol oynamaktadır.



Diğer birimlerle ilişkili işletim

Kimyasal ve elektriksel ölçüm değerlerindeki uyarı ve alarm durumları, değerlendirilmek üzere çevre iş istasyonları üzerinden veya Scada Merkezi yolu ile ilgili birimlere aktarılmakta ve ilgili birim çalışmalarının sonuçları takip edilmektedir. Pompaj ve depolarda yaşanan aykırı durumlar karşısında olay bölgesinin sorumluları haberdar edilerek vana uygulamaları veya arızanın giderimi sağlanmaktadır. Sahadaki istasyonlara giriş/çıkışların kontrolü ile yetkisiz kişilerin tesislere girişi durumunda Güvenlik birimi harekete geçirilmektedir.

Bakım-arıza durumunda işletim

Hat, pompa ve vana arızalarında veya bakım çalışmaları esnasında yerel işletme saha ekiplerine terk edilmektedir. Arıza ve bakım sonrasında sahanın işletilmesi, tekrar Merkez tarafından üstlenilmektedir.

≠ **Scada sisteminin bakımı**

Çok geniş bir alana yayılmış Scada sistemi ve bu sistemi oluşturan bileşenlerin bakımı sürekli ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bu amaçla oluşturulmuş 8 kişilik 2'li vardiya sistemi ile çalışan saha bakım elemanları (ekipler) nitelikli ve tecrübeli personelden oluşturulmuş olup sorunların hızlı ve etkin bir biçimde giderilmesini ve bunun yanında arıza önleyici bakım çalışmalarını sürdürmektedirler.

Scada sistemi kapsamındaki mevcut 190 adet RTU cihazı ile sahada montajlı yüzlerce sensör, transmitter, algılayıcı, haberleşme ekipmanları vb.nin sağlıklı ve sürekli çalışmasının sağlanması amacı ile periyodik ve arıza giderici bakım çalışmaları; eğitimli personelden oluşturulan bakım ekiplerince sürdürülmektedir.

Bakım amaçlı müdahaleler:

1. Genel bakım

≠ RTU panolarının genel bakımlarını yapmak, eksiklerini gidermek

≠ Pompa ve motorlarda görülen aksaklık, aykırılıkları ilgililere bildirmek

≠ İstasyon çevresinin temiz ve emniyetli olması amacıyla tespitler yapmak ve tedbir alınmasını sağlamak için; 122 adet genel bakım yapılmıştır.

2. Haberleşme çalışmaları

≠ Röle, frekans, telsiz cihazı dışında haberleşme ekipmanlarının (modem, kablo, anten vb.) arızalarını gidermek, yenileriyle değiştirmek, ayarlarını yapmak.

242 adet değişik haberleşme ile ilgili cihazın bakım ve ayarı yapılmıştır.

3. Enstrümantasyon ile ilgili çalışmalar

≠ Fiziksel, kimyasal, elektriksel, konumsal sensörler ile çeviricileri ve eklentileri üzerinde bakım, tamir, değiştirme, kalibrasyon çalışmalarını yapmak.

5 adet ultrasonik debimetre montajı, 92 adet yerinde debimetre kalibrasyon ayarı, 35 adet hidrostatik seviye kalibrasyonu, 22 adet basınç sensörü montajı, 7 adet ultrasonik seviye montajı, 27 adet display montajı, 85 adet klor sensörü kalibrasyonu, 25 adet bulanıklık sensörü temizlenmesi, kalibrasyonu, 12 adet kapı açık-kapalı sensörü ayarı tamiri yapılmıştır.

4. Yazılım çalışmaları

≠ RTU cihazlarına yüklenmesi gereken programları yüklemek

≠ RTU cihazlarında depolanan bilgileri recover etmek

2012 yılı içinde 128 adet yazılımın bakımı yapılmıştır.

≠ **Scada sistemi yardımcı hizmetleri**

Yöneticiler, yardımcıları ve görevliler; Scada Merkezi donanımı ve yazılımının işlerliğini denetlemekte, sahanın bakımını yapmakta, Scada sistem yapısı üzerinde gerekli parametre ve konfigürasyon değişikliklerini gerçekleştirmekte, sistem ihtiyacı olan malzeme ve ekipmanları belirleyip seçimini yapmakta olup sistemin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamaktadırlar.

Scada sisteminin temel taşlarından olan haberleşme ortamının izlenmesi, aykırılıkların tespiti, bakımı ve işlerliğinin sürdürülmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Scada sisteminde kullanılan ve arızalanan cihaz, alet, sensör, çevirici, elektronik kart, vb. ekipmanın tamir yolu ile geri kazanılması amacıyla kurulmuş olan ekipman laboratuvarında elektronik kart arıza tespit cihaz ve donanımı ile yedek parçalar mevcut olup RTU, enstrüman, aktüatör, dalgıç pompa vb. ekipmanın tamirleri gerçekleştirilmektedir.

6 adet 24 volt kaynak tamiri, 5 adet 12 volt kaynak tamiri, 1 adet 5 volt kaynak tamiri, 20 adet arızalı aktüatörmatiği tamiri, 5 adet telsiz beslemesi tamiri, 7 adet telsiz protector arası kablo, 22 adet UPS pili montajı, 52 adet UPS Pili tamir ve montajı, 1 adet istasyon RTU panosu montajı (Onur Pompaj), yapılmıştır.

≠ **Scada sistemi verilerinin değerlendirilmesi ve kararlar alma**

Scada sistemindeki tüm veri ve değerler Oracle veritabanında toplanmaktadır. Bu veritabanı kullanılarak geçmişe yönelik değerler analiz edilmekte ve sonuçlar üretilmektedir. Periyodik olarak alınan back-up dosyaları ile veri kayıplarının önüne geçilmektedir.

Tarihsel yapıda biriktirilen bu veriler ile, yeni yerleşim bölgelerinin oluşumunda besleme kaynaklarının yeterliliği, mevcut pompaların verimlilikleri, talep tahminleri, değişik türden tespit amaçlı tablo, grafik, rapor üretilebilmektedir.

Günlük su üretim raporları ile önemli depoların seyir bilgileri kayıt altına alınmaktadır.

Scada kapsamındaki bazı bölgelerde su kaçaklarının azaltılması çalışmalarına ışık tutacak debi bilgileri

de üretilmektedir. (gece debisi, toplam bölge debisi gibi)

Database verileri, Scada sisteminin iç kontrolü amaçlı da kullanılabilmektedir. (Tarihsel anlık ve toplam debi değerlerinin kullanılarak debimetre cihazının oto-testi)

Yetersiz veya eksik beslemenin olduğu bir bölgeyi besleyecek yeni bir pompanın ya da herhangi bir nedenle değişecek bir pompanın Hm ve debi değerlerinin seçimine esas bilgiler, database kullanılarak üretilebilmektedir.

Mevcut pompa etiket değerleri ile gerçekleşen Hm/debi değerleri kıyaslanarak verimsiz pompalar tespit edilebilmektedir. Bu amaçla testler de yapılmaktadır. Çek-valf arızaları, mil kesme durumları, izlenen ve database yolu ile elde edilen değerlerden tespit edilebilmektedir.

Scada Bakım ekiplerinin çalışmaları da kayda alınarak istasyonlarla ilgili veya donanımla ilgili saptamalar yapılmaktadır.

4. Su dağıtım sisteminin bakımı ve iyileştirilmesi

Su temin, isale, dağıtım hatları üzerinde bakım ve iyileştirme çalışmaları ekipler tarafından yürütülmektedir.

Ekip araç ve ekipman durumu:

Bu amaçla kurulmuş ve gerekli her tür ekipman, alet ve edevatla donatılmış 4 adet hat bakım ekibi, 2 adet anaboru tamir ve tadilat ekibi ile su dağıtım sisteminin iyileştirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Çalışmalara yardımcı olarak bir kaynak ve bir beton ekibi mevcuttur.

Hat bakım, tadilat ve beton ekipleri, 1 ekipbaşı ile 3 işçiden, kaynak ekibi 2 kaynakçıdan oluşmaktadır. Her bir ekibe ait araç (kamyon, damperli kamyon) ve bu araçlar üzerinde dalgıç pompa, matkap, jeneratör, kaynak makinesi, oksijen kaynak malzemeleri gibi, temel cihazlar ile her tür yardımcı alet ve ekipman bulunmaktadır. Ekipler tarafından ortak kullanılan kimi cihazlar ise birime ait depodan temin edilmektedir.

≠ **İsale ve taşıyıcı hatlar üzerinde arıza giderim çalışmaları**

Su temin ve dağıtım sistemindeki her türden ve her çaptaki borular üzerinde meydana gelen arızalara, yetişmiş ekiplerce, hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmektedir.



Beton boru hatlarında oluşan arızalar, boru içinden tamir yöntemi ile pratik olarak giderilmektedir. 2012 yılında Ø 400-2200 mm çaplı isale hatlarında meydana gelen 42 büyük arıza tamir edilmiş, Ø 1600-2200 mm. Borularda boru içine girilerek sorunlu bölge tamamen içten taranmış ve arızalar tespit edilerek giderilmiştir.

≠	(Ocak-2012)	Çiğli	Ø 600 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Ocak-2012)	Çiğli	Ø 450 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Ocak-2012)	Çiğli	Ø 600 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Ocak-2012)	Mithatpaşa	Ø 900 St.	boru arızası giderildi.
≠	(Şubat-2012)	Yeşildere	Ø 1600 EB	boru arızası 2 kez giderildi.
≠	(Şubat-2012)	Mithatpaşa	Ø 1200 EB	boru arızası giderildi.
≠	(Şubat-2012)	Bayraklı	Ø 1000 St	boru arızası giderildi.
≠	(Şubat-2012)	Çiğli	Ø 450 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Mart -2012)	Güzelbahçe	Ø 800 St	boru arızası giderildi.
≠	(Mart -2012)	Menderes	Ø 350 ACB	boru arızası giderildi.
≠	(Mart -2012)	Egekent	Ø 1000 St	boru arızası giderildi.
≠	(Nisan-2012)	Gültepe	Ø 600 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Nisan-2012)	Kadifekale	Ø 800 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Nisan-2012)	Egekent	Ø 1000 St	boru arızası giderildi.
≠	(Mayıs-2012)	Yeşilyurt	Ø 900 St	boru arızası giderildi.
≠	(Mayıs-2012)	Çiğli	Ø 600 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Mayıs-2012)	Çankaya	Ø 1400 Eb	beton arızası giderildi.

≠	(Mayıs-2012)	Özdere	Ø 400 DF	boru arızası giderildi.
≠	(Mayıs-2012)	Sarnıç	Ø 200 DF	boru arızası giderildi.
≠	(Haziran-2012)	Bozyaka	Ø 900 St	boru arızası 2 kez giderildi.
≠	(Haziran-2012)	Sasalı	Ø 300 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Haziran-2012)	Bornova	Ø 500 DF	boru arızası giderildi.
≠	(Temmuz-2012)	Koyundere	Ø 2200 Eb	boru arızası giderildi.
≠	(Temmuz-2012)	Urla-Zeytinalanı	Ø 600 DF	boru arızası giderildi.
≠	(Temmuz-2012)	Bornova	Ø 1400 Eb	boru arızası giderildi.
≠	(Temmuz-2012)	Alsancak	Ø 450 St	boru arızası giderildi.
≠	(Ağustos-2012)	Buca	Ø 500 St	boru arızası giderildi.
≠	(Ağustos-2012)	Bayraklı	Ø 1000 St	boru arızası giderildi.
≠	(Ağustos-2012)	Çiğli	Ø 450 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Ağustos-2012)	Sasalı	Ø 400 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Eylül-2012)	Menemen	Ø 2200 Eb	boru arızası giderildi.
≠	(Eylül-2012)	Çiğli	Ø 600 CTP	boru arızası giderildi.
≠	(Ekim-2012)	Mithatpaşa	Ø 1200 Eb	boru arızası giderildi.
≠	(Ekim-2012)	Hatay	Ø 400 St	boru arızası giderildi.
≠	(Kasım-2012)	Gümüşpala	Ø 500 St.	boru arızası giderildi.
≠	(Kasım-2012)	Çiğli	Ø 450 DF	boru arızası giderildi.
≠	(Kasım-2012)	Bozyaka	Ø 900 St	boru arızası giderildi.
≠	(Kasım-2012)	Oyak sitesi	Ø 250 Pik	boru arızası giderildi.
≠	(Kasım-2012)	Gültepe	Ø 350 DF	boru arızası giderildi.
≠	(Kasım-2012)	Esendere	Ø 500 St	boru arızası giderildi.
≠	(Aralık-2012)	Kadifekale	Ø 800 CTP	boru arızası 2 kez giderildi.
≠	(Aralık-2012)	Alsancak	Ø 300 Pik	boru arızası giderildi.

Ayrıca Teknik Amirliklerden gelen talepler doğrultusunda ve destek olmak amacıyla, 7 adet şebeke bağlantısı, 301 adet şebeke tamiri yapılmıştır.





Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasına giren her yerde, her çapta, her cinste boruda meydana gelen

arızaların usulüne uygun olarak ve hızlı şekilde giderilmesi faaliyetleri sürdürülmüştür.



≠ **İsale ve taşıyıcı hatların iyileştirilmesi faaliyetleri**

Eldeki bilgiler ışığında yapılan değerlendirmeler sonucu alınan kararlar doğrultusunda veya diğer birimler tarafından yürütülen projeler kapsamında yapılan düzenlemeler gereğince veya şahısları yada kurumların taleplerine istinaden su dağıtım sistemi üzerinde değişiklikler, iptaller, yenilemeler yapılmaktadır.



Boru döşeme faaliyetleri

Hat oluşumu, hat değişikliği, hat yenileme gibi nedenlerle yeni hatların döşenmesi çalışmaları ekiplerce yapılmaktadır.

(Ocak-2012)	Torbalı	200 metre	Ø 400 DF
(Ocak-2012)	Çiğli	50 metre	Ø 150 DF
(Mart -2012)	Bornova	82 metre	Ø 500 DF
(Nisan-2012)	Çiğli	200 metre	Ø 250 DF
(Mayıs-2012)	Menemen Asarlık	42 metre	Ø 200 DF
(Mayıs-2012)	Çiğli	36 metre	Ø 300 DF
(Mayıs-2012)	Yeşildere	55 metre	Ø 110 HDPE
(Temmuz-2012)	Çiğli	1.098 metre	Ø 450 DF
(Ağustos-2012)	Çiğli	1.542 metre	Ø 450/400 DF
(Eylül-2012)	Çiğli	48 metre	Ø 400 DF
(Eylül-2012)	Kadifekale	100 metre	Ø 110 HDPE
(Ekim-2012)	Boğaziçi Caddesi	727 metre	Ø 500 DF

Ø 300 ile Ø 500 mm. arası toplam 4180 metre boru döşeme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bağlantı çalışmaları

2012 yılında, Ana isale hatları deplasmanı yanında Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca yapımı gerçekleştirilen şebeke döşeme işleri kapsamında, yeni döşenen şebeke hatlarının mevcut şebeke hatlarına bağlantısı 25 noktada yapılmıştır.

≠	(Şubat-2012)	Harmandalı	Ø 1000	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Şubat-2012)	Çiğli	Ø 1000	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Şubat-2012)	Bozyaka	Ø 1000	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Şubat-2012)	Menemen	Ø 450	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Mart -2012)	Bornova	Ø 500	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Mart -2012)	Bornova	Ø 300	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Mart -2012)	Çiğli	Ø 1000	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Nisan-2012)	Güzelbahçe	Ø 225	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Nisan-2012)	Menemen	Ø 400	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Mayıs-2012)	Çiğli	Ø 250	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Mayıs-2012)	Çiğli	Ø 200	hat bağlantısı yapıldı..
≠	(Mayıs-2012)	Gaziemir	Ø 250	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Haziran-2012)	Çiğli	Ø 350	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Ağustos-2012)	Bornova	Ø 250	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Ağustos-2012)	Doğançay	Ø 100	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Eylül-2012)	Çiğli	Ø 150	sayaç bağlantısı yapıldı. (2 adet)

≠	(Eylül-2012)	Çiğli	Ø 400	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Eylül-2012)	Bozyaka	Ø 500	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Eylül-2012)	Doğançay	Ø 110	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Eylül-2012)	Boğaziçi	Ø 600	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Eylül-2012)	Bornova	Ø 150	sayaç bağlantısı yapıldı.
≠	(Eylül-2012)	Menderes	Ø 350	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Aralık-2012)	Menemen	Ø 300	hat bağlantısı yapıldı.
≠	(Aralık-2012)	Buca	Ø 110	Gediz klorlama ünitesinin bağlantısı yenilendi.

Hat iptali çalışmaları

2012 yılında, Ana isale hatlarının bağlantısı yanında Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca yapımı gerçekleştirilen şebeke döşeme işleri kapsamında yeni döşenen şebeke hatlarının mevcut şebeke hatlarına bağlantısı yapıldıktan ve branşman nakilleri tamamlandıktan sonra 11 noktada eski şebekenin iptali gerçekleştirilmiştir.

≠	(Nisan-2012)	Çiğli	Ø 1000
≠	(Nisan-2012)	Buruncuk	Ø 1200
≠	(Nisan-2012)	Eskiizmir	Ø 500
≠	(Nisan-2012)	Konak	Ø 1000
≠	(Haziran-2012)	Çiğli	Ø 200
≠	(Haziran-2012)	Yıkıkkemer	Ø 250
≠	(Haziran-2012)	Yıkıkkemer	Ø 350
≠	(Ağustos-2012)	Doğançay	Ø 100
≠	(Eylül-2012)	Çiğli	Ø 300
≠	(Kasım-2012)	Bozyaka	Ø 500
≠	(Aralık-2012)	Oyak sitesi	Ø 250

Deplasman çalışmaları

Mevcut borunun güzergahının değiştirilmesi faaliyetleridir. Köprü yapımı, yol yapımı, tesis yapımı gibi yeni yapılanmalar ile diğer altyapı tesisleri (kanal, enerji, telefon gibi) ile çakışma durumlarında uygulanmaktadır. 2012 yılında 4 adet değişik çapta ve cinste borunun deplasmanı çalışması gerçekleştirilmiştir.

≠	(Ocak-2012)	Menderes	Ø 400	hat deplasmanı yapıldı.
≠	(Mart -2012)	Bornova	Ø 500	hat deplasmanı yapıldı.
≠	(Mayıs-2012)	Gaziemir	Ø 250	hat deplasmanı yapıldı.
≠	(Eylül-2012)	Menderes	Ø 350	hat deplasmanı yapıldı.

Kontrol elemanları üzerinde yapılan faaliyetler

Vana, vantuz, hidrant, demontaj, sayaç, debimetre, vb. kontrol elemanlarını;

≠ Montajı

≠ Sokumu

≠ Değiştirilmesi

≠ Bakımı çalışmalarıdır.

Bu kapsama uzaktan kontrolü yapılmayan vanaların uygulamaları da girmektedir.

Scada kapsamındaki her tür enstrümanın montajı da yapılmaktadır.

2012 yılında, arızalı olan vana, vantuz ve hidrantların değiştirilmesi, ve montajı veya eskilerinin iptali çalışmaları kapsamında 24 adet vananın söküm ve montajı, 24 adet vana sökümü, 43 adet hidrant söküm ve montajı, 17 adet hidrant sökümü ve 238 adet hidrantın bakım ve tamiri ve genel 3 kez tüm İzmir'deki hidrantların bakımı yapılmış, 25 adet vantuz montajı, 5 adet vantuz sökümü ve 10 adet vantuz bakım ve tamiri yapılmıştır.

VANA MONTAJI, DEMONTAJI VE DEĞİŞİMİ ÇALIŞMALARI

(Ocak-2012)	Karşıyaka	Ø 1000	vana montajı yapıldı.
(Ocak-2012)	Karabağlar	Ø 800	vana değiştirildi. (söküm/montaj).
(Ocak-2012)	Menemen	Ø 500	vana değiştirildi. (söküm/montaj).
(Ocak-2012)	Harmandalı	Ø 500	vana değiştirildi. (söküm/montaj).
(Ocak-2102)	Kale	Ø 500	vana değiştirildi. (söküm/montaj).
(Şubat-2012)	Bozyaka	Ø 1000	vana montajı yapıldı.
(Şubat-2012)	Çiğli	Ø 1000	vana söküldü.
(Mart -2012)	Selçuk	Ø 300	vana değiştirildi. (söküm/montaj).
(Mart -2012)	Selçuk	Ø 400	vana değiştirildi. (söküm/montaj)
(Mart -2012)	Bozyaka	Ø 800	vana söküldü.
(Mart -2012)	Bornova	Ø 1000	vana söküldü.
(Nisan-2012)	Kadifekale	Ø 1000	vana montajı yapıldı.
(Nisan-2012)	Urla	Ø 400	vana montajı yapıldı.
(Nisan-2012)	Bozyaka	Ø 900	vana değiştirildi. (söküm/montaj)
(Nisan-2012)	Buruncuk	Ø 1200	vana söküldü.
(Nisan-2012)	Buruncuk	Ø 600	vana söküldü.
(Nisan-2012)	Buruncuk	Muhtelif	tüm küçük çaplı vanalar söküldü.
(Mayıs-2012)	Bozyaka	Ø 800	vana montajı yapıldı.
(Mayıs-2012)	Çankaya	Ø 1200	vana değiştirildi. (söküm/montaj)
(Haziran-2012)	Yıkıkkemer	Ø 300	vana söküldü.
(Temmuz-2012)	Sarıkız	Ø 2000	vana değiştirildi. (söküm/montaj)
(Ağustos-2012)	Bozyaka	Ø 900	vana değiştirildi. (söküm/montaj)
(Ağustos-2012)	Bozyaka	Ø 300	vana değiştirildi. (söküm/montaj)
(Eylül-2012)	Altındağ	Ø 200	vana değiştirildi. (söküm/montaj)
(Eylül-2012)	Bornova	Ø 300	vana değiştirildi. (söküm/montaj)
(Eylül-2012)	Yenişehir	Ø 250	vana değiştirildi. (söküm/montaj)
(Eylül-2012)	Alsancak	Ø 200	vana değiştirildi. (söküm/montaj)

(Kasım-2012)	Çiğli	Ø 500	vana montajı yapıldı.
(Kasım-2012)	Gümüşpala	Ø 500	vana değiştirildi. (söküm/montaj)
(Aralık-2012)	Karabağlar	Ø 100	vana montajı yapıldı.
(Aralık-2012)	Sarıkız-Gördes	Ø 2000	Demontajı değiştirildi. (söküm/montaj)

VANTUZ MONTAJI, DEMONTAJI VE DEĞİŞİMİ ÇALIŞMALARI

(Şubat-2012)	vantuz değiştirme (sökme- takma)	2 adet	Yeşildere, Mithatpaşa
(Mart -2012)	vantuz montajı	3 adet	Halkapınar, Gültepe, Bornova
(Mart -2012)	vantuz montajı	1 adet	Karşıyaka
(Mart -2012)	vantuz tamiri	3 adet	Eskiizmir, Halkapınar, Çiğli
(Nisan-2012)	vantuz montajı	1 adet	Güzelbahçe
(Mayıs-2012)	vantuz tamiri	1 adet	Gültepe
(Haziran-2012)	vantuz tamiri	3 adet	Çiğli
(Temmuz-2012)	vantuz değiştirme (sökme- takma)	1 adet	Bornova
(Temmuz-2012)	vantuz tamiri	2 adet	Menderes
(Ağustos-2012)	vantuz montajı	1 adet	Yenişehir
(Ağustos-2012)	vantuz tamiri	1 adet	Manisa
(Eylül-2012)	vantuz sökümü	1 adet	Çiğli
(Eylül-2012)	vantuz değiştirme (sökme- takma)	1 adet	Harmandalı
(Ekim-2012)	vantuz montajı	8 adet	Konak, Karabağlar, Menemen Çiğli, Ulukent, Harmandalı
(Kasım-2012)	vantuz montajı	6 adet	Çiğli, Bozyaka, Mithatpaşa, Gültepe ve Yamanlar
(Aralık-2012)	vantuz montajı	1 adet	Bornova



HİDRANT MONTAJI, DEMONTAJI VE DEĞİŞİMİ ÇALIŞMALARI

(Ocak-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	52 adet	İzmir
(Şubat-2012)	hidrant montajı	1 adet	Bornova
(Şubat-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	64 adet	İzmir
(Mart -2012)	hidrant montajı	4 adet	Çiğli, Güzelyalı, Gaziemir
(Mart -2012)	hidrant sökümü	1 adet	Eskiizmir
(Mart -2012)	hidrant bakımı ve tamiri	29 adet	Merkez, Karşıyaka, Pınarbaşı, Buca
(Nisan-2012)	hidrant montajı	5 adet	Buca (2), Narlıdere (3)
(Nisan-2012)	hidrant sökümü	2 adet	Karşıyaka, Yeşilyurt
(Nisan-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	genel	İzmir
(Mayıs-2012)	hidrant sökümü	2 adet	Çamdibi
(Mayıs-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	9 adet	Karabağlar, Karşıyaka, Buca, Bornova
(Haziran-2012)	hidrant montajı	1 adet	Seyrek
(Haziran-2012)	hidrant sökme-takma	9 adet	Bornova, Pınarbaşı, Çiğli, Buca
(Haziran-2012)	hidrant sökümü	1 adet	Buca
(Haziran-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	18 adet	Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Seyrek
(Temmuz-2012)	hidrant montajı	1 adet	Karşıyaka
(Temmuz-2012)	hidrant sökme-takma	1 adet	Hatay
(Temmuz-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	5 adet	Seyrek
(Ağustos-2012)	hidrant sökme-takma	1 adet	Çiğli

(Ağustos-2012)	hidrant montajı	1 adet	Çiğli
(Ağustos-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	13 adet	Karşıyaka
(Eylül-2012)	hidrant sökme-takma	8 adet	Çiğli, Gaziemir, Yeşilyurt, Boğaziçi
(Eylül-2012)	hidrant sökümü	3 adet	Hatay, Buca
(Eylül-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	31 adet	İzmir
(Ekim-2012)	hidrant montajı	4 adet	Çiğli, Karşıyaka, Karabağlar
(Ekim-2012)	hidrant sökümü	3 adet	Hatay, Narlıdere
(Ekim-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	genel	Gültepe, Narlıdere, Buca
(Kasım-2012)	hidrant montajı	3 adet	Sasalı, Gültepe
(Kasım-2012)	hidrant sökümü	3 adet	Hatay, Narlıdere
(Kasım-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	genel	Çamdibi, Karşıyaka, Gültepe
(Aralık-2012)	hidrant montajı	3 adet	Gültepe, Çamdibi, Bornova
(Aralık-2012)	hidrant sökme-takma	1 adet	Karşıyaka
(Aralık-2012)	hidrant sökümü	2 adet	Menemen, Çamdibi
(Aralık-2012)	hidrant bakımı ve tamiri	17 adet	Çamdibi, Bornova, Balçova

Boru kaynak işleri ile birim içinde gerekli her tür kaynak işleri oluşturulmuş kaynak ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Gerektiğinde diğer birimlerden takviye ekip tedarik edilmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucu bozulan beton yüzeylerin eski haline getirilmesi, arıza giderim çalışmaları esnasında gerekli olan beton içerikli çalışmalar, rögar yapımı, rögarlara beton kapak imali, istinat duvarı, beton dolgu, tretuvar tamiri, duvar tamiri gibi faaliyetler mevcut inşaat ekibi tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda; inşaat ekibimizce; 20 adet rögar imal edilmiş, 20 rögarda bakım çalışması yapılmış, 3 adet rögar tamiri yapılmış, 154 ayrı noktada taş döşeme ve beton tamirat işleri yapılmıştır.

≠ **İsale hatlarının bakımı faaliyetleri**

İsale hatlarının kent içinde kalan bölümleri, birim içi ekip çalışmaları ve ekip sorumlularının seyrüseferleri esnasında kontrol edilmekte olup kent dışı hatların kontrolü amaçlı rutin bakım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda yapılan faaliyetler, özetle:

≠ Hatlar boyunca yüzeye çıkan su olup olmadığının kontrolü,

≠ Hatlar üzerinde yük oluşturacak türden yapılaşma, moloz, vb. olup olmadığının

≠ Hatlar üzerindeki dolgu malzemesi kaybı olup olmadığının kontrolü,

≠ Dere, yol geçişlerindeki boruların gözle kontrolü,

≠ Hatlar üzerindeki rögarların ve rögar kapaklarının kontrolü,

≠ İsale hatları üzerindeki vantuzların çalışıp çalışmadığının kontrolü,

≠ Yangın musluklarından yetkisiz kişilerin su almaların önlemek amaçlı kontrol,

≠ Yağışlı havalarda özellikle deniz seviyesine yakın rögarlardaki suyun çektirilmesi,

olarak sayılabilir.



"İzmir İçmesuyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve iyileştirilmesi" ihalesi kapsamında ve birim ekipleri tarafından, 2012 yılında Menemen, Manisa, Buca, Görece, Çiğli ve Aliağa bölgelerindeki isale hatları güzergahları dolaşılarak;

≠ 9 kez İsale hatlarının periyodik kontrolü ve bakımı,

≠ Beton boru arızalarının giderilmesi (belli sayıda)

≠ Rögarların bakım, temizlik ve boyanması,

≠ İsale hatları üzerindeki kontrol elemanlarının bakımı ve işlerlik kontrolü,

≠ Belli sayıda vantuz, vana değişiklikleri,

≠ Rögar imali ve tamiri gibi çalışmalar yanı sıra,

≠ (Ocak-2012) 6 adet depo ve pompanın bakım ve temizliği yapıldı.

≠ (Şubat-2012) 39 adet depo ve pompanın bakım ve temizliği yapıldı.

≠ (Mart -2012) 33 gün, depo ve pompa tesislerinin bakım ve temizliği yapıldı.

≠ (Nisan-2012) 32 gün, depo ve pompa tesislerinin bakım ve temizliği yapıldı.

≠ (Mayıs-2012) 8 adet depo ve pompa tesislerinin bakım ve temizliği yapıldı.

≠ (Haziran-2012) 45 adet depo ve pompa tesislerinin bakım ve temizliği yapıldı.

≠ (Temmuz-2012) 3 adet depo bakım ve temizliği yapıldı.

2012 yılında bu kapsamda, dirsek betonu güçlendirmesi, taban betonu ve güvenlik duvarı yapılmış, bu işler esnasında 96 m³ beton, 2,5 ton demir, 175 m³ dolgu yapılmış veya kullanılmıştır.

≠ **Alternatif besleme imkanlarının araştırılması ve uygulanması**

Su dağıtımının aksamadan gerçekleştirilebilmesi amacıyla genel olarak su dağıtım sistemi üzerinde altyapı yönünden yaşanan sıkıntılar belirlenmekte ve çözüm yolları üretilmektedir. Bu amaçla bölgelerin alternatif besleme imkanları araştırılmaktadır. Mümkün olan yerlerde bu alternatifler uygulamaya alınmaktadır. Bu şekilde oluşturulan by-pass sistemleri ile bir besleme noktasındaki aksama halinde alternatif besleme kanalları devreye alınabilmektedir.

≠ **İğne vana uygulamaları**

Farklı basınç zonlarındaki üretim kaynakları veya iletim hatları ile bir bölgenin beslenmesi halinde meydana gelen basınç artışının probleme neden olmaması amacıyla iğne vanalar kullanılmakta ve bu sayede debi kontrol edilerek aşırı basınç önlenmektedir.

≠ **Çelik hatlar üzerinde Katodik koruyucu bakım faaliyetleri**

2006 yılında tamamlanan bir proje ile İzmir çelik boru isale hatlarının hemen tamamı üzerinde katodik koruma sistemi tesis edilmiştir. Daha önceden tesis edilmiş hatlarla birlikte katodik koruyucu sisteme ait cihaz ve donanımın periyodik bakımı gerçekleştirilmekte ve arızaları giderilerek sağlıklı çalışmaları sağlanmaktadır. Bu amaçla hatlar üzerinden alınan elektriksel ölçüm sonuçları değerlendirilmekte ve katodik korumanın sürekliliğine çalışılmaktadır. Çelik olmayan borular üzerinde yapılan çelik bağlantı kısımlarında veya deplase edilen çelik kısımlarda katodik koruyucu tedbirlerin alınmasına çalışılmaktadır.

2012 yılında, toplam 154761 metre uzunluğundaki Ø 250-2200 mm. çelik boru hattının korozyondan korunması ve kullanım ömürlerinin arttırılmasını sağlamak için, 65 adet T/R (trafo redresör) ve 137 adet ölçüm kutusunun (ölçüm noktalarının) düzenli olarak bakım ve onarımları yapılmıştır.

5.Resimhane faaliyetleri

İzmir kent alanı için su temin ve dağıtım sisteminin altyapı kayıtlarının tutulduğu, güncelleştirildiği ve saklandığı birim olup Genel Müdürlük bazında hizmet vermektedir.

İZSU (içmesuyu, kanal) veya diğer kurum ve kuruluşlar (TEDAŞ, Türk Telekom, Karayolları, İzmir Gaz, Belediyeler, vb.) veya şahıslar tarafından yürütülen altyapı veya tesis çalışmalarında; 2012 yılı için; 3200 adet, bölgedeki mevcut altyapı güzergahları işlenerek yeni yapı tesislerinin İZSU altyapısına zarar vermeden gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

İzsu bünyesinde gerçekleştirilen altyapı üzerindeki değişiklikler (proje, ataşman) bu birimce bilgisayar ortamına işlenerek güzergahlar güncellenmektedir.

İsale hatlarına ait detaylı as-built projeler resimhane biriminde saklanmaktadır.

2012 yılında 37 adet bağlantı kayda alınmıştır.

İzmir Coğrafi Altyapı Bilgi Sistemine aktarılan tüm içmesuyu altyapı bilgilerinin kontrol çalışmaları sürmekte olup, ataşman defterlerinin fotoğraflanıp ait oldukları sokaklara yüklenmesi devam etmektedir

6.Ambar faaliyetleri

2008 yılında, oluşturulan Daire Başkanlığımıza ait Scada ambarından, ihtiyacımız olan malzeme, ekipman, cihaz, alet ve gereçler temin edilerek kullanılmıştır.

7.Telsiz haberleşme sistemi izleme, kontrol, bakım ve tamiri

Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı Telsiz Atölyesince;

≠ İZSU bünyesindeki pek çok birimde kullanılmakta olan el, araç, sabit telsiz cihazları ile bu cihazlara ait aksesuarların (piller, antenler, klipsler, vb.) montajı, sökümü, tamiri, bakımı, ayarı, testleri, parametre kontrol çalışmaları sürdürülmektedir.

≠ 2012 yılında, 224 adet sabit telsiz bakım ve tamiri, 35 adet telsiz montaj ve sökümü 488 adet telsiz programlaması ve 10 adet anten montaj ve sökümü yapılmıştır.

≠ Yamanlar ile Yelkentepe'de kurulu haberleşmeyi yöneten siteler ile bu sitelerde kurulu R/L cihazlarının montajı, sökümü, bakımı, ayarı, testleri, parametre kontrol çalışmaları sürdürülmektedir. (2012 yılında 36 kez analog röle arıza ve bakım yapılmıştır.)

≠ İZSU bünyesinde kullanılan telsiz cihazlarının zimmet kayıtları tutulmaktadır.

≠ Kurum içi telsiz hareketleri ve gerekirse telsiz görüşmeleri süreç olarak izlenmektedir.

≠ Birimlerin kullanım amaçlı telsiz talepleri karşılanmaktadır.

≠ Telekomünikasyon Kurumu, Türk Telekom gibi kurumlarla iletişim kurulmakta, bu kurumlara

yapılan telsiz kullanım bedeli ile kira bedeli ödemelerinin yapılması sağlanmaktadır.

≠ İlgili kurumlara, çalınan, kaybolan, hurdaya ayrılan telsiz cihaz ve donanımına ait bildirimler yapılmaktadır.

8.İzmir Metropol Alan dışındaki Çevre Belde-Belediye ve Köylerdeki Faaliyetler

2012 yılında, 5216 sayılı yasa çerçevesinde, kurumumuzun görev alanında bulunan "İzmir Anakent Scada Sistemi"ne dahil olacak 30 adet ilçe, belde ve belediyelerde; kuyu, depo, pompa istasyonu, pompa gibi tüm dağıtım elemanları hakkında bilgi sahibi olmak için daha önce yapılan arazi çalışmaları güncellenmiştir.

Arazi çalışmaları ışığında elde edilen bilgiler sayesinde tüm yerleşim bölgelerinin şebeke analizleri yapılmakta, bilgileri işlenmekte ve su dağıtım krokileri CAD ortamında bilgisayara aktarılmaktadır.

Bu sayede yerleşim bölgelerinin su temin, dağıtım ve isale hatları hakkında bilgi sahibi olunmakta ve hem birim içi hem de İdaremiz birimlerinin kullanımına açılmaktadır.

9.Mal ve hizmet satın alınması ve yürütülmesi

≠ Su isale ve dağıtım hatları üzerinde ekiplerce yapılan çalışmalarda kullanılmakta olan kimi cihaz ve makinelerin sağlıklı çalışır halde tutulması amacıyla "Muhtelif Cihaz ve Makine Bakımı" işi,

≠ Birimimizde bulunan ve Halkapınar'daki tüm birimlerin evrak, form, tablo, vb. gibi kayıtların çoğaltılması amaçlı kullanılan baskı makinesinin sağlıklı çalışır halde tutulması amacıyla "Baskı Makinesi Bakımı" ve "Plan kopya makinesi" işi,

≠ Halkapınar'da kurulu bulunan Scada binasının enerji beslemesinde kullanılmakta olan jeneratörün periyodik ve arıza giderici bakımı amacıyla "Scada Sistem Binası Jeneratörü Bakımı" işi,

≠ Birim çalışmalarında ihtiyaç olan hazır betonun ihale yoluyla temini amacıyla "Hazır Beton Temini" işi,

10.Yazı İşleri Faaliyetleri

Birim içi ve birimler arası yazışmaların hazırlandığı, bilgisayar ortamına aktarıldığı, gelen ve giden evrakların kayıt altına alındığı, ilgili yerlere ulaştırılmasının sağlandığı, yazışmaların takibinin yapıldığı ve evrakların tasniflenerek dosyalandığı birimdir.

≠ Personel bilgilerinin güncelleştirilerek saklanması,

≠ Fazla mesai ve pazar çalışmalarının Genel Müdürlüğe olur'a gönderilmesi,

≠ İZSU çalışmaları esnasında kırılan beton zeminlerin onarımı amacıyla İzbeton' dan tedarik edilen beton alımlarının dosyalanması,

≠ İZSU çalışmaları sırasında kırılan asfalt zeminlerin düzeltilmesi amacıyla adres ve alan bilgilerinin raporlanıp Aykome Servisine bildirilmesi.

≠ Şebeke bakım ve tamir ekiplerinin yaptığı, bağlantı, tamir, döşeme arıza gibi işlerin ve bu işlerde kullanılan malzemelerin giriş ve çıkışlarının bilgisayar ortamına aktarılması.

≠ Günlük yapılan hafriyat çalışmalarını, su kesintilerinin ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi.

≠ Gerekli durumlarda faks yolu ile iletişimin sağlanması, işletmede kullanılan veya ihtiyaç duyulan belge ve evrakların fotokopi cihazı ile çoğaltılması

≠ faaliyetleri arasındadır.

Evrak Kayıt ve Takip programı verilerine göre, 2012 yılında gelen ve giden evrak olarak 2030 adet evrak işlem görmüştür.

YERALTI SUYU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen faaliyetleri, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Yeraltı Suyu Üretim Şube Müdürlüğü; görev kapsamındaki faaliyetlerin benzerlerini, sırasıyla, Su ve Kanal Daire Başkanlığı, Su İşletme Daire Başkanlığı, İşletme ve Bakım Daire Başkanlığı bünyesinde yürütmekteydi.

Son olarak; 19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Su Tesisleri Daire Başkanlığının görev tanımı ve bağlı birimleri değiştirilerek yeniden organize edilmiş ve Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı birim olarak görev yapmakta olan Su Üretim Şube Müdürlüğü, görev kapsamı genişletilerek ve Yeraltı Suyu Üretim Şube Müdürlüğü adıyla Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.

19.04.2007 tarih ve M.35.0.İBB.5.01-21/243 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen görevler doğrultusunda hizmet yürütmektedir. Bu doğrultuda şu hizmetleri yürütmektedir:

≠ İzmir'e yeterli ve düzenli olarak içme suyunun yeraltı suyu aküferlerinden üretimini yapmak, bu amaçla Göksu, Sarıkız, Menemen Acil ve Çavuşköy kuyularını işletmek, yeraltı suyu beslenme ve boşalım ilişkilerini dengede tutabilmek için statik ve dinamik su seviyelerini kontrol altında tutmak.

≠ İzmir'e su temini amaçlı Manisa'da ki Göksu Pompa İstasyonu ile Menemen'deki Yahşelli Pompa ve Acil Pompa İstasyonlarını işletmek, ilgili tüm tesislerdeki mevcut pompaların ve motorların Kurum içi paydaş birim olan Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Elektrik ve Pompa İstasyonları Şube Müdürlüğü tarafından yapılması gereken gerekli bakım ve onarımların takip etmek ve arızayı 'Arıza takip programı' ile kendilerine bildirerek giderilmesini sağlamak,

≠ İçme suyu üretim kaynaklarını dengeli ve idareli bir şekilde kullanımını sağlamak ve ileriye dönük planlamalarını yapmak.

≠ TS 266 ya uygun su üretiminin sağlanması açısından kaynakların işletme düzenini belirleyerek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

≠ Su üretimine yönelik İşletme sahalarındaki enerji nakil hatları ile yüksek gerilim hatlarının tamir, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırtmak.

≠ Sarıkız Kuyuları İşletme Birimi ile Çullu Arsenik Arıtma Tesisi arasındaki Ø1850mm isale hattı, Yahşelli Pompa ile Çullu Arsenik Arıtma Tesisi arasındaki Ø2200mm isale hattı, Göksu Pompa İstasyonu ile Çullu Arsenik Arıtma Tesisi arasındaki Ø1850mm lik isale hattı, Menemen Acil Pompa İstasyonu ile Petkim Pompaj Birimi arasındaki isale hattı, Menemen Acil Pompa İstasyonu ile Acil-Çavuşköy Kuyuları arasındaki Ø1000mm lik isale hattı ve Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi ile Makine Dairesi arasındaki Ø1000mm lik isale hattının daimi olarak periyodik kontrolünün yapılması, isale hatlarında meydana gelen arızaları ve isale hatları koruma alanı içerisinde herhangi bir işgal veya tecavüz olması halinde (tarım çalışmaları, tel örgü çekilmesi, bina yapımına teşebbüs, v.b.) Daire Başkanlığı bünyesindeki iç paydaş birim olan Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesini sağlamak,

≠ İzmir'e bağlı çevre ilçe, belde ve köylerdeki su kuyuları çıkışlarına, su üretiminin takibi amacıyla debimetre montajlarını yapmak, kuyuların iyileştirilmesine yönelik inkişaf ve kuyu kütüklerinin oluşturma çalışmalarını yürütmek,

≠ Bağlı tüm tesislerin elektrik tüketimlerini, aktif-reaktif oranlarını kontrol ve takip etmek,

≠ Gerektiğinde Petkim pompa istasyonunu işletmek,

≠ Arsenik arıtma tesisleri olan Manisa'daki Çullu, Menemen Acil ve Halkapınar arsenik arıtma

tesislerini işletmek, bu tesislerdeki tüm ekipmanlarının tamir, bakım ve onarımlarını yaptırtmak,

≠ İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan doğal kaynak suları ve tesisleri ile ilgili yasadan doğan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gereken tüm iş ve işlemleri yürütmek,

≠ Doğal kaynak suları ile ilgili yasal mevzuatları takip ederek gereğini yapmak,

≠ Doğal kaynak sularını kiraya verme işlemlerini ve süreçleri takip etmek, bu konuda gerekli ihale dosyalarını ve şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,

≠ İZSU'ya yapılmış veya yapılacak olan kaynak suyu kiralama ile ilgili başvuruları değerlendirmek ve takibini yapmak,

≠ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Harcama Yetkilisi ile birlikte Gerçekleştirme Görevlileri olarak stratejik plan, performans programı, analitik bütçe ve iç kontrol mekanizmasını yürütmek,

≠ Taşınır Mal Yönetmeliğine göre tüm malzemeleri ve demirbaşları takip etmek, Müdürlük faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ihtiyacını belirlemek, bu malzemelerin asgari stokunu oluşturmak ve bu amaçla malzeme ve ekipmanın teknik şartnamelerini hazırlayarak satın alınmasını sağlamak,

≠ Kuyular, Pompa İstasyonları, Arsenik Arıtmalar, Doğal Kaynak Suları ile İsale Hattı ve depoların bakım ve onarımı ile ilgili Teknik Şartname ve yaklaşık maliyetleri hazırlamak,

≠ İhale Komisyonlarında görev almak ve ihaleli sözleşmeleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

≠ 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında İş ve İş güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak, kontrol etmek ve uygulanmasını sağlamak,

≠ Müdürlük bünyesinde kullanılan hizmet amaçlı, araç ve iş makinelerinin verimli, ekonomik ve hatasız kullanımını sağlamak, akaryakıt kontrollerini takip etmek, her türlü bakım ve onarımını yaptırmak ve çalışır durumda tutmak,

≠ Bu görevler kapsamında gerekli birimler arası koordinasyonu sağlamak.

≠ Bağlı bulunduğu Daire Başkanının ve üst Makamların vereceği diğer işleri yapmak.

2012 YILI FAALİYETLERİ

1. Yeraltı suyu üretim kaynakları ile bu hatlar üzerindeki tesislerin izlenmesi

Kapsam içindeki Derinkuyu, pompaj, depo, kontrol elemanları ekiplerce izlenmektedir. Bu amaçla Scada sistemi etkin şekilde kullanılmaktadır.

İzlenen Yeraltı İçme suyu Kaynakları

Sarıkız Kuyuları



Manisa il sınırları içerisindeki Saruhanlı yakınlarında mevcut 35 adet aktif derin kuyunun sağladığı su, Çullu Arsenik Arıtma Tesisi Ham su deposuna dökülmektedir. Çullu Arsenik Arıtma Tesisi 5000 m³ lük Arıtılmış Su deposundan çıkan su, Yahşelli terfi pompa istasyonuyla pompalanarak, 1850 ve 2200 mm. çaplı 98 kilometre uzunluğundaki isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.

Göksu Kuyuları

Manisa il sınırları içerisindeki Göksu bölgesinde mevcut toplam 22 adet aktif derinkuyunun sağladığı su, pompalanarak Çullu Arsenik Arıtma tesisindeki Ham su deposuna dökülür. Arıtma sonucu üretilen su Çullu Arsenik Arıtma içerisindeki arı su deposundan 70 kilometre uzunluğundaki isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.





Göksu Kuyuları

Menemen Acil Kuyuları

İzmir-Menemen ilçe sınırları içerisinde 20 adet aktif derin kuyudan üretilen su, Menemen Acil Arsenik Arıtma tesisine gelerek arsenik arıtma işlemine tabi tutulmaktadır. Arıtma çıkışı su, Menemen Acil pompa istasyonunda pompalanarak 35 kilometre uzunluğundaki 1000 mm. çaplı isale hattı üzerinden kente ulaştırılmaktadır.

Çavuşköy Kuyuları

Menemen derin kuyularına yakın bir bölgede bulunan toplam 12 adet derin kuyunun sağladığı su, Menemen Acil Arsenik Arıtma tesisinde Menemen derinkuyularının ürettiği su ile birleşmektedir.

Halkapınar Derinkuyuları

Kent içinde eski bir göl alanı içinde bulunan 19 adet aktifderinkuyunun ürettiği su arıtma tesisinden geçirilip, klorlanarak yine bu havza içindeki pompa istasyonlarında İzmir şehir şebekesine pompalanmaktadır. 6 adet yeni açılan kuyu yedek amaçlı bekletilmektedir.

Bunun yanında yeni yapılanma çerçevesinde genişleyen İZSU hizmet alanındaki yerleşim yerlerinde bulunan yeraltı suyu üretim kaynakları, izleme kapsamına alınmıştır.

2. Yeraltı suyu kaynakları ile tesislerin kontrolü

İzlenen yeraltı suyu kaynakları ile tesislerin çalışma süreleri, enerji tüketimleri, arızaları kayıt altına alınmaktadır. Rasat kuyuları vasıtasıyla havza durumu periyodik olarak kontrol edilmektedir. Bu kontrollere derinkuyu ve pompajlardaki elektriksel arızalar da dahildir.

3. Yeraltı içme suyu kaynaklarının planlaması

İhtiyaca uygun olarak; üretim kaynakları devreye alınmakta veya devreden çıkarılmakta olup değişen durumlar karşısında ilgili pompajlarda bu duruma uygun düzenlemeler yapılmaktadır. Program dahilinde kuyular dinlendirilmekte ve bakıma alınmaktadır.

4. Yeraltı içme suyu kaynaklarının işletilmesi

İzleme ve kontrol faaliyetleri ile kaynak planlamasına uygun yapıda işletme gerçekleştirilmektedir. İşletme kayıtları günlük raporlar şeklinde tutulmaktadır.

5. Yeraltı suyu Arsenik Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

Kente, daha sağlıklı ve arsenik miktarı Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği sınırlar içerisinde su verebilmek için kurulan Arsenik Arıtma Tesislerinin işletimi yapılmaktadır.

Arsenik Arıtma Nedeni

Küresel ısınma ve kuraklığa bağlı olarak yer altı sularında arsenik konsantrasyonu artmıştır.

Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütünün almış olduğu karara göre içme suyundaki kabul edilebilir arsenik konsantrasyonu 10 µg/l' nin altına indirilmiştir.

İZSU da büyük bir hızla bu sorunu çözmek için 3 büyük arsenik arıtma tesisini işletmeye almış bulunmaktadır.

Genel Arsenik Arıtma Prensibi

Tesislerimizde uygulanan arsenik arıtma basamakları kısaca şöyle sıralanabilir;

- Ön klorlama
- Koagülasyon
- Filtrasyon

Ön klorlama

İki amaçla yapılmaktadır.

Dezenfeksiyon: sağlık açısından zararlı olan patojen mikroorganizmalar etkisiz hale getirilir.

Oksidasyon: Arseniğin içme suyundan başarılı bir şekilde arıtılması, Arsenitin (As (III)) Arsenata (As(IV)) oksitlenmesi ile sağlanır. Bu amaçla arıtma tesislerinin üçünde de ön klorlama prosesi uygulanarak oksidasyon işlemi gerçekleştirilir.



Koagülasyon

Ön klorlamadan sonra arseniğin filtre edilebilir hale gelmesi için koagülant kimyasalı Demir (III)klorür kullanılır.

Filtrasyon

Suyun içindeki arsenik koagülant uygulamasından sonra, multi mineralle doldurulmuş filtre tanklarında tutulur. Arıtılmış su şebekeye verilerek kullanıma sunulur.

Manisa Göksu ve Sarıkız, Halkapınar ve Menemen Acil kuyuları için 2008 yılı Ağustos ayı içinde inşalarına başlanan toplam 3 Arsenik Arıtma Tesisi 2008 Aralık ayında devreye alınmıştır.

Çullu Arsenik Arıtma Tesisi

Yapımı biten Çullu Arsenik Arıtma Tesisi 3000 l/s kapasitesiyle dünyanın en büyük arsenik arıtma tesisidir.Filtre binasında 32 grup (yonca) toplamda 128 tane Filtre tankı mevcuttur.

2012 yılında Çullu Arsenik Arıtma tesisinde arıtılmış su üretimi 53.627.990 m^3/yıl olmuştur.



Ayrıca 6 adet Filtre tankı ile önfiltrasyon yapılmaktadır. Filtre tankları 7 katmandan oluşan multimedya mineral ile doldurulmuştur. Filtre Binasında arıtılmış su mevcut 5000 m^3 depoya gönderilmektedir. Buradan da su cazibeyle Yahşelli depoya gelerek şebekeye verilir. Filtreler belli süre serviste kaldıktan sonra önce ters yıkama sonra da durulama yapılır. Bu işlemler için kullanılan su miktarı çok büyük olduğu için suyun geri kazanılması gerekmektedir. Tek damla su kaybı olmadan Atık Su Arıtma Prosesi uygulanır.

Çamur, susuzlaştırma işlemlerine tabi tutularak dekantör binasına gönderilir. Dekantör ile çamurdan uzaklaştırılan su Geri Yıkama havuzuna gelir.



Durulama Suyu Küçük Filtre Binasında bulunan 3' erli 2 Grup Filtre Tankından geçirilerek ön arıtmaya uğratılır. Su daha sonra Ham su deposuna verilerek sisteme geri kazanılmış olur.

Çullu Arsenik Arıtma tesisinde su üretimi sonucunda oluşan çamur miktarı yıllık yaklaşık 1200 tondur. Bu çamur, yapılan analizlerce tehlikeli atık sınıfına girmediği için Harmandalı Çöp Alanına dökülmektedir.



Tesisin Verimi:

WHO'nun arsenik konsantrasyonunu 10 ppb'nin altına çekmesiyle devreye giren Çullu Arsenik Arıtma Tesisinin arsenik konsantrasyonu yıllık ortalama 5,0 ppb nin altındadır.

Mevcut ölçüm cihazları ile üretilen suyun kalitesi tesisin verimli çalışıp çalışmaması açısından kontrol edilmektedir. Ayrıca 2012 yılı sonunda online arsenik ölçüm cihazı alınmıştır. Tesiste üretilen sudaki arsenik konsantrasyonu saatlik olarak ölçülmekte ve scada sistemine aktarılmaktadır.

Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi

Halkapınar kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi 1000 l/s kapasiteyle devrededir. Halkapınar Arsenik arıtma tesisinde arıtılan su üretimi 2012 yılı içerisinde 31.128.709 m^3/yıl dır.

Ham su Deposu: 60 m^3

Filtre Tank Sayısı: 22 Adet

Servis Pompası: 4 Adet

Yıkama Pompası: 1 Adet

Blower: 1 Adet

Tesisin çalışma prensibi Çullu Arsenik Arıtma tesisinin hemen hemen aynıdır.

Farklar:

a) Filtre Tankları 5 multimedya katmandan (4 Kat Quarz ve 1 kat Antrasit) oluşmaktadır.

b) Ters Yıkama yapmadan önce tanklar Blower'la havalandırılıp akışkan hale getirilmektedir.

c)Geri Yıkama suyu kanalizasyon şebekesine verilerek Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılması sağlanmaktadır. Geri yıkama sularının tesise geri döndürülmesi için çamur susuzlaştırma ünitesi kurulması proje çalışmaları başlatıldı.

d) Arıtılmış suya ham sudan bir miktar karışma vardır. Bu minumuma indirilmektedir.

Bu koşullarda çalışmakta olan arsenik arıtma tesisi arıtılmış su arsenik konsantrasyonu yıl boyunca 5 ppb'nin altında ortalama 3-4 ppb dir.

Menemen Acil Arsenik Arıtma Tesisi

Menemen acil arsenik arıtma tesisinin genel özellikleri:

Kapasite: 600 l/s .

2012 yılı içerisinde, Menemen Acil Arsenik arıtma tesisinde arıtımış su üretimi 17.103.272 m^3/yıl dır.

Ham su Deposu: 400 m^3

Filtre Tank Sayısı: 14 Adet

Servis Pompası: 3 Adet

Yıkama Pompası: 1 Adet

Blower: 1 Adet

Filtre Binasında toplam 14 Tank bulunmaktadır. Bu filtreler de Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisindeki Tanklarla aynı özellikleri taşırlar. Arıtılmış su Filtre Tanklarından, önce Arıtılmış su deposuna sonrada şebekeye verilmektedir. Tesisin Geri yıkama suyu Pompa Binası yanındaki küçük depoda biriktirilip daha sonrada kanalizasyon sistemine verilerek Menemen Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılması sağlanmaktadır.



Tesis Verimi:

Tesis arıtılmış su arsenik değerleri diğer arsenik arıtma tesislerinde olduğu gibi standartların üstüne çıkmamıştır ve tesis sağlıklı çalışmaya devam etmektedir. Tesisteki tanklar içinde mevcut antrasit seviyelerinde belli oranlarda antrasit azalması görüldüğü için seçilen 4 filtre tankına antrasit eklemesi yapılmış, 2013 yılı içinde de kalan tanklarla Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi filtre tanklarına alınacak olan yaklaşık 30.000 litre antrasit eklemesi yapılacaktır.

Menemen Acil Arsenik arıtma tesisi 2012 arsenik değerleri, ortalama 5 ppb'dir.

6. İsale ve toplama hatlarının işletilmesi

Toplama, İsale ve Ana Dağıtım Hatları

Kuzey Kaynakları diye adlandırılan İzmir metropol alan dışında Manisa ili ile Aliağa ve Menemen ilçeleri civarındaki su tedarik kaynakları Sarıkız, Göksu, Menemen ve Çavuşköy pınarlarıdır.

Sarıkız pınarlarında kurulu derinkuyu pompaları ile yeraltından çekilen su toplama hatları ile kendi bölgesindeki depolarda toplanıp 1850 mm. çaplı bir isale hattı ile Çullu Arsenik Arıtma hamsu deposuna cazibe ile aktarılmaktadır.

Göksu pınarlarında yeraltından çekilen su da toplama hatları ile toplanmakta ve Göksu'da kurulu pompa istasyonu yardımıyla 1850 mm. çaplı bir isale hattı ile Çullu Ham Su deposuna pompalanmaktadır.

Sarıkız ve Göksu'da yeraltı suyunun genel seviyesi, uygun yerlerde açılmış 4 adet rasat kuyusu (Sarıkız'da 3, Göksu'da 4 adet, Menemen'de 4 adet) ile izlenmektedir.

Çullu Arsenik Arıtma tesisinde arsenikten arındırılan su, 2200 mm. çaplı isale hattı ile Menemen'deki Yahşelli pompa istasyonuna cazibe ile aktarılmaktadır. Bu pompa istasyonunda basılan su, 2200 mm. çaplı borular ile Karşıyaka bölgesindeki Cumhuriyet deposuna ulaştırılmakta, depo seviyesine uygun olarak ya depoda biriktirilmekte ya da ihtiyaç halinde Halkapınar'daki 55,000 m³ kapasiteli depoya aktarılmaktadır.

Menemen ve Çavuşköy derinkuyularından üretilen su, toplama hatları ile Menemen Acil Arsenik Arıtma tesisine gelmektedir. Menemen Acil pompa istasyonunun bastığı su, Sarıkız-Göksu hattına paralel çalışan 1000 mm. çaplı bir isale hattı ile Cumhuriyet depoya ve/veya Alsancak bölgesine aktarılmaktadır.

Altyapıya uygun olarak isale ve toplama hatları devreye alınmaktadır.

7. Pompa istasyonlarının işletilmesi

İZLENEN POMPA İSTASYONU	MOTOPOMP SAYISI
Göksu pompaj	6
Menemen Acil pompaj	5
Yahşelli pompaj	6
Petkim pompaj	5
Çullu Arsenik Arıtma Tesis Pompaj	11
Menemen Arsenik Arıtma Pompaj	3
Halkapınar Arsenik Arıtma Pompaj	4

Kapsam içerisindeki pompa istasyonları usulüne uygun olarak devreye alınmakta ve devreden çıkarılmaktadır. Pompa istasyonlarındaki motopompların seçimi de bir planlama çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.





Göksu Pompaj





Menemen Acil Pompaj



Yahşelli Pompa İstasyonu

8.Depoların işletilmesi

İZLENEN DEPOLAR	DEPO SAYISI
Sarıkız Toplama depoları	3
Çullu Arsenik Hamsu Depo	1
Çullu Arsenik Arıtma Arıtılmış su deposu	1
Yahşelli depo	1
Menemen Acil Arsenik Arıtma tesisi Hamsu depo	1
Menemen Acil Arsenik Arıtma Temizsu depo	1
Halkapınar Arsenik Arıtma Ham su depo	1

İsale ve toplama hatları üzerindeki denge ve toplama depoları hatlar çalışırken dikkatle izlenmekte olup deponun taşması su kaybına, deponun boşalması pompaların susuz kalmasına neden olacağından bu durumu önleyecek tedbirler alınmaktadır. Seviye ölçüm cihazları ile mevcut arıtma tesisleri scada sistemine aktarılan bilgiler saatlik raporlanmakta 24 saat çalışan bu tesisler operatörler tarafından takip edilmektedir.

<1 **Ekipmanın işletimi**

İsale hatları üzerindeki vana, vantuz gibi ekipmanın işletimi, manevraları ile İsale hatları üzerindeki vana, vantuz gibi ekipmanın işlerlik kontrolü yapılmakta ve suyu yönlendirmek ya da kontrol etmek amaçlı manevralar gerçekleştirilmektedir.

Farklı çaplarda kullanılan vanalar ile suyun hareketine yön verilmekte ve suyun istenen şekilde akışı sağlanarak su trafiği yönlendirilmektedir. (Aç-kapa vanalar, elektronik aktüatörlü vanalar, elektrikli vanalar, vb.) Özellikle isale hatları üzerindeki vana uygulamaları, dikkatli ve açılma/kapanma süreleri ile ilişkili olarak gerçekleştirilmektedir.

Vantuzlar; değişik yollarla boru içerisine giren havanın dışarı atılmasını (hattın doldurulması), tersine olarak yeterli miktar havanın içeri alınmasını (hattın boşaltılması) sağlayan elemanlardır. Bu sayede boruyu, iç/dış basınç farkından kaynaklanabilecek patlama, büzülme gibi olumsuz sonuçlardan korur ve aynı zamanda boru içerisindeki suyun hareketini kolaylaştırırlar. Genel olarak isale hatları üzerinde ve boru hatlarının yüksek kodlu noktalarında bu görevleri icra etmektedirler. Arıza veya bakım nedenleriyle hatların boşaltılması ve doldurulması işlemleri; vantuzların hava atma ve hava alma kapasitelerine bağlı olarak dikkatli ve özenli bir çalışma gerektirmektedir.

10. İsale hatları ile tesislerin bakımı

Müdürlük bünyesindeki pompa istasyonlarının bina bakım ve onarımı ile pompaların yenilenmesi ve revizyonu yapılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan faaliyetler, özetle:

1)Hatlar boyunca yüzeye çıkan su olup olmadığının kontrolü,

2)Hatlar üzerinde yük oluşturacak türden yapılaşma, moloz, vb. olup olmadığının kontrolü,

3)Hatlar üzerindeki dolgu malzemesi kaybı olup olmadığının kontrolü,

4)Dere, yol geçişlerindeki boruların gözle kontrolü,

5)Hatlar üzerindeki rögarların ve rögar kapaklarının kontrolü,

6)İsale hatları üzerindeki vantuzların çalışıp çalışmadığının kontrolü,

7)Rögarların kontrolü

8)Tüm yukarıdaki kontroller sonucu görülen olumsuzlukların iç paydaş birim olan Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğüne haber verilmesi olarak sayılabilir.

11. Yer altı kuyularının sağlıklı kütüklerini oluşturmak ve inkişaf işleri

Kuyularda gözlemlenen oksitlenme, bakteri oluşması, kuyu tabanının kumla dolması, filtrelerde ve çakıl bantında kirlenme ve siltlenme gibi nedenlerle kuyu içerisine su girişinin azalmasına bağlı gereksinim duyulan kuyularda inkişaf işleminin yapılması ve kuyu kütüklerinin oluşturulması amacıyla inkişaf yapılmaktadır.

Bu proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Urla kuyularından sonra Menemen ve Aliağa Kuyularının çıkışına 14 adet debimetre takılmıştır. Ayrıca çevre ilçelerden gelen taleplere göre 54 adet kuyunun daha inkişafı yapılmaya başlanmıştır. İşler 2013 yılında devam edecektir.







İnkişaf İşlemleri

12. Ambar hizmeti

2012 yılında planlanan mal alımları sonucu malzeme, araç ve gereçler alınarak Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı ambarında depolanmaktadır. Gerektiğinde ambardan ihtiyaç kadar malzeme çekilmektedir.

13. Mal ve hizmet satın alınması ve yürütülmesi

Çullu, Menemen ve Halkapınar arsenik arıtma tesisleri için personel temini işi 24.06.2012 tarihinde tamamlanmış, Muayene ve Kabul işlemleri bitirilmiştir.

Çullu Arsenik arıtma tesisi geri yıkama ünitesi için yedek dekantör alımı yapılmış, çamur transferi için yeni bir kamyon alınmıştır.

Menemen Acil ve Halkapınar Arsenik Arıtma tesislerine 2 adet yedek Klornatör alımı yapılıp montajları tamamlanmıştır.

Menemen Acil Arsenik arıtma tesisinde 4 adet tanka antrasit ilavesi yapılmış, Halkapınar ve Menemen Acil Arsenik arıtma tesisinde kalan tanklara da antrasit eklemesi yapmak için 2013 yılında alıma çıkılmasına karar verilmiştir.

Arsenik Arıtma Tesisleri için toplu olarak değişik çaplarda kelebek vana ve contası ile vanalara uygun aktüatörler ve konpanzatörler alınmıştır.

Sarıkız ve Göksu Kuyularını besleyen hatlardaki Yüksek Gerilim Ayırıcılarının yenilenmesi ihalesi kapsamında 6 adet ayırıcı ve 6 adet parafudur yenilenmiştir.

2012 yılı içinde müdürlüğe bağlı birimlerde kullanılacak elektrik ve hırdavat malzemeleri alımları da yapılmıştır.

Gea Marka dekantörün yıllık ve 6 aylık bakımları ve yedek parça alımları gerçekleştirilmiştir.

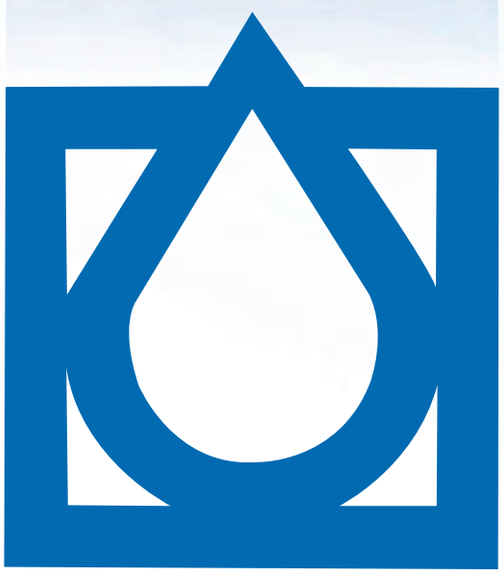

İZSU

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İZSU Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü' nün kuruluşu hakkındaki 2560 / 3009 Sayılı Kanuna eklenen 3305 Sayılı Kanun, 23.03.1987 tarih ve 1941 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 01.03.1987 tarih, 87 / 11594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Alan içinde " Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini " yürütmek üzere 01.04.1987 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 19.04.2007 tarih 21/243 sayılı kararı ile Genel Müdürlüğümüzün teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur.

Daire Başkanlığının görevi kapsamındaki işler;

5216 sayılı yasa ile tanımlı Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm yerleşimlerin atıksu kollektörleri ve ana kuşaklama kanalları ile imalatı tamamlanmış olan her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi ve yağmursuyu kanalları ve derelerin bakım, onarım ve temizliğini, atıksu, yağmursuyu ve derelerdeki sirkülasyon pompalarının bakım ve onarımını periyodik olarak yapmak,

Atıksuyun aboneden arıtma tesislerine, yağmur sularının da toplama noktasından alıcı ortama ulaşmasını sağlamak için gerekli her türlü iyileştirme ve yenileme imalatını yapmak veya yaptırmak,

Daha önceki yıllarda yapımı tamamlanan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında meydana gelen arızaları gidermek, yenilemek, şikayet veya taleplerin gerektirdiği ilave imalat veya yenilemeyi yapmak veya yaptırmak,

Kanal Açma ve Vidanjör Araçları ile abonelerin rabıt tıkanıklığını açmak, fosseptik çekim hizmetini yürütmek,

Kanal araçlarının alt ve üst aksam ve ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

Atıksu veya yağmursuyu hatlarını sürekli çalışır halde tutmak ve bunun için İdarenin diğer Daire Başkanlıkları ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

İdare imkanları dahilinde yapılamayan ve ihale edilmek suretiyle yapılabilecek işlerin tespitini yapmak, ön inceleme raporunu düzenlemek ve bu durumu ilgili Daire Başkanlıklarına bildirmek ve ihale yada satın alınmasını sağlamak,

İştevzi birimleri ve 185 Arıza Kayıt Servisinden gelen kanal arızalarının takip edilmesi, ekiplere yönlendirilmesi, giderilmesi ve yapılan işlerle ilgili istatistiki çalışmaları yürütmek,

Altyapı yapan kurum, kuruluş ve üçüncü şahısların kanalizasyon şebekesi ve diğer sistemlere verdiği hasarları tutanak altına almak, oluşan hasar bedellerini ilgililere rücu ettirmek amacıyla gerekli verileri ilgili Daire Başkanlığı'na bildirmek,

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş ve işçi güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak ve kontrol etmek,

Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılan hizmet ve iş araçlarının verimli, ekonomik ve hatasız kullanımını temin etmek için kontrol yapmak,

Elektrik, mekanik arızalara müdahale ederek sistemi sürekli çalışır halde tutmak, pompa montaj ve revizyonlarını yapmak,

Atıksu pompalarının elektrik tüketimlerini (aktif reaktif oranları) kontrol altında tutmak,

Pompa tesis binalarının bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, (İZSU Genel Kurulunun 18.05.2012 tarih, M.35.1.İBB.5.01-50.01.04/08 sayılı kararı ile değişikliği uygun görülmüştür.)

Daire Başkanlığının görev kapsamındaki işlerin ihale edilmek suretiyle yaptırılması durumunda; Her türlü bakım, onarım iyileştirme ve gerektiğinde yenileme yatırımları ile işletmenin ihtiyaç duyacağı diğer tesisler ile ilgili projeleri yapmak veya yaptırmak hususunda Projeler Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlandıktan sonra Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyetleri hazırlamak, ihalesi talep edilen imalat veya hizmet işlerine ait sözleşmeleri yürütmek,

Hakediş raporlarını tanzim etmek, kesin hesapları çıkarmak, geçici ve kesin kabul işlerini yapmak ve yürütmek, (İZSU Genel Kurulunun 18.05.2012 tarih, M.35.1.İBB.5.01-50.01.04/08 sayılı kararı ile değişikliği uygun görülmüştür.)

Tamamlanan işlerin iş sonu projelerini hazırlamak ve onayladıktan sonra kopyasını ilgili Daire Başkanlıklarına göndermek,

Derelerin körfeze çıkış ağızlarının temizliği amacıyla körfez içinde açılacak akış kanalları inşaatlarını yaptırmak ve körfezdeki su sirkülasyonunu sağlamak,

Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.

Yönetim Kurulumuzun 29.03.2012 tarih 224 sayılı kararı ile Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı teşkilat yapısı yeniden düzenlenerek “Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü” kurulmuştur.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı; Kanal Bakım Şube Müdürlüğü, Atıksu Pompa Tesisleri Şube Müdürlüğü ve 2012 yılı Mart ay’ında kurulan Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü adı altında 3 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Kanal Bakım Şube Müdürlüğü Görev Ve Sorumlulukları

5216 sayılı yasa ile tanımlı Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm yerleşimlerin atıksu kollektörleri ve ana kuşaklama kanalları ile imalatı tamamlanmış olan her çap ve kesitteki kanalizasyon şebekesi ve yağmursuyu kanallarının bakım, onarım ve temizliğini periyodik olarak yapmak,

Atık suyun aboneden arıtma tesislerine, yağmur sularının da toplama noktasından alıcı ortama ulaşmasını sağlamak için gerekli her türlü iyileştirme ve yenileme imalatını yapmak veya yaptırmak,

İşletme ömrünü tamamlamış veya her hangi bir nedenle çalışmaz hale gelen kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını yenilemek,

Kanal Açma ve Vidanjör Araçları ile abonelerin rabıt tıkanıklığını açmak, fosseptik çekim hizmetini yürütmek,

Kanal araçlarının alt ve üst aksam ve ekipmanlarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

Atıksu veya yağmursuyu hatlarını sürekli çalışır halde tutmak ve bunun için İdarenin diğer Daire Başkanlıkları ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

Birimimize gelen şikayet ve talepleri yerinde inceleyerek tespit yapmak, şikayet ve taleplerin gerektiği ilave imalat ve yenilemeyi yapmak veya yaptırmak

İdare imkanları dahilinde yapılamayan ve ihale edilmek suretiyle yapılabilecek işlerin tespitini yapmak, ön inceleme raporunu düzenlemek birimimizce yada ilgili daire başkanlığınca ihale yapılması gerekirse işlemleri yapmak yada yaptırmak,

İştevzi birimleri ve 185 Arıza Kayıt Servisinden gelen arızaların takip edilmesi, ekiplere yönlendirilmesi, giderilmesi ve yapılan işlerle ilgili istatistik çalışmalarını yürütmek,

Altyapı yapan kurum, kuruluş ve üçüncü şahısların kanalizasyon şebekesi ve diğer sistemlere verdiği hasarları tutanak altına almak, oluşan hasar bedellerini ilgililere rucu ettirmek amacıyla gerekli verileri ilgili birimlere bildirmek,

Altyapı yapan kurum, kuruluş ve üçüncü şahısların yapacağı altyapı çalışmalarında kanalizasyon şebekesinin zarar görmemesi amacıyla gözlemci vermek,

Birimimiz bünyesinde kullanılan hizmet ve iş araçlarının verimli, ekonomik ve hatasız kullanımını temin etmek için kontrol yapmak,

görevlerini yürütmektedir.

Atıksu Pompa Tesisleri Şube Müdürlüğü Görev Ve Sorumlulukları

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisine tüm şehrin atıksularını Büyük Kanal vasıtasıyla iletimini sağlayan 4 ana pompa istasyonunda bulunan (Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli) 24 adet atık su pompasının elektrik, mekanik ve elektronik aksamlarında gelişen arızaların giderilmesi, ekipmanların günlük ve yıllık periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi, çalıştırılması, bakımı, onarımı ve sürekli işler halde tutulmasını sağlamak,

4 Ana pompa istasyonunun haricinde merkez ve çevre yerleşimlerdeki toplam 65 adet atıksu pompasının elektrik, mekanik ve elektronik aksamlarında gelişen arızaların giderilmesi, ekipmanların günlük ve yıllık periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi, çalıştırılması, bakımı, onarımı ve sürekli işler halde tutulmasını sağlamak,

Merkez ve çevre yerleşimlerde yer alan 7 adet yağmursuyu pompaları ile 13 adet altgeçitlerde yer alan pompaların elektrik, mekanik ve elektronik aksamlarında gelişen arızaların giderilmesi, ekipmanların günlük ve yıllık periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi, çalıştırılması, bakımı, onarımı ve sürekli işler halde tutulmasını sağlamak,

Merkezde yer alan derelerde koku ve kirliliği önlemek amacıyla kurulan sirkülasyon pompalarının elektrik, mekanik ve elektronik aksamlarında gelişen arızaların giderilmesi, ekipmanların günlük ve yıllık periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi, çalıştırılması, bakımı, onarımı ve sürekli işler halde tutulmasını sağlamak,

görevlerini yürütmektedir.

Dereler Bakım Ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü Görev Ve Sorumlulukları

İzmir ili mücavir alan sınırları içerisinde yer alan tüm derelerin daimi olarak akarlarını sağlamak amacı ile bakım, onarım ve temizleme çalışmalarını periyodik olarak yapmak,

Islahı yapılmış yada yapılmamış merkez ve ilçe belediyelerinde olmak üzere yaklaşık 213 adet derelerde olası taşkın riskine karşı gerekli müdahalenin önceden yapılabilmesi için rutin izleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek, bakım ve temizlik çalışmalarını ve programlarını yapmak,

Islah projeleri gerektiren alanlarla ilgili ön etüt çalışmalarını yürütmek, ilgili Daire Başkanlığınca ihale edilmesini sağlamak,

Acil müdahale gerektiren menfez geçişleri ile ilgili varsa ıslah projelerinde yer alan verilere yada yıllık yağış verileri esas alınarak gerekli imalatları gerçekleştirmek üzere ilgili Daire Başkanlığı'na bildirmek,

İzmir körfezi su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tarama ve izleme faaliyetlerini yürütmek,

İzmir körfezi su kalitesinin izlenmesi ve akıntı modellemesi amacıyla kurulan meteo-oşinografik gözlem sistemlerinden düzenli veri akışını sağlamak, istasyonların periyodik bakım ve onarımlarını yürütmek,

Müdürlüğümüze iletilen şikayet ve talepleri, yerinde tespit etmek, gerekli bakım , temizlik ve onarım çalışmalarını yapmak,

Faaliyetlerimiz kapsamında kullanılan hizmet, iş makineleri ve gemilerimizin verimli, ekonomik kullanımını temin etmek için bakım ve kontrollerini yapmak,

görevlerini yürütmektedir.

KANAL BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI

Arıza Takip Programı:

2012 Yılında birimimize gerek maximo programı üzerinden, gerekse HİM, Muhtarlar Masası yada diğer birim ve kurumlardan gelen 131.638 adet talep (Kanal çöküntüsü, bina kol tıkanıklığı, kanal temizliği, ızgara kırığı, ızgara tıkanıklığı, ızgara temizliği, baca kapağının kırılması, bina kolu bağlantısı, dere temizliği gibi) doğrultusunda arızalar ekiplerce giderilmektedir.



2012 Yılında İhaleli İşler Kapsamında;

İhaleli işler kapsamında Aliağa ilçesinde

751 Adet parsel bağlantısı yapılarak

7.365,25 m PVC boru döşenmiştir.

İZSU Ekipman ve Personeli ile;

878 adet parsel arızası giderilmiştir.



Aliğa İlçesi Parsel Bacası ve Bağlantısı Yapımı

Coğrafi Bilgi Sistemleri:

İzmir metropol sınırları içerisinde bulunan tüm atıksu ve yağmursuyu sisteminde oluşan arıza şikayetleri ile birimimizce tespit edilip düzenli periyotlarla bakım ve temizliği yapılan noktaların coğrafi bilgi sistemi programı üzerinden kayıt altında tutulması hedeflenmektedir. Bu amaçla kurumumuzca oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı altyapı çalışmalarına Daire Başkanlığımızca gerekli destek sağlanmış ve sistem için gerekli verilerin 2012 yılı itibariyle girişleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Çalışmalar tamamlandığında arıza şikayetleri harita üzerinde konumlandırılarak, geriye dönük sorgulama yapmada kolaylık sağlaması, yoğunluk haritalarının çıkarılabilmesi ve böylelikle çalışmalarımızdaki öncelik sıralamasının daha net ortaya konularak, vatandaş memnuniyetinin sağlanması hedeflenmiştir.

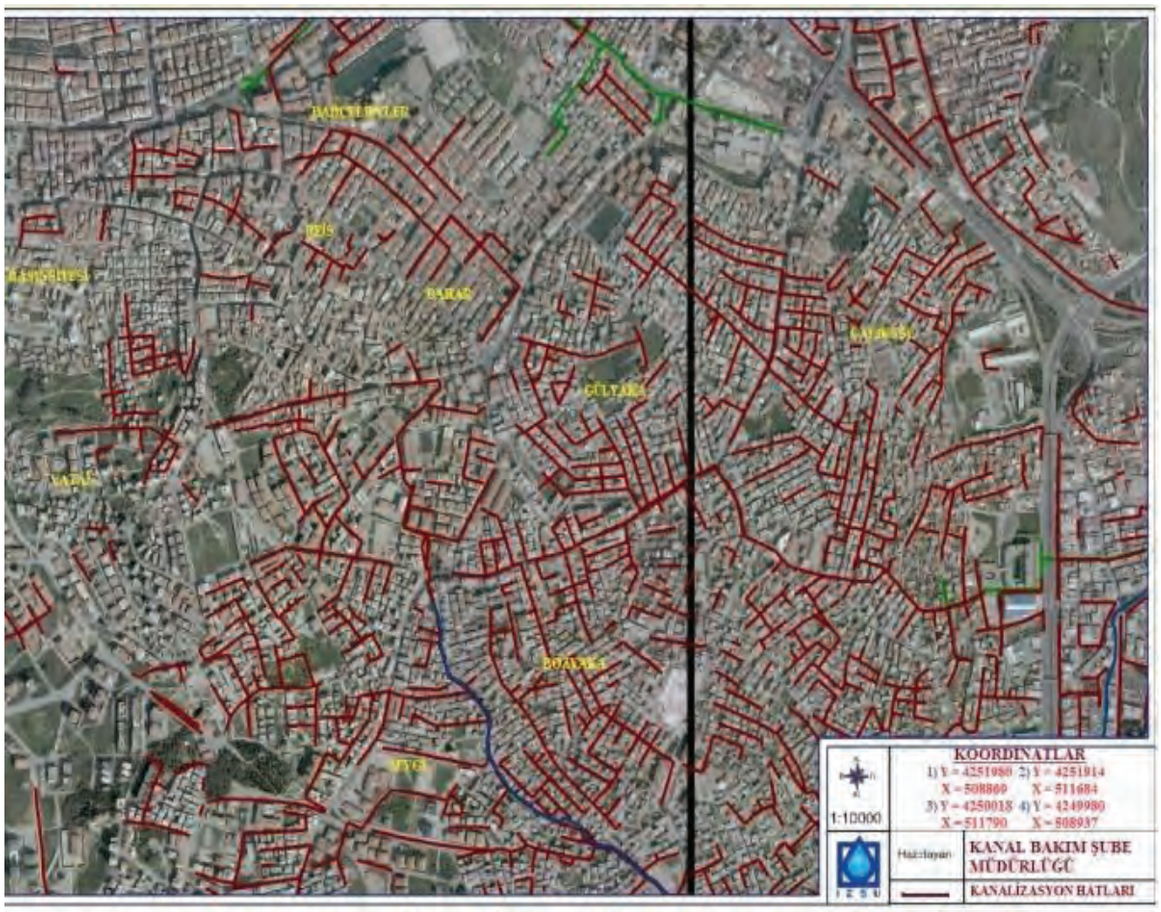

KARABAĞLAR BÖLGESİ KANALİZASYON HATLARI VERİLERİ

Proje Yönetimi Programı:

İdarece 2012 yılında oluşturulan Proje Yönetimi Programı çok kısa bir sürede kullanıma hazır duruma getirilmiştir.

29 adet muhtelif kapsamdaki ihaleli işlerin Proje Yönetimi Programına veri girişleri yapılmıştır. Bu sayede maliyet, yer ve raporlanmaları vs. tüm detaylar bazında takip edilmesi, geriye dönük sorgulanmasında kolaylık sağlamaktadır.

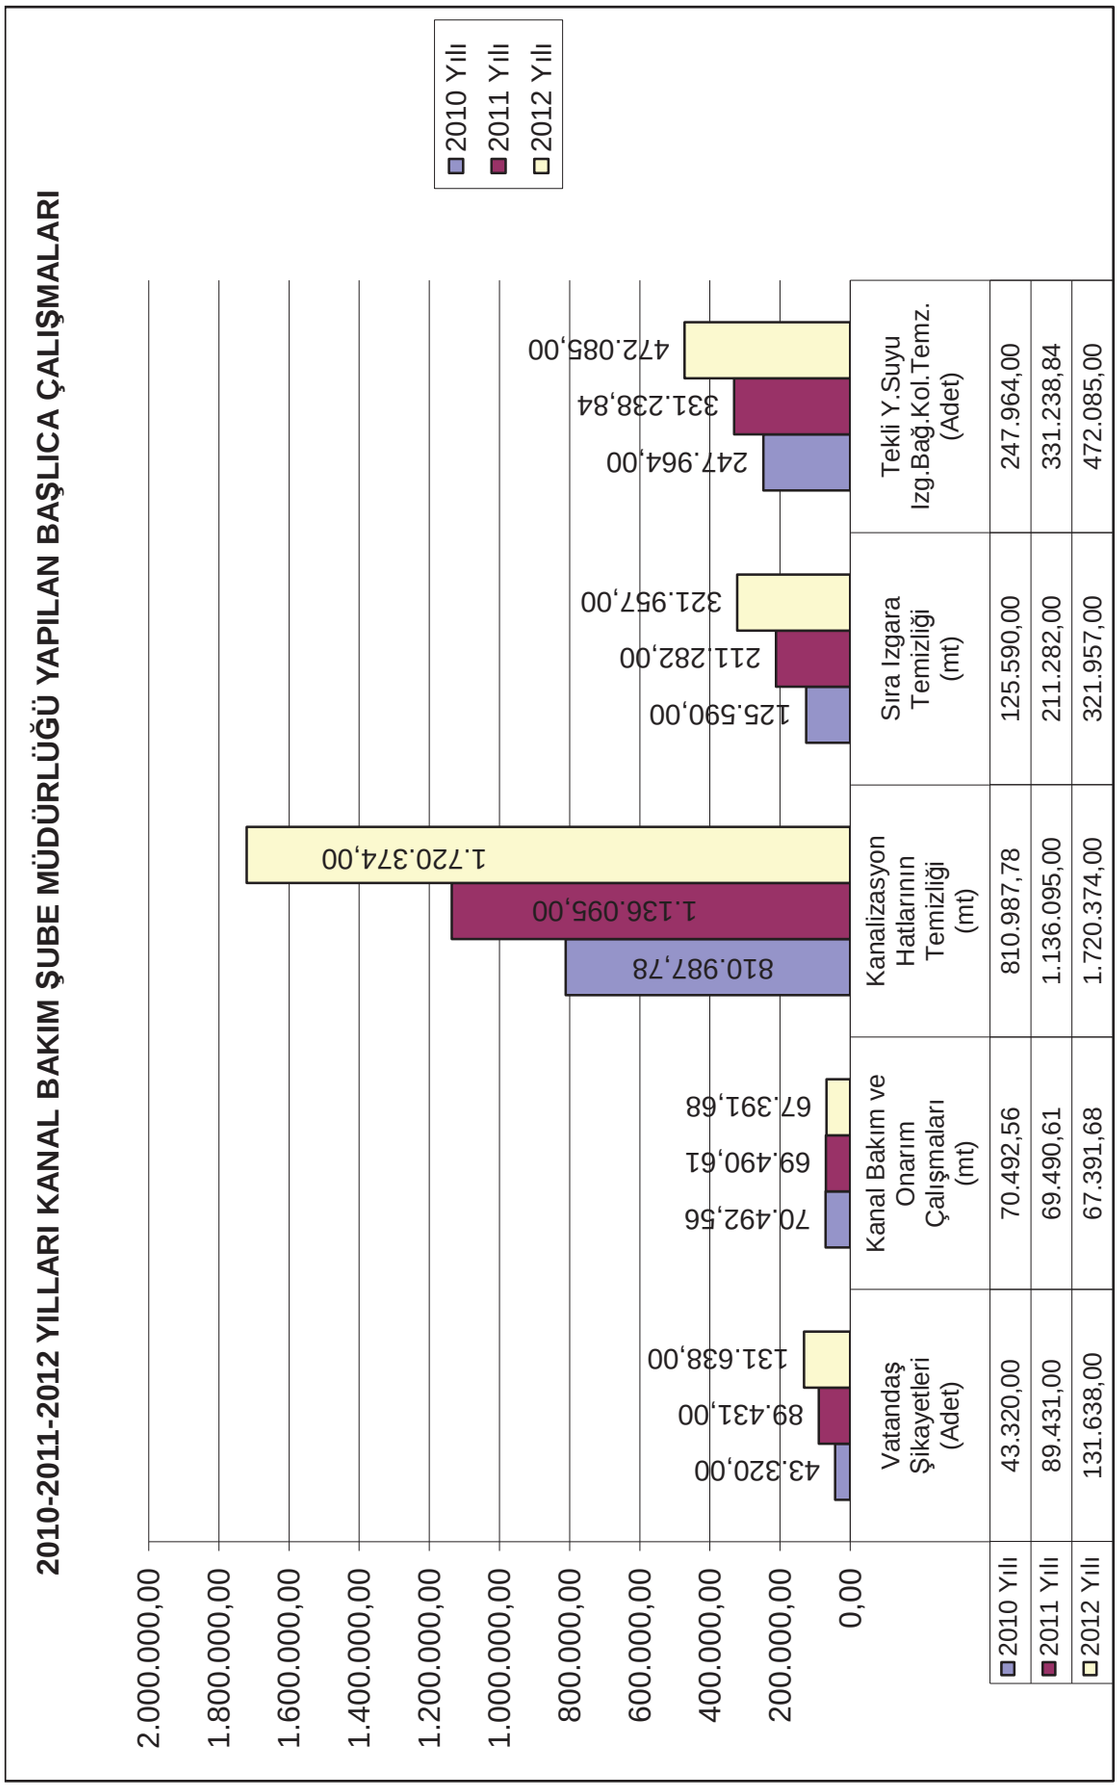
2010-2011-2012 YILLARI KANAL BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALARI
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Vatandaş Şikayetleri (Adet)
Kanal Bakım ve Onarım Çalışmaları (mt)
Kanalizasyon Hatlarının Temizliği (mt)
Sıra Izgara Temizliği (mt)
Tekli Y.Suyu Izg.Bağ.Kol.Temz. (Adet)
43.320,00
89.431,00
131.638,00
70.492,56
69.490,61
67.391,68
810.987,78
1.136.095,00
1.720.374,00
125.590,00
211.282,00
321.957,00
247.964,00
331.238,84
472.085,00

KANALİZASYON HATLARININ BAKIM ONARIM VE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI

2012 Yılında İhaleli İşler Kapsamında;

**** İzmir İli I., II. ve III.Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi;***

Bu kapsamda ihaleli işler kapsamında **41.713,08 m** kanal bakım onarım inşaatı işi yapılmıştır. **231.667,00 m** kanalizasyon hatlarının temizliği yapılmıştır.

İZSU Ekipman ve Personeli ile;



İzmir genelinde **26.050,00 m** kanal bakım ve onarım işi, **1.488.707 m** kanalizasyon hatlarının temizliği yapılmıştır.

308,90 m³ galeri mecra hattından malzeme çıkarılarak temizliği yapılmış, **24.270 adet** bina kolu, **878 adet** parsel arızası giderilmiştir.



Bornova, Çiğli, Sasalı, Altındağ, Menemen, Bayraklı, Kemalpaşa İlçelerinde İhaleli işler kapsamında toplam 15.417 m ōl·ʅᴾʏ ƻyl·ɴᴊᴾʏ œl·ƭᴾŏʏ l·ăᴾ ȅl·ʟᴊᴾƭʏ ᴾŏǘᴾɴᴊɸ

.BUCA İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Şehrin tüm sokaklarında olduğu gibi Buca ilçesinde de Kanalizasyon Yenilenmektedir.





GÜZELBAHÇE İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bölgesel olarak yağmursuyu hatlarının yapılması gerektiğinde her ne zorlukta olursa olsun İZSU ekiplerince yapılmaktadır. Güzelbahçe İlçesindeki yağmur suyu hattı çalışması İZSU ekiplerince yapılmıştır.









ALİAĞA İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Aliağa ilçesinde eski kanalizasyon hatlarına bağlı olan ve körfezi kirleten bina kolları Aliağa Atıksu Arıtma Tesisine bağlantısı olan kanalizasyon hattına bağlanarak Aliağa Körfezi atıklarından kurtulmuştur.







BAYINDIR İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Hatlarda meydana gelen ve araçların müdahalesi ile dahi açılmayan bacalarda işçilerimizin özverili çalışmaları sonrası hatlar çalışır duruma getirilmektedir.







MENDERES İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Menderes İlçesi, Bulgurca 120 Konutluk iskân evlerinin iki sokağına acil kanal yapımı istenmiş, bakımı ve onarımı yapılarak İZSU ekiplerince söz konusu atıksu şebeke imalatları yapılmıştır.





Menderes İlçesi, Kuyucak Köyü girişinde mevcut olan Ø1000' lik beton boruların yağışlı günlerde gelen malzeme ile tıkandığı ve derenin taşkınına neden olan boruların yerine 1,5 x 1,5 bax imalatı uygun görülmüş olup, bakımı ve onarımı İZSU ekiplerince imalat yapılarak sorun çözülmüştür.







VİDANJÖR HİZMETİ

İhaleli İşler Kapsamında;

15.043 sefer vidanjör hizmeti sunulmuştur.

İZSU Ekipman ve Personeli ile;

20.768 sefer fosseptik çekimi yapılmıştır.



Henüz kanalizasyon şebekesinin olmadığı ya da Atıksu Arıtma Tesisi yapımı devam eden yerleşimlerde hem ihale kapsamında hem de İdare vidanjörleri ile atıksuların taşınarak İZSU Atıksu Artıma Tesisi'ne boşaltılması hizmeti verilmektedir.



KANALİZASYON BACA KAPAKLARIN VE YAĞMURSUYU IZGARALARIN YOL SEVİYESİNE GETİRİLMESİ;

İhaleli İşler Kapsamında;

Yılın sonunda başlayan ihaleli iş kapsamında **1.156 adet** baca kapağı, **105 adet** yağmursuyu ızgarası yol seviyesine getirilmiştir.



İZSU Ekipman ve Personeli ile;

7.945 adet baca kapağı ve yağmursuyu ızgaraları yol seviyesine getirilmiş, **4.705 adet** baca kapağı yenilenmiştir



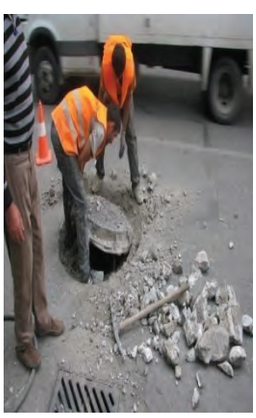

Kanal Bakım Şube Müdürlüğü
2012 Yılı Vidanjör Hizmeti

Bölgesi /İşin Adı	Yapılan Sefer Sayıları												
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
İzmir İli Menderes İlçesi Özdere ve Gümüldür Beldeleri İle Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi Arası Çalışacak Vidanjör Hizmeti Alımı İşi	408	360	372		429	340		1.125	825	1.362	815	430	6.466
İzmir İli Foça İlçesi Yeni Foça ve Gencelli Mahallelerinde Çalışacak Vidanjör Hizmeti Alımı İşi	1.479	494		153					1.408	2.744	1.198	1.101	8.577
İZSU Ekipman ve personeli ile İzmir genelinde yapılan vidanjör çekimi	1.166	1.203	1.433	1.602	3.574	2.021	1.945	2.029	1.489	1.499	1.395	1.412	20.768
TOPLAM	3.053	2.057	1.805	1.755	4.003	2.361	1.945	3.154	3.722	5.605	3.408	2.943	35.811

Dubalar ve çalışma levhalarıyla trafik emniyeti sağlandıktan sonra elmas uçlu dairesel kesim makinas ile kesme işlemi yapılır. Baca kodu ile yol kaplama kodu arasındaki fark 10 cm den fazla ise şekilde de görüldüğü gibi baca konulmadan önce uygun prekast (bilezik) yükseltme elemanı konulur. Daha sonra baca mastar profillerinden tutularak yerine konulur.




Baca içine malzeme akmayacağına emin olunduktan sonra bacanın içine şamrel şişirilip bacanın etrafi 1 saatlik mukavemeti 13,0 n/mm2 ve 28 günlük mukavemeti 55,0 n/mm2 olan hızlı dayanım kazanan çimento esaslı, rötre yapmayan, yüksek mukavemetli, akıcı tip çimento harcıyla doldurulur (yol kaplaması asfalt olan yerlerde 5 cm asfalt payı bırakılır)




YAĞMURSUYU HATLARININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI;

İhaleli İşler Kapsamında;

253 adet tekli yağmursuyu ızgarası, **16.749,95 m** yağmursuyu ızgarası kolu ile bina kolu bağlantısı yapımı, **42 m** delikli saçlı yağmursuyu ızgarası yapımı, **2.909,97 m** kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgarasının tamiri, **368.106 adet** tekli yağmursuyu ızgarası, **66.725,00 adet** bağlantı kollarının temizliği, **148.920,50 m** sıra ızgara **25.843,00 m** U kesitli kapalı yağmursuyu hatlarının temizliği yapılmıştır.

İZSU Ekipman ve Personeli ile;

3.567 adet tekli ızgara yenileme, **15.616,65 m** yağmursuyu ızgara kolu ve bina kolu bağlantısı yapımı, ***3*.660,50 m** yağmursuyu hattı imalatı, **61.741,25 m** kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamiri, **37.254 adet** tekli ızgara ve bağlantı kolu temizliği, **147.193,50 m** sıra ızgara temizliği yapılmıştır.

MENDERES İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Menderes ilçesi, Ataköy köy giriş yolunun yağışlarda yüzeysel yağmur sularının giriş yolunun düşük kotlarda toplandığı nokta teknik ekiplerce tespit edilmiş yol dikine sıra ızgara imalatı yapılarak sorun çözülmüştür.






SEFERİHİSAR İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Seferihisar İlçesi, Akarca mevkiinde mevcut yol geçişlerinde bulunan beton boruların yetersiz ve yağmursuyu taşkınına sebebiyet verdiği bu nedenle iki ayrı noktada problemli olan yol geçişleri ve yağmursuyu hattının imalatı yapılması gerektiği teknik ekiplerce uygun görülmüş imalat yapılarak sorun çözülmüştür.










Akarca Yol Geçiş Devamı Y.suyu Hattı

Seferihisar ilçesi Akarca mevkiinde denize açılan ancak kotları nedeni ile yol geçişlerinde daralarak su baskını yaşanılan bölgelere acil müdahaleler yapılmıştır



Seferihisar ilçesi Akarcada denize bağlı su kanalları yol kotlarının düşük olması nedeni ile ızgaralı sistem yapılarak yol geçişleri sağlanmıştır

BORNOVA İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İhaleli işler kapsamında Bornova İlçesi Erzene Mahallesi 124 sokakta eski tip ızgaraların sökülerek, yerine takılacak olan vidalı tip ızgara imalatlarına hazırlık yapılmaktadır.

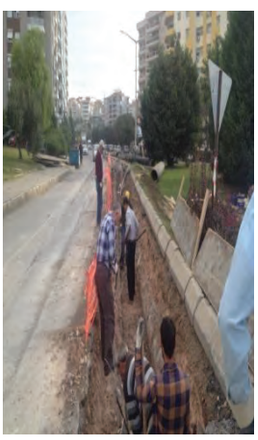



Çeşitli nedenler ile aşırı ses yapan ve çöküntüye uğrayarak gerek trafik gerekse yaya ulaşımını zorlaştıran sıra ızgaralar yenilenmektedir.







URLA İLÇESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Urla İlçesi, Balıklıova Köyü içerisinde bulunan ilköğretim okulunun, yağışlarda su baskınına maruz kalması nedeniyle okul girişine ekiplerce sıra ızgara imalatı yapılarak sorun giderilmiştir.







YAĞIŞ ÖNCESİ ALINAN ÖNLEMLER;

Cumhuriyet Bulvarının Konak Meydanı Cumhuriyet Meydanı arasında kalan kısmının yol kotlarının deniz seviyesine göre düşük olması sebebi ile deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda denize çıkış yapamayan yağmur suları, Meteorolojik uyarılar sonucunda yağmur öncesi en çok su seviyesinin yükselerek trafik akışının engellendiği Fevzi Paşa Bulvarının deniz çıkışı ile Cumhuriyet Meydanı su tahliye pompaları kurularak yağmur suları üst kotlardan denize deşarj edilmektedir.

FEVZİ PAŞA ÇIKIŞI YAĞMUR ÖNCESİ POMPA KURUMU



CUMHURİYET MEYDANI PTT ÖNÜ YAĞMUR ÖNCESİ POMPA KURUMU





SFERO DÖKÜM KAPAK İMALAT VE TEST AŞAMALARI

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan kendi ekipleri ve diğer ihaleli işler kapsamında yüklenici firmalara idare malı olarak verilmek üzere Sfero Döküm Kapak alımı gerçekleştirilmiştir.



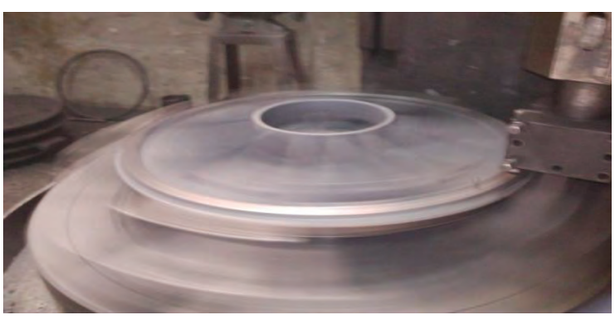

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca İzmir ili ve ilçelerinde kullanılmak üzere satın alınan Sfero Döküm kapaklar satıcıların fabrikalarında TSE Standartlarına göre uygunluğunun tespiti için testler İdare Mal Kabul Komisyonunca yetkili laboratuarlarda yaptırılmıştır.



İdarece satın alınan korige borular test aşamalarında seçilerek stoklara dahil edilmektedir.

KORİGE BORU İMALATI

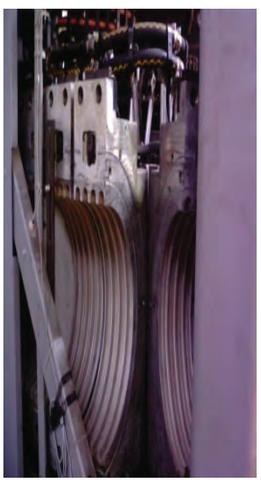







MENFEZ İMALATI

Menfez imalatları yerinde takip edilmekte imalat esnasında dahi testler yapılmaktadır.






BACA TABAN ELEMANI İMALATI

İdarece alınan malzemeler sadece alım esnasında test edilmek ile kalmayıp teknik ekiplerce imalat esnasında da takip edilmektedir.







İhaleli işler ve İZSU ekiplerince kullanılmak üzere baca taban elemanı alım işinde imalat devam etmektedir. Bu kapsamda alınan baca taban elemanı İzmir İli ve İlçelerinde Kanalizasyon yenileme, tamirat, bakım ve onarım işlerinde kullanılmaktadır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı' nca ihalesi yapılıp beton kırım testleri yapılarak kalite kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra ambarlarında stoklanmaktadır.




MUFLU BETON İMALATI

İdarece satın alınan Muflu Beton Boru test aşamalarında seçilerek stoklara dahil edilmektedir.







MUFLU BETON BORU ALIMI

İhaleli işler ve İZSU ekiplerince kullanılmak üzere muflu beton boru alım işinde imalat devam etmektedir. Bu kapsamda alınan muflu beton borular İzmir İli ve İlçelerinde Kanalizasyon yenileme, tamirat, bakım ve onarım işlerinde kullanılmaktadır. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı' nca ihalesi yapılıp sızdırmazlık ve beton kırım testleri yapılarak kalite kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra ambarda stoklanmaktadır.




İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKSU POMPA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE İLÇELER TERFİ MERKEZLERİNİN SAYISI

BÖLGESİ MAHALLE/İLÇE	İSTASYON ADI	
ÜRKMEZ GÜMÜLDÜR	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	5
SEFERİHİSAR	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	5
URLA	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	10
MENDERES TORBALI	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	9
ALİAĞA	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	4
FOÇA	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	2
MENEMEN	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	2
KEMALPAŞA	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	3

BÖLGESİ MAHALLE/İLÇE	İSTASYON ADI	
KARŞIYAKA	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	6
	ATIKSU	2
ÇİĞLİ	ALT GEÇİT	5
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	3
KONAK	ALT GEÇİT	2
	YAĞMUR SUYU	6
	ATIKSU	
BORNOVA	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	2
	ATIKSU	
MERSİNLİ	ALT GEÇİT	2
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	
BALÇOVA	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	1
	ATIKSU	4
BUCA	ALT GEÇİT	
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	2
GAZİEMİR	ALT GEÇİT	4
	YAĞMUR SUYU	
	ATIKSU	1

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKSU POMPA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İLÇELER TERFİ MERKEZLERİ
1. EKİP YILLIK FAALİYET RAPORU

TARİH : 01.01.2012 – 31.12.2012

BÖLGESİ MAHALLE/İLÇE	İSTASYON ADI		TESİS DEBİSİ (lt/ sn)	POMPA SAYISI	TESİSİN AKTİF OLMA DURUMU	JENERATÖR DURUMU	ARIZA	
							PERİYODİK KONTROL	ADET
KARŞIYAKA	PTT YANI	A.S	300	2+1	AKTİF	VAR	205	86
	ŞEMİKLER	A.S	-	2+1	A.DEĞİL	YOK (*)	-	-
	BALIKÇI BARINAĞI	Y.S	750	3+1	AKTİF	VAR	306	76
	YELKEN KLUBÜ	Y.S	900	2+1	AKTİF	VAR	198	18
	MAVİŞEHİR	Y.S	2.400	3+1	AKTİF	VAR	203	12
	NİKAH SARAYI	Y.S	150	2+1	AKTİF	YOK (*)	178	38
	RÜŞTÜ ŞARDAĞ	Y.S	100	1+1	AKTİF	YOK (*)	190	25
	BOSTANLI DERESİ	Y.S	120	1+1	AKTİF	YOK (*)	53	9
ÇİĞLİ	ARITMA GİRİŞİ	A.S	150	2+1	AKTİF	YOK (*)	133	48
	KAKLIÇ	A.S	90	2+1	AKTİF	YOK (*)	138	66
	SASALI	A.S	120	1+1	AKTİF	YOK (*)	398	69
	6026 ALT GEÇİT	A.G	280	3+1	AKTİF	VAR	164	44
	ÇİĞLİ ALT GEÇİT	A.G	220	2+1	AKTİF	VAR	78	12
	TUZLA ALT GEÇİT	A.G	100	1+1	AKTİF	VAR	78	11
	HARMANDALI ALT GEÇİT	A.G	200	1+1	AKTİF	VAR	130	9
	HAVA JET ÜSSÜ ALT GEÇİT	A.G	140	1+1	AKTİF	VAR	114	10
KONAK	KONAK ALT GEÇİT	A.G	180	2+1	AKTİF	VAR	50	6
	HAMİDİYE	Y.S	2.000	1+1	AKTİF	VAR	38	9
	POLİGON DERESİ	Y.S	20	1+1	AKTİF	YOK (*)	-	-
	SİRGELİ	Y.S	150	2+2	AKTİF	YOK (*)	-	-
	ARAP DERESİ	Y.S	100	1+1	AKTİF	YOK (*)	-	-
	MELEZ DERESİ	Y.S	240	1+1	AKTİF	YOK (*)	-	-
	KEMER ALT GEÇİT	A.G	180	3+1	AKTİF	VAR	88	12
	SÜMERBANK	Y.S	300	2+1	AKTİF	YOK (*)	22	18
BORNOVA	BORNOVA DERESİ	Y.S	120	1+1	AKTİF	YOK (*)	-	-
	MANDA DERESİ	Y.S	120	1+1	AKTİF	YOK (*)	-	-
MERSİNLİ	OZAN ABAY	A.G	3.000	2+1	AKTİF	VAR	112	23
	YUNUSLAR	A.G	-	2+2	A.DEĞİL	VAR	-	-
BALÇOVA	ÖZDİLEK	A.S	105	2+1	AKTİF	YOK (*)	80	15
	ALTIEVLER	A.S	350	1+1	AKTİF	VAR	65	8
	ESKİ GÜRLER	A.S	-	3+1	A.DEĞİL	YOK (*)		-
	YENİ GÜRLER	A.S	150	2+1	AKTİF	VAR	60	6
	GÖZTEPE	Y.S	180	3+1	AKTİF	YOK (*)	98	20
BUCA	BELENBAŞI	A.S	4	1+1	AKTİF	YOK (*)	102	26
	KIRIKLAR	A.S	4	1+1	AKTİF	YOK (*)	105	18
GAZİEMİR	SARNIÇ	A.S	40	1+1	AKTİF	YOK (*)	98	25
	SARNIÇ ALT GEÇİT	A.G	84	2+1	AKTİF	VAR	78	9
	ESBAŞ ALT GEÇİT	A.G	84	2+1	AKTİF	VAR	78	8
	İNKILAP ALT GEÇİT	A.G	180	2+1	AKTİF	VAR	90	7
	GAZİEMİR ALT GEÇİT	A.G	84	2+1	AKTİF	VAR	78	12

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKSU POMPA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İLÇELER TERFİ MERKEZLERİ YILLIK 2. EKİP FAALİYET RAPORU

TARİH.: 01.01.2012 - 31.12.2012

BÖLGE	İSTASYON ADI	TESİS DEBİSİ (lt/sn)	POMPA SAYISI	TESİSİN AKTİF OLMA DURUMU	JENARATÖR DURUMU	ARIZA	
						PERİYODİK KONTROL	ADET
ALİAĞA	TM 1	132	2+1	AKTİF	YOK (*)	98	38
	TM 2	615	2+1	AKTİF	VAR	130	68
	TM 3	615	2+1	AKTİF	VAR	168	55
	TM 6	22	1+1	AKTİF	YOK (*)	88	22
FOÇA	ÇAKMAKLI	22	1+1	AKTİF	YOK (*)	180	18
	BAĞARASI	20	1 (**)	AKTİF	YOK (*)	172	9
MENEMEN	KOZBEYLİ	4	1+1	AKTİF	YOK (*)	204	12
	ULUKENT	60	2+1	AKTİF	VAR	274	82
KEMALPAŞA	ÖREN	2,5	1+1	AKTİF	YOK (*)	158	25
	YİĞİTLER	12	1+1	AKTİF	YOK (*)	104	5
	SÜTÇÜLER	120	2+1	AKTİF	YOK (*)	66	20

ATIKSU POMPA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4 ANA İSTASYON YILLIK FAALİYET RAPORU

Tarih.: 01.01.2012 - 31.12.2012

	GÜMRÜK	BAYRAKLI	KARŞIYAKA	ÇİĞLİ
Pompa Kapasitesi m3/sn	1,3 m3/sn	4m3/sn	4m3/sn	4m3/sn
Pompa Yıllık Toplam Çalışma Saati	15.288	15.960	13.476	15.336
Kurulu Pompa Miktarı(adet)	6	5	5	8
Periyodik Bakım (Adet)	86	84	108	96
Arıza (Adet)	178	145	158	168

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKSU POMPA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İLÇELER TERFİ MERKEZLERİ YILLIK FAALİYET RAPORLARI

TARİH.: 01.01.2012 - 31.12.2012

BÖLGESİ MAHALLE/İLÇE	İSTASYON ADI	DEBİSİ	POMPA SAYISI	TESİSİN AKTİF OLMA DURUMU	JENERATÖR DURUMU	ARIZA	
						PERİYODİK KONTROL	ADET
ÜRKMEZ GÜMÜLDÜR	TM16	190	2+1	AKTİF	VAR	276	34
	TM17	190	1+1	AKTİF	VAR	276	32
	TM18	600	2+1	AKTİF	VAR	276	46
	TM19	1050	2+1	AKTİF	VAR	276	40
	ARAP YERİ	90	2+1	AKTİF	VAR	108	34
SEFERİHİSAR	SIĞACIK	150	2+1	AKTİF	VAR	106	28
	AKARCA	150	2+1	AKTİF	VAR	106	18
	ZÜMRÜTEVLER	190	2+1	AKTİF	VAR	112	35
	HARİTACILAR	90	1+1	AKTİF DEĞİL	VAR		
	AKKUM	90	2+1	AKTİF	VAR	96	9
URLA	ŞAHİNTEPESİ	32	1+1	AKTİF	YOK (*)	120	12
	KALABAK	375	2+1	AKTİF	VAR	130	45
	ÖN ARITMA	1200	2+1	AKTİF	VAR	104	13
	İSKELE	50	1+1	AKTİF	YOK (*)	105	8
	NEBİOĞLU	330	1+1	AKTİF	VAR	106	9
	MAVİ PLAJ	80	1+1	AKTİF	YOK (*)	102	10
	ŞOFÖRLER	40	1+1	AKTİF	YOK (*)	101	10
	YÜKSEK TEK.	45	1+1	AKTİF	VAR	85	8
	TOKİ	90	1+1	AKTİF	YOK (*)	112	9
	ZEYTİNALANI	270	2+1	AKTİF	VAR	114	11
MENDERES TORBALI	GÖRECE	320	3+1	AKTİF	VAR	276	16
	PAMUKYAZI	20	1 (**)	AKTİF	YOK	45	9
	OĞLANANASI	51	2+1	AKTİF	VAR	96	36
	KÜNER	5	1+1	AKTİF	VAR	88	22
	YEŞİLKÖY	6	1	AKTİF	YOK (*)	99	8
	ÇATALCA	8	1+1	AKTİF	YOK (*)	87	8
	BAHÇECİK	8	1+1	AKTİF	YOK (*)	96	8
	YENİKÖY	6	1+1	AKTİF	YOK (*)	92	6
	ŞAŞAL	5	1+1	AKTİF	YOK (*)	118	7

BÜYÜK KANAL
4 ANA POMPA İSTASYONLARI İLE TERFİ MERKEZLERİ YILLIK DEBİ MİKTARLARI VE ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ

	GÜMRÜK POMPA İSTASYONU				BAYRAKLI PİYALE POMPA İSTASYONU				KARŞIYAKA POMPA İSTASYONU				ÇİĞLİ POMPA İSTASYONU			
Ocak	3622164,00	M³	46438,00	kWh	15610498,39	M³	140998,05	kWh	16432016,81	M³	223519,69	kWh	20147681,74	M³	257442,60	kWh
Şubat	6598739,94	M³	84599,23	kWh	15566847,07	M³	140603,78	kWh	16533199,72	M³	224896,05	kWh	17264987,22	M³	220608,17	kWh
Mart	5657021,76	M³	72525,92	kWh	13766492,18	M³	124342,51	kWh	14823200,90	M³	201635,46	kWh	15289982,61	M³	195372,00	kWh
Nisan	6684210,00	M³	85695,00	kWh	16323271,43	M³	147436,00	kWh	18560559,94	M³	252473,61	kWh	19341391,30	M³	247140,00	kWh
Mayıs	6231788,16	M³	79894,72	kWh	10889233,82	M³	98354,37	kWh	18800437,43	M³	255736,59	kWh	19462578,26	M³	248688,50	kWh
Haziran	5003683,62	M³	64149,79	kWh	16246014,45	M³	146738,20	kWh	16201165,48	M³	220379,49	kWh	16166371,30	M³	206570,30	kWh
Temmuz	4959489,60	M³	63583,20	kWh	10283559,70	M³	92883,77	kWh	15951187,05	M³	216979,11	kWh	12463685,22	M³	159258,20	kWh
Ağustos	5178898,14	M³	66396,13	kWh	6182683,18	M³	55843,59	kWh	15451906,52	M³	210187,55	kWh	15608919,13	M³	199447,30	kWh
Eylül	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh
Ekim	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh
Kasım	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh
Aralık	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh	0,00	M³	0,00	kWh
2012	43935995,22	M³	563281,99	kWh	104868600,21	M³	947200,26	kWh	132753673,85	M³	1805807,55	kWh	135745596,78	M³	1734527,07	kWh



GPİ DEBİ GRAFİĞİ



BPİ DEBİ GRAFİĞİ



KPİ DEBİ GRAFİĞİ



ÇPİ DEBİ GRAFİĞİ



GPİ ENERJİ GRAFİĞİ



BPİ ENERJİ GRAFİĞİ



KPİ ENERJİ GRAFİĞİ



ÇPİ ENERJİ GRAFİĞİ

ANA POMPALARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2012 Yılında İzmir Büyük Kanalı üzerinde konumlandırılmış olan Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli Pompa İstasyonlarında bulunan dikey emişli santrüfij ve dalgıç tipte pompanın sürekli ve kesintisiz Arıtma Tesisine su naklini gerçekleştirmek amacıyla istasyonlarda bulunan toplam 24 adet pompanın bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir.

Alt Geçitlerdeki Pompalarda Yapılan Çalışmalar:

Atıksu Pompa tesisleri Görev sahası içerisinde yer alan toplam 13 adet alt geçitte bulunan yağmursuyu terfi pompalarının yağmur mevsiminden önce bakımları ve havuz temizlikleri ve onarımları yapılarak yağış durumlarında alt geçitlerde oluşabilecek arızaların önüne geçilmesi yönünde azami özen gösterilmiştir.

Terfi İstasyonlarındaki Seyyar ve Sabit Jeneratörlerde Yapılan Çalışmalar:



Çiğli Pompa İstasyonuna Kurulan Jeneratör.



Ozan Abay Alt Geçidine Kurulan Jeneratör.

2012 yılı içerisinde tüm bölge istasyonlarının çalışma sürekliliğini sağlamak, oluşabilecek enerji kesintilerinin önüne geçmek amacıyla alternatif enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla seyyar ve sabit 12 adet jeneratör alınmıştır.

Alınan Yerler:

Sabit Jeneratörler: 1 adet Aliağa TM2, 1 adet Aliağa TM3, 1 adet Gümrük Pompa İstasyonu, 1 adet Bayraklı Pompa İstasyonu, 1 adet Karşıyaka Pompa İstasyonu, 1 adet Çiğli Pompa İstasyonu, 1 adet Ozan Abay Alt Geçidi, Seferihisar Akarca, Seferihisar Akkum, Seferihisar Haritacılar, Seferihisar Zümrüt evler, Ürkmez TM16, Ürkmez TM 17, Ürkmez TM 18.

Ayrıca ihtiyaç halinde farklı yerlerde kullanılmak üzere 3 adet seyyar jeneratör alınmıştır. Çevre istasyonlarımızın elektrik kesintileri sırasında kullanılmaktadır.

İstasyonlarda Enerji Verimliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar:

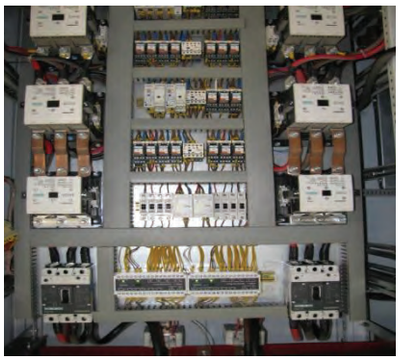



2011 yılında yapıldığı gibi 2012 yılında da Tesislerin modernizasyonu kapsamında gümrük terfi istasyonuna invertör temin edilip montajları işletme teknik personeli tarafından yapılarak 330 KW güce sahip güç katsayısı 0,76 olan pompa motorları low harmonik sürücülerle güç katsayıları 0,97'ye yükseltilerek % 21 oranında güç katsayısında düzelme sağlamış olmuş ayrıca duruş sayılarının azalması pompa arızalarının azalmasını sağlamıştır. Günde 8 saat çalıştığı (%70, % 80, %90 ve %100 devirlerde 2 saat çalıştığı) düşünülerek hesaplandığında %54 yatırım kazancı ve 19 ay gibi kısa bir sürede kendini amorti ettiği görülmüştür. Bu da Şehir ekonomisine büyük oranda tasarruf sağlamıştır.

Pompa İstasyonlarındaki Bakım Çalışmaları:

2011 yılında olduğu gibi 2012 yılı içinde de ömrünü tamamlamış olan Görece terfi istasyonunda pompa basma kollektörleri, sürgü vanalar, çek vanalar yenilenmiş olup işletme koşullarında yaşanabilecek kollektör delinme ve yırtılmalarının önüne geçilmiştir.

RÜŞTÜ ŞARDAĞ POMPA İSTASYONU



Önceki yıllarda yağmur suyunu deşarj etmek amacıyla kendinden emişli pompa ve Jeneratör yardımıyla pompa kurulmak suretiyle bölgedeki yağmur suyu deşarj edilirken, 2012 yılı içinde yapılan girişimler sonucunda tesis yanına kalıcı enerji alınmış pompa, basma boruları ve vanalar yerleştirmek suretiyle İdare personeli tarafından kalıcı terfi istasyonu oluşturulmuştur.

DERE BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

İzmir içindeki tüm derelerin temizliği yapılarak daimi olarak akarları sağlanmakta, özellikle yağış sonrasında derelerin mansap kısımlarında toplanan rusubatlar temizlenerek bir sonraki yağışlarda dere taşkınların yaşanmasını önlemek için çalışmalar periyodik olarak sürdürülmektedir.

29.03.2012 tarihinde İdaremiz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürlüğü" olarak yeni bir müdürlük kurulmuştur. Müdürlüğün görev tanımı kapsamında İzmir İli mücavir alanı sınırları içerisinde yer alan tüm derelerin bakım ve temizlik çalışmalarının yapılması ile birlikte İzmir Körfezi su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tarama faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.



İdare tarafından öncelikle İzmir Metropol alanı içerisinde yeralan derelerin bakım ve temizleme çalışmalarında kullanılmak üzere "Makine Parkı" oluşturulmuştur. Araç filosu toplam maliyetleri 11.117.360,09 TL olan 20 iş makinası ve 20 adet damperli kamyondan oluşmaktadır.



CİNSİ	KAPASİTESİ	ADEDİ
Kırıcı Hatlı Paletli Ekskavatör ve Kırıcıları	30 ton	5 adet
Kırıcı Hatlı Lastik Tekerlekli Ekskavatör ve Kırıcıları	18 ton	7 adet
Teleskopik Bomlu Kırıcı Hatlı Kazıcı Yükleyici ve Kırıcıları	11 ton	6 adet
Lastik Tekerlekli Yükleyici (20 farklı ataşman takılabilir özellikte)	15 ton	1 adet
Paletli Yükleyici	25 ton	1 adet
Hardox Damperli 6x4 290HP Kamyon	14m^3	20 adet

İzmir merkezde 85 adet, çevre ilçe belediyelerde özellikle ıslahı yapılmamış tarımsal alanlardaki toplam 222 adet dere ve dere yan kollarında bakım ve temizleme çalışmaları, İdarenin kendi iş makinaları ve elemanları ile gerçekleştirilmektedir.

Böylelikle İlimizde derelerin düzenli bakım ve temizlikleri programlı bir şekilde yapılmış, yağış öncesi taşkınlara sebep olabilecek unsurlar ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca derelerle ilgili yaşanabilecek olağandışı bir durumda tüm iş makinaları ve personellerle birlikte en kısa sürede müdahale edebilme olanağı sağlanmıştır.







İdare personelleri ile deneyimli bir çalışan kadrosu yaratarak daha disiplinli, konusuna, bölgesine ve teknolojiye hakim çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu durum işlerin daha planlı/ programlı ve sistemli bir şekilde yürütülmesine imkan sağlamıştır.



İlimiz yerleşim alanları içerisinden gelen İzmir Körfezi'ne dökülen ana derelerden olan **Melez** ve **Arap** derelerinde yıllık bakım çalışması mayıs ayı içerisinde yapılmış olup **89175 ton** malzeme çıkartılmıştır



Yağışlar sonrası yüzeysel atık malzemelerin dereler yoluyla İzmir Körfezi'ne ulaşmadan bertarafının sağlanması için Melez ve Arap derelerinin birleşim noktası ile Manda Deresi üzerinde **110m sabit bariyer sistemi** tesis edilmiştir. Sabit bariyerin kurulumu Ekim 2012 yılında yapılmış olup 2012 yılı içerisinde 122535 ton malzemenin bariyer önünden alımı yapılarak denize taşımı ve olası deniz kirliliği önlenmiştir.





Büyükçiğli Deresi'nde istinat duvarının yıkılan ve risk arz eden **125 m** uzunluğundaki bölümünün güçlendirilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları 20.12.2012 tarihinde tesis edilmiş ve sorun ivedilikle giderilmiştir.





2012 YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ METRAJ VE TONAJ TABLOSU

BÖLGE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	BÖLGE	ÇIKARILAN MALZEME (t)
ALİAĞA	3.164,00	ALİAĞA	900,00
BALÇOVA	2.740,00	BALÇOVA	510,00
BAYINDIR	3.590,00	BAYINDIR	2.985,00
BAYRAKLI	11.610,00	BAYRAKLI	3.660,00
BORNOVA	21.794,00	BORNOVA	6.435,00
BUCA	5.850,00	BUCA	375,00
ÇİĞLİ	19.635,00	ÇİĞLİ	18.855,00
FOÇA	24.213,00	FOÇA	8.070,00
GAZİEMİR	6.310,00	GAZİEMİR	810,00
GÜZELBAHÇE	3.710,00	GÜZELBAHÇE	2.115,00
KARABAĞLAR	23.925,00	KARABAĞLAR	7.950,00
KARŞIYAKA	17.305,00	KARŞIYAKA	4.515,00
KEMALPAŞA	3.110,00	KEMALPAŞA	2.145,00
KONAK	25.749,00	KONAK	121.170,00
MENDERES	15.240,00	MENDERES	3.555,00
MENEMEN	9.954,00	MENEMEN	15.555,00
NARLIDERE	6.230,00	NARLIDERE	9.870,00
SEFERİHİSAR	23.723,00	SEFERİHİSAR	9.000,00
SELÇUK	2.410,00	SELÇUK	1.455,00
TORBALI	22.205,00	TORBALI	10.365,00
URLA	18.608,00	URLA	23.990,00
TOPLAM	**271.075,00**	**TOPLAM**	**254.285,00**

KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DERELER BAKIM VE KÖRFEZ TARAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 Yılında Yapılan Dere Temizlikleri

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
ALİAĞA	GÜNEŞ SOKAK DERESİ	40	3.164	0	0	900
	HACI ÖMERLİ KÖYÜ DERESİ	40		0	0	
	ALLI KÖPRÜ DERESİ HELVACI KÖYÜ DERESİ	3.064		60	900	
	PETSAN DERESİ	20		0	0	
İLÇE	**DERE**	**YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)**	**TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)**	**SEFER SAYISI**	**ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)**	**TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)**
BAYINDIR	KÜÇÜK MENDERES KOLU AMBAR PINAR MEVKİİ	1.450	3.590	21	315	2.985
	KÜÇÜK MENDERES KOLU GENCER MEVKİİ	1.050		70	1.050	
	ŞEHİTLER DERESİ	100		29	435	
	ARABBAŞI DERESİ	90		0	0	
	ÇANLI DERESİ	0		1	15	
	EMİNE SUYU DERESİ	80		0	0	
	HAVUZBAŞI DERESİ	60		16	240	
	SÖĞÜT ÖREN KÖYÜ DERESİ	180		12	180	
	YAĞCI KAVAĞI DERESİ	580		50	750	
İLÇE	**DERE**	**YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)**	**TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)**	**SEFER SAYISI**	**ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)**	**TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)**
BALÇOVA	HACİ ALİ AHMET DERESİ	1.590	2.740	19	285	510
	ÇAKAL BURNU KANALETİ	180		5	75	
	GÖKÇELİ EFE DERESİ	150		0	0	
	KENT ORMAN PARKI DERESİ	150		3	45	
	MOLLA KUYU DERESİ	400		2	30	
	İNCİRALTI ORMAN VAKFI DERESİ	0		4	60	
	KİPA ARKASI KANALETİ	200		1	15	
	BALÇOVA BARAJI	70		0	0	
İLÇE	**DERE**	**YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)**	**TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)**	**SEFER SAYISI**	**ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)**	**TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)**
BAYRAKLI	ILICA DERESİ	3.030	11.610	12	180	3.660
	BORNOVA ÇAYI	3.915		75	1125	
	TAHTACI DERESİ	200		0	0	
	ŞELALE DERESİ	15		0	0	
	LAKA DERESİ	2.750		23	345	
	SEPETÇİ DERESİ	350		17	255	
	MANDA DERESİ	485		80	1.200	
	DALLIK DERESİ	160		16	240	
	ONUR MAH. 7375 SOK. DERESİ	15		1	15	
	YAMANLAR DERESİ	690		20	300	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
BORNOVA	ŞEYTAN DERESİ	600	21.794	46	690	6.435
	GÖKDERE	2.550		54	810	
	KAVAKLI DERE	2.420		92	1380	
	MANDA DERESİ	4.237		13	195	
	BORNOVA ÇAYI	4.005		33	495	
	KAZAN KULPU DERESİ	150		0	0	
	KOCA BOĞAZ	200		1	15	
	KUDURGAN DERESİ	100		6	90	
	SABİ DERESİ	1.745		2	30	
	KAN DERESİ	500		0	0	
	PİÇİ DERESİ	110		32	480	
	KIRMIZI TOPRAK DERESİ	1.650		28	420	
	ARAP DERESİ	170		20	300	
	PİÇİ DERESİ DEĞİRMENDERE ALTI KOLU	430		0	0	
	KAYADİBİ KÖYÜ DERESİ	12		0	0	
	LAKA DERESİ	680		2	30	
	TAŞPINAR DERESİ	1.270		57	855	
	ZEYTİNLİK DERESİ	130		2	30	
	HOMEROS VADİSİ	590		15	225	
	EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ DERESİ	245		26	390	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
BUCA	KOZAĞAÇ DERESİ	2900	5.850	16	240	375
	YOBAZ DERESİ	2180		8	120	
	OTOBAN ALTI KANALETİ	60		0	0	
	TAHTALI ÇAYI	700		0	0	
	205/53 SOK. YANI	10		1	15	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
ÇİĞLİ	BALATCIK DERESİ	3.340	19.635	35	525	18.855
	HARMANDALI DERESİ	5.255		674	10110	
	BÜYÜK ÇİĞLİ DERESİ	3.975		227	3405	
	KÜÇÜK ÇİĞLİ DERESİ	2.850		8	120	
	KAKLIÇ KÖYÜ DERESİ	760		0	0	
	MALTEPE DERESİ VE KOLU	1.945		83	1245	
	PEYNİRCİOĞLU DERESİ	50		0	0	
	SASALI DERESİ	630		166	2490	
	OTOBAN ALTI DERESİ	100		0	0	
	KIRMIZI TOPRAK DERESİ	50		0	0	
	B.ÇİĞLİ DERESİ İNCİRLİ GÜZELTEPE KOLU	100		1	15	
	ŞEHİTLER CAD. HARMANDALI	420		61	915	
	EVKA 2 SOYAK SİTESİ ALTI DERESİ	160		2	30	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
FOÇA	POYRAZ DERESİ	100	24.213	0	0	8.070
	KUMRURNU DERESİ	390		12	180	
	289 SOK.NADİR SİTESİ DERESİ	150		4	60	
	439/1 SOKAK YANI DERE	2.920		189	2.835	
	414 SOK. BAĞARASI KİLLİK MEVKİİ DERESİ	340		9	135	
	434 SOK. BAĞARASI DERESİ	370		15	225	
	407 SOK. BAĞARASI DERESİ	360		13	195	
	403 SOK. BAĞARASI DERESİ	60		0	0	
	30/2 SOK. BAĞARASI DERESİ	200		4	60	
	MALİYETÇİLER SİTESİ DERESİ	750		11	165	
	CUMHURİYET CUMACIK DERESİ	200		1	15	
	GENCERLİ ATABEY SOK. DERESİ	150		5	75	
	GENCERLİ YUNUS EMRE CAD. DERESİ	280		7	105	
	CUMHURİYET MELTEM SİTESİ	0		2	30	
	MALA DERESİ	4.925		85	1.275	
	BAĞARASI ANA YOL KAVŞAĞI DERESİ	250		0	0	
	GENCERLİ DERESİ	130		0	0	
	411 SOK. BAĞARASI DERESİ	5		0	0	
	GAZİOSMANPAŞA CAD. MEZARLIK YANI DERESİ	100		0	0	
	KARA YOLLARI ŞANTİYE YANI DERESİ	50		0	0	
	NAZAN SOK. MALİYETÇİLER SİT. DERESİ	50		0	0	
	SAZLICA DERESİ	110		0	0	
	ŞAFLI DERESİ	950		0	0	
	408 SOK. YANI DERESİ	150		0	0	
	505 SOK. YANI DERESİ	4.748		88	1.320	
	BUCAK DERESİ	1.655		0	0	
	KÖR GEDİZ DERESİ	760		0	0	
	KILINÇ KAYALAR DERE VE KOLLARI	2.920		17	255	
	MEZARLIK YANI DERESİ	1.140		76	1.140	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
GAZİEMİR	AKTEPE DERESİ	550	6.310	1	15	810
	YOBAZ DERESİ	3.330		8	120	
	İNPO DERESİ	1.150		32	480	
	IRMAK DERESİ	650		1	15	
	SARINÇ PİKNİK ALANI DERESİ	630		12	180	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
GÜZELBAHÇE	GÜZELBAHÇE DENİZ ÇIKIŞLARI	510	3.710	20	300	2.115
	ILICASU DERESİ	240		7	105	
	KÖSDALI DERESİ	960		3	45	
	ÇAMLIÇAY DERESİ VE KOLU	370		33	495	
	98 SOK. DERESİ	160		3	45	
	DEREPINARI	500		15	225	
	ÇAKAL BURNU KANALETİ	50		0	0	
	OTOBAN ALTI DERESİ	20		0	0	
	KUDUZ DERESİ	250		0	0	
	ALİBEY DERESİ	200		0	0	
	MALTEPE ASKERİ LİSESİ İÇİ DERESİ	250		22	330	
	NAMIK KEMAL CAD. NO 21 YANI YELKİ	200		38	570	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
KARABAĞLAR	ARAP DERESİ	230	23.925	1	15	7.950
	EMREZ DERESİ	3.545		36	540	
	AKTEPE, EMREZ DERESİ	10		5	75	
	YOBAZ DERESİ	3.920		147	2.205	
	KARTAL PARKI DERESİ	500		5	75	
	UZUNDERE	2.300		142	2.130	
	ÇİTLENBİK DERESİ	7.710		8	120	
	POLİGON DERESİ	3.080		147	2.205	
	ESKİ ÇAMLIK 3718 SOK. DERESİ	440		15	225	
	ESKİ ÇAMLIK ÇİTLENBİK DERESİ KOLU	100		0	0	
	ESKİ İZMİR ÇİTLENBİK DERESİ KOLU	660		0	0	
	ÇİTLENBİK DERESİ KOLU	250		2	30	
	ESKİ İZMİR PAZAR YERİ	0		2	30	
	3962 SOK. AYARLAR MAH. UZUNDERE	0		11	165	
	UZUNDERE OTOBAN YANI	50		0	0	
	UZUNDERE OTOBAN ALTI	200		0	0	
	UZUNDERE TOKİ KONUTLARI	0		4	60	
	3959/17 SOK UZUNDERE	200		4	60	
	BURDA ARKASI (ŞEHİTLER HÜSEYİN KARA SOKAĞI)	120		1	15	
	3911 SOK. ESKİ İZMİR	100		0	0	
	3028 SOK DERESİ	60		0	0	
	5698/2 BURDANIN ARKASI	50		0	0	
	3031 SOK. ÇİTLENBİK DERESİ KOLU	400		0	0	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
KARŞIYAKA	AHIR KUYU DERESİ	11.055	17.305	174	2.610	4.515
	ILICA DERESİ	3.735		98	1470	
	KARTALKAYA DERESİ	1.215		0	0	
	MAVİŞEHİR DERESİ	1.150		27	405	
	PEYNİRCİOĞLU DERESİ	150		2	30	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
KEMALPAŞA	SÜTÇÜLER KANALI	0	3.110	3	45	2.145
	SARILAR KÖYÜ DERESİ	640		20	300	
	ARMUTLU DERESİ	150		0	0	
	BÜYÜK PARSA (BAĞYURDU)	650		29	435	
	KÜÇÜK PARSA (BAĞYURDU)	250		4	60	
	YEŞİLDERE (BAĞYURDU)	250		8	120	
	8 EYLÜL MAH. KULAKDERE	100		0	0	
	AŞAĞIKIZILCA DERESİ	750		59	885	
	YUKARIKIZILCA DERESİ	250		20	300	
	SOĞUKPINAR DERESİ	70		0	0	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
KONAK	MELEZ DERESİ	17.929	25.749	8.039	120.585	121.170
	BOĞAZ İÇİ DERESİ	500		0	0	
	ARAP DERESİ VE KOLU	3.330		8	120	
	MERSİN PINARI	175		0	0	
	DGM KANALETİ	110		1	15	
	1131 SOK. BASAŞ ÖNÜ	150		0	0	
	181 SOK. KANALETİ (HALİL RIFAT PAŞA)	300		1	15	
	MELEZ (YEŞİLDERE)	2.610		29	435	
	SÜNERBANK YANI	30		0	0	
	TEPECİK PAZARYERİ	600		0	0	
	YEŞİLDERE KONAK TÜNELİ	15		0	0	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
MENDERES	KARAKOÇ DERESİ	135	15.240	0	0	3.555
	AZMAK DERESİ	545		6	90	
	TAHTALI ÇAYI	675		2	30	
	KÜNER KÖYÜ ANA DERE SANDI ÇAYI	1.100		3	45	
	KONA DERESİ	1.765		0	0	
	YONCA KÖY KUYUMCULAR SİTE İÇİ DERESİ	1.190		16	240	
	KARAKUYU DERESİ	2.810		16	240	
	PANCAR 1. KANAL	3.160		0	0	
	ARAP YERİ DERESİ VE KOLLARI	890		21	315	
	KAYAŞ KURUTMA KANALI	1.035		92	1.380	
	MEZARLIK DERESİ	200		18	270	
	TOPMAS SİTESİ YANI YAĞMUR KOLU	200		1	15	
	SAZLI DERESİ	110		2	30	
	GÜMÜŞ GÖLÜ DERESİ	20		3	45	
	BULGURCA DERESİ	0		0	0	
	GAZELLİ DERESİ YAN KOU	50		2	30	
	AHMETBEYLİ PLAJ CAD.4042 SOK. DENİZ ÇIKIŞI	100		3	45	
	6219 SOK. DENİZ ÇIKIŞI	15		2	30	
	KOLOPYALI DENİZ ÇIKIŞI	15		0	0	
	HACI SADIK CAMİ SOK. DENİZ ÇIKIŞI	210		4	60	
	RESORT OTEL YANI DENİZ ÇIKIŞI	210		3	45	
	AKÇA KÖYÜ DERESİ	100		12	180	
	ÖZDERE AHMETBEYLİ DENİZ ÇIKIŞI	20		0	0	
	AKÇAY KÖYÜ DERESİ	0		1	15	
	KÜNER KÖYÜ KEL DERESİ	80		3	45	
	KUYUCAK KÖYÜ DERESİ	0		4	60	
	AHMETBEYLİ DERESİ	120		2	30	
	ŞEYTAN DERESİ	140		9	135	
	ÖZDERE 1062 SOK. ORTA MAH. DERESİ	150		4	60	
	BAŞPINAR DEĞİRMENDERE DERESİ	150		7	105	
	ORTA MAH.1060 SOK. DERESİ	40		0	0	
	CLUB YALI DENİZ ÇIKIŞI	5		1	15	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
MENEMEN	KURUÇAY DERESİ	2.000	9.954	0	0	15.555
	İNCİRLİ PINAR DERESİ	368		10	150	
	KOCA ÇAY DERESİ EMİRALEM	1.510		77	1.155	
	SARI YALAK DERESİ TÜRKELİ	1.030		0	0	
	SEYREK KÖY DERESİ	1.360		81	1.215	
	KOYUNDERE OTOBAN YANI DERESİ	420		14	210	
	SÜLEYMANLI KÖYÜ DERESİ	100		3	45	
	YAHŞELLİ ÇINARLI DERESİ	527		3	45	
	ÇALTI KÖY DERESİ	115		0	0	
	ASARLIK 105/2 SOK. DERESİ	92		18	270	
	DOĞA KÖY DERESİ	280		31	465	
	GÖÇMEN SOK. DERESİ	40		0	0	
	HATUNDERE DERESİ	22		0	0	
	HAYKIRAN DERESİ	860		64	960	
	KESİK KÖY DERESİ	490		583	8.745	
	KOYUNDERE KAY SÜT ARKASI	425		153	2.295	
	TÜRKELİ DERESİ	20		0	0	
	YANIK KÖY DERESİ	295		0	0	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
NARLIDERE	KÖROĞLU DERESİ	680	6.230	16	240	9.870
	CİNO DERESİ	500		13	195	
	DİNO DERESİ	150		7	105	
	ALİONBAŞI DERESİ VE KOLU	2.090		106	1.590	
	OTOBAN ALT YOLU KANALETİ	2.630		0	0	
	KUMSAL SOK. ALTI EVLER DERESİ	40		367	5.780	
	LİMANREİS MAH. BEREN SOK. DERESİ	0		117	1.960	
	NARLIDERE KANALETİ	140		0	0	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
SEFERİHİSAR	AĞA DERESİ ULAMIŞ	700	23.723	0	0	9.000
	KOOPERATİF DERESİ BADEMLER	500		0	0	
	TOPMAS DERESİ	665		17	255	
	AZMAK ÇAYI	225		0	0	
	30 EVLER DERESİ	405		9	135	
	DOĞANBEY ÇİÇEK SİT. DENİZ ÇIKIŞI	55		0	0	
	6011-6106-6108 SOK. YAĞMUR KANALLARI	200		3	45	
	GİRLEN DERESİ	0		2	30	
	DOĞANBEY DENİZ ÇIKIŞI	40		0	0	
	6304 SOK. YAĞMUR KANALLARI	50		2	30	
	DOĞANBEY 5193 SOK. DERESİ	200		1	15	
	AKARCA DERESİ	870		22	330	
	ŞAŞAL DERESİ	1.500		0	0	
	6116 SOK. DERESİ ÜRKMEZ	50		1	15	
	BADEMLER DERESİ VE KOLU	280		0	0	
	5197 SOK. PAYAMLI DERESİ	20		2	30	
	KOCA ÇAY VE KOLU	5.970		23	345	
	KIRBAĞ DERESİ	200		3	45	
	5185 SOK. DENİZ ÇIKIŞI	0		1	15	
	MELTEMTUR SİT. DOĞANBEY	115		0	0	
	KUDURGAN DERESİ	150		40	600	
	6117 SOK. DERESİ ÜRKMEZ	70		1	15	
	SIĞACIK DERESİ	570		26	390	
	6465 SOK YAĞMUR SUYU KANALETİ	100		1	15	
	HAMAM DERESİ	1.200		0	0	
	KARAKOÇ DERESİ	0		0	0	
	KAVAKDERE ÇAYI	180		0	0	
	ÜRKMEZ DERESİ DENİZ ÇIKIŞI	315		10	150	
	İMAM DERESİ	1.900		10	150	
	(AŞA CLUB YANI) PAYAMLI DERESİ DENİZ ÇIKIŞLARI	480		13	195	
	ARAP DERESİ	1.530		0	0	
	AVŞAROĞLU DERESİ	450		252	3.780	
	SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ ÇIKIŞI	135		1	15	
	6120 SOK DERESİ	60		4	60	
	YENİSU ALTI DERESİ AKARCA CAD.	100		0	0	
	ORTA MAH. ORHANLI KÖYÜ	80		5	75	
	BATARYA DERESİ	65		15	225	
	93/3 SOK. DERESİ	7		0	0	
	YEŞİLKENT DERESİ	540		3	45	
	1056 SOK. DERESİ	6		0	0	
	KOCA ÇAY YANI DERESİ	0		47	705	
	MEZARLIK DERESİ	325		0	0	
	HEREKE DERESİ	250		4	60	
	TEOS MARİNA KARŞISINDAKİ DERE	135		9	135	
	KARAKOÇ DERESİ YANI	0		0	0	
	TAHTALI DERESİ	70		0	0	
	GELİN ALAN ÇAYI	2.280		1	15	
	ULAMIŞ KOCA ÇAY DERESİ	100		48	720	
	ÇAMLIK DERESİ	200		0	0	
	İSSANİYE DERESİ	380		24	360	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
SELÇUK	YEMİŞLİK DERESİ	2.360	2.410	93	1.395	1.455
	MEZARLIK DERESİ	50		4	60	
İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
TORBALI	ÇEŞME DERESİ	880	22.205	18	270	10.365
	GÖZTAŞI DERESİ AHMETLİ KÖYÜ	685		8	120	
	FETREK ÇAYI VE KOLU	745		12	180	
	HARA DERESİ PAMUKYAZI MAH.	730		20	300	
	KÖYTÜR YANI DERESİ AYRANCILAR İNÖNÜ MAH.	210		0	0	
	KARAKUYU DERESİ	150		0	0	
	TAŞLI TARLA DERESİ	275		11	165	
	TULUM DERESİ	1.160		133	1.995	
	AYLAZ DERESİ KOLU	200		14	210	
	ÇAKIR DERESİ VE KOLU	700		13	195	
	ÇAKIRBEY DERESİ	0		7	105	
	MERSİNLİ DERESİ	400		8	120	
	YAZIBAŞI 29 EKİM MAH. GAZİ DERESİ	60		0	0	
	HACÇALI DERESİ	0		5	75	
	SARI İMAM DERESİ	850		19	285	
	YAĞMUR DERESİ	150		3	45	
	KÜÇÜK MENDERES KOLU	2.430		96	1.440	
	YENİKÖY DEĞİRMEN ÖNÜ DERESİ	1.520		24	360	
	MANDIRACILAR SİTESİ KILCAL DERELER	300		12	180	
	MOSKOF ÇAYI VE KOLU	2.000		126	1.890	
	AYRANCILAR İNÖNÜ MAH. 147 SOK.	210		7	105	
	AYRANCILAR DERESİ	1.050		18	270	
	25 SOK. YAĞMUR KOLLARI AYRANCILAR	290		4	60	
	ÜÇ PINAR DERESİ VE KOLLARI	1.410		35	525	
	BOZALAN DERESİ	1.720		35	525	
	BADEMLİ DERESİ YAZIBAŞI	940		12	180	
	ENGELLİ DERESİ KARAKUYU	100		0	0	
	MEZARLIK DERESİ VE KOLLARI (YENİKÖY ÖRNEKKÖY)	670		14	210	
	YEMİŞLİK DERESİ ÖZBEY KÖYÜ	600		12	180	
	ÇAMLICA KÖYÜ KÖY İÇİ DERE	200		4	60	
	ÇAMLICA KÖYÜ MEZARLIK ÖNÜ DERESİ	150		0	0	
	ÜÇ GÖZ DERESİ YAZIBAŞI İSTİKLAL MAH.	90		5	75	
	ÜÇ GÖZ DERESİ YAZIBAŞI 29 EKİM MAH.	430		7	105	
	AHMETLİ KÖYÜ MEZARLIK ÖNÜ	600		6	90	
	AYRANCILAR FEVZİ ÇAKMAK MAH. İHLAS DERESİ	50		1	15	
	KUŞÇU BURUN DERESİ BACİT BORU YANI	60		2	30	
	SAĞLIK KÖYÜ CAMİ YANI	150		0	0	
	SUYUN BAŞI DERESİ	40		0	0	

İLÇE	DERE	YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	TOPLAM YAPILAN DERE TEMİZLİĞİ (m)	SEFER SAYISI	ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)	TOPLAM ÇIKARILAN MALZEME MİKTARI (t)
URLA	ÖZBEK DERESİ	500	18.608			23.990
	KALABAK DERESİ VE KOLLARI	580		30	450	
	BARBAROS KÖYÜ YAĞMUR KOLU	550		6	90	
	TABAKHANE DERESİ	2.450		159	2.385	
	İNANÇ ÇİÇEKÇİLİK YANI DERESİ	250		0	0	
	KÜP DERESİ	650		0	0	
	HAMZA DERESİ	1.258		42	630	
	SİVRİCE DERESİ	160		63	945	
	İSKELE CAD KILCAL DERESİ	630		174	2.610	
	ZEYTİNALANI DERESİ	560		16	240	
	1050 SOK KILCAL DERESİ	100		378	7.220	
	PINAR DERESİ TOROSAN	200		7	105	
	MAB DERESİ	350		16	240	
	3296 SOK DERESİ	100		8	120	
	İÇMELER DENİZ ÇIKIŞLARI	350		16	240	
	48 SOK DERESİ ÇEŞMEALTI	370		29	435	
	URLA DERESİ	100		0	0	
	YEŞİL EMLAK YANI DENİZ ÇIKIŞI	50		0	0	
	YEMİŞLİK DERESİ	450		20	300	
	NEBİOĞLU DERESİ ÇEŞMEALTI	95		6	90	
	KARA MERSİN DERESİ	570		20	300	
	UKUF DERESİ	100		4	60	
	YAĞMUR DERESİ	15		0	0	
	3285 SOK İÇİ KANALET	0		1	15	
	3247 SOK İÇİ KANALET	0		1	15	
	İÇMELER YAĞICILAR DERESİ	390		18	270	
	85 SOK URLA DERESİ	0		1	15	
	İÇMELER ÇAKALLAR DERESİ ÇANAKKALE BOĞAZ MEVKİİ	3.245		208	3.120	
	SANAYİ DERESİ	0		2	30	
	SİTELER DERESİ	0		1	15	
	ÇAKAL DERESİ	650		21	315	
	ÇAKALLAR DERESİ VE YAN KOLU	3.195		178	3.645	
	KEKLİK TEPE DERESİ	290		5	75	
	BOZAVLU DERESİ	400		0	0	
	ÇEŞMEALTI 114 SOK İÇİ DERESİ	0		1	15	
TOPLAM		271075 m			254285 t	

İZMİR KÖRFEZİ SU KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

İzmir Körfezi'nin çevresindeki akarsuların taşıdığı malzemelerin birikimi sonucu oluşan **karasallaşma**, Körfez'in karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biridir. İzmir Körfezi'ndeki su değişim potansiyeli, gerek Körfez'in doğal batimetrik yapısı ve karmaşık yapıdaki kıyı şeridi, gerekse Körfez'e boşalan akarsuların ve derelerin ağzında malzeme taşınımına bağlı olarak meydana gelen birikimler nedeniyle, olumsuz yönde etkilenmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yaklaşımdan yola çıkarak Körfez'in mevcut su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve gerek karasal gerekse sucul ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla **"Büyük Körfez Projesi"** genel başlığı altında toplanan projeler kümesini hayata geçirmiştir.

DERE AĞIZLARI VE RAGIPPAŞA DALYANI TARAMA ÇALIŞMALARI

İzmir Körfezi'ne dereler vasıtasıyla taşınan teressubatın belirli periyotlarla alınması ve körfez kuzey aksında su sirkülasyonunu engelleyen Ragıp Paşa Dalyanı'nın ve dere ağızlarının denizden tarama yapılarak temizlenmesi ve su sirkülasyonunu engelleyen Ragıp Paşa Dalyanı dip kalıntılarının alınması için 11.03.2010 tarihinde **Denizdibi Tarama Başmühendisliği** (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) ile İdaremiz arasında Protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Mavişehir ve Bostanlı Derelerinde tarama çalışmaları tamamlanmış ve **Ragıp Paşa Dalyanı** da dahil olmak üzere bugüne kadar (Aralık 2012 sonu itibariyle) yaklaşık **1.068.950 m^3** tarama işlemi gerçekleşmiş olup, yine protokol hükümleri kapsamında belirlenen yaklaşık 210.585 m^3 daha malzeme alınması için tarama işlemi sürdürülecektir. Dere ağızlarının açılması ve Ragıp Paşa Dalyanı dip kalıntılarının da taranmaya başlanılması ile birlikte körfezin bu bölümünde deniz suyu sirkülasyon hızında belirgin bir artış sağlanmıştır.

	Sefer Sayısı		Malzeme Miktarı (m^3)	
Ocak 2012	81		40500	
Şubat 2012	71		35500	
Mart 2012	105		52500	
Nisan 2012	81		40500	
Mayıs 2012	85		42500	
Haziran 2012	13		6500	
Temmuz 2012	67		33500	
Ağustos 2012	27		13500	
Eylül 2012	70		35000	
Ekim 2012 (*)	1	7	500	3500
Kasım 2012 (*)	38	11	19000	5500
Aralık 2012 (*)	46	19	23000	9500
TOPLAM	722		361000	

2012 yılında DLH Kazar Gemisi ile yapılan tarama çalışmaları

1 sefer = 500 m^3

2012 yılında İZSU Kazıcı Emici Tarama Gemisi ile yapılan tarama çalışmaları

1 sefer = 350 m^3

(*) Ekim ayından itibaren İdaremize ait Meltem İzmir tarama gemisi de (mavi renkli) tarama çalışmalarına katılmıştır.



MELTEM / İZMİR VE İMBAT / İZMİR

Tarama çalışmalarının daha hızlı, yüksek kapasite ve verimlilikle ve kendi öz imkanlarımızla yapılabilmesi için İdaremiz tarafından bir adet **kesici/emici tip tarama gemisi** ve bu iş gemisine lojistik destek sağlayacak **römorkör** tipinde diğer bir iş gemisinin ihale kapsamında imalatı yaptırılmıştır. **İmbat İzmir** Römorkörü, İstanbul Tuzla Tersaneleri'nde üretilmiş ve 23.06.2012 tarihinde İZSU Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. **Meltem İzmir** kesici-emici tip tarama gemisi ise, Çiğli Ata Sanayi Sitesi'nde imal edilmiş; 02.07.2012 tarihinde Levent Marina'dan denize indirilmiştir.





İMBAT İZMİR RÖMORKÖRÜNÜN TEKNİK VE MALİ DURUMU	
Tam boy	14,75 metre
Genişlik	6,40 metre
Derinlik	2,50 metre
Çekme gücü	11,4 ton
Servis sürati	10,8 knot
Maliyeti (KDV hariç)	**3.236.100,00 TL**

MELTEM İZMİR KESİCİ-EMİCİ TİP TARAMA GEMİSİNİN TEKNİK VE MALİ DURUMU	
Dubaların tam boyu	25 metre
Maksimum yüklü draft	1,5 metre
Maksimum tarama derinliği	14 metre
Minimum katı taşıma kapasitesi	800 m3/saat
Minimum katı taşıma kapasitesi (%20 katı madde içerigi ile)	4000 m3/saat
Serbest seyir hızı	10 knot
Maliyeti (KDV hariç)	**5.850.000 ,00 TL**

Her iki iş gemimizin de açılışı, **24.07.2012** tarihinde İnciraltı Levent Marina'da gerçekleştirilmiştir.



İZMİR KÖRFEZİ GERÇEK ZAMANLI SAYISAL AKINTI VE SEDİMENT TAŞINIMI MODELLEME PROJESİ

Körfezin; öncelikle doğal yapısına uygun koruma/kullanım dengesinde planlanmasının sağlanması amacıyla, denizlerin üretken olabilmeleri ve temiz kalabilmeleri açısından en önemli etken olan akıntı rejimini gerçek zamanlı olarak izlemek üzere **"İzmir Körfezi Gerçek Zamanlı Sayısal Akıntı Ve Sediment Taşınımı Modelleme Projesi"** kapsamında gerçek zamanlı meteo-oşinografik gözlem verilerine dayalı matematiksel modelleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan model; körfezde kanal açılması, derinleştirme çalışmaları ve gelecekteki kıyı tasarımı ve mühendislik uygulamalarında temel oluşturmaktadır.

İSTASYON KURULMASI

Süre giden modelleme projesi doğrultusunda İzmir Körfezi'nin akıntı modelini doğrulamak ve sürekli çevrimiçi ölçümlerle yenileyebilmek amacıyla **"Meteorolojik Ve Oşinografik Gözlem Sistemleri Kurulumu Ve İşletimi Projesi"** kapsamında tüm körfezi kapsayacak şekilde Foça / Deveboynu, Güzelbahçe / AAT, Karaburun / Büyükada ve Pasaport İskele'de kurulan gözlem istasyonları devreye alınmıştır.



Bu istasyonlardan, gerçek zamanlı yüzey suyu sıcaklığı, deniz seviyesi, tuzluluk, rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava basıncı, hava sıcaklığı, görüş mesafesi, solar radyasyon ölçüm verileri alınmakta olup; ayrıca deniz tabanına yerleştirilen akustik akıntı ölçüm cihazları vasıtasıyla su seviyesi, dalga yüksekliği ve akıntı ölçümü yapılmaktadır.

SENSÖR	Pasaport	Güzelbahçe	Foça	Karaburun
Rüzgar Hızı	●	●	●	-
Rüzgar Yönü	●	●	●	-
Hava Sıcaklığı	●	●	●	-
Atm. Basıncı	●	●	●	-
Bağıl Nem	●	●	●	-
Görüş Mesafesi	●	●	●	-
Solar Radyasyon	●	●	●	-
Yağış Miktarı	●	●	●	-
Su Sıcaklığı	●	●	●	-
Tuzluluk	●	●	●	-
Deniz Seviyesi	●	●	●	-
Akıntı Hızı	●	●	●	●
Akıntı Mekan & Zaman Değişimi	●	●	●	●



Güzelbahçe İstasyonu



Karaburun İstasyonu



Foça İstasyonu



Pasaport İstasyonu

İSTASYONLARDAN VERILERE ILIŞKIN GRAFIKLER

Bağıl Nem Grafiği;

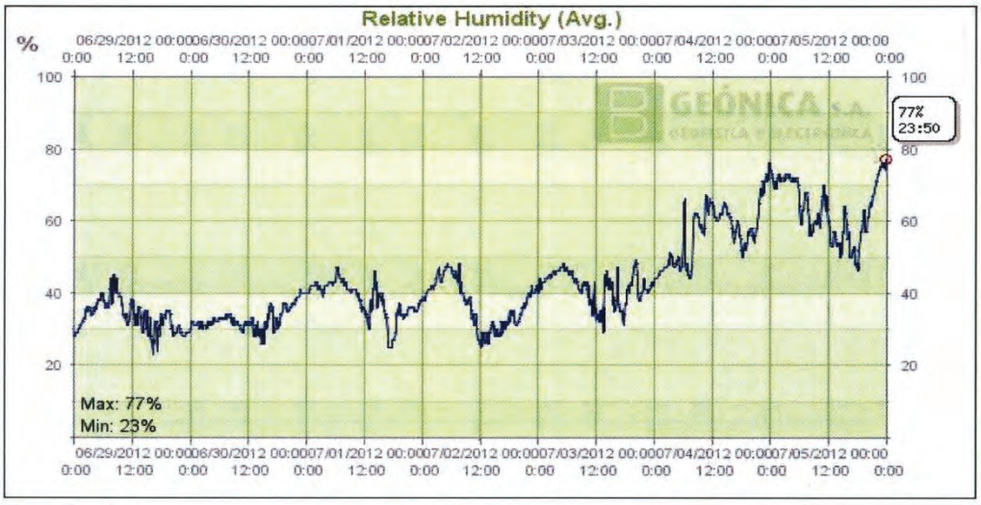

Rüzgar Yönü Grafiği;

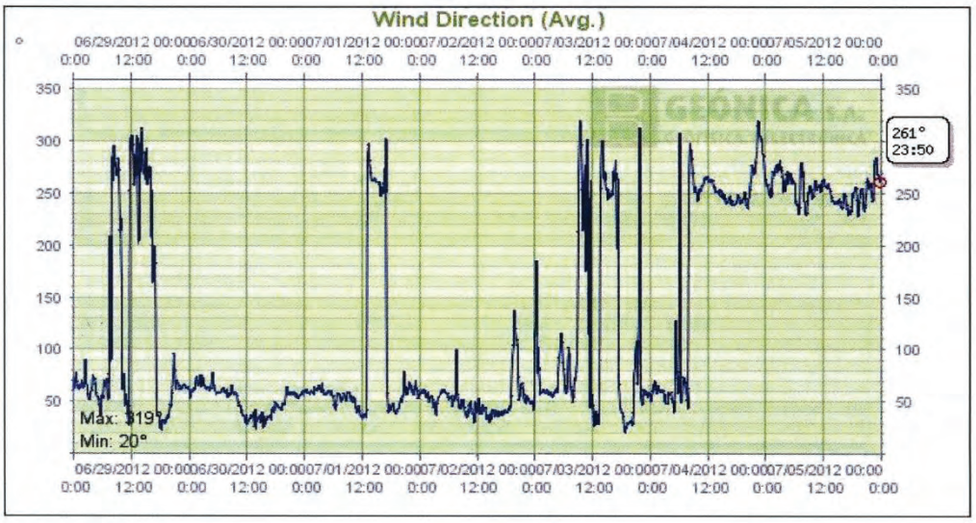

Hava Sıcaklığı Grafiği

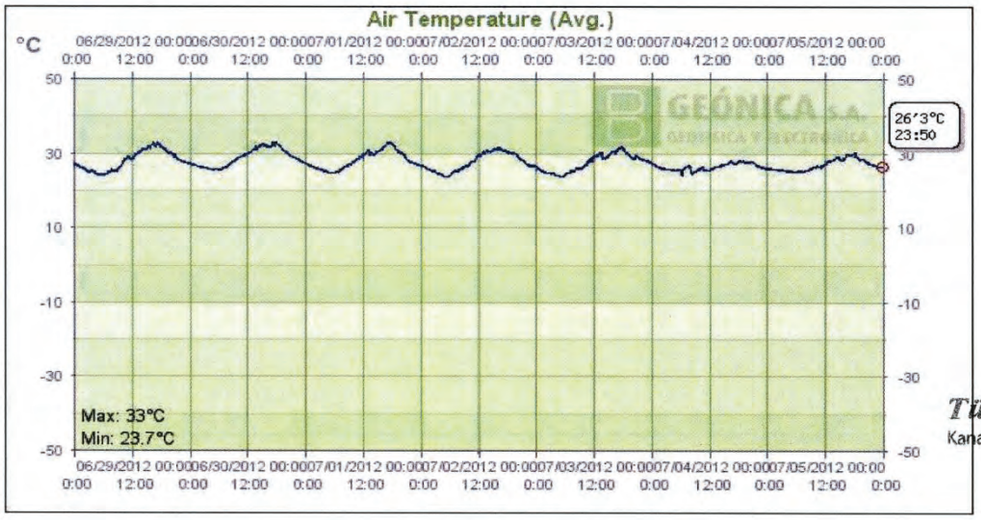

İZMİR KÖRFEZİ VE LİMANI REHABİLİTASYONU PROJESİ

İdaremiz ile Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı arasında "**İzmir Körfezi Tarama İşlerinde İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol**" 08.08.2011 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında, her iki kurum tarafından yapılacak çalışmalara ilişkin olarak mühendislik hizmetleri ile ÇED Yönetmeliği kapsamında gerekli görülen tüm iş ve işlemler entegre olarak gerçekleştirmektedir. Bu işbirliğinin ilk adımı olarak gerçekleştirilen "İzmir Körfezi ve İzmir Limanı Rehabilitasyon Projesine Ait Mühendislik Hizmetleri İle Çevresel Etki Değerlendirilme (ÇED) Raporlarının Hazırlanması ve Nihai ÇED Kararlarının Alınmasına Yönelik Danışmanlık Hizmet Alımına İlişkin İhale" Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 31.01.2012 tarihinde yapılan sözleşme ile yürürlüğe konumuştur. Sözleşme kapsamında ÇED sürecinin doğru amaçlarla yapılandırılması ve uygulanması amacıyla 19-21 Eylül 2012 tarihleri arasında sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, akademisyenler, yerel yöneticiler ve halkın katılımıyla **"İzmir Körfezi Ve Limanı Rehabilitasyon Projesi Çalıştayı"** düzenlenmiştir.



İdaremiz ve **TCDD** işbirliği ile yürütülen **"İzmir Körfezi Ve Limanı Rehabilitasyonu Projesi"** kapsamında; Körfez'in kuzey aksında oluşturulacak **Sirkülasyon Kanalı** sayesinde Körfez'e temiz su girişinin artırılması; buna bağlı olarak bölgedeki akıntı hızlarının yükselmesi; böylece ekolojik açıdan daha hassas olan kuzey kıyıları ve Gediz Deltası Sulak Alanı boyunca Körfez'e giren temiz suyun miktarının ve dolaşımının hızlanması; sonuç olarak, sulak alan potansiyeli ile önemli bir doğal değer olan, bu yöredeki su kalitesinin ve ekolojik çeşitliliğin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Yürütülen proje; Sulak Alan'ın, mevcut koşullarda görülen karasallaşmayı ve yeterli temiz su girişi olmaması nedeniyle su kalitesindeki değişimlere bağlı olarak sucul ortamın değer kaybetmesini engelleyecek; böylece mevcut karasal ve sucul ekosistemin çok daha sağlıklı bir yapıya dönüşmesine olanak sağlayacaktır.

Bu kapsamda, sirkülasyon kanalının açılacağı koordinatlardaki 25 farklı noktada sondaj çalışmaları yapılmış, analizler sonucunda 26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan **"Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"** EK-2A'da yer alan "Atık Kabul Kriterleri" çerçevesinde değerlendirildiğinde, Körfez'in muhtelif kesimlerinden taranacak malzemenin **"inert (zararsız) atık"** sınıfına girdiği görülmüştür.





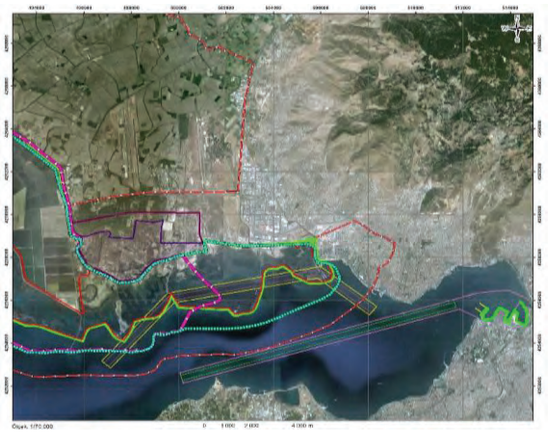



İZLEME ÇALIŞMALARI

Tüm bu çalışmalara bağlı olarak körfez suyundaki değişimleri yakından takip etmek ve dereler yoluyla körfeze boşalan suyun yarattığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimleri izlemek amacıyla yürütülen "**İzmir Körfezi Su Kalitesi İzleme Projesi**" kapsamında belirlenen 22 farklı noktadan periyodik olarak numune alınarak İdaremize bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nde analizleri yapılmaktadır.

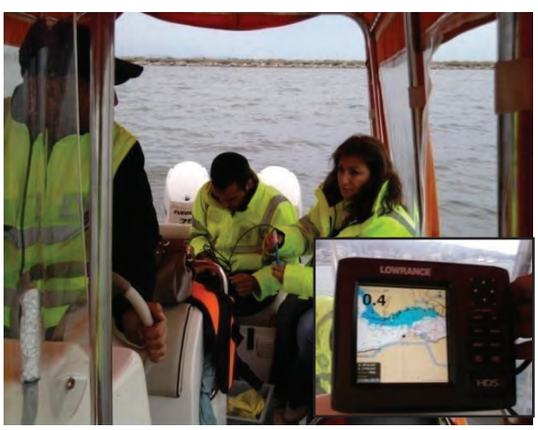

MAKİNE VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



22.02.2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, İZSU Genel Kurulu'nun 08.12.2006 tarih M.35.0.İBB.5.01.21 / 494 sayılı kararı ile ihdas edilen Atölye ve Ambarlar Daire Başkanlığı ünvanı değiştirilerek, Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı ünvanı ile yeniden teşkilatlandırılmıştır

İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı bulunan ve İZSU Yönetim Kurulunun 27.10.2011 tarih, M.35.1.İBB.5.01.11.04-50.02.04 / 686 sayılı kararı gereğince yeniden teşkilatlanan

Daire Başkanlığı;

1 – Araç Sevk ve Bakım Şube Müdürlüğü
2 – Elektrik ve Pompa İstasyonları Şube Müdürlüğü
3 – Bina ve Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

birimlerinden oluşmaktadır.

ELEKTRİK VE POMPA İSTASYONLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Su dağıtım sisteminin önemli bir kısmını oluşturan içme suyu amaçlı motopompların verimli bir şekilde sürekli çalışabilirliklerini sağlamak amacıyla pompa, motor ve ekipmanlarında yapılması gereken bakım, onarım, revizyon, montaj-demontaj v.b. gibi çalışmaları organize etmek ve yapılan çalışmaları denetlemek.

Pompa, motor ve ekipmanlarında oluşan arızaların, zamanında ve en kısa süre içerisinde giderilmesini sağlamak.

Sistemde çalışan motopompların ideal verimli olduğu noktalarda çalışmalarını sağlamak amacıyla, verimi düşük ve sık sık arıza yapan motopompların tespit ve yenileme çalışmalarını organize etmek.

Birimlerin talepleri doğrultusunda; istenilen yerlere ve istenilen değerlerde içme suyu amaçlı motopomp ve ekipmanlarının alımı ile yerlerine montaj çalışmalarını organize etmek.

Pompa istasyonlarında montajlı motopompların bakımlarını yaptırmak.

Merkez bölge pompa istasyonlarında kompanzasyon sistemi takibini yaptırmak ve arızalarını gidermek.

Tesislerimize ait diğer elektriksel arızaların (ölçü sistemi, aydınlatma, yüksek gerilim, elektrikli el aletleri ve kablo arızaları) giderilmesini sağlamak.

Diğer birimlerle ortak yürütülecek çalışmaları organize etmek.

Çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin tespit ve alımının zamanında yapılmasını sağlamak.

HARCAMA BİRİMİ : MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

NO	NO	Proje/Faaliyet Adı		Başlangıç Tarihi Gün/Ay/Yıl	Bitiş Tarihi Gün/Ay/Yıl	Yapılan Çalışmalar		Açıklamalar
Elektrik ve Pompa İstasyonları Şube Müdürlüğü	1	**Bakım ve onarım malzemesi alımları**		01/01/2012	31/12/2012	Birimlerin talepleri doğrultusunda gerek metropol alanı içerisinde, gerekse çevre ilçe, belde ve köylerdeki arıza, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin istekleri yapıldı.		Araç-iş makinası, elektrik, pompa, inşaat, boya, kaynak ve torna çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bakım ve onarım malzemelerini kapsamaktadır.
	2						**Adet**	
		Bakım ve onarım faaliyetleri	Pompa ve Elektrik Atölyesi Faaliyetleri	01/01/2012	31/12/2012	Pompa Arıza-Onarım Çalışmaları	192	Gerek metropol alanı içerisinde gerekse çevre ilçe, belde ve köylerde toplam **3356** adet arıza-onarım, montaj, revizyon ve bakım çalışması gerçekleştirilmiştir.
						Ekipman Arıza-Onarım Çalışmaları	40	
						Motor Arıza-Onarım Çalışmaları	247	
						Pano Arıza-Onarım Çalışmaları	204	
						Diğer Elektrik Arıza-Onarım Çalışmaları	1283	
						Pompa Montaj Çalışmaları	100	
						Ekipman Montaj Çalışmaları	208	
						Motor Montaj Çalışmaları	110	
						Pano Montaj Çalışmaları	23	
						Diğer Montaj Çalışmaları	150	
						Pompa Revizyon Çalışmaları	47	
						Ekipman Revizyon Çalışmaları	59	
						Motor Revizyon Çalışmaları	55	
						Pano Revizyon Çalışmaları	52	
						Pompa Bakım Çalışmaları	252	
						Motor Bakım Çalışmaları	252	
						Pano Bakım Çalışmaları	82	

BİNA VE TESİSLER BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Bina ve tesislerimizin verimli bir şekilde sürekli çalışabilirliklerini sağlamak amacıyla yapılması gereken kaynak, inşaat, torna, boya vb. bakım onarım çalışmalarını organize etmek ve yapılan çalışmaları denetlemek.

Daire başkanlığımız bünyesinde kullanılan tüm malzemelerin teminini, ambar giriş-çıkışlarının yapılmasını ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Harcama Yetkilisi ile birlikte Gerçekleştirme Görevlileri olarak stratejik plan, performans programı ve analitik bütçe ile ilgili çalışmaları yürütmek.

İdaremize ait diğer tesislerin ve pompa istasyonlarının bakım onarımlarının (inşaat bakım onarım, tadilat, boya vs.) yapılmasını sağlamak.

Diğer birimlerle ortak yürütülecek çalışmaları organize etmek.

Çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin tespit ve alımının zamanında yapılmasını sağlamak.

Yapılan çalışmalar ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

4857 Sayılı İş Kanunu gereği; çalışmalar esnasında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak ve aldırılmasını sağlamak.

HARCAMA BİRİMİ : MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

NO	NO	Proje/Faaliyet Adı		Başlangıç Tarihi Gün/Ay/Yıl	Bitiş Tarihi Gün/Ay/Yıl	Yapılan Çalışmalar		Açıklamalar
Bina ve Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü	3	**Bakım Onarım Faaliyetleri**	Pompa İstasyonları Tadilatı	01/01/2012	31/12/2012	Narlıdere bölgesinde bulunan muhtelif 7 adet pompa istasyonunun tadilatı ve bakım onarımı gerçekleştirildi.		
			Kaynak Atölyesi Faaliyetleri	01/01/2012	31/12/2012	İmalat Çalışmaları	415	Gerek metropol alanı içerisinde gerekse çevre ilçe, belde ve köylerde toplam **1.888** adet kaynak çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
						Şebeke Bağlantı Kaynak Çalışmaları	304	
						Demir-Doğrama	780	
						Pompa Montaj Çalışmaları	73	
						Araçlarda ve İş Makinelerinde Yapılan Kaynak Çalışmaları	87	
						Muhtelif Kaynak Çalışmaları	229	
			Torna Atölyesi Faaliyetleri	01/01/2012	31/12/2012	Muhtelif torna-tesviye çalışmaları	8880	Birimlerin talepleri doğrultusunda toplam **34.730** adet torna-tesviye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
						Muhtelif freze çalışmaları	660	
						Radyal Çalışmaları	25190	
			İnşaat - Marangoz Atölyeleri Faaliyetleri	01/01/2012	31/12/2012	Beton İşleri	71	Gerek metropol alanı içerisinde, gerekse çevre ilçe, belde ve köylerde birimlerin talepleri doğrultusunda toplam **279** adet inşaat ile ilgili tamir ve tadilat çalışmaları (duvar örme, fayans-seramik döşeme, beton dökme, sıva, çatı tamir ve tadilatı v.b. gibi) ile marangozluk ile ilgili tamir ve tadilat (masa, sandalye, etajer, kapı, pencere, dolap v.b. gibi) çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
						Sıva İşleri	27	
						Duvar İşleri	26	
						Seramik Fayans ve Plaka İşleri	29	
						Demir İşleri	19	
						Kalıp İşleri	79	
						Çatı İşleri	28	
	4	**Ambar Birimi Satın Alma İşlemleri**	İdaremize ait tüm birimlerden gelen satın alma talep formlarına istinaden, talebi yapılan malzemelerin stok kontrolleri ve takip çalışmaları ile Çevre İlçe, Belde ve köylerden gelen talepler doğrultusunda malzeme temini çalışmaları yapılmıştır.	01/01/2012	31/12/2012	İsteği yapılan söz konusu malzemelerin stok kontrol ve takip çalışmaları yapılmış, gerekli evrakları hazırlanarak ihale aşamasına getirilmiştir.		
			Akaryakıt İşlemleri	01/01/2012	31/12/2012	İdaremize bağlı araç, iş makinesi ve makine ekipmanlarında kullanılan akaryakıtların dağıtımı gerçekleştirilmiştir. (Ayrıca DLH ile imzalanan protokol kapsamında akaryakıt dağıtımı gerçekleştirilmiştir.) TOPLAMDA İSE 3.296.968 LT EURO DİZEL, 91.705 LT KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.		
	5	**Ambar Birimi Taşınır İşlemleri**	Hurdaya Ayırma ve Zimmet İşlemleri	01/01/2012	31/12/2012	Kullanılamaz durumdaki malzemelerin tespitleri yapılıp hurdaya ayrıldı. 253-254-255 grubu envanter kayıtlarında bulunan tüm malzemelerin, personele zimmetleri yapıldı		
			Sayım İşlemleri ve Raporlama	01/01/2012	31/12/2012	Daire Başkanlığı yıl sonu sayımları yapıldı ve ilgili raporlar muhasebe birimine gönderildi. 3 aylık dönemlerde mutabakat raporları çekilerek muhasebe birimi ile mutabakat sağlandı.		

ARAÇ SEVK ve BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesindeki araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım hizmetlerini tekniğine ve talimatlara uygun olarak yaptırmak. Sevk ve idarede ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi için koordinasyonu sağlamak.

Bakım ve tamir atölyelerinin çalışmalarını kontrol ve koordine etmek, araçların bakım onarımlarının zamanında ve gerektiğinde yetkili uzman servislere yaptırılmasını sağlamak.

Ortak kullanımda olan araçların (İş makineleri ,vinçler , kamyonlar ve havuzdaki araçlar)sevk ve idaresini denetlemek.

Araçların trafik işlerinin takibini (Sigorta , vize , egzoz , vergi vb.) yaptırarak , hasarlı trafik kazalarında gerekli işlemler ile trafik cezalarını takip ettirmek

Ekonomik ömrünü dolduran araçların trafikten çekme ve hurdaya ayırma işlemlerini aracın bağlı bulunduğu birimle ortaklaşa gerçekleştirmek.

İhtiyaç duyulan araç ve iş makineleri için uygun teknik şartnameleri Atölyeler sorumlusu ve/veya teknik personele hazırlatarak satın alınmasını sağlamak.

İZSU Genel Müdürlüğüne ait araçların ilgili şube müdürlüklerine zimmet karşılığı dağıtılmasını sağlatmak. Araçların yer değiştirmelerinde gerekli teslim belgelerini düzenletmek.

Satın alınan yedek parçaların uygunluğunu talebi yapan atölye ustabaşısına kontrol ettirmek.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Harcama Yetkilisi ile birlikte Gerçekleştirme Görevlileri olarak stratejik plan, performans programı ve analitik bütçe ile ilgili çalışmaları yürütmek.

Diğer birimlerle ortak yürütülecek çalışmaları organize etmek.

Çalışmaların aksamadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin tespit ve alımının zamanında yapılmasını sağlamak.

Yapılan çalışmalar ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

4857 Sayılı İş Kanunu gereği; çalışmalar esnasında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak ve aldırılmasını sağlamak.

HARCAMA BİRİMİ : MAKİNA İKMAL VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

NO	NO	Proje/Faaliyet Adı	Başlangıç Tarihi Gün/Ay/Yıl	Bitiş Tarihi Gün/Ay/Yıl	Yapılan Çalışmalar		Açıklamalar
Araç Sevk ve Bakım Şube Müdürlüğü	6	**Araç Bakım Atölyeleri Faaliyetleri**	01/01/2012	31/12/2012	Motor Arızaları	459	İdaremize ait araçlardan; iş makinaları, kamyon, kamyonet, minibüs ve binek araçların toplam **4.753** adet değişik arıza, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
					Fren Arızaları	283	
					Debriyaj Arızaları	119	
					Şanzıman Arızaları	97	
					Diferansiyel Arızaları	2	
					Alt Takım Arızaları	747	
					Soğutma Sistemi Arızaları	205	
					Yakıt Sistemi Arızaları	128	
					Elektrik Aksamı Arızaları	735	
					Ateşleme Sistemi Arızaları	15	
					Motor Ayar Arızaları	17	
					İş Makinesi Arızaları	242	
					Kaporta Arızaları	435	
					Oto Boya Arızaları	6	
					Yağ Bakım	859	
					Lastik tamir, bakım ve onarım çalışmaları	404	
	7	**Araç Sevk ve Bakım Şube Müdürlüğü Faliyetleri (499 adet muhtelif marka araç ve 123 adet iş makinesi bazında)**	01/01/2012	31/12/2012	Halkapınar Sular işletmesi hurda sahası içerisinde bulunan ve çevrelerden gelen hurdaların Menemen Atıksu Arıtma Tesisleri içerisindeki depo sahasına nakli sağlanmıştır.		
					Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan çeşitli cins ve miktarlardaki 382 Adet aracın Eksoz Emisyon pulu ve 21 Adet aracın Eksoz Emisyon kartı ihalesi yapılmış olup ay bazında günü gelen araçların Emisyon pulları ve emisyon kartlarının alınması sağlanmıştır.		
					Yıl içerisinde maddi hasarlı kazalara karışan araçlarımızın kusur nispetine göre hasar bedellerinin karşı tarafın sigortalarından tahsili sağlanmıştır.		
					Dışarıda protokol ile çalışan araçlarımızın kira protokollerinin takip edilerek kira bedelinin tahsili için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bilgi verilmiştir.		
					Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan 402 Adet araç, 94 Adet iş makinesi ve 4 Adet araca ait tehlikeli maddeler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarının 2011 yılı içerisindeki ihalesi yapılmış olup ay bazında günü gelen araçların sigorta poliçelerinin temini sağlanmıştır.		
					137 adet çift sürgülü kapılı camlı panel binek araç, 20 adet sedan tipi binek araç ve 58 adet çift kabinli kamyonet olmak üzere toplam 215 adet sürücüsüz kiralık araç çalıştırılmıştır.34 adet minibüs, 81 adet çift sürgülü kapılı camlı panel binek araç, 34 adet çift kabinli kamyonet olamk üzere toplam 149 adet sürücülü araç çalıştırılmıştır.		

2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2010-2014 STRATEJİK PLANI - 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE FAALİYET GERÇEKLEŞMELERİ

AMAÇ-1	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI DAHİLİNDE: YENİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRIP BULARAK MEVCUT SU KAYNAKLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAYARAK, SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİNİ VE SU KAYIPLARINI ÖNLEYEREK SAĞLIKLI VE YETERLİ SU TEMİN ETMEK, ARITMAK VE DAĞITMAK.
HEDEF-1	Mevcut su havzalarını koruyarak ve yeni su kaynakları bularak temiz ve sağlıklı su temini sağlamak.

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
1	1	1	İzmir İçme Suyu Master Planının Hazırlanması	340.102,84	33.696,75	10%	Master plan sözleşmesi fiziki gerçekleşmesinin %30 'unu tamamlamak.	-	0%	İhale süreci başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır.	Projeler Dairesi Başkanlığı
1	1	2	Yeni Yüzeysel Su Kaynakları	1.156.349,69	114.568,97	10%	Yeni yüzeysel su kaynakları revize planlama raporları veya projelerinin hazırlanmasına dair hizmet alımı sözleşmesinin %50'sini tamamlamak.	İzmir İçmesuyu Gördes ve Çağlayan Uygulama Projeleri kapsamında Arıtma Tesisi Projeleri onaylanmıştır.Bostanlı Barajı Revize Planlama Raporu ve Uygulama Projeleri kapsamında mühendislik hidrolojisi, jeolojisi, doğal yapı gereçleri, kamulaştırma revize planlma raporları onaylanmak üzere DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Hidroloji ve sismik risk değerlendirme raporları onaylanmış ve idaremize teslim edilmiştir. Alionbaşı Barajı Revize Planlama Raporu hazırlanması ve ihalesi yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir.	100%	-	Projeler Dairesi Başkanlığı
1	1	3	Çamlı Barajı İsale Hattı Arıtma Tesisi	427.395,91	42.345,59	10%	Çamlı barajı revize planlama raporu sözleşmesinin %50 'sini tamamlamak.	İzmir İçmesuyu Projesi Çamlı Barajı Revize Planlama İşi 2012 yılı sonunda tamamlanmıştır.	100%	-	Projeler Dairesi Başkanlığı
1	1	4	Değirmendere Barajı İsale Hattı İçme Suyu Arıtma Tesisi	793.573,32	78.625,77	10%	Değirmendere barajı revize raporu ve uygulama projelerinin %50 'sini tamamlamak.	Ara rapor kapsamında mühendislik hidrolojisi, jeolojisi, doğal yapı gereçleri, kamulaştırma revize planlma raporları onaylanmak üzere DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Hidroloji, jeoloji ve sismik risk değerlendirme raporları DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanarak idaremize teslim edilmiştir.	26%	DSİ .2.Bölge Müdürlüğü ile İdaremiz arasında yapılan protokole istinaden proje ve raporların onay süreçlerindeki geçikmeler ve baraj tipinin seçimi ve malzeme ocakları seçimindeki geçikmeler yüzünden sapmalar meydana gelmiştir.	Projeler Dairesi Başkanlığı
1	1	5	Tuzlusu Arıtma Tesisleri	68.020,47	6.739,26	10%	Tuzlusu arıtma tesisi fizibilite etüdü raporunun fiziki olarak %100 'ünü tamamlamak.	-	0%	Fizibilite çalışmalarını yürütecek kurumlarla ilgili çalışmalar devam ediyor.	Projeler Dairesi Başkanlığı
1	1	6	İçme Suyu (Yeraltı Suyu) Arıtma Tesisi	1.517.755,61	11.653,68	1%	7 adet arıtma tesisi	-	0%	*Bu yıl ilgili faaliyette fiziksel gerçekleşme olmamış olup, performans programına göre planlanan personel giderleri ve sgk devlet pirimi giderleri kelemlerindeki gerçekleşmeler toplam mali gerçekleşmeye yansımıştır.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1	1	8	Sarıkız (Gördes) İçme Suyu Arıtma Tesisi	1.118,67	77,77	7%	-	İş 2011 yılında tamamlanmıştır.	-	2011 yılında iş tamamlanmış olup, 2012 yılında kalan ödemeler için ve olursa öngörülmeyen masraflar için mali kaynak ayrılmıştır.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1	1	9	Aliağa İçme Suyu Arıtma Tesisi (Yenileme)	22.673,52	2.246,45	10%	Petkim ile protokol hazırlanması halinde Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisi (Yeni Tesis) projelerinin fiziki olarak %15 'ini tamamlamak.	Petkim ve DSİ ile sürdürülen Güzelhisar Barajından su verilmesine ilişkin görüşmeler sonuçlanmış ve 2012 yılında protokol imzalanmıştır.	0%	Arıtma Tesisi yapılacak alanların orman sahası içinde kalması nedeniyle gerekli izinler için başvurulmuş henüz sonuç alınamamıştır. Bu nedenle proje çalışmalarına başlanamamıştır.	Projeler Dairesi Başkanlığı

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
1	1	11	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini (Etüd)	10.030,00	10.030,00	100%	İhtiyaç duyulan kuyular, terfi istasyonları, arıtma tesisleri, hizmet binaları için 7 adet enerji temin proje sözleşmesi yapmak ve tamamlamak.	-	100%	* Etüd ve Planlama Dairesi Başkanlığı ile Projeler Dairesi Başkanlığı Mayıs ayından itibaren ayrı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 1-1-11 kodlu faaliyet, Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından devam ettirilmiştir.	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
1	1	11	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini (Proje)	114.674,37	25.300,07	22%	İhtiyaç duyulan kuyular, terfi istasyonları, arıtma tesisleri, hizmet binaları için 7 adet enerji temin proje sözleşmesi yapmak ve tamamlamak.	İlçe, mahalle ve köylerde sondaj kuyularına, pompa istasyonlarına elektrik temini için 32 adet proje hazırlandı. Ayrıca devam eden projelerde bulunmaktadır.	100%	-	Projeler Dairesi Başkanlığı
1	1	11	Su Kuyusu Araştırma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini (Yapım)	1.669.524,62	1.410.539,85	84%	16 adet su kuyusu açmak.	17 adet Su Sondaj kuyusu 1 adet Atıksu Terfi istasyonuna Elektrik temini 2 adet Terfi merkezi imalatı 9 adet İçmesuyu Terfi Merkez 6 adet İçmesuyu Kuyusu Enerji Temini) 1 adet Pompa istasyonu Güç Yükseltilmesi 1 adet Yağmursuyu Terfi Merkezi 10 adet Sondaj Kuyularına Motopomp temini ve montajı ile saç kabin imalatı 2 adet Arsenik giderimi için paket arıtma sistemi ekipmanı temini ve montajı işi. 1 adet Güvenlik kulubelerine elektrik temini işi) 1 adet Yağmursuyu Terfi Merkezi Alçak Gerilim Özel Anahtar Elektrik işi 1 adet Su Deposuna Elektrik Temini ve 1000m3 lük Depo Elektrik Temini İşi devam etmektedir.	106%	-	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1	1	12	Yeraltı Kuyularının Sağlıklı Kütüklerini Oluşturmak ve İyileştirme Çalışmaları	600.000,00	448.070,78	75%	*%100 *Faaliyet 2010 yılında başlamış olup, 2012 yılında da devam edilecektir.	Proje kapsamında 2011 yılında ihalesi yapılan Aliağa ve Menemen ilçelerindeki 14 adet merkez kuyusunun üretim debilerinin takibi için debimetre montajı işi bitmiştir. İzmir muhtelif bölgelerde 54 adet sondaj kuyusu inkişafı işi başlamış olup öncelik sırasına göre kuyular temizlenmeye başlamıştır. Toplamda 30 adet kuyu inkişafı bitmiş bulunmaktadır. 123 adet elektromanyetik debimetre alımı işi tamamlanmıştır.Ayrıca proje kapsamında 29 adet transformatörbakım işi bitmiştir. mevcut hamsu ve atıksu pompalarının genel bakımı tamamlanmıştır.	74%	*Transformatör bakımları bittiği ve kabul aşamasına gelinmesi rağmen ve işin 2013 yılına sarkması nedeniyle 2012 yılı içinde ödeme yapılamamıştır.	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
1	1	13	Yüzeysel Sulardan Sağlıklı İçme Suyu Üretimi	15.837.580,95	12.755.388,80	81%	Üretilen suyun %100'ünün standartlara uygun olması.	Bu faaliyet kapsamında yüzey suyundan içmesuyu temin edilen Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Aliağa, Sarıkız İçmesuyu Arıtma Tesislerinden 2012 yılında toplam 89.166.874 m3 standartlara uygun olarak su üretimi gerçekleştirilmiştir.	100%		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
1	1	14	Çamlı Baraj Havzası Bilimsel Etüdü	152.800,00	-	0%	Bu havzanın koruma ve uygulama prensiplerinin belirlenmesi.	*Etüd Plan Dairesi Başkanlığı'nca ihalesi yapılan 2.ci planlama raporu revizyon çalışmasının tamamlanmasından sonra bilimsel etüd çalışmasına başlatılacaktır.	0%	*Baraj yapımına ilişkin mevcut planlama raporunu DSİ'nin kabul etmemesi nedeni ile 2.ci planlama raporu revizyon çalışmasının yapılma zorunluluğu getirilmesi ve çalışmanın sürmesi yüzünden hedeften sapmalar meydana gelmiştir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
1	1	15	Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı Ağaçlandırılması, Bakım ve Koruma İşi	500.000,00	269.565,16	54%	100 Hektar alanın ağaçlandırılması, 250 hektar alanın bakımı , 530 hektar alanın korunması	120 hektar alanın ağaçlandırılması, 402 hektar alanın bakımı, 612 hektar alanın koruması yapılmıştır.	110%	*Fiziksel gerçekleşme %100' ün üzerindedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
1	1	16	İçme Suyu Havzalarının Koruma ve Kontrol Çalışmaları	432.776,20	270.222,76	62%	Asgari 1.500 adet kirletici denetim sayısı	*1.977 adet kirletici denetlenmiştir.	132%	*Fiziksel gerçekleşme %100' ün üzerindedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
1	1	17	Kamulaştırmalar	10.463.837,36	6.796.144,54	65%	Genel müdürlük proje ve faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kamulaştırmaların fiziki olarak %100' ünü tamamlamak.	Gördes Barajı Mutlak Koruma Alanı içinde kalan Karayakup Köyünde 9 Adet parsel (tam) toplam 8.084,00 m2 alan ile 10 Adet (hisseli) toplam 8.521,99 m2 alan İdaremiz adına tescil edilmiştir.Tahtalı Barajı Koruma Alanında toplam 20 Adet parsel 277.098,62 m2 ile aynı alanda toplam 17 Adet parsel (hisseli) 63.680,09 m2 alan idaremiz adına tescil edilmiştir.İlçelerde toplam 50 Adet parsel, 189.913,97 m2 alan idaremiz adına tescil edilmiştir.İdaremiz adına toplam 8 Adet parselin, 27.783,86 m2 alanın daimi tahsisi gerçekleştirilmiş ve toplam 4 adet parselde 2.864,09 m2 alanın idare adına daimi irtifak hakkı tesisi kurulmuştur.	100%	-	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	34.108.213,54	22.275.216,21	65%					

			HEDEF-2	Su dağıtım hatlarını ve su tesislerini hijyenik biçimde ve sürekli çalışır halde tutmak ve modernleştirmek.							
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
1	2	1	İzmir İçme Suyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi	500.000,00	441.026,67	88%	*%100 *Bu projenin sözleşmesi 950.400,00 TL bedelle 2 yıllık olarak imzalanmış, 20.05.2010 tarihinde iş başlamıştır. İş programına göre 2012 yılı ödemeleri 160.030,00TL' dir. Benzer şekilde 2012 yılında yenilenecektir.	İş programına uygun olarak; periyodik hat bakım ve kontrolleri yapılmıştır.	88%	*İzmir İçme Suyu İsale Hatlarının Bakım, Onarım ve İyileştirilmesi işine ait 2012 yılı için 500.000,00 TL ödenek ayrılmış olup 350.000,00 TL artış yapılarak 850.000,00 TL olarak revize edilmiştir. *Planlanan işlerin tamamı gerçekleşmiştir ancak geçici kabul eksikleri için her ara hakedişten kesilen hakediş bedelinin %10'u kadar tutarın ödemesi geçici kabul onaylandıktan sonra yapılacaktır.	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
1	2	2	Su Kalitesinin İzlenmesi Çalışmaları	4.182.466,66	3.088.380,04	74%	Asgari 125.000 adet analizlenen parametre sayısı	*Asgari 168.084 adet analizlenen parametre sayısı	134%	*Fiziksel gerçekleşme %100' ün üzerindedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
1	2	3	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması	2.000.000,00	1.835.100,63	92%	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen su depolarının bakım ve onarımı için öngörülmüştür. Bu faaliyet kapsamında; Torbalı ilçesinde 32 adet, Bayındır ilçesinde 26 adet, Menderes ilçesinde 28 adet, Selçuk ilçesinde 10 adet, Kemalpaşa ilçesinde 30 adet, Urla, Seferihisar ilçelerinde 55 adet olmak üzere toplam 181 adet içmesuyu deposunun ihale marifetiyle revizyonu için öngörülmüştür. Su depolarının bakım ve revizyonları yapıldığında abonelerimize daha sağlıklı su verilmesi sağlanacaktır.	Bayındır Teknik Amirliği Sorumluluk Alanındaki İzsu İçmesuyu Depolarının Bakım ve Onarım İşi Kapsamında, 19 köy deposu yenilenmiştir. Ayrıca Yarımada Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanındaki Mevcut Su Depolarının Bakım Ve Onarım İnşaatı işi kapsamında 30 adet tesisin bakım ve onarımı yapılmıştır.	54%	*Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tarafından İşletilen Su Depolarının Bakım ve Revizyonlarının Yapılması faaliyetini ilgilendiren "Atölye ve Tesis Binalari Bakim ve Onarimi Giderleri" kaleminden ödenek aktarılması sebebiyle Yıllık planlanan ödenek 2.000.000 TL olmuştur.	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1	2	4	Genişleyen İZSU Hizmet Alanı Üzerinde Scada Sistemi Tesis Etmek	5.000.000,00	44.132,00	1%	*%100 *Proje hazırlanmış olup 2012 yılı son çeyreğinde ihalesi yapılacaktır.	25 Haziran 2012 tarihinde ihalesi yapılmıştır.	0%	-	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı
1	2	5	Pompa İstasyonlarının İyileştirilmesi Çalışmaları	400.000,00	49.442,00	12%	2012 Yılı Sonuna Kadar 15 Adet Pompa İstasyon Binasının İyileştirilmesi Çalışmalarını Tamamlamak	7 adet pompa tadilatı yapılmıştır	47%	Akaryakıt Ototmasyon Sistemi Kurulması işine ait 750.000 TL lik maliyet bu proje kapsamına ilave edilmiştir. Ancak söz konusu işin ihale çalışmaları devam ettiğinden herhangi bir harcama yapılamamıştır. Ayrıca birinci 3 aylık dilimde gerçekleştirilen 7 adet pompa istasyonu tadilatı işine dair ödeme ikinci 3 aylık dilimde yapılmıştır. *Sermaye giderleri kaleminden 600.000 TL Ödenek düşülmüştür.	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	12.082.466,66	5.458.081,34	45%					

			HEDEF-3	Su dağıtım sistemini sürekli izlemek ve enerji hatlarının tasarruflu ve sorunsuz biçimde çalışmasını sağlamak.							
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
1	3	4	Atölye Bakım Onarım Çalışmaları	25.317.400,00	24.146.154,31	95%	Yıl İçerisinde Gerçekleşen Arızaların, %100 Oranında Bakım, Onarım Çalışmalarını Gerçekleştirmek	46.204 adet bakım onarım çalışması gerçekleştirilmiştir.	100%	Söz konusu bakım onarım çalışmaları, İdaremiz diğer birimlerinden gelen arıza talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	25.317.400,00	24.146.154,31	95%					

			HEDEF-4	Su kaçaklarını en aza indirerek kaynak arttırımını sağlamak.							
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
1	4	1	Muhtelif İçme Suyu Hatlarının Revizyonu ve Boru Alımı	74.008.585,20	73.713.126,55	100%	600 km	515,7 km. Muhtelif İçme Suyu Hatlarının Revizyonu ve Boru Alımı 5.931 adet ara parça alımı	86%	-	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1	4	2	5216 Sayılı Yasa İle İlave Edilen İlçe ve Beldelerde Uzaktan Okuma Sistemi Kurulması	200.000,00	-	0%	5216 sayılı yasa ile ilave edilen ilçe ve beldelerde oluşturulan izole bölge sayaçlarının otomasyonunu sağlayacak sistemin kurulması amacıyla 2012 yılında 40 adet izole bölge sayacı kurulması öngörülmüştür.	-	0%	5216 sayılı yasa ile ilave edilen Bölgelerde şebeke yenileme çalışmaları tamamlanamadığından projeye başlanamamıştır. Elektrik Alımları" kalemine 800.000 TL ödenek aktarımı yapıldığından bu kalemin ödeneği 200.000 TL olmuştur.	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1	4	3	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması	72.833.640,00	63.122.034,95	87%	İçme suyu sisteminin iyileştirilmesi, bakım onarımlarının yapılması ile su kaçaklarını en aza indirerek su kaynaklarının verimli kullanılması ve abonelerimizin kesintisiz su almasını sağlamak, yeni su taleplerinin karşılanması ile abonelerimizin memnuniyetinin sağlanması amacıyla 2012 yılında yapılacak faaliyetleri kapsar.	Toplam *57,3 km. branşman hattı yenilenmesi *İZSU imkanları ile 56,3 km. , ihale yoluyla 60,3 km. olmak üzere toplam 117.6 km. ana boru döşenmiştir. *3.757 adet sayaç bağlantısı ihaleli işler kapsamında yapılmıştır. *19.185 adet su bağlantısı devam eden işler kapsamında yapılmıştır. *87.639 adet su şebeke arızasının giderilmesi sağlanmıştır.	100%	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması faaliyetine yapılan bütçe aktarımları sonucu, faaliyetin ödeneği değişmiştir.	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1	4	4	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Kaçağı Azaltma Çalışmaları	2.822.660,00	2.469.775,76	87%	Mevcut izole bölge sayaçlarının tüketimlerinin izlenmesi, su kaçağı tespit yöntemleri ile görünmeyen şebeke arızalarının tespiti giderilmesi, izole sayaç bölgelerinde gerekiyorsa basınç regülasyonu yapılması ile su kayıplarının azaltılmasını kapsar.	1.674 Adet görünmeyen şebeke arızasının tespiti ve giderilmesi yapıldı. 28 adet Basınç Kontrol Vanası Montajı, 53 adet debimetre değişimi, 64 adet sayaç montajı, 34 adet basınç kırıcı değişikliği yapıldı.	100%	-	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
1	4	5	Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), SCADA ve Uzaktan Okuma Sistemi Entegrasyon Yazılımı İşi	150.000,00	-	0%	Abone bilgi yönetim sistemi (ABYS)' nde abone su tüketim bilgileri, SCADA yazılımından su üretim değerleri ile İzole Bölge Sayaçlarının Uzaktan Okuma Sistemi Yazılımındaki verileri çapraz değerlendirecek yazılım alınması	-	0%	Abone İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Su İsale Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde pilot bir bölgede uygulamanın yapılması için görüş birliğine varılmıştır.	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
1	4	6	İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı (Etüd)	151.208,46	151.208,46	100%	1.015 km'lik içmesuyu projeleri sözleşmelerini fiziki olarak yapmak ve tamamlamak, yerleşim alanlarındaki şebekeleri yenilemek.	-	100%	* Etüd ve Planlama Dairesi Başkanlığı ile Projeler Dairesi Başkanlığı Mayıs ayından itibaren ayrı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 1-4-6 kodlu faaliyet, Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından devam ettirilmiştir.	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
1	4	6	İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı (Proje)	1.260.236,98	338.011,07	27%	1.015 km'lik içmesuyu projeleri sözleşmelerini fiziki olarak yapmak ve tamamlamak, yerleşim alanlarındaki şebekeleri yenilemek.	İlçe ve köylerde 606 km. içmesuyu şebeke ve iletim hattı yenileme projeleri yaptırılmıştır.	60%	Etüdlerin zaman alması ve ihale sürecindeki gecikmeler yüzünden sapmalar meydana gelmiştir.	Projeler Dairesi Başkanlığı
1	4	6	İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı (Yapım)	84.653.180,09	42.562.131,37	50%	600 km	723 km. içme suyu şebeke ve isale hattı yapımı tamamlanmıştır.	121%	*Hedeflenen miktardan %21 oranın da daha fazla içmesuyu şebeke ve isale hattı yapımı gerçekleşmiştir.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
1	4	7	Su Depoları	94.013,82	731,04	1%	2 adet depo yapımı	-	0%	*Bu yıl ilgili faaliyette fiziksel gerçekleşme olmamış olup, performans programına göre planlanan personel giderleri ve sgk devlet pirimi giderleri kelemlerindeki gerçekleşmeler toplam mali gerçekleşmeye yansımıştır.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	236.173.524,55	182.357.019,20	77%					

	HEDEF-5	Tarihi su yapılarını restore ederek, kente kazandırmak	

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
1	5	2	Halkapınar Genel Müdürlük Binası ve Açıkhava Müzesi Restorasyonu	500.000,00	56.161,23	11%	Halkapınar genel müdürlük hizmet binası projesinin sözleşmesinin fiziki olarak %50'sini tamamlamak.	İşe Eylül ayında başlanmıştır. İş kapsamında ön proje çalışmaları yapılmıştır.	30%	ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle işe ancak Eylül ayında başlanabilmiştir.	Projeler Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	500.000,00	56.161,23	11%					

			AMAÇ-2	İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDE OLUŞAN EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSULARI DOĞAYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, YÜZEYSEL (KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER, VS) SULARIN VE YERALTI SULARININ KİR-LENMESİNİ ÖNLEYEREK TOPLAMAK, BER-TARAF ETMEK VE YAĞMURSULARINI TOPLAYARAK UZAKLAŞTIRMAK, YAĞMUR SONRASI YAŞANAN SORUNLARINI VE DERE ISLAHLARI İLE İLGİLİ SEL BASKINLARINI ÖNLEMEK						
			HEDEF-1	Kanalizasyon hatları ve üzerindeki tesislerin bakım,onarım,temizlik ve yenileme işlerini yapmak.						
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
2	1	10	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri (Etüd)	196.287,04	196.287,04	100%	400 km'lik kanalizasyon uygulama projeleri yapmak.	-	100%	* Etüd ve Planlama Dairesi Başkanlığı ile Projeler Dairesi Başkanlığı Mayıs ayından itibaren ayrı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 2-1-10 kodlu faaliyet, Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından devam ettirilmiştir.	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
2	1	10	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri (Proje)	411.816,63	207.714,46	50%	400 km'lik kanalizasyon uygulama projeleri yapmak.	Yaklaşık 194 .km uzunluğunda kanalizasyon projesi, 3 adet terfi merkezi,2 adet pompa istasyonu içeren 2 adet götürü usulü atıksu projeleri yaptırılmıştır.	49%	Etüdlerin zaman alması ve ihale sürecindeki gecikmeler yüzünden sapmalar meydana gelmiştir.	Projeler Dairesi Başkanlığı
2	1	10	Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri (Yapım)	34.089.077,38	17.258.118,84	51%	120 km	131 km. Atık Su Toplama ve Bertaraf Sistemleri yapımı gerçekleşmiştir.	109%	*Fiziksel gerçekleşme %100' ün üzerindedir.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2	1	11	Atık Su Tesislerine Gelen Kirliliğin Kontrolü Çalışmaları	232.776,19	223.172,57	96%	Asgari 3.000 adet kirletici denetim sayısı	*4.694 adet kirletici denetlenmiştir.	156%	*Fiziksel gerçekleşme %100' ün üzerindedir.	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2	1	13	Kanalizasyon ve Yağmursuyu Master Planı	340.102,84	33.696,75	10%	Master plan sözleşmesi fiziki gerçekleşmesinin %35 'ini tamamlamak.	-	0%	*Teknik şartname hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.	Projeler Dairesi Başkanlığı

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
2	1	14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	12.580.600,00	4.261.682,22	34%	42 km kollektör ve kanal şebeke bakım, onarım inşaatı işlerinin yapılması	*İhaleli işler kapsamında : 41,7 km. *İzsu Ekipleri tarafından : 26,1 km. kollektör ve kanal şebeke bakım, onarım inşaatı yapılmıştır.	98%	* Öngörülmeyen ömrünü yitirmiş mevcut hatlarda arıza, bakım vb. İhtiyaçlarının oluşması; yapımı tamamlanan ve birimimize devredilen şebeke metrajlarının artması *Birimimize iştevzi, HİM vs yoluyla gelen talep ve şikayetlerden ihale edilmesi beklenemeyecek durumdakilere olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek için İZSU ekipman ve personeli ile anında müdahale edilmiştir. * İZSU ekipman ve personeli ile yapılan çalışmaların maliyetinin hesaplanmasında yaşanan sıkıntılar yüzünden sapmalar meydana gelmiştir. *Planlanan ihaleli işler dışında 9.420.320 TL İZSU Ekiplerinin yaptığı işler için harcanmıştır.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
2	1	15	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	2.533.400,00	795.910,02	31%	138 km kanalizasyon hatlarının temizliğinin yapılması	*ihaleli işler kapsamında: 231,7 km *İzsu Ekipleri tarafından: 1.488 km. kanalizasyon hatlarının temizliğini yapılmıştır.	168%	* Öngörülmeyen ömrünü yitirmiş mevcut hatlarda temizlik İhtiyaçlarının oluşması; yapımı tamamlanan ve birimimize devredilen şebeke metrajlarının artması *Birimimize iştevzi, HİM vs yoluyla gelen talep ve şikayetlerden ihale edilmesi beklenemeyecek durumdakilere olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek için İZSU ekipman ve personeli ile anında müdahale edilmiştir. * İZSU ekipman ve personeli ile yapılan çalışmaların maliyetinin hesaplanmasında yaşanan sıkıntılar yüzünden sapmalar meydana gelmiştir. *Planlanan ihaleli işler dışında 17.819.312 TL İZSU Ekiplerin yaptığı işler için harcanmıştır. *Fiziksel gerçekleşmesi %100' ün üzerindedir.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
2	1	16	İzmir Metropol Sınırları İçerisinde Buluna Kanalizasyon Baca Kapaklarının, Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmesi İşi	17.924.200,00	205.055,56	1%	21.080 adet baca kapağı, 18.920 adet yağmursuyu ızgaralarının yol seviyesine getirilmesi	*İhaleli işler kapsamında 1.156 Adet Baca Kapağı, 105 Adet Yağmursuyu Izgarası; *İZSU ekipman ve personeli ile 5.127 Adet Baca Kapaklarının ve 2.818 Adet Yağmursuyu Izgaralarının Yol Seviyesine Getirilmiştir.	3%	*2011 yılında ihale çalışmaları başlatılmış ancak Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazlar nedeniyle 23 Temmuz 2012'de iş başlatılabilmiştir.Acil ihtiyaç duyulan çalışmalar İZSU ekipman ve personeli ile yapılmıştır. *Planlanan ihaleli işler dışında 3.614.975 TL İZSU Ekiplerinin yaptığı işler için harcanmıştır.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
2	1	17	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Bulunan Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği İşi	2.477.500,00	23.675,98	1%	18.400 m3 galeri mecra hatlarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılması	*İZSU Ekipman ve Personeli ile 308,90 m3 Galeri Mecra Hatlarının Bakım, Onarım ve Temizliği Yapılmıştır.	0%	*Galeri mecra mevcut hatlarının bakım, onarım ve temizliğine hatlardaki akışı engelleyecek tıkanıklığa sebep olan doluluk oranı, İZSU ekipman ve personeli ile müdahele edilecek miktarda olması nedeniyle ihale edilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. *Planlanan ihaleli işler dışında 211.287,60 TL İZSU Ekiplerinin yaptığı işler için harcanmıştır.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
2	1	18	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	3.673.100,00	835.312,56	23%	130 adet yağmursuyu ızgarası yapılması 9.100 mt. yağmursuyu ızgarası ve yağmursuyu ızgarası kolu ile bina kolu bağlantısı yapılması	*İhaleli işler kapsamında 253 AdetTekli Yağmursuyu Izgarası 16.750 mt Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı *İZSU ekipman ve personeli ile 3.567 Adet Tekli Yağmursuyu Izgarası 15.616 mt Yağmursuyu Izgarası Kolu İle Bina Kolu Bağlantısı Yapılmıştır.	184%	* Kamu İhale Kanununa dayalı olarak verilen teklif bedellerinin düşük olması nedeniyle sapmalar olmaktadır. * İZSU ekipman ve personeli ile yapılan çalışmaların maliyetinin hesaplanmasında yaşanan sıkıntılar yüzünden sapmalar meydana gelmiştir. *Birinci Dönemden itibaren Fiziksel gerçekleşmesi %100' ün üzerine çıkmıştır. *Planlanan ihaleli işler dışında 1.405.499 TL İZSU Ekiplerinin yaptığı işler için harcanmıştır.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	74.458.860,08	24.040.626,01	32%					
			HEDEF-2	Yağmursuyu kanalları yapmak ve mevcut hatların yenileme, bakım, onarım ve temizliklerini, yapmak							
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
2	2	4	İzmir İli Konak, Bornova ve Karşıyaka İlçelerinde Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Izgaralı (U 80) Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi	1.776.600,00	55.641,88	3%	2.000 mt. ızgaralı (U80) yağmursuyu kanalı inşaatı yapılması	*İhaleli işler kapsamında 42 mt , *İZSU ekipman ve personeli ile 3.661 mt ızgaralı (U 80) yağmursuyu kanalı inşaatı işi yapılmıştır.	2%	* İhale çalışmaları başlatılamaması yüzünden faaliyet İZSU Ekipleri tarafından yürütülmüştür. Bu yüzden fiziksel gerçekleşme düşük kalmıştır. * İZSU ekipman ve personeli ile yapılan çalışmaların maliyetinin hesaplanmasında yaşanan sıkıntılar yüzünden sapmalar meydana gelmiştir. *Planlanan ihaleli işler dışında 4.941.675 TL İZSU Ekiplerinin yaptığı işler için harcanmıştır.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
2	2	5	İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamiratı İşi	6.732.400,00	2.231.939,64	33%	5.000 mt. kırılan ve tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamirlerinin yapılması	İhaleli işler kapsamında ; 2.909 mt, *İZSU ekipman ve personeli ile 61.741 mt tahrip olan yağmursuyu ızgaralarının tamiratı yapılmıştır.	58%	* Kamu İhale Kanununa dayalı olarak verilen teklif bedellerinin düşük olması nedeniyle sapmalar olmaktadır. *Planlanan ihaleli işler dışında 5.791.538 TL İZSU Ekiplerinin yaptığı işler için harcanmıştır.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
2	2	12	Yağmursuyu Toplama Sistemleri (Etüd)	34.736,18	34.736,18	100%	200 km'lik yağmursuyu projeleriyapmak.	-	100%	* Etüd ve Planlama Dairesi Başkanlığı ile Projeler Dairesi Başkanlığı Mayıs ayından itibaren ayrı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 2-2-12 kodlu faaliyet, Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından devam ettirilmiştir.	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
2	2	12	Yağmursuyu Toplama Sistemleri (Proje)	401.729,16	294.299,45	73%	200 km'lik yağmursuyu projeleriyapmak.	Drenaj havzaları belirlenerek hidrolik şartları sağlayacak imalatlar tespit edilmiştir.2012 yılında yaklaşık 162 km yağmursuyu şebeke uygulama projeleri yaptırılmıştır	81%	Yağmursuyu deşarj noktasına uygun mansap şartlarının mevcut olmaması, etüdlerin zaman alması nedeniyle sapmalar meydana gelmiştir.	Projeler Dairesi Başkanlığı
2	2	12	Yağmursuyu Toplama Sistemleri (Yapım)	30.861.107,65	12.045.382,49	39%	20 km	18,9 km. Yağmursuyu Toplama Sistemleri yapımı gerçekleşmiştir.	95%	-	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2	2	13	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı Kollarının Temizliği İşi	1.972.300,00	1.312.197,82	67%	355.000 adet yağmursuyu ızgara ve 66.000 adet bağlantı kolu temizliğinin yapılması	*İhaleli işler kapsamında 368.106 Adet tekli yağmursuyu ızgaralarının 66.725 Adet bağlantı kollarının temizliği, *İZSU ekipman ve personeli ile 20.693 Adet tekli yağmursuyu ızgaralarının 16.561 Adet bağlantı kollarının temizliği yapılmıştır.	103%	*Planlanan ihaleli işler dışında 2.235.240 TL İZSU Ekiplerinin yaptığı işler için harcanmıştır. *Fiziksel gerçekleşmeleri %100 oranını aşmıştır.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
2	2	14	İzmir İli I. II. ve III. Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi	1.758.700,00	1.166.562,82	66%	71.000 mt. kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmursuyu hatlarının temizliğinin yapılması	*İhaleli işler kapsamında 174.764 mt, *İZSU ekipman ve personeli ile 147.194 mt kaynaklı sıra ızgara ve U kesitli kapalı yağmursuyu hatlarının temizliği yapılmıştır.	246%	* Kamu İhale Kanununa dayalı olarak verilen teklif bedellerinin düşük olması nedeniyle sapmalar olmaktadır. *Fiziksel gerçekleşmeleri %100 oranını aşmıştır. *Planlanan ihaleli işler dışında 3.459.047 TL İZSU Ekiplerinin yaptığı işler için harcanmıştır. *Fiziksel gerçekleşmeleri %100 oranını aşmıştır.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	43.537.572,99	17.140.760,28	39%					

			HEDEF-3	Dere ıslahı ve temizliği çalışmalarını yürütmek							
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
2	3	1	Dere Temizlikleri İçin İş Makinelerinin Çalıştırılması ve İş Gücü Temini	16.099.300,00	6.669.460,63	41%	97.960 saat iş makinelerinin çalıştırılması	İhaleli işler kapsamında 78.187 saat iş makineleri çalıştırılarak derelerin temizlikleri yapılmıştır. İZSU ekipman ve personeli ile 205.394 mt dere temizliği yapılmıştır.	80%	*Planlanan ihaleli işler dışında 8.814.384 TL İZSU Ekiplerinin yaptığı işler için harcanmıştır.	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
2	3	2	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil) (Etüd)	131.707,29	131.707,29	100%	96 km'lik dere ıslahı projeleri yapmak.	-	100%	* Etüd ve Planlama Dairesi Başkanlığı ile Projeler Dairesi Başkanlığı Mayıs ayından itibaren ayrı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 2-3-2 kodlu faaliyet, Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından devam ettirilmiştir.	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
2	3	2	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil) (Proje)	309.179,38	309.179,38	100%	96 km'lik dere ıslahı projeleri yapmak.	Su baskını ve taşkın riski taşıyan derelerde 120 km dere ıslahı,5 adet planlama raporu 3 adet tersip bendi yapılmıştır.	100%	*Fiziksel gerçekleşme %100' ün üzerindedir.	Projeler Dairesi Başkanlığı
2	3	2	Dere Islahları (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil) (Yapım)	25.700.731,71	10.776.983,14	42%	15 km	18,5 km. dere ıslahı 22.3 km. korkuluk imalatı 4 adet tersip bendi onarımı imalatları yapılmıştır.	123%	-	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	42.240.918,38	35.885.474,16	85%					

			HEDEF-4	Atıksu arıtma tesisleri inşaa ederek,uygun maliyetle ve ilgili mevzuata göre işlemek.							
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
2	4	1	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	49.942.000,00	28.742.294,70	58%	*Atık Su Arıtma Tesislerini En Verimli ve Ekonomik Şekilde İşletmek, İşletme Maliyetlerini Yıllık %5 Düşürmek *2012 yılında atıksu arıtma tesislerinde yıllık toplam 270.000.000 m3 atıksu arıtmak	* Toplam 270.485.036 m3 su arıtılmıştır.	100%	-	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
2	4	2	Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz İnşaatı İşi	1.000.000,00	-	0%	Çiğli A.A.T Kapasite Arttırımını Sağlamak	*30.03.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış, 06.08.2012 tarihinde proje raporu teslim edilmiştir.	0%	-	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
2	4	3	Merkezi Scada Sistemi İşi	2.650.000,00	557.668,00	21%	Atık Su Arıtma Tesislerini Tek Merkezden İzlemek	*Merkezi Scada Sistemi İşi; Tesislerden alınacak veriler için teknik şartname ve yaklaşık maliyet güncellenmiştir.	20%	*Faaliyet kapsamında harcanan para "ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SAHA ANALİZ KABİNLERİ ALT YAPISI İŞİ" ve "ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ÇIKIŞ SUYU" ÖLÇÜM VE ANALİZ KABİNİ ALIMI" işine harcanmıştır. *Yedek ödenek kaleminden 05.06.2012 tarih ve 28 nolu aktarım ile 1.900.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
2	4	4	Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları (Proje)	681.112,65	106.724,75	16%	7 adet arıtma tesisi projesi, 4 adet derin deniz deşarjı proje sözleşmelerini yapmak ve sürdürmek. 2 adet	1 adet atıksu arıtma tesisi uygulama projesi çalışmalarına başlanmış, ancak yüklenicinin sözleşme şartlarını yerine getirememesi sebebiyle sözleşmesi fesh edilmiş olduğundan proje çalışması sonuçlandırılamamıştır. 7 adet jeolojik-jeoteknik araştırma projesi yapılmıştır.	18%	İdarenin endüstriyel atıksuların atıksu arıtma tesislerine bağlanmaması yönündeki 27.12.2012 tarih ve 808 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği 2 adet endüstriyel atıksu arıtma tesisi projesinden vazgeçilmiştir. Diğer arıtma tesisleri için yer tahsislerinin sağlanamaması ve imar plan çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle sapmalar meydana gelmiştir.	Projeler Dairesi Başkanlığı

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
2	4	4	Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları (Yapım)	24.928.086,09	22.611.006,63	91%	2 adet Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	2 adet Atıksu Arıtma Tesisi (imalatlarının yapım işleri tamamlanmış olup İşletmeye Alma ve Eğitim faaliyetleri devam etmektedir). 1 adet Atıksu Antma Tesisine Elektrik temini imalatları devam etmektedir. 1 adet Özdere AAT Alanı Enerji Nakil Hattı Tadilatı 1 adet Atıksu Antma Tesisine Elektrik temini ve kablo alımı işleri tamamlanmıştır.	100%	Özdere Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işine (deşarj hattı yapım aşamasına müteakip başlanacaktır.) ve Doğanbey Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işine de (Tesisin enerjilendirilmesine kadar geçecek süre Yönetim Kurulunca süre uzatımı olarak verilmiştir.)	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	79.201.198,74	52.017.694,07	66%					
			HEDEF-5	İzmir körfezini temizlemek,korumak ve körfeze kirlilik taşıyan su havzalarını izlemek							
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
2	5	1	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	115.050,00	115.050,00	100%	Yıllık izleme çalışmalarının fiziki olarak %100'ünü tamamlamak.	-	100%	* Etüd ve Planlama Dairesi Başkanlığı ile Projeler Dairesi Başkanlığı Mayıs ayından itibaren ayrı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 2-5-1 kodlu faaliyet, Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından devam ettirilmiştir.	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
2	5	1	Su Havzaları Su Kalitesi İzleme Projesi	1.953.992,36	436.366,10	22%	Yıllık izleme çalışmalarının fiziki olarak %100'ünü tamamlamak.	İzmir Körfezinde Gerçek Zamanlı Gözlem Sistemli Sayısal ve Sediman Taşınımı Modelleme Projesi sözleşmeye dayalı olarak sürdürülmekte olup proje süresi 3 yıllıktır.Proje kapsamında aylık periodda ölçümler anlık gerçekleşmiş ve bu verilere dayalı olarak akıntı modelleme çalışması sürdürülmüştür . Ayrıca sürekli veri oluşturmak için 3 adet meteoroloji istasyonu, 4 adet akıntı ölçüm istasyonu kurulmuştur.	50%	Çalışmalar kapsamında Gediz Nehri üzerinde 8 ve Küçük Menderes Nehri üzerinde 7 noktada debi ölçümlerini gerçekleştiren Elektrik İşleri Etüd İdaresi'nin 2011 yılı başında gerçekleştirilen yeni yasal düzenleme ile kapatılarak DSİ Genel Müdürlüğüne bağlanması sebebi ile projenin devamına ilişkin protokol imzalanamamış olduğundan 2012 yılı içinde proje çalışmalarına ara verilmek zorunda kalınmıştır. Söz konusu çalışmaların devamı amacıyla söz konu debi ölçüm işinin DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesine yönelik görüşmeler devam etmekte olup yetişmesi halinde 2013 yılının 2. yarısında çalışmalara yeniden başlanması planlanmaktadır	Projeler Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	2.069.042,36	551.416,10	27%					

	AMAÇ-3	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK-LARININ KULLANIMINI İLGİLİ MEVZUATA UYGUN BİÇİMDE ARTIRABİLMEK İÇİN ATIK-LARI DEĞERLENDİRİP EKONOMİYE KAZAN-DIRARAK KAMU GELİRLERİNİN ARTI-RILMASINA KATKIDA BULUNMAK, ÇEVREYİ VE DOĞAL YAŞAM ALANLARINI KORUMAK, ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SUYU KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE ETKİN KULLANMAK.	
	HEDEF-1	Atıksu arıtma çamurlarını yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirmek.	

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
3	1	1	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi İnşaatı	35.000.000,00	10.495.621,65	30%	Çamur çürütme ve kurutma tesisi inşaatının %50 oranında tamamlanması.	Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi inşaatı işi %30 oranında tamamlanmıştır.	60%	*Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi yapımı öngörülen proje aşamasındadır.Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisine Yeni Terfi İstasyonu işinin Projenin uygulanabilirliği tetkik edilmektedir.	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	35.000.000,00	10.495.621,65	30%					

	HEDEF-2	Arıtma tesisleri çıkış sularının kullanılabileceği iş alanlarının fizibilite çalışmalarını yapmak ve geliştirmek.	

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
3	2	1	Çamur Yönetimi Master Planı	250.000,00	-	0%	Çamur yönetim master planının hazırlanması	*Mevcut veriler değerlendirilerek teknik şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir.	0%	Büyükşehir sınırlarının il sınırlarına genişlemesi sebebi ile Çamur Yönetimi Master Planı Projesinin, İzmir İlindeki tüm yerleşimleri kapsaması gerekli hale gelmiştir ve bu nedenle ön hazırlık çalışmalarının süresi uzamıştır.	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
3	2	3	A.A.T. Çıkış Sularının Yeniden Kullanımı Projesi	5.560.000,00	-	0%	*AAT Çıkış sularının kullanım projesi kapsamında 2.000 m3/gün sulama ve kullanım suyu elde edilmesi	*Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Geri Kazanım Tesisi Alanı Jeoteknik Etüdü" işinin 16.11.2012 tarihinde zemin etüd raporu tamamlanmıştır.	0%	-	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	5.810.000,00	-	0%					

	AMAÇ-4	ÇAĞDAŞ GEREKSİNİMLERE UYGUN KALİTE VE GELİŞMİŞLİKTE BİR KURUMSAL ÇİZGİYİ YAKALIYABİLMEK İÇİN; VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRARAK, KURUM YAPI, İŞLEYİŞ VE KAPASİTESİNE İLİŞKİN UNSURLARISÜREKLİ İZLEYİP DEĞERLEN-DİREREK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIP, İYİLEŞTİR-MELERİNİ YAPARAK KURUMSAL GELİŞİM VE ETKİN YÖNETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK	
	HEDEF-1	Kurumun fiziksel kaynaklarının verimli ve gereksinimlere uygun biçimde kullanılmasına ve yenilenmesini sağlamak.	

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
4	1	1	Hizmet Binaları, Tesis Yapımı (Etüd)	87.821,50	87.821,50	100%	Muhtelif ilçelerde ihtiyaç duyulan ve yeri temin edilen hizmet binası proje sözleşmesinin fiziki olarak %40'ını tamamlamak.	-	100%	* Etüd ve Planlama Dairesi Başkanlığı ile Projeler Dairesi Başkanlığı Mayıs ayından itibaren ayrı olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 4-1-1 kodlu faaliyet, Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından devam ettirilmiştir.	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
4	1	1	Hizmet Binaları, Tesis Yapımı (Proje)	272.924,01	191.299,68	70%	Muhtelif ilçelerde ihtiyaç duyulan ve yeri temin edilen hizmet binası proje sözleşmesinin fiziki olarak %40'ını tamamlamak.	Yapılan proje İhaleleri kapsamında 12 adet hizmet binası projesi,3 adet pompa istasyonu projesi, 1 adet restorasyon projesi yapılmıştır.	100%	-	Projeler Dairesi Başkanlığı
4	1	1	Hizmet Binaları, Tesis Yapımı (Yapım)	5.565.125,77	1.002.234,41	18%	Hizmet binalarının %100 tamamlanması.	*1 adet İdari Bina ve Atölye Binası İnşaatı yapılmıştır. *4.740mt betonarme direkli tel çit imalatı ve 6 adet giriş kapısı tamamlanmıştır. *67mt.Koruma Çiti Yapılmıştır. *200.88 mt.tel örgü imalatı,33,05 mt.betonarme duvar imalatı,25,32 mt. Ø150 PVC boru imalatı yapılmıştır. *1 adet hizmet binası Subasman Seviyesi İkmal İnşaatı imalatı devam etmektedir. *1 adet Muhtelif İlçelerde Ambar, Arşiv ve İstinat Duvarı Yapımı imalatı devam ediyor	100%	-	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
4	1	3	Araç ve İş Makinesi Bakım Onarım Çalışmaları	2.575.000,00	1.642.652,21	64%	%100	4.753 adet arıza, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.	100%	Söz konusu bakım onarım çalışmaları, İdaremiz diğer birimlerinden gelen arıza talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
4	1	4	Akaryakıt Alımı	13.100.000,00	13.039.765,46	100%	%100	3.296.968 LT Euro Dizel, 91.705 LT Kurşunsuz Benzin alımı gerçekleştirilmiştir.	100%	Söz konusu faaliyet birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmektedir. *3.100.000 TL ödenek eklenmiştir.	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
4	1	5	Araç, İş Makinesi Trafik Tescil ve Sigorta İşlemleri	875.000,00	703.947,68	80%	%100	2.163 Adet Trafik, Tescil ve Sigorta İşlemi gerçekleştirilmiştir.	100%	Söz konusu faaliyet birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmektedir.	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
4	1	6	Hizmet Aracı Kiralaması	11.000.000,00	10.557.055,16	96%	%100	365 adet sürücüsüz ve sürücülü kiralık araç aylık puantajları ve hak edişleri düzenlendi	100%	Söz konusu faaliyet birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmektedir.	Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	33.475.871,28	27.224.776,09	81%					

			HEDEF-2	Beşeri kaynakların verimlilik, kalite ve etkinliğini arttırmak							
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
4	2	1	Proje Yapım Kontrollüğü-Müşavirlik / Dere Havzaları Taşkın Modelleme Projesi	50.000,00	-	0%	İhtiyaç halinde sözleşmesini başlatmak.	-	0%	İdare tarafından ihtiyaç duyulmadığından ihalesine yönelik çalışma başlatılmadı	Projeler Dairesi Başkanlığı
4	2	2	Personelin Özlük, Mali, Sosyal Haklarıyla İlgili İş ve İşlemler	15.095.958,85	9.877.997,02	65%	432 adet işlem	432 adet işlem	100%	*Emekliye ayrılan işçi sayısının düşünülenin altında olması nedeniyle, KIDEM TAZMİNATI kalemi, gerçekleşme oranını düşürmüştür.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
4	2	3	Personelin Doğru Yerde İstihdamının Sağlanması	1.223.023,62	913.385,94	75%	42 adet işlem	42 adet işlem	100%	*Daire Başkanları tarafından nakilleri uygun görülen personelin Genel Müdürlük olurlarıyla nakilleri sağlanmış, görev ve unvan değişiklikleri yapılmıştır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
4	2	4	Personelin Özlük ve Sosyal Haklarının İyileştirilmesi	1.239.714,96	929.432,92	75%	15 adet işlem	15 adet işlem	100%	*2011/28 ve 2012/1 Sayılı Genelgeler ile duyurusu yapılan Görevde Yükselme Sınavına iştirak eden İdaremiz personelinin sınav sonuçları Sınav Kurulumuzcan değerlendirilmiş olup, başarı listesi Sınav Kurulu Kararı ile imza altına alınmış ve tüm birimlere duyurusu yapılmıştır. Sınavı kazanan personelin atama işlemleri sonuçlandırılmıştır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
4	2	5	Birimlerin Personel İhtiyacının Giderilmesi	110.458.030,35	87.354.402,42	79%	65 adet işlem	65 adet işlem	100%	*15 özürlü personelin atama işlemleri sonuçlandırılmiş olup, buna ilişkin onaylı ÖMSS Yerleştirme Bildirim Raporu T.C. Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir. Mülakat işlemi tamamlanan 76 personel Teknolojik Yapılan Şirketinde işe başlatılmıştır. Has güvenlik şirketinde iş başı yapan 48 personelin iş ve işlemleri sonuçlandırılmıştır. İdaremize naklen tayin talebinde bulunan ve kurumlarınca ayrılmasında sakınca görülmeyen 7 memur personelin naklen tayin işlemleri sonuçlandırılmıştır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
4	2	6	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütümü, Organizasyon, Koordinasyonu ve Gerekli Destek Hizmetlerini Yerine Getirme	81.172,22	60.879,16	75%	734 adet işlem	734 adet işlem	100%	*2013 Eğitim Kurulu Kararı ve Daire Başkanlıklarının Eğitim Plan ve Projelerinin icmal tablosu düzenlenmiş olup, Eğitim Kurulu Kararı oluşturularak imzaya sunulmuştur. .Ege Belediyeler Birliği tarafından 16-18 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen Kamu İhale Mevzuatı Eğitimine 3 personelimizn katılımı sağlanmıştır.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
4	2	9	Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı	18.000,00	-	0%		İzmi Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığından naklen atama yapılması çalışmalarının başlatılmasına ilişkin süreç dolayısı ile Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının gerekmesi halinde bu süreçten sonra değerlendirmeye alınması planlanmıştır.	0%	-	Teftiş Kurulu Başkanlığı
			TOPLAM	128.165.900,00	99.136.097,46	77%					

			HEDEF-3	Kurumun hizmet alıcılarının ve abonelerin gereksinimleri yönünde en kısa zamanda ve etkili biçimde çözümler üretilmesini sağlamak.						
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
4	3	1	Abone Arşivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi	4.850.828,00	3.388.712,28	70%	Arşiv dosyalarına kolayca ulaşılabilmeyi ve abone memnuniyetini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir projedir. Uygulaması olan kurumları, örnek çalışmaları araştırmak ve onlarla yapmak aşamasındadır.	*Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlama çalışmalarına başlanmıştır.	100%	-	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4	3	2	Bilgi İşlem Hizmet Alımı İhalesi	3.540.200,00	2.485.232,27	70%	100%	Bilgi İşlem işlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirildi. Gerekli ekipman, program ve sistemler temin edilerek hizmete sunulmuşturç	100%	-	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
4	3	3	Bilgi İşlem Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Devamı	4.065.000,00	3.971.493,80	98%	100%	*Yüklenici firma ile sözleşme sonuna kadar verimli şekilde kaynaklar kullanılmıştır.	100%	-	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
4	3	4	Araç, İş Makinesi ve Ekipman Alımı	9.517.400,00	4.799.063,39	50%	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin çalışmalarında kullanılmak üzere 4 adet iş makinası (4 adet mini kazıcı yükleyici), 6 adet damperli kamyon (4 adet 16 tonluk+2 adet 26 tonluk) 2 adet küçük taşıyıcı kamyon, 15 adet ekip aracı, 5 adet panelvan tipi ekip aracının satın alınma yoluyla temin edilecektir. Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin çalışmalarında alımı öngörülen ekipmanlar olan 11 adet Dizel Jeneratör,25 adet Hidrolik Kesici, 25 adet Hidrolik Dalgıç, 25 adet Hidrolik Sıkma, 25 adet Hidrolik Kırıcı, 6 adet Kırıcı Ataşmanı, 10 adet Dinleme Cihazı, 3 adet Elektrikli Kırıcı, 14 adet Elektrikli Motopomp, 5 adet Benzinli Motopomp satın alınma yoluyla temin edilmesi planlanmıştır.	10 Adet Çıplak Şasili Kamyon, Yüklenici Firma tarafından Ekip Aracına dönüştürülerek teslim edilmiştir. Ekip aracı yapılmak üzere alımı yapılan 5 adet Ford Transit 4X2 330 S Kombi (Klimalı) Araç, 4 Adet Hidrolik Kırıcı Beko-Loder ve orjinal kırıcı tesisat alımı, 19 Adet Çift Kabin Çıplak Şase Araç alımı ve 23 adet motopomp alımı yapıldı.	100%	*19 adet Çift Kabin Çıplak Şase Kamyona Hidrolik Üst Ekipman Temin ve Montajı için 2012 yılında ihaleye çıkılıp sözleşme imzalanmıştır. İhale kapsamında ödeme nin tamamı 2013 yılında tamamlanacağı için mali gerçekleşme %50' de kalmıştır.	Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
4	3	5	Sayaç Kontrol İşlemleri	4.850.828,00	3.388.712,28	70%	Öncelikle belirlenmiş olan stratejik amaca ulaşabilmeyi desteklemek ve abone memnuniyetini sağlamak amacıyla idaremiz sayaç ihtiyacını belirleyip karşılamak ve sayaçlarla ilgili her türlü kontrol işlemlerini Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün vereceği raporlar doğrultusunda sonuçlandırmak başlıca işlemleridir.	*125.080 sayaç kontrol edilmiş, *32.967adet sayaç tamir edilip damgalama işlemi yapılmıştır.	100%	-	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
4	3	6	Açma Kesme İşlemleri	4.850.828,00	3.388.712,28	70%	Borçlu olan abonelerimizin suyunu kesmek ödeme yapıldığında suyun açılması, uzun süre borçlu kalması durumunda hukuksal işlemleri yapmaktır. Ayrıca arızalı, patlak ve çalışmayan sayaçları değiştirmek, sayaç mahalinde oluşan arızaları gidermek, usulsüz su kullanan abonelerin tespitini yapmak başlıca işlemleri arasındadır.	Toplam 1.288.426 adet Açma Kesme İşlemi yapılmıştır.	100%	-	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4	3	7	Atık Su-Köp (Katılım Ödeme Payı) İşlemler	4.850.828,00	3.388.712,28	70%	İçmesuyu Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Ettiği Suyu Kullandıktan Sonra Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Edenlerin Tespiti ile Atıksu Aboneliğinin Yapılması amacıyla Yer altı Suyu, Tanker Suyu Kullanan veya Şebeke Suyu Kullanarak Üretim Yapan İş yerlerinin (KÖP) ve Konutların Atıksu Abonelik İşlemlerinin Yapılması İşlemleridir.	2012 yılında toplam *11.874 adet Atıksu – Köp abonesi işlemi yapılmıştır. *Atıksu olarak 10.059.536 m3 tahakkuk ettirilmiş, 21.386.861 TL tahsilat yapılmıştır.	100%	-	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4	3	8	Abonelik Oluşturma, Su Bağlama	4.850.828,00	3.388.712,28	70%	Yeni bina yapan veya daha önce yaptığı binasına su bağlamak isteyen vatandaşların abonelik müracaatlarını alarak abonelik oluşturmak faaliyete yönelik ana çalışmalarındandır. Tüm şube müdürlükleri tarafından ortak olarak yürütülmektedir.	*21.099 Adet Yeni abonelik yapılmıştır. *Sebeke suyu olarak 148.775.573 m3 tahakkuk ettirilmiş, 596.661.124TL. tahsilat yapılmıştır.	100%	-	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4	3	9	Kanal Katılım İşleri	4.850.828,00	3.388.712,28	70%	Taşınmaz sahiplerinden yasa ve yönergeler gereği Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yürütme yetkisi Su ve Kanalizasyon İdarelerine verilen içmesuyu ve kanalizasyon katılım paylarının tahakkuk ve tahsilat İşlemlerinin yürütülmesidir.	*Toplam5.585 Adet Katılım Payları Belgesi, 4.482 Adet Kanal Ruhsatnamesi düzenlenmiş olup, tüm kanal işlemleri karşılığında 22.780.232 TL tahsilat yapılmıştır.	100%	-	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
4	3	10	Sayaç Okuma İşlemleri	4.850.828,00	3.388.712,28	70%	Abonelerin su sayaçlarını okuyarak tüketimlerini belirlemek, tüketim bildirimi bırakmak, sayaç okuma işleminden sonra her türlü tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, yapılan itirazları değerlendirmek, her ay su sayaçlarının okuma planının hazırlanarak uygulanmasını sağlamak başlıca sayaç okuma işlemleridir.	Toplam 13.492.447 adet fatura basılmış,okuma yapılmıştır.	100%	-	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	51.078.396,00	34.976.775,40	68%					

STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
			HEDEF-4	**Destekleyici hizmetler alanındaki gereksinimleri çağdaş standartlara uygun biçimde karşılamak ve geliştirmek.**							
4	4	2	Personel Memnuniyeti ve Veriminin Arttırılması ile Evrak Akışının Sağlanması	8.143.600,00	3.648.690,98	45%	85%	88%	100%	2012 yılında yapılan personel memnuniyetine ilişkin anket sonucu personel memnuniyetinde olumlu yönde artış olmuştur.	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
4	4	3	Güvenlik Amirliğimize Bağlı Faaliyet Gösteren 250 Güvenlik Personelinin Yasada Belirtilen Şekilde Techizat Alınması	2.278.269,09	2.262.426,64	99%	100%	Koruma ve güvenlik amirliği 2012 yılı yazlık ve kışlık kıyafet alımı gerçekleşmiştir. Tüm personele dağıtımı tamamlanmıştır.	100%	2012 Mali yılı bütçesinde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumları prim ödemeleri kalemlerinde yılsonu öngörülmeyen eksikliklerden dolayı 350.000 tl ek bütçe talebinde bulunulmuş ve 04.12.2012 tarih ve 861 sayılı genel müdürlük oluru ile 42.01.1.4.01 sosyal haklar kalemine aktarımı yapıldığından, gerçekleşme oranı 107% olarak gerçekleşmiştir.	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
4	4	4	5188 Sayılı Kanun Gereği Kurumumuz Tesislerinin Koruma Planlarının Yapılması ve İl Özel Güvenlik Komisyonuna Sunulması	2.278.269,09	2.187.018,00	96%	100%	Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz sorumluluk alanlarından yeni açılan 5 tesisin, koruma ve güvenlik planı yeniden yapılmıştır.	100%	5188 sayılı kanun gereği kurumumuz tesislerinin koruma planlarının yapılması ve il özel güvenlik komisyonuna sunulması faaliyetidir.	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
4	4	5	Kurumumuz Tesislerinde Görev Yapan Tüm Koruma ve Güvenlik Personelinin Denetim ve Kontrollerinin Periyodik Olarak Yapılması	2.278.269,09	2.187.018,00	96%	100%	İlk üç aylık dömende, gerçekleşen denetim sayısı 3.712 tür.	100%	Koruma ve güvenlik amirliğimiz sorumluluk alanlarındaki toplam 121 nöbet yeri ve 627 (kendi bünyemizdeki personel sayısı ile hizmet satın alınan özel güvenlik personel sayısı) koruma ve güvenlik personelinin denetim ve kontrolü bölge grup şefleri, vardiya şefleri ve koruma ve güvenlik amiri ve yardımcıları tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.Ortalama günde 10 nöbet yerinin denetim ve kontrolü yapılmaktadır.Hedeflenen her nöbet yerinin ay'da 3 defa denetim ve kontrolünün yapılmasıdır.	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
			TOPLAM	**14.978.407,27**	**10.285.153,61**	**69%**					

			HEDEF-4	Destekleyici hizmetler alanındaki gereksinimleri çağdaş standartlara uygun biçimde karşılamak ve geliştirmek.							
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
4	4	6	Özel Güvenlik Hizmeti Satın Alma İşi	14.158.374,00	14.158.374,00	100%	100%	Koruma ve Güvenlik Amirliğimiz sorumluluk alanlarında, 2012 aralık sonu itibari ile 80 adet nöbet yerinde özel güvenlik hizmeti satın alınmak suretiyle 391 özel güvenlik görevlisi çalışmaktadır	100%	-	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
4	4	7	Tahtalı Baraj Havzasının Korunması	2.359.269,09	2.191.117,00	93%	100%	Tahtalı baraj havzasının korunması 91 personel ile sağlanmaktadır.	100%	Tahtalı baraj havzası, kendi bünyemizden 21 koruma ve güvenlik görevlisi ve özel güvenlik hizmet satın alınmak sureti ile 70 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 91 personelle korunmaktadır. Koruma ve güvenlik görevlilerinin baraj sahasında denetim ve kontrolleri için 2 adet 4x2 araç tahsis edilmiştir. Arazinin geniş, ormanlık ve dağlık olması sebebi ile gerekli olan dürbün, fotoğraf makinesi gibi malzemeler ve personelin gerekli olan teçhizatlan temin edilmiştir. Barajda güvenliğin sağlanması ve numunelerin alınmasında 1 adet tekne kullanılmaktadır.Baraj sahası içinde 10 adet sabit nöbet yeri ve gezici ekipler mevcuttur.	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
4	4	8	Kurumumuza Ait Nöbet Yerlerinin Güvenlik İzin Belgesinin Alınması	123.000,00	34.635,00	28%	100%	Amirliğimizce gerektiğinde izmir valiliği, il emniyet müdürlüğü, il jandarma alay komutanlığı ve Manisa jandarma alay komutanlığı ile gerekli yazışmaların yapılması, ayrıca nöbet yerlerindeki adres değişikliklerinde güncellemeler yapılmıştır.	100%	Amirliğimizce gerektiğinde izmir valiliği, il emniyet müdürlüğü, il jandarma alay komutanlığı ve Manisa jandarma alay komutanlığı ile gerekli yazışmaların yapılmıştır.	Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amirliği
4	4	9	Dava ve İcra Takiplerinin İdare Lehine Yürütülmesi	1.489.853,56	1.278.750,96	86%	100%	İdare tarafından öngörülen hukuksal işlerin tamması gerçekleştirilmiştir.	100%	İdareniniş ve eylemleri hukuka uygun olarak yerine getirilmiş olup, yürütülen dava ve icra takip işlemlerine devam edilmiştir. *Personel giderleri kalemine toplam 300.000 TL ödenek eklenmiştir. *Mal Alım ve Hizmet Giderleri Kalemine 180.000 TL ödenek eklenmiştir.	Hukuk Müşavirliği
			TOPLAM	18.130.496,65	17.662.876,96	97%					

			HEDEF-5	Çağdaş yönetim tekniklerini ve teknolojileri kurumun gereksinimlerine uygun biçimde kullanarak, verimli ve ekonomik mali kaynak yönetimini sağlayarak yönetimde etkinliği geliştirmek							
STR. AMAÇ NO	STR. HEDEF NO	FAALİYET NO	FAALİYETLER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME	TOPLAM MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME	TOPLAM FİZİKSEL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	AÇIKLAMA	SORUMLU BİRİMLER
4	5	1	Bütçe Yönetimi	644.860,00	570.234,46	88%	%88 Gelir Bütçesi gerçekleşmesi %72 Gider Bütçesi gerçekleşmesi	66% Gider Bütçesi gerçekleşmesi 103% Gelir Bütçesi gerçekleşmesi	100%	-	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
4	5	2	Finansman Yönetimi	644.860,00	570.234,46	88%	%55 Banka Tahsilat Oranı	%55 Banka Tahsilat Oranı	100%	-	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
4	5	3	Ön Mali Kontrol Faaliyetleri	644.860,00	570.234,46	88%	Risk analizi ve risk yönetimi ile ilgili eğitim yapılması	Ön mali kontrol ve iç kontrol faaliyetleri ile ilgili idare tarafından öngörülen çalışmalar gerçekleşmiştir.	100%	-	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
4	5	4	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	644.860,00	570.234,46	88%	Mevzuat ve İdarece öngörülen Stratejik Yönetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Mevzuat ve İdarece öngörülen Stratejik Yönetim çalışmaları, yıllık birim faaliyet raporunda özetlendiği çerçevede gerçekleştirilmiştir.	100%	-	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
4	5	5	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri	644.860,00	570.234,46	88%	Araştırma Geliştirme Faaliyetleri kapsamında belirlenen ve talep edilen çalışmaların, bilimsel ve uygulamadaki teknik standartlara uygun gerçekleştirilmesi.	Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında İdarece ve/veya yetkili idarelerce talep edilen çalışmalar, yıllık birim faaliyet raporunda özetlendiği çerçevede, uygun teknik ve bilimsel standartlar doğrultusunda gerçekleşmiştir.	100%	-	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
4	5	6	Kurumda Talep Edilen Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhaleleri	1.615.373,33	1.025.399,69	63%	350 adet işlem	203 adet işlem	58%	-	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
4	5	7	Hakediş ve Kesin Hesap İşleri	350.327,00	347.161,30	99%	942 adet işlem	997 adet işlem	106%	-	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
4	5	8	Coğrafi Altyapı Bilgi Sisteminin Kurulması	200.000,00	17.115,00	9%	Plan Proje Alımları	Kamulaştırma planlarının hazırlanması	-	2011 yılında iş tamamlanmıştır. Plan Proje alımları kapsamındaki ödemedir.	Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
			TOPLAM	5.390.000,33	4.240.848,28	79%					

2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi (B)

İdaremizde, 2011 yılı içerisinde 2010-2014 Yılları Stratejik Planı doğrultusunda 2012 yılına ait performans hedeflerinin belirlendiği Performans Programı hazırlanıp basılmıştır. Bu plan ve programlara dayalı olarak İdaremiz birimlerince yürütülen faaliyet ve projeler ile diğer çalışma ve faaliyetlerin ilerleme, tamamlanma durumları ve gerçekleşme oranlarına ilişkin veri, açıklama ve değerlendirmeler, İdaremiz 2012 Yılı Faaliyet Raporunun tamamında raporlanmıştır.

3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

İdaremizde stratejik yönetim, performans yönetimi ve bilgi sisteminin sağlıklı işlemesini sağlayacak veri, bilgi ve izleme sisteminin geliştirilmesi yönündeki girişim ve çalışmalara devam edilmiş ve bu yönde mesafe kat edilmiştir. İdaremiz ilgili personelinin ve yöneticilerinin bu konuda stratejik yönetim uygulamalarına geçiş dönemlerine göre daha fazla deneyim, bilgi ve farkındalık sahibi olduğu söylenebilir.

Bu yönde önemli bir adım olarak, 2011 Yılı içinde periyodik olarak performans ve faaliyet izleme amaçlı bir sistem kurulmuş; ilk aşamada sistematik bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanından yararlanarak, bazı temel periyodik raporlamalar yapılabilmektedir ve 2012 Yılında da bu raporlama çalışmaları sürdürülmüştür. Ayrıca, 2012 Yılında yine önemli bir adım atılarak Performans Programlarının hazırlanmasında veri girişleri ve ilgili tabloların hazırlanmasına yönelik bir veri programı oluşturulmuş ve uygulanmıştır.

Personelin ve yöneticilerin sürekli eğitimi ve bilgilerinin tazelenmesi, gerekli insan kaynağı ve teknik desteğin sağlanması, sağlıklı bilgi akışı ve yönetim alışkanlıklarının bu yönde daha fazla gelişmesinin, stratejik yönetim ve performans yönetiminin başarılı olabilmesi için vazgeçilmez koşullar olduğu açıktır. Bu koşulların süreklilik kazanması ise, çok büyük ölçüde Stratejik Yönetim ve Performans Yönetiminin, hem ülke hem de tek tek kurumlar düzeyinde kurumsallaşmasına dayalıdır. Kurumsallaşma ise zaman isteyen bir süreçtir.

Günümüz koşulları ve kurumsallaşma düzeyi içinde, daha verimli ve pratik işleyen bir performans bilgi sistemi için çalışmalar İdaremizde gayretle sürdürülmektedir. Bu çaba kapsamında, bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanılarak mevcut ve yeni kurulan veri ve bilgi sistemlerinin sistemin geliştirilmesi yönünde ve yukarda örnekleri özetlenen çalışmalar sürdürülmektedir.

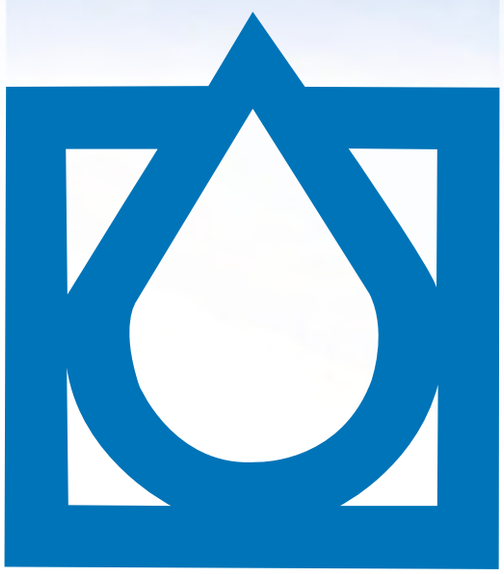

İZSU

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



IV-Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

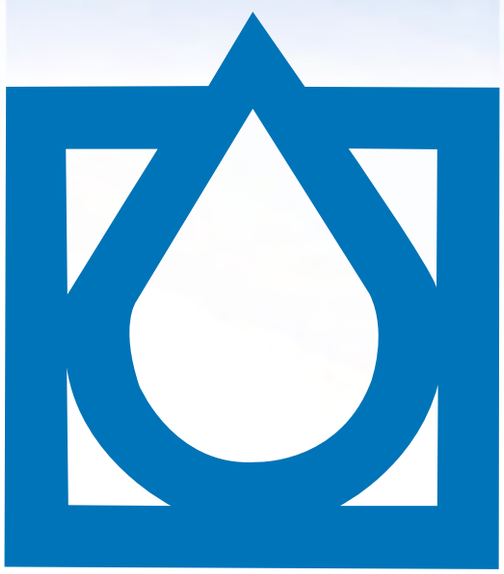

İZSU

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Kapsamlı Kuruluş Kanunu'nun olması
- Köklü kurumsal geçmiş
- İdari ve mali özerklik
- Büyük ölçekli yatırımcı bir kuruluş olması
- Özgelirlerin toplam gelirlere oranının %90'ın üzerinde olması
- Mali yapıda kısa vadede önemli bir riskin bulunmaması
- Büyük kanal projesinin tamamlanmış olması
- Su dağıtımında alternatif besleme olanaklarının kullanılması
- Metropol alanda su ve kanal altyapısının tamamlanmış olması
- Kriz yönetim yeteneğinin gelişmiş olması
- İçme suyu ve atık su analizinde uluslararası standartlarda tesis ve teknik kullanımı
- Abone takibinde otomasyona geçilmiş olması
- Personelin gelişimi ve hizmet içi eğitim olanaklarının önemsenmesi
- Arsenik arıtmada ülke çapında lider olunması
- SCADA sisteminin büyük ölçüde tamamlanmış olması
- Bilgi işlem teknolojik altyapısının çağdaş yapıda olması
- Güçlü araç ve iş makinesi parkına sahip olması
- Mevcut yerleşim yerlerinin tamamına yakınında içme suyu şebekesinin yapılmış olması
- Teknolojik anlamda AB normlarında ve ileri düzeyde içme suyu ve atık su arıtma tesislerine sahip olunması
- Yapılan proje ve çalışmalarla, su kaçakları ve arıza miktarının giderek azalıyor olması
- Büyükşehir Belediyesi ve diğer bağlı kuruluşları ile güçlü koordinasyon içinde olması
- İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde su ve kanalizasyon hizmeti veren tek yetkili kurum olması nedeniyle rakipsiz olması
- İç denetim faaliyetlerine başlanmış olması
- Etkili su tasarrufu kampanyaları yürütülebilmesi

B- Zayıflıklar

- Memur-işçi ve sözleşmeli personel arasında ücret dengesizliği
- 5216 Sayılı Yasa ile genişleyen hizmet ve sorumluluk alanını karşılayabilecek altyapı, teknik donanım ve insan gücü açısından hazırlıklı olunmaması
- 4734 Sayılı İhale Kanununun alımlarda getirdiği sıkıntılar
- İçme suyu ana isale hatlarının (Kuzey kaynakları ve Tahtalı) betonarme ve tek boru hattı olarak döşenmesi ve yedeğinin bulunmaması
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun gerekliliklerinin bir kısmı kurumun organizasyon yapısıyla tam örtüşmediği için uygulamadaki aksaklıklar
- Mevzuat değişikliklerine uyumun yeterli düzeyde olmaması
- Kurumsal işleyişte planlama yetersizliğinin olması
- Abone şikayetlerinin iletilmesi ve sonuçlandırılmasında hızlı ve geribildirimci yapının yeterince gelişmemiş olması
- Hizmet binaları ve çalışma alanlarında fiziksel yetersizlik olması
- Oryantasyon eğitimlerinin olmaması
- AR-GE çalışmalarına gerekli önemin verilmemesi
- 5216 Sayılı Yasa ile hizmet alanlarına dahil olan bölgelerdeki teknik bilgi ve verilerin eksikliği
- Kalite güvence sisteminin eksikliği
- Alt yapı bilgilerinin bulunduğu haritaların tamamının dijital ortama aktarılmamış olması
- Yapılan hizmetlerin halka yeterince tanıtılamaması
- Personele yönelik sosyal imkanların (lokal, sosyal tesis, dinlenme tesisleri vb.) olmaması
- Yeni bağlanan ilçelerde SCADA sisteminin kurulmamış olması
- Su kaçaklarının makul seviyelere indirilememesi
- Kurum içi koordinasyon eksikliği
- Teknik ve idari personelin sayıca yetersizliği
- Yönetim bilgi sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması
- Kurumda merkezi düzeyde istatistiki veri çalışmalarının yetersizliği
- Uluslararası düzeydeki ilişkilerin yeterli düzeyde olmaması

C- Değerlendirme

Genel Müdürlüğümüz, 2012 yılında içme suyu, atıksu ve kanalizasyon altyapı ve hizmetleri alanında önemli yatırım ve projeler gerçekleştirmeye devam etmiştir.

2012'de kentimizde; yaklaşık 723 km. içme suyu, 131 km. atıksu kanalizasyon hattı döşenmiş olup; 19 km yağmursuyu kanalizasyonu ve 18 km'de dere ıslahı çalışması gerçekleştirilmiştir.
Yetki ve sorumluluk alanımız içinde, içme suyu hattı imalat düzeyimiz 2012 Yılında geçen yılın yaklaşık iki katına çıkarılarak gerçekleştirilmiştir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, kentimize 24 saat kesintisiz su verme imkanı devam etmektedir.
2012 Yılı kış aylarında gerçekleşen yoğun yağışlar sonucu İzmir'imize oldukça fazla su sağlanmış, ancak can kaybı yaratacak ölçüde büyük taşkınlar yaşanmamıştır. Bu sonuç, İZSU tarafından yapılan altyapı çalışmalarının olumlu katkısı ile sağlanmıştır. Yağışlar ve baraj rezervuarlarımızda önemli su potansiyeli elde edilmesi, önümüzdeki yıllar için büyük bir su rezervi yaratılmasını sağlamıştır.

Gördes Barajından kentimize su temin etme amaçlı DSİ ile ortak çalışmalarımız kapsamında; İdaremizce 2011 Yılında planlanan tarihten önce tamamlanarak barajdan su temini başlatılan 135.000 metreküp/gün kapasiteli Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden sonra, devreye girmesi öngörülen ikinci büyük kapasiteli tesis olarak Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisinin proje çalışmaları 2012 Yılında sürdürülmüştür. 365.000 metreküp/gün kapasiteli Tesise ilişkin çalışmalar tamamlandığında, buraya ulaştırılarak arıtılacak suyun temini giderek nüfusu ve çağdaş ihtiyaçları artan kentimize su kaynağı kazandırmada yeni bir büyük adım olacaktır.

Önemli su kaynaklarından birisi olan Çamlı Barajının planlama revizyon raporu tamamlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz, vizyonu doğrultusunda çevreye yönelik yatırımlarına önem ve öncelik vermeye devam etmiştir.

2011 ve 2012 Yıllarında 60 köyümüzdeki su depolarında kurulan güneş panelleri ile, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik önemli bir adım atılmıştır. Su depolarının otomatik klorlama sistemleri, bu panellerden üretilen enerji ile beslenerek, hem enerji maliyetleri düşürülmüş hem de çevreye duyarlı bir teknolojiyle suyun dezenfeksiyonu sağlanmıştır.

Tüm atıksu arıtma tesislerimizin çamurlarının bertaraf edilmesi amacıyla, Çiğli'de yapılması planlanan atıksu çamurları bertaraf tesisi inşaatı önemli ölçüde tamamlanmıştır. Çamur Çürütme Kurutma Tesisi yapımına 2012 Yılında başlanmış olup, 2013 Yılında Kurutma Tesisinin işletmeye alınması ve Çürütme Tesisinin tamamlanması planlanmaktadır.

İleri teknolojilerle atıksu arıtma kapasitesinde İzmir'in lider kentler arasında olmasını sağlayan Atıksu Arıtma Tesislerimizin sayısı 2012 itibariyle 24'tür ve tesislerimizde arıtılan suyun yaklaşık %99'u ileri biyolojik yöntemlerle arıtılmaktadır. 2012 Yılında, kıyı şeridinde oldukça yüksek öneme haiz olan Özdere ve Doğanbey Atıksu Arıtma Tesislerinin inşaatının tamamlanması aşamasına gelinmiştir. Özdere Atıksu Arıtma Tesisiyle birlikte, kentimiz 125.000 kişilik evsel atıksu arıtma kapasitesine sahip bir ileri biyolojik arıtma tesisine daha kavuşacaktır.

Kanalizasyon altyapısına yönelik çalışmalar kapsamında hayata geçirilen yağmur suyu ayrıştırma projeleri, atıksu ve yağmur sularını birlikte toplayarak arıtma tesislerine ileten mevcut birleşik sistem kanalizasyon altyapısının ve arıtma tesislerinin ömürlerini uzatma amacıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda, yağmur suları mevcut sistemden ayrıştırılarak alıcı ortama ulaştırılmaktadır. 2012 Yılında ilk etapta Bornova Çamdibi bölgesi projelendirilerek yapım aşamasına gelinmiş, ikinci etap olarak ele alınan Buca ilçesi projelerinde tamamlanma aşamasına gelinmiştir.

İzmir'in çevreye yönelik en önemli projelerden biri olan Büyük Körfez Projesi için 2011 Yılında Genel Müdürlüğümüzce başlatılan çalışmalar hızla ilerletilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzde kurum içi ve dışı eğitim ve seminerlere katılım devam etmekte olup, personelin gelişimi için çalışmalar sürdürülmektedir. 2010-2014 yılları Stratejik Planı doğrultusunda 2012 yılında gerçekleştirilen ve ileriki yıllarda devam etmesi öngörülen proje ve çalışmalarla, gerek hizmet alanlarında gerekse kurumsal işleyişte verimlilik ve kapasitenin yükseltilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

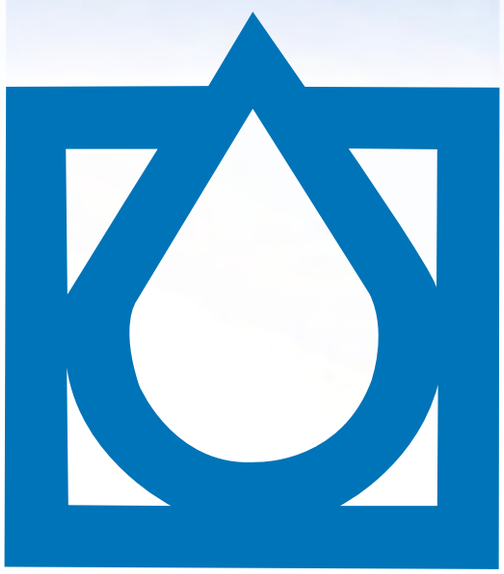

İZSU

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İZSU

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



Güvence Beyanları

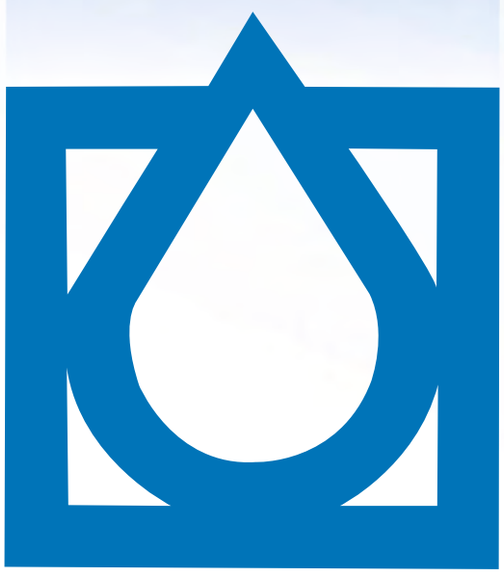

İZSU

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Strateji Geliştirme Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2012 Yılı Faaliyet Raporunun "Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (İzmir-22.04.2013)



Cemile BEKTAŞ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

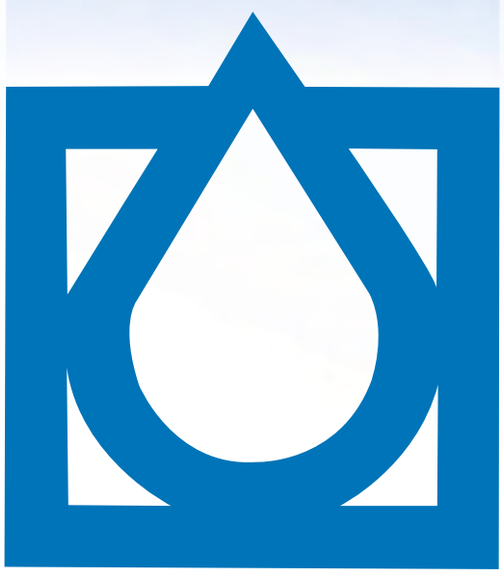

İZSU

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (İzmir-22.04.2013)

Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
GENEL MÜDÜR

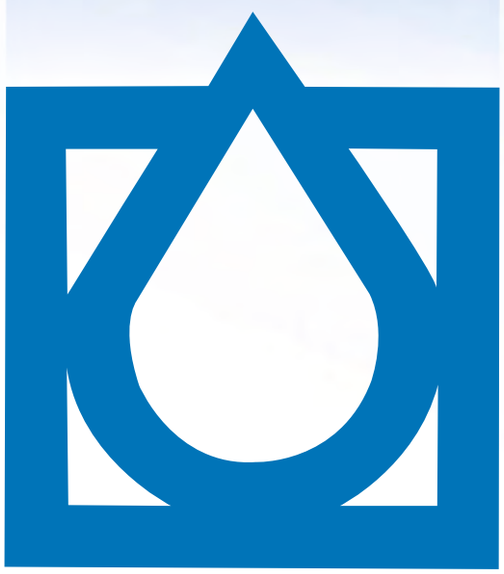

İZSU
